
Les schémas du chapitre 8 à savoir refaire

20 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Six stratégies à combiner (Charte d'Ottawa, 1986) (8.3.1, figure 8.1)

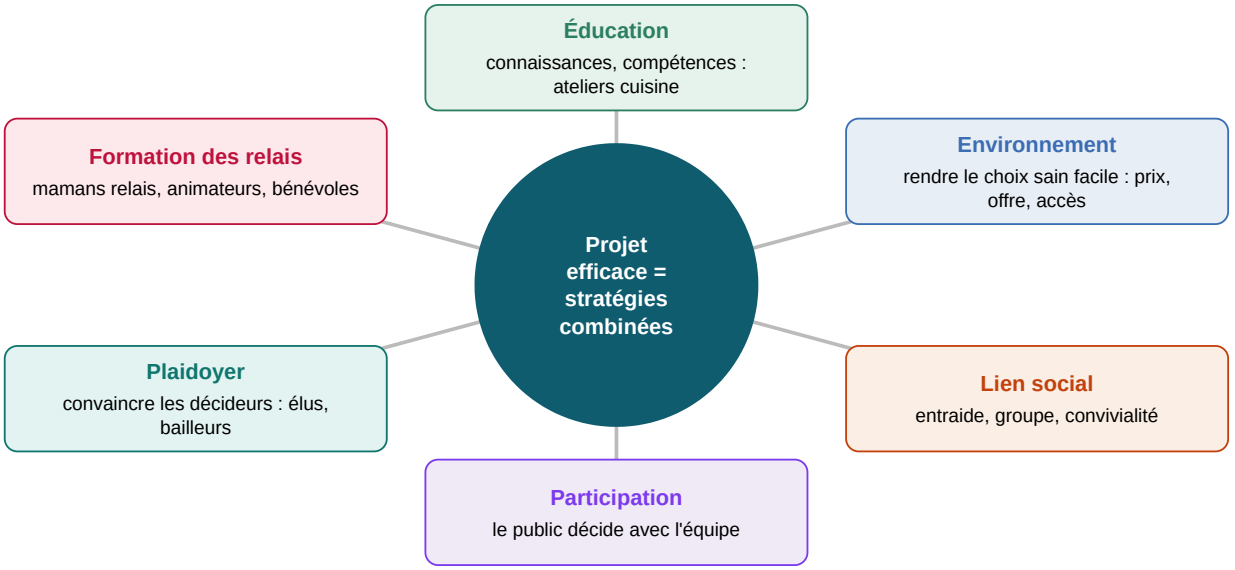

Dire : l'information seule est peu efficace et peut creuser les inégalités, car ce sont les plus favorisés qui en profitent. On choisit selon 6 critères : cohérence, efficacité, adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique. Au moins une action sur l'environnement à l'épreuve E5.

2. Décrire une action avec le QQOQCCP (8.3.1 ; fiche O8.1)

Question	Ce qu'on précise	Exemple : ateliers cuisine
Quoi ?	nature de l'action	6 ateliers « légumes secs »
Qui ?	public et intervenants	12 parents ; conseillère ESF + maman relais
Où ?	lieu accessible	cuisine du centre social, plain-pied
Quand ?	dates, horaires, durée	jeudis 9 h 30-11 h 30, mars-avril
Comment ?	méthodes, supports	cuisine en binômes, dégustation, recettes
Combien ?	budget, quantités	620 € ; 12 places par séance
Pourquoi ?	objectif spécifique visé	cuisiner les légumes secs 2 fois par semaine

Dire : la fiche projet F4 tient en 1 ou 2 pages. Le « pourquoi » relie toujours l'action à un objectif spécifique, lui-même relié à une cause du diagnostic.

3. La chaîne de cohérence (8.3.1, figure 8.2)



action orpheline (sans objectif) = à rattacher ou supprimer ; cause sans action = angle mort

Dire : action probante = preuves solides ; prometteuse = résultats encourageants mais peu évaluée. Pour transférer une action, on garde ses fonctions clés et on adapte la forme (Hawe, 2004). Outil ASTAIRE (Cambon, 2013) : population, environnement, mise en œuvre, soutien.

4. La matrice pouvoir/intérêt (Mendelow, 1981) (8.3.2, figure 8.3 ; fiche O8.2)

	Intérêt faible	Intérêt fort
Pouvoir fort	SATISFAIRE : élu, directeur de la CAF	GÉRER ÉTROITEMENT : ARS, mairie financeuse
Pouvoir faible	SURVEILLER : commerçant du quartier	ASSOCIER : parents, mamans relais, épicerie

Dire : Mendelow date de 1981 (et non 1991 comme écrit dans le cours). La position bouge : un acteur peut gagner en intérêt. Fiche PP : mission, intérêt, apport, crainte, pouvoir, modalité. Penser aux PP cachées (gardienne, agent d'entretien).

5. La matrice RACI (8.3.2 ; fiche O8.3)

Tâche	Inès	Conseillère	Directeur	Épicerie
Réserver la cuisine	R	C	A	I
Acheter les denrées	R	I	A	C
Animer l'atelier	C	R	A	I
Valider le budget	C	C	A	I
Bilan au COPIL	R	C	A	I

Dire : R = réalise, A = approuve et rend des comptes (un seul A par tâche), C = consulté avant, I = informé après. Deux A = personne ne décide vraiment.

6. Les instances du projet (8.3.2)

COPIL

- décide, valide
- 2 à 3 réunions par an
- financeurs, élus, direction, usagers

Comité technique

- organise, prépare
- plus fréquent
- professionnels de terrain

Comité d'usagers

- donne son avis
- participation réelle
- parents, habitants

Engagement écrit

- courriel → lettre d'engagement
- → convention
- on parle de la mission du partenaire

Dire : 4 types d'acteurs (CNED) : consultatifs (HCSP, CNS, CRSA, CNA), décideurs (État, ARS), opérateurs (Santé publique France, associations), financeurs (Assurance maladie, mutuelles). Attention : CRSA (et non CRAS), Haut Conseil (et non Haut Comité), CNS.

7. Qui finance quoi ? (8.3.3, figure 8.4 ; fiche O8.4)

Financeur	Ce qu'il finance	Repère
ARS	prévention, promotion de la santé	FIR, art. L. 1435-8 CSP
Collectivités	actions de quartier, alimentation	CLS, contrat de ville, PAT
CAF	familles, parentalité	REAAP
Conférence des financeurs	prévention de la perte d'autonomie	loi du 28/12/2015, 60 ans et +
AM, mutuelles, retraite	prévention des assurés	appels à projets annuels
Fondations	projets innovants	attention aux conflits d'intérêts
État	QPV, aide alimentaire	Mieux manger pour tous ; FSE+ (UE)


Dire : on vise le vocabulaire et les priorités de chaque financeur. Éligibilité : numéro RNA et SIRET. Dossier : Cerfa 12156 ou Le Compte Asso. Une fondation d'industriel de l'agroalimentaire pose un problème d'éthique.

8. Répondre à un appel à projets en 7 étapes (8.3.3)

1	**Lire le cahier**	priorités, public, montant, critères, date limite
2	**Vérifier l'éligibilité**	statut, RNA, SIRET, territoire
3	**Parler comme le financeur**	ses mots, ses priorités
4	**Rédiger**	constats chiffrés, objectifs SMART, actions, budget, évaluation
5	**Remplir le dossier**	Cerfa 12156 ou Le Compte Asso
6	**Relire**	chiffres identiques partout, pièces jointes
7	**Déposer à temps**	garder une marge de quelques jours


Dire : le résumé répond à 5 questions : quel problème, pour qui, quelles actions, avec qui, quels résultats. Après : contrat d'engagement républicain (loi du 24/8/2021), convention au-delà de 23 000 €/an, compte rendu financier (Cerfa 15059) sous 6 mois.

9. Calculer une subvention : min(taux × assiette ; plafond) (8.3.3 ; exercice)

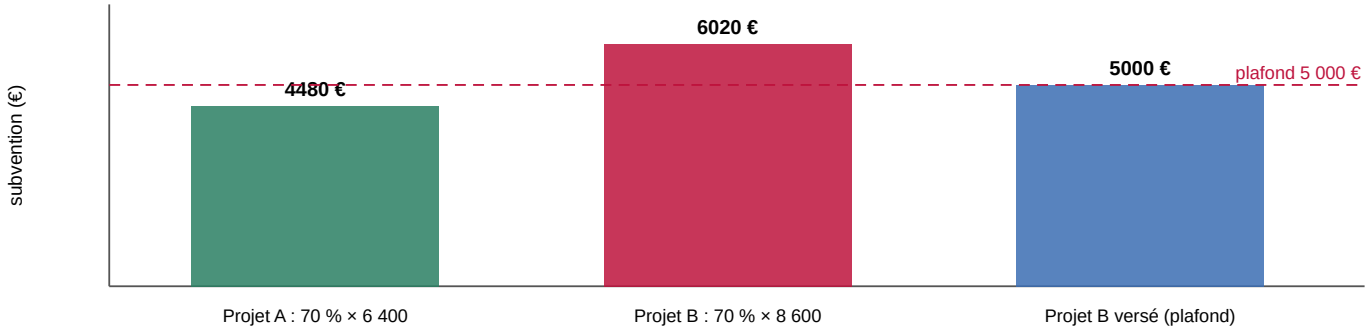

Dire : on calcule taux × assiette, puis on compare au plafond et on garde le plus petit. Projet B : 6 020 € dépasse le plafond, l'ARS verse 5 000 € ; il manque 1 020 € à trouver ailleurs (cofinancement).

10. Le réseau PERT et le chemin critique (8.3.4, figure 8.3 ; fiche O8.5)

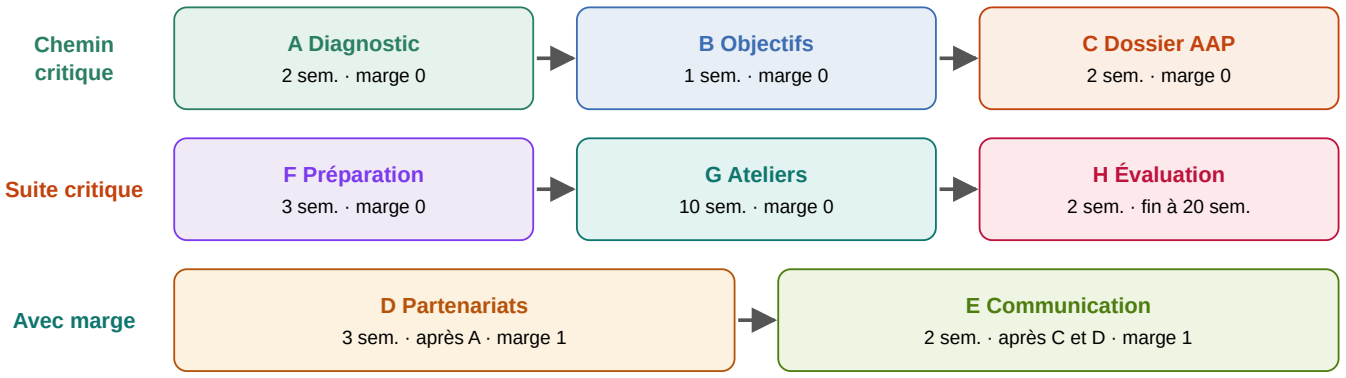

Dire : date au plus tôt = maximum des fins des tâches précédentes (G commence à max(7 ; 8) = 8) ; date au plus tard = minimum des débuts des suivantes ; marge = tard − tôt. A → B → C → F → G → H = 2 + 1 + 2 + 3 + 10 + 2 = 20 semaines. Un retard de 3 semaines sur une tâche qui a 2 semaines de marge décale le projet d'1 semaine.

11. Estimer une durée en trois points (8.3.4)

Optimiste (O)	Probable (M)	Pessimiste (P)	Résultat
• tout va bien • mairie : 1 semaine	• cas habituel, compté 4 fois • mairie : 3 semaines	• tout va mal • mairie : 8 semaines	• (O + 4M + P) / 6 • (1 + 12 + 8) / 6 = 3,5 sem. • écart-type (P − O)/6 ≈ 1,2

Dire : le Gantt (vers 1910) montre tâches, durées, jalons (losanges) et dépendances ; on y place les contraintes (vacances scolaires, Ramadan). Rétroplanning : on part de la date imposée et on garde 10 à 20 % de marge.

12. Le budget prévisionnel équilibré des Tilleuls (8.3.5 ; fiche O8.6)

Charges	€	Produits	€
60-62 Achats, services extérieurs	820	70 Participation des familles	144
64 Personnel (1 520 + 720)	2 240	74 Subvention ARS (FIR)	1 500
		74 Commune + CAF	600 + 400
		Autofinancement	416
86 Contributions en nature	450	87 Contributions en nature	450
TOTAL	3 510	TOTAL	3 510

Dire : règles : équilibre charges = produits ; compte 86 = compte 87 ; cofinancement ; quantité × coût unitaire ; distinguer acquis et sollicités. Ratios : ARS 1 500 / 3 510 = 42,7 % ; public 2 500 / 3 510 = 71,2 % ; personnel 2 240 / 3 510 = 63,8 % ; 3 510 / 12 = 292,50 € par famille. Coût horaire = 2 840 / 151,67 = 18,73 €.

13. Contributions en nature et seuil de rentabilité (8.3.5)

Contributions en nature	Coût par participant	Seuil	Écarts
• bénévolat : heures × taux justifié • salle : tarif de location • dons : valeur de marché • hors trésorerie (ANC 2018-06)	• fixes / n + variable • baisse quand n augmente	• fixes / (recette − variable) • 192,60 / 15,80 = 12,2 • → 13 participants	• (réalisé − prévu) / prévu × 100 • denrées + 12,6 % • total + 2,3 % : OK (< 5 %)


Dire : on arrondit toujours le seuil au nombre entier supérieur. Ne jamais gonfler les contributions en nature. Choix d'un devis : on fixe les poids des critères avant d'ouvrir les offres (scores 7,4 / 7,6 / 7,7).

14. Le tableau de bord de suivi (8.3.6, figure 8.8 ; fiche O8.7)

Indicateur	Formule	Cible	Alerte
Réalisation	séances faites / prévues	6/6	< 5
Présence	présences / (inscrits × séances)	≥ 80 %	< 70 %
Fidélisation	venus ≥ 4 fois / inscrits	≥ 75 %	< 60 %
Budget consommé	dépenses / budget × 100	≈ avancement	> + 10 pts
Retards	tâches en retard	0	1 critique

Dire : 5 à 8 indicateurs, toujours nombre + pourcentage. Mi-parcours des Tilleuls : 31 présences / (12 familles × 3 ateliers) = 86,1 % ; budget 1 650 / 3 510 = 47,0 %. Fiche indicateur : nom, définition, formule, source, fréquence, responsable, cible, seuil d'alerte. Écart : constater → causes → options → décider → vérifier.

15. Hiérarchiser les risques : criticité = P × G (8.3.6 ; fiche O8.8)

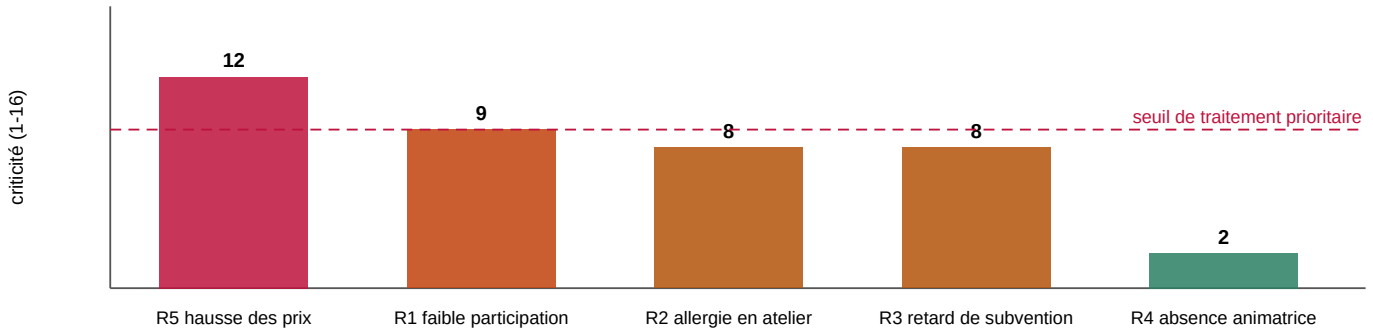

Dire : probabilité et gravité de 1 à 4 (R5 : 4 × 3 = 12) ; une gravité 4 (allergie) est toujours traitée, même peu probable. Registre : signal d'alerte, prévention, plan de repli, responsable. Les personnes passent avant le projet. TIAC = au moins 2 cas groupés : déclaration à l'ARS.

16. Le plan de communication (8.3.7, fiche F10)

1	**Objectifs**	de communication (faire venir 12 parents) ≠ objectif de santé
2	**Cibles**	public, relais, partenaires, financeurs
3	**Messages**	ce que la personne va trouver, pas ce qui ne va pas chez elle
4	**Canaux**	relais humains d'abord, affiches, réseaux, presse
5	**Calendrier**	J − 30, J − 7, J − 1, après
6	**Budget et évaluation**	coût par contact, d'où viennent les inscrits

Dire : les relais humains apportent 67,7 % des contacts ; les flyers 0,67 % pour 22,50 € par contact. On teste les messages auprès du public. Communiqué de presse : qui, quoi, où, quand, pourquoi, citation, contact. Photo : accord écrit.

17. Les cinq méthodes pédagogiques (8.3.8, figure 8.10)

Expositive	Interrogative	Démonstrative	Active	Coopérative
• l'animateur transmet • ≤ 15 min	• questions qui font • trouver la réponse	• montrer, puis faire • refaire	• les participants font • et découvrent	• travail en groupe • entraide

Dire : la « pyramide de l'apprentissage » (10 % de ce qu'on lit…) est un mythe sans base scientifique : ne pas la citer. Objectif pédagogique = qui + verbe observable + conditions + critère. Bloom révisée : se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Grille INPES 2005 : contenu, pédagogie, support, conception.

18. Logistique d'un atelier cuisine (8.3.9 ; exercice)

Quantités	Froid et chaud	Allergènes	Dates
• brut = net × coef / rendement • 900 g / 0,85 = 1 059 g • PDT 80 %, oignons 90 %	• froid 0-4 °C • chaud ≥ 63 °C • 63 → < 10 °C en < 2 h	• 14 allergènes (INCO 1169/2011) • affichage écrit • allergies demandées par écrit	• DLC : danger, ne pas dépasser • DDM : qualité seulement • premier entré, premier sorti


Dire : règlement 852/2004 et arrêté du 21/12/2009 : mains, tenue, marche en avant, pas de restes. Publics fragiles : pas d'œufs crus ni de lait cru. Depuis le 1/1/2024, la sécurité sanitaire des aliments relève du ministère de l'Agriculture. Urgence : 15 ou 112.

19. Le plan de trésorerie des Tilleuls (8.3.10, figure 8.9)

Mois	Encaissements	Décaissements	Solde fin de mois
Départ	réserve 500		500
Janvier	0	180	320
Février	0	150	170
Mars	600 (commune)	1 240	− 470
Avril	400 (CAF)	620	− 690
Mai	144 (familles)	700	− 1 246 (besoin max)
Juin	1 500 (ARS)	170	84

Dire : solde = solde précédent + encaissements − décaissements. Besoin maximal 1 246 € fin mai, avant le versement de l'ARS en juin. Budget = le projet est-il financé ? Trésorerie = l'argent arrive-t-il à temps ? Les contributions en nature (450 €) n'y figurent jamais. Solutions : acompte, décaler des achats, trésorerie de la structure, versement anticipé.

20. Pérenniser et coordonner (8.3.12 et approfondissements)



Dire : scénarios chiffrés (3 060 € avec intervenant contre 870 € avec relais formés). Pas de dépendance à une seule personne. Cadre logique : objectif général, un seul objectif spécifique, résultats, activités, avec indicateurs, sources et hypothèses ; lecture de bas en haut. FSE+ 2021-2027 : versements tardifs, contrôles.
