DOCUMENT COMPLET · VERSION JOURNAL



CHAPITRE 8

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Mots-clés : Démarche de projet (2), Stratégies, Partenaires, Financements, Calendrier, Budget, Pilotage

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 8 · Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage · version journal

1 COURS

Mise en page journal (BPADN) · 62 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 65

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page journal (BPADN) · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 66 à 72

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page journal (BPADN) · 96 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 73 à 168

4 ANNALES E5

Mise en page journal (BPADN) · 28 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 169 à 196

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

8.1 Compétences mobilisées 8
8.2 Croisement référentiel × précisions × indications 8
8.3 Cours 9
8.4 Approfondissements 51
8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 55
8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 56
8.7 L'essentiel à retenir 58
8.8 Entraînement 59
8.9 Glossaire 65
8.10 Renvois bibliographiques par notion 65
8.12 Bibliographie numérotée 65

2 · Fiche de révision et fiches-outils **66**

Fiche de révision du chapitre 8 70
1. Les définitions à savoir 70
2. Les outils 70
3. Les formules 70
4. Les financeurs 71
5. Les pièges 71
6. Auto-test 71
7. Flashcards 71
Compléments du chapitre enrichi 71
Fiches-outils du chapitre 8 71
O8.1 – Fiche action QQOQCCP 71
O8.2 – Cartographie des parties prenantes 71
O8.3 – Matrice RACI 71
O8.4 – Analyse d'un cahier des charges 71
O8.5 – Calcul PERT 72
O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé 72
O8.7 – Registre des risques 72
O8.8 – Compte rendu de réunion 72

3 · Cahier d'exercices **73**

Cahier d'exercices – Chapitre 8 79
Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action 80
Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage 92
Partie 3 – Les financements et les appels à projets 103
Partie 4 – Planifier le projet 113
Partie 5 – Construire et suivre le budget 123
Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques 132
Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication 143
Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet 155
Bilan : grille d'auto-évaluation 168

4 · Annales E5 ..... **169**

Cahier d'annales E5 – chapitre 8 174
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 175
Partie II – Les corrigés détaillés 183
Grille d'auto-évaluation 196

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 8

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 8

Article de synthèse · Review article

Chapitre 8 – Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action, pilotage, appels à projets et parties prenantes

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 8

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (2); Stratégies; Partenaires; Financements; Calendrier; Budget; Pilotage

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ; décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ; identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ; connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ; planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ; construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé.

Contenu. 8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 8.3.1 Choisir les stratégies et les actions ; 8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat ; 8.3.3 Les financements et les appels à projets ; 8.3.4 Planifier le projet ; 8.3.5 Construire et suivre le budget ; 8.3.6 Piloter le projet ; 8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet ; 8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ Combiner les stratégies : éducation + environnement + lien social + participation + plaidoyer + formation de relais.

■ Choisir une action : cohérence, efficacité (données probantes), adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique.

■ QQOQCCP : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi ; fiche projet (F4).

■ Parties prenantes : matrice pouvoir/intérêt (gérer étroitement, satisfaire, associer, surveiller) ; RACI (réalise, approuve, consulté, informé) ; convention ; COPIL (décide) / comité technique (organise) / comité d'usage

■ Financeurs : ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP), collectivités, CAF, conférence des financeurs (loi du 28 décembre 2015), assurance maladie, mutuelles, fondations ; appel à projets : lire le cahier des charges, éligibilité, c

Sommaire

8.1 Compétences mobilisées 8

8.2 Croisement référentiel × précisions × indications 8

8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 8

8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 8

8.3 Cours 9

8.3.1 Choisir les stratégies et les actions 9

8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat 12

8.3.3 Les financements et les appels à projets 16

8.3.4 Planifier le projet 20

8.3.5 Construire et suivre le budget 24

8.3.6 Piloter le projet 29

8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet 32

8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques 35

8.3.9 Organiser la logistique des ateliers 39

8.3.10 Anticiper la trésorerie du projet 42

8.3.11 Rédiger un dossier de demande de financement : exemple commenté 44

8.3.12 La convention de partenariat : un modèle commenté 45

8.3.13 Estimer la charge de travail et tenir une feuille de temps 47

8.3.14 Utiliser les outils numériques du projet 48

8.3.15 Fil rouge : le plan d'action d'Inès 51

8.4 Approfondissements 51

8.4.1 Le cadre logique, outil des financeurs 51

8.4.2 Le travail en réseau et la coordination territoriale 52

8.4.3 La pérennisation dès la conception 53

8.4.4 Les contrats pluriannuels et les fonds européens 54

8.4.5 La gestion des bénévoles 55

8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 55

8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 56

Ce que le jury attend sur la conception et le pilotage 58

8.7 L'essentiel à retenir 58

8.8 Entraînement 59

8.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 59

8.8.2 Exercices 60

8.8.3 Questions de réflexion 62

8.8.4 Étude de cas 62

8.8.5 Mises en situation express 62

8.8.6 Exercices complémentaires 64

8.9 Glossaire 65

8.10 Renvois bibliographiques par notion 65

8.12 Bibliographie numérotée 65

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ;
- décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ;
- identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ;
- connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ;
- planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ;
- construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé ;
- piloter un projet : tableau de bord, gestion des risques, analyse des écarts, ajustements, comptes rendus.

8.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Cœur de la compétence : concevoir un plan d'action et des moyens réalistes, mobiliser partenaires et financements, piloter ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes ; projet mis en œuvre ; ajustements envisagés

C3.2 — *Ce que le chapitre apporte :* Programmer et organiser les ateliers dans le plan d'action (calendrier, budget des denrées, logistique) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Programme d'ateliers adapté ; organisation cohérente

C3.5 — *Ce que le chapitre apporte :* Présenter le projet aux partenaires et financeurs, animer une réunion, travailler en équipe ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Expression écrite et orale maîtrisée ; techniques d'animation et posture adaptées

C3.6 — *Ce que le chapitre apporte :* Partager les documents du projet (tableau de bord, budget) de façon sécurisée ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Environnement numérique géré et sécurisé ; bonnes pratiques de messagerie

8.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Stratégies d'intervention — *Objectifs pour l'apprenant :* Choisir et justifier des actions ; *Limites et attendus :* Données probantes ; combinaison de stratégies

Plan d'action — *Objectifs pour l'apprenant :* Formaliser une action (QQOQCCP, fiche projet) ; *Limites et attendus :* Fiche F4

Parties prenantes, partenariat — *Objectifs pour l'apprenant :* Identifier, analyser, mobiliser ; *Limites et attendus :* Matrice pouvoir/intérêt ; convention ; COPIL

Financements, appels à projets — *Objectifs pour l'apprenant :* Repérer les financeurs ; lire un cahier des charges ; rédiger une réponse ; *Limites et attendus :* FIR, CAF, collectivités ; formulaire Cerfa n° 12156

Planification — *Objectifs pour l'apprenant :* Construire un Gantt ; identifier le chemin critique ; *Limites et attendus :* Fiche F5

Budget — *Objectifs pour l'apprenant :* Construire un budget équilibré ; calculer coûts et ratios ; *Limites et attendus :* Plan comptable associatif simplifié ; fiche F6 ; tableur

Pilotage — *Objectifs pour l'apprenant :* Suivre, anticiper les risques, ajuster ; *Limites et attendus :* Tableau de bord ; matrice des risques

8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », indicateurs « Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes » et « Projet mis en œuvre ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 pour les notions et les outils de la démarche de projet, p. 108 pour les étapes et l'apport des autres blocs). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 8.2.2.

Texte · Critère ou notion · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Étapes : conception du projet et plan d'action ; conduite et pilotage du projet ; *Où dans ce cours :* 8.3.1 ; 8.3.4 à 8.3.6 ; 8.3.15 (fil rouge)

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Appel à projets ; parties prenantes ; *Où dans ce cours :* 8.3.2 et 8.3.3 ; 8.3.11 (dossier commenté) ; 8.3.12 (convention)

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Cahier des charges ; fiche projet ; conducteur de séance ; *Où dans ce cours :* 8.3.3 ; 8.3.1 (fiche projet) ; encadré « Repères » du CNED en 8.3.2 ; chapitre 10

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Plan de communication ; *Où dans ce cours :* 8.3.7

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Diagramme de Gantt, feuille de temps, tableaux de bord ; *Où dans ce cours :* 8.3.4 ; 8.3.13 ; 8.3.6

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Logiciels de gestion de projet, mind-mapping, tableur, formulaire en ligne ; *Où dans ce cours :* 8.3.14

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Budgets (autres enseignements) ; *Où dans ce cours :* 8.3.5 ; 8.3.10 (trésorerie)

Référentiel, C3.1 — *Critère ou notion :* « Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes » ; « Projet mis en œuvre » ; *Où dans ce cours :* 8.3.1 à 8.3.6 ; 8.3.9 (logistique)

8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) présente les étapes du projet et ses parties prenantes (séquence 2) et les acteurs des politiques de santé (séquence 3). Il ne détaille pas la planification ni le

budget, qui viennent du guide de 2025. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

Essentiels S2 §2 (p. 10 et 11) — *Contenu CNED :* Parties prenantes : équipe, partenaires, usagers ; étapes du diagnostic à l'évaluation (doc. 3) ; *Où dans ce cours :* 8.3.2 (parties prenantes, encadré « Repères » du CNED) ; 8.3.1

Essentiels S2 §2 (p. 12) — *Contenu CNED :* Communication et valorisation tout au long du projet ; cadre à respecter ; *Où dans ce cours :* 8.3.7 (plan de communication) ; 8.3.12 (convention) ; chapitre 6

Essentiels S3 §1.1 (p. 13) — *Contenu CNED :* Quatre types d'acteurs : consultatifs, décideurs, opérateurs, financeurs ; *Où dans ce cours :* 8.3.2 (encadré « Repères » du CNED) ; 8.3.3 (financeurs)

Essentiels S3 §1.2 (p. 14) — *Contenu CNED :* Priorité sanitaire, programme, planification ; *Où dans ce cours :* 8.3.1 (choisir des actions cohérentes avec les politiques) ; chapitre 7

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Instances** (p. 14 et 15) : le fascicule écrit « CRAS », « Haut Comité de santé publique » et « CNSP ». Il faut lire **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), **Haut Conseil** de la santé publique (depuis 2004) et **CNS** (Conférence nationale de santé).
- **Politiques de référence** : un projet de 2026 s'appuie sur le **PNNS 5** et le **PNA 4** (2026-2030, lancés le 8 avril 2026) et sur la SNANC 2025-2030, et non sur le PNNS 4 (2019-2023) ; les annales du chapitre ont été corrigées.
- **Financements vérifiés en octobre 2026** : le formulaire de demande de subvention reste le Cerfa n° 12156*06 (compte rendu : Cerfa n° 15059) ; le programme « Mieux manger pour tous » a publié ses appels à projets 2026 ; le FSE+ couvre la période 2021-2027.

8.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Appels à projets** : les ARS (fonds d'intervention régional), les DRAAF (programme national pour l'alimentation, PNA 4 2026-2030) et les services de l'État chargés de la cohésion sociale (« Mieux manger pour tous ») publient leurs appels à projets chaque année, avec des priorités et des calendriers propres : consultez leurs sites en début d'année.
- **Demandes de subvention** : le formulaire Cerfa n° 12156*06 et le service en ligne « Le Compte Asso » sont les outils de référence pour les associations (version en vigueur en octobre 2026 ; compte rendu financier : Cerfa n° 15059).
- **Interventions probantes** : le répertoire de Santé publique France des interventions efficaces ou prometteuses est enrichi régulièrement : consultez-le avant de choisir une action.
- **Outils numériques** : avant d'utiliser un logiciel de gestion de projet ou un formulaire en ligne pour des données personnelles, vérifiez les recommandations de la CNIL et la politique de votre structure (voir la partie « Utiliser les outils numériques du projet » de ce cours).

8.3.1 Choisir les stratégies et les actions

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S3 §1.2 (p. 14)

Combiner plusieurs stratégies

Les objectifs spécifiques (chapitre 7) indiquent **ce qui doit changer** ; les stratégies indiquent **par quels leviers**. Les interventions les plus efficaces en nutrition **combinent** plusieurs leviers (Charte d'Ottawa, chapitre 1) : une action purement informative change peu les comportements, surtout chez les publics défavorisés.

Stratégie · Exemples en nutrition · Facteurs visés (PRECEDE)

Éducation pour la santé — *Exemples en nutrition :* Ateliers culinaires, dégustations, groupes de parole, éducation sensorielle ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Prédisposants (connaissances, attitudes) et facilitants (compétences)

Action sur l'environnement — *Exemples en nutrition :* Eau en carafe, fruits à la récréation, menus améliorés, partenariat avec l'épicerie solidaire, jardin partagé ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Facilitants (accessibilité, prix, offre)

Renforcement du lien social et de l'entourage — *Exemples en nutrition :* Mamans relais, repas partagés, implication des familles ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* De renforcement

Participation et développement du pouvoir d'agir — *Exemples en nutrition :* Comité d'usagers, choix des recettes par les familles, habitants enquêteurs ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Tous ; empowerment

Plaidoyer — *Exemples en nutrition :* Note au CLS sur l'offre alimentaire du quartier, demande de navette vers le marché ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Environnement, politiques

Formation des relais — *Exemples en nutrition :* Formation des animateurs périscolaires, des aides à domicile ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Facilitants ; démultiplication

Méthode pas à pas – Choisir une action : 6 questions

1. Cohérence : l'action répond-elle à un objectif spécifique (et à une cause de l'arbre) ?

2. Efficacité : existe-t-il des preuves ou des retours d'expérience (portail des interventions probantes de Santé publique France, littérature, évaluations d'actions similaires) ?

3. Adaptation au public : littératie, langue, culture, horaires, budget, mobilité (chapitres 4 et 5) ?

4. Faisabilité : compétences, locaux, matériel, temps, budget ?

5. Acceptabilité et participation : les personnes ont-elles été consultées ?

6. Éthique : non-stigmatisation, équité, indépendance (chapitre 6) ?

Décrire une action : la méthode QQOQCCP

Question · Ce qu'on précise · Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls

Quoi ? — *Ce qu'on précise :* Nature de l'action, contenu ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Atelier culinaire « Repas complet petit budget »

Qui ? — *Ce qu'on précise :* Public ; animateurs ; partenaires ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* 12 familles ; Inès et la diététicienne ; l'épicerie fournit les légumes secs

Où ? — *Ce qu'on précise :* Lieu, accessibilité ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Cuisine pédagogique du centre social, rez-de-chaussée

Quand ? — *Ce qu'on précise :* Date, horaire, durée, fréquence ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Mardi 28 mars 2028, 9 h – 12 h

Comment ? — *Ce qu'on précise :* Méthodes, outils, déroulé ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Photo-expression, réalisation en 3 groupes, dégustation, calcul du coût (conducteur F7)

Combien ? — *Ce qu'on précise :* Moyens humains, matériels, coût ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* 2 animatrices ; 16,55 € de denrées ; 6 h de préparation

Pourquoi ? — *Ce qu'on précise :* Objectif visé ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Objectif spécifique 1 (légumes secs) et 2 (connaissances petit budget)

Définition – Fiche projet

Document de synthèse (1 à 2 pages) qui présente le projet à un partenaire, à un financeur ou à un jury : intitulé, porteur, contexte et constats, public, objectifs, actions, partenaires, calendrier, évaluation, budget (fiche **F4**). Elle sert de base à la réponse aux appels à projets.

De l'arbre à problèmes au plan d'action : la chaîne logique

Un plan d'action solide ne commence pas par une liste d'idées d'ateliers. Il commence par les **causes** retenues dans l'arbre à problèmes (chapitre 7). Chaque cause sur laquelle le projet veut agir devient un **objectif spécifique** ; chaque objectif spécifique appelle une ou plusieurs **stratégies** ; chaque stratégie se traduit en **actions** concrètes, et chaque action reçoit un **indicateur** de suivi. Cette chaîne garantit que rien n'est fait « pour faire » et que rien d'important n'est oublié.

Cause retenue (arbre à problèmes) · Objectif spécifique · Stratégie · Action · Indicateur de suivi

Les parents ne savent pas cuisiner les légumes secs — *Objectif spécifique :* Augmenter la part des familles qui cuisinent des légumes secs chaque semaine ; *Stratégie :* Éducation pour la santé ; *Action :* Quatre ateliers « légumes secs en 30 minutes » ; *Indicateur de suivi :* Nombre d'ateliers réalisés ; taux de présence

Le seul commerce proche vend peu de produits frais, à prix élevé — *Objectif spécifique :* Améliorer l'accès aux fruits et aux légumes frais ; *Stratégie :* Action sur l'environnement ; *Action :* Marché de producteurs mensuel sur la place ; panier à prix solidaire ; *Indicateur de suivi :* Nombre de marchés ; nombre de paniers vendus

Les parents se sentent seuls face aux refus des enfants — *Objectif spécifique :* Renforcer le soutien entre parents ; *Stratégie :* Lien social ; *Action :* Groupe de parole mensuel avec la PMI ; *Indicateur de suivi :* Nombre de séances ; nombre de parents présents

Les familles ne sont jamais consultées sur les actions du quartier — *Objectif spécifique :* Associer les familles aux choix du projet ; *Stratégie :* Participation ; *Action :* Comité de quatre parents au comité de pilotage ; *Indicateur de suivi :* Nombre de réunions avec les parents ; décisions prises sur leur proposition

Le tableau se lit dans les deux sens. De gauche à droite, il répond à la question **« comment ? »** : comment agir sur cette cause ? De droite à gauche, il répond à la question **« pourquoi ? »** : pourquoi faire cette action ? Si une action ne peut pas être reliée à une cause, elle est « orpheline » : on la supprime ou on la rattache à un objectif. Si une cause importante n'a aucune action, le projet a un angle mort.

Méthode pas à pas – Construire la chaîne logique en cinq étapes

1. Reprendre l'arbre à problèmes validé et entourer les causes sur lesquelles le projet peut agir (critères de faisabilité et de priorité, chapitre 7).

2. Transformer chaque cause en objectif spécifique SMART : la cause négative devient un changement positif mesurable.

3. Choisir une ou deux stratégies par objectif, en veillant à combiner, sur l'ensemble du projet, des stratégies individuelles (éducation) et collectives (environnement, lien social, plaidoyer).

4. Décrire chaque action avec la méthode QQOQCCP (8.3.1) et vérifier sa faisabilité.

5. Associer un indicateur de suivi à chaque action ; les indicateurs de résultat, liés aux objectifs, sont préparés pour l'évaluation (chapitre 9).

Attention – Une action peut servir plusieurs objectifs

Un atelier culinaire peut à la fois donner un savoir-faire (objectif 1) et créer du lien entre parents (objectif 3). C'est un avantage, à condition de le prévoir : on choisit alors des méthodes qui servent les deux objectifs (travail en binômes, repas pris ensemble) et on suit les deux indicateurs. À l'inverse, un projet dont toutes les actions sont des ateliers n'agit que sur les facteurs individuels, même s'il en organise beaucoup.

Exemple – Une chaîne logique incomplète, repérée en comité technique

Dans un projet sur l'alimentation de personnes âgées vivant seules (CCAS fictif), l'arbre retenait trois causes : la difficulté à faire les courses sans voiture, la perte d'envie de cuisiner pour soi seul, et la méconnaissance des besoins en protéines après 70 ans. Le plan proposait cinq conférences et une distribution de livrets. Le comité technique a constaté que la première cause n'avait aucune action, et que la deuxième était traitée par une information alors qu'elle relève du lien social. Le plan a été complété par une navette solidaire vers le marché (environnement) et par des repas partagés mensuels (lien social) ; deux conférences sur cinq ont été remplacées par

des ateliers.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.1

Dans une école de production (structure fictive qui forme des jeunes de 15 à 18 ans en atelier), l'arbre à problèmes retient trois causes du saut du petit-déjeuner : les horaires de transport très matinaux, l'absence de produits du petit-déjeuner dans les placards en fin de mois, et l'idée qu'un petit-déjeuner « prend trop de temps ». Pour chaque cause, proposez un objectif spécifique, une stratégie, une action et un indicateur de suivi.

Corrigé

Exemple de réponse. Horaires matinaux : augmenter la part de jeunes qui prennent un petit-déjeuner avant de partir ; stratégie d'action sur l'environnement ; un « petit-déjeuner d'atelier » servi à l'arrivée, de 7 h 45 à 8 h, dans la salle de pause ; indicateur : nombre de portions prises chaque semaine. Placards vides en fin de mois : améliorer l'accès aux produits de base ; environnement et partenariat ; convention avec l'épicerie sociale pour un panier petit-déjeuner à prix réduit ; indicateur : nombre de paniers retirés. « Trop de temps » : faire évoluer cette représentation ; éducation pour la santé ; défi « petit-déjeuner en 5 minutes » avec dégustation ; indicateur : nombre de participants au défi.

S'appuyer sur des interventions qui ont fait leurs preuves

Avant d'inventer une action, le professionnel cherche si des interventions comparables ont déjà été **évaluées**. C'est le deuxième critère de choix d'une action (efficacité). Santé publique France met en ligne un **répertoire des interventions efficaces ou prometteuses** en prévention et promotion de la santé : chaque fiche décrit l'intervention, son public, ses résultats et le niveau de preuve. Les revues de la littérature, les évaluations publiées par les instances régionales de promotion de la santé et les retours d'expérience des réseaux locaux complètent cette recherche.

Définition – Intervention probante, intervention prometteuse

Une intervention **probante** a montré son efficacité dans des évaluations de bonne qualité, si possible répétées. Une intervention **prometteuse** a donné des résultats encourageants, mais avec un niveau de preuve plus faible (évaluation unique, petit échantillon, absence de groupe de comparaison). Les deux peuvent inspirer un projet, à condition de dire clairement sur quoi l'on s'appuie.

Transférer une action : garder les fonctions clés, adapter la forme

Une intervention efficace dans un contexte ne l'est pas forcément dans un autre : le public, les ressources et l'environnement changent. Pour transférer une action, on distingue ce qui la fait marcher et ce qui peut changer. Les chercheurs parlent de **fonctions clés** (ce que l'action doit produire, par exemple « donner un savoir-faire pratique » ou « créer un soutien entre pairs ») et de **forme** (la manière concrète de le faire : durée, lieu, support, animateur). Hawe et ses collègues ont proposé cette distinction en 2004 (*British Medical Journal*) : on peut adapter la forme, à condition de préserver les fonctions clés.

Élément de l'action d'origine · Fonction clé (à garder) · Forme (adaptable)

Six ateliers culinaires de 3 heures en centre social — *Fonction clé (à garder) :* Pratique répétée d'un geste culinaire, avec dégustation ; *Forme (adaptable) :* Quatre ateliers de 2 heures dans la cuisine d'une résidence

Recettes choisies par les participantes — *Fonction clé (à garder) :* Participation au choix du contenu ; *Forme (adaptable) :* Recettes proposées par un comité de résidents

Animation par une diététicienne et une mère relais — *Fonction clé (à garder) :* Présence d'un pair qui partage l'expérience du public ; *Forme (adaptable) :* Co-animation par un résident volontaire

Livret de recettes remis à la fin — *Fonction clé (à garder) :* Support pour refaire à la maison ; *Forme (adaptable) :* Fiches avec photos et pictogrammes, ou vidéos courtes

Pour analyser la **transférabilité**, une équipe française a construit la grille ASTAIRE (Cambon et ses collègues, *BMC Public Health*, 2013). Elle invite à comparer le contexte d'origine et le nouveau contexte sur quatre familles de critères : la **population** (caractéristiques, besoins, attentes), l'**environnement** (ressources, partenaires, politiques), la **mise en œuvre** (compétences des intervenants, moyens) et le **soutien au transfert** (accompagnement, formation). Plus les écarts sont grands, plus l'adaptation doit être réfléchie et évaluée.

Astuce – Citer ses sources dans le dossier

Dans le dossier de projet et devant le jury, une phrase suffit souvent : « Cette action s'inspire de l'intervention X, décrite dans le répertoire de Santé publique France (consulté le…), dont nous avons gardé la pratique répétée et la participation, et adapté la durée et le lieu. » Elle montre que le choix est réfléchi et que l'on connaît ses limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.2

Une association veut reprendre, dans des villages ruraux, une action évaluée en ville : un « marché mobile » de fruits et de légumes à prix réduit, accompagné de dégustations, installé une fois par semaine au pied des immeubles. Identifiez deux fonctions clés de cette action, puis proposez deux adaptations de forme pour le milieu rural.

Corrigé

Fonctions clés : rendre les fruits et légumes **accessibles** (proximité et prix réduit) ; donner envie de les **goûter et de les cuisiner** (dégustation, idées de recettes). Adaptations de forme : une tournée qui s'arrête sur la

place de chaque village à jour fixe, au moment de la sortie de l'école ou du marché existant ; une commande possible par téléphone pour les personnes qui ne se déplacent pas, avec un portage par des bénévoles ; des recettes adaptées aux produits de saison des producteurs locaux.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.1 – Les stratégies et les actions

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six stratégies d'intervention présentées dans le cours.
2. Quelles sont les sept questions de la méthode QQOQCCP ?
3. Qu'est-ce qu'une action « orpheline », et que faut-il en faire ?
4. Citez quatre des six questions qui aident à choisir une action.
5. Que signifie « garder les fonctions clés » quand on transfère une action ?
6. Pourquoi une action purement informative est-elle insuffisante, surtout auprès des publics défavorisés ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.1

1. Éducation pour la santé ; action sur l'environnement ; lien social et entourage ; participation et pouvoir d'agir ; plaidoyer ; formation des relais.
2. Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
3. Une action qui ne répond à aucun objectif spécifique ; on la supprime ou on la rattache explicitement à un objectif.
4. Cohérence, efficacité, adaptation au public, faisabilité, acceptabilité et participation, éthique (quatre suffisent).
5. Préserver ce qui fait l'efficacité de l'action (par exemple la pratique répétée), tout en adaptant sa forme (durée, lieu, support) au nouveau contexte.
6. L'information ne lève ni les freins d'accès (prix, offre, transport), ni le manque de savoir-faire, ni l'absence de soutien ; les personnes qui ont le plus de ressources en profitent davantage, ce qui peut creuser les inégalités.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.2.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le tableau des stratégies et la chaîne logique.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.1 et je refais les exercices d'application.

8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S3 §1.1 (p. 13)

Définition – Partie prenante et partenaire

Une **partie prenante** est toute personne ou organisation **concernée** par le projet ou **susceptible de l'influencer** : public, professionnels, structures, élus, financeurs, commerçants. Un **partenaire** est une partie prenante qui **s'engage** dans le projet en apportant des ressources (temps, locaux, produits, financement, orientation du public) selon des modalités définies.

Cartographier et analyser les parties prenantes

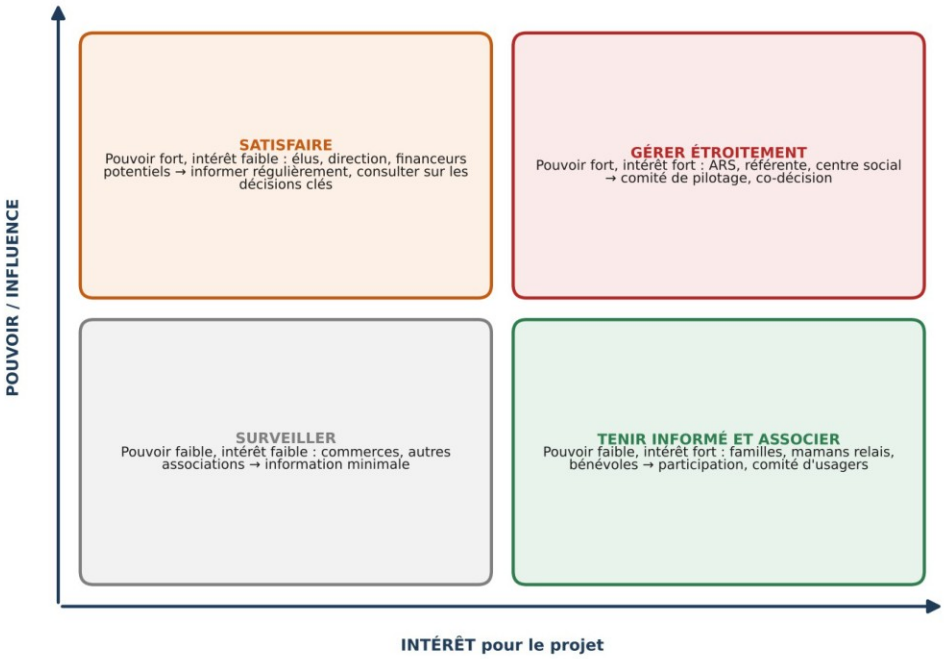


Figure 8.1 – La matrice pouvoir/intérêt des parties prenantes

Comprendre le schéma – Figure 8.1

1. Chaque partie prenante est placée selon son **pouvoir** (capacité à décider, financer, bloquer) et son **intérêt** pour le projet (d'après la grille de Mendelow).

2. Pouvoir fort, intérêt fort (ARS financeur, direction et référente du centre social) : à **gérer étroitement** ; ils siègent au comité de pilotage et participent aux décisions.

3. Pouvoir fort, intérêt faible (élus, direction de la CAF) : à **satisfaire** ; on les informe des avancées et on les consulte sur les décisions qui les concernent (communication institutionnelle, invitation au temps fort).

4. Pouvoir faible, intérêt fort (familles, mamans relais, bénévoles) : à **associer** et tenir informés ; ce sont les premiers concernés, leur participation est une exigence (chapitre 6).

5. Pouvoir faible, intérêt faible (commerces voisins) : à **surveiller**, avec une information minimale ; leur position peut évoluer (un commerce peut devenir partenaire).

6. La matrice est **dynamique** : on la met à jour au cours du projet.

Répartir les rôles : la matrice RACI

Tâche · Inès (étudiante) · Diététicienne · Référente familles · Épicerie · COPIL

Diagnostic — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* C ; *COPIL :* I

Dossier d'appel à projets — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* I ; *COPIL :* I

Conception des ateliers — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* I ; *COPIL :* –

Animation ateliers 1 à 3 — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* R ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* – ; *COPIL :* –

Animation ateliers 4 à 6 — *Inès (étudiante) :* C ; *Diététicienne :* R ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* – ; *COPIL :* –

Orientation des familles — *Inès (étudiante) :* I ; *Diététicienne :* I ; *Référente familles :* R ; *Épicerie :* R ; *COPIL :* –

Évaluation — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* I ; *COPIL :* I

Validation des étapes — *Inès (étudiante) :* C ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* R ; *Épicerie :* C ; *COPIL :* A

R = réalise ; A = approuve, rend compte (une seule personne A par tâche) ; C = consulté ; I = informé.

Formaliser le partenariat

Outil · Contenu

Convention de partenariat — *Contenu :* Objet ; engagements de chaque partie (ressources, moyens, temps) ; durée ; communication (logos, mentions) ; confidentialité et RGPD ; évaluation ; conditions de résiliation ; signatures

Comité de pilotage (COPIL) — *Contenu :* Instance de décision : porteur, partenaires principaux, financeurs, représentants des usagers ; 2 à 3 réunions (lancement, mi-parcours, bilan)

Comité technique / équipe projet — *Contenu :* Instance d'organisation et de mise en œuvre ; réunions fréquentes ; suivi du tableau de bord

Comité d'usagers — *Contenu :* Participation des personnes concernées (choix des thèmes, avis sur les supports)

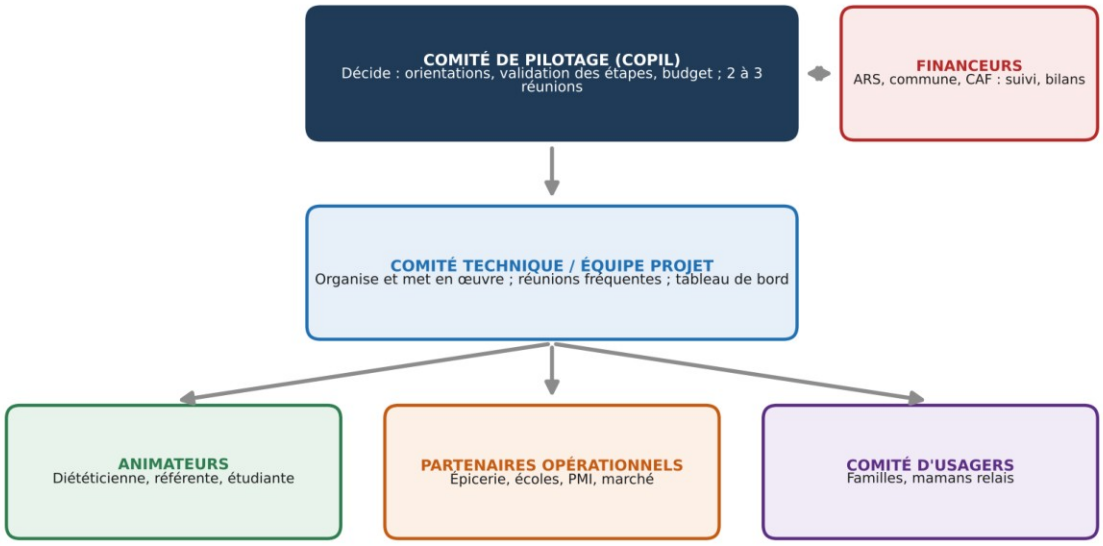


Figure 8.2 – L'organisation du pilotage d'un projet

Attention – Un partenariat se construit

Un partenaire ne s'implique que s'il y trouve un **intérêt** pour sa propre mission (l'épicerie veut que les légumes secs soient utilisés ; l'école veut associer les parents). Présenter le projet en montrant ce qu'il **apporte** au partenaire, rester disponible, respecter ses contraintes, l'associer aux décisions et lui **restituer** les résultats sont les clés d'un partenariat durable.

Analyser chaque partie prenante en profondeur

La matrice pouvoir/intérêt donne une vue d'ensemble. Pour les parties prenantes les plus importantes, on va plus loin avec une **fiche d'analyse** : que veut cette personne ou cette structure ? Que peut-elle apporter ? Que craint-elle ? Comment l'associer ? Ce travail évite deux erreurs fréquentes : supposer que tout le monde partage les objectifs du projet, et oublier une partie prenante capable de le bloquer.

Question · Ce que l'on cherche · Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner

Quelle est sa mission ? — *Ce que l'on cherche :* Ce qui guide ses décisions ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Réussite des élèves, sécurité, relations avec les familles

Quel intérêt peut-il trouver au projet ? — *Ce que l'on cherche :* Le point de rencontre avec ses propres objectifs ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Moins de malaises et de baisses d'attention en fin de matinée

Que peut-il apporter ? — *Ce que l'on cherche :* Les ressources concrètes ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Une salle, un créneau dans l'emploi du temps, l'accord pour informer les parents

Que craint-il ? — *Ce que l'on cherche :* Les freins, souvent non dits ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Surcharge des équipes, responsabilité en cas d'allergie, réaction des parents

Quel est son pouvoir sur le projet ? — *Ce que l'on cherche :* Sa capacité à décider ou à bloquer ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Il peut refuser l'accès à l'établissement

Comment l'associer ? — *Ce que l'on cherche :* La modalité adaptée ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Le rencontrer avant tout dépôt de dossier ; l'inviter au comité de pilotage ; lui proposer un protocole allergies écrit

Méthode pas à pas – Préparer la rencontre avec un futur partenaire

1. Se renseigner sur la structure : missions, public, projets en cours, personnes à rencontrer.

2. Préparer un message court : le constat (deux ou trois chiffres), l'objectif du projet, ce que l'on attend du partenaire, et surtout ce que le projet peut lui apporter.

3. Écouter ses contraintes et ses craintes avant de proposer des solutions.

4. Proposer un engagement précis et limité (une salle deux matins par mois, une orientation de familles) plutôt qu'une participation vague.

5. Laisser une trace : un courriel de remerciement qui reprend ce qui a été convenu, puis, si l'engagement se confirme, une lettre d'engagement ou une convention.

Attention – Les parties prenantes « cachées »

Certaines parties prenantes ne figurent sur aucun organigramme, mais elles comptent : l'agent d'entretien qui ferme la salle à 17 h, la gardienne d'immeuble qui connaît toutes les familles, la secrétaire qui gère les réservations, le conjoint qui décide des courses. Les oublier peut faire échouer une action bien conçue. Pendant le diagnostic, on demande systématiquement : « Qui d'autre pourrait aider ou gêner ce projet ? »

Exemple – Une crainte levée, un partenaire gagné

Une diététicienne voulait organiser des dégustations de fruits dans le hall d'une maison de santé. Le médecin coordinateur hésitait. En l'écoutant, elle a compris qu'il craignait la gêne pour les patients en salle d'attente et le

risque d'hygiène. Elle a proposé un créneau le mercredi après-midi, quand il n'y a pas de consultation, avec des fruits préparés devant le public sur un plan de travail désinfecté. Le médecin a accepté et a proposé lui-même d'orienter ses patients diabétiques vers l'atelier suivant.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.3

Un service de santé au travail veut installer des fontaines à eau et un distributeur de fruits dans une blanchisserie industrielle (fictive). Remplissez la fiche d'analyse (mission, intérêt, apport, crainte, pouvoir, modalité) pour deux parties prenantes : le directeur de l'entrepôt et les représentants du personnel.

Corrigé

Directeur : mission, productivité et sécurité ; intérêt, moins d'accidents et d'absences liés à la fatigue et à la déshydratation ; apport, financement et emplacement des équipements ; crainte, coût et temps de pause supplémentaire ; pouvoir fort (il décide) ; modalité, le rencontrer avec des chiffres (relevé des malaises, coût d'une fontaine) et l'inviter au comité de pilotage. Représentants du personnel : mission, défendre la santé et les conditions de travail des salariés ; intérêt fort ; apport, relais auprès des équipes et connaissance des postes ; crainte, que l'action serve à surveiller les pauses ou culpabilise les salariés ; pouvoir moyen (ils peuvent soutenir ou dénoncer le projet) ; modalité, les associer dès le diagnostic et à la rédaction des messages.

Faire vivre le partenariat dans la durée

Signer une convention ne suffit pas. Un partenariat se **construit**, s'**entretient** et se **termine** proprement. Trois outils l'organisent, du plus léger au plus formel.

Outil · Quand l'utiliser · Contenu

Courriel de confirmation — *Quand l'utiliser :* Après une première rencontre, pour un engagement ponctuel ; *Contenu :* Ce qui a été convenu, les dates, le contact

Lettre d'engagement (ou lettre de soutien) — *Quand l'utiliser :* Pour un dossier de financement : elle prouve au financeur que le partenaire s'engage ; *Contenu :* Nom et signature du responsable, nature de l'engagement (orientation, locaux, temps, produits), durée

Convention de partenariat — *Quand l'utiliser :* Pour un engagement durable ou qui comporte des moyens importants, des données ou de l'argent ; *Contenu :* Objet, engagements, durée, communication, données, suivi, résiliation, signatures (8.3.12)

Prévenir et gérer les désaccords

Les partenaires n'ont pas les mêmes contraintes ni le même calendrier. Des tensions apparaissent souvent sur quatre sujets : le **partage du travail** (« c'est toujours nous qui faisons tout »), la **visibilité** (« notre logo n'apparaît pas »), le **calendrier** (« vous nous prévenez trop tard ») et les **résultats** (« on ne sait jamais ce que deviennent les familles qu'on vous envoie »). On les prévient en écrivant les engagements de chacun, en partageant le calendrier dès le début, en validant ensemble les supports et en restituant régulièrement les résultats, sous une forme agrégée et anonyme.

Méthode pas à pas – Traiter un désaccord entre partenaires

1. Séparer les faits des interprétations : qu'est-ce qui s'est passé exactement ?

2. Écouter chaque point de vue sans chercher un coupable, de préférence en réunion et non par courriel.

3. Revenir à l'objectif commun et aux engagements écrits.

4. Chercher une solution qui respecte les contraintes de chacun, puis la noter dans le compte rendu (qui fait quoi, pour quand).

5. Si le désaccord persiste, le porter au comité de pilotage, qui arbitre.

Lien diététique – Le diététicien, partenaire et non prestataire

Quand une structure sollicite un diététicien pour « faire un atelier », le risque est de devenir un simple prestataire, sans lien avec le reste du projet. Le diététicien gagne à demander où se situe l'atelier dans le projet, quels objectifs il sert, qui sont les participants et comment les résultats seront suivis. Il devient alors un partenaire qui contribue à la cohérence de l'ensemble. La participation des personnes concernées aux instances, et ses exigences éthiques, sont traitées au chapitre 6.

Exemple – Une fin de partenariat bien gérée

Une épicerie solidaire qui orientait des familles vers des ateliers a dû réduire son activité faute de bénévoles. Plutôt que de laisser le partenariat s'éteindre sans explication, la coordinatrice du projet a proposé une dernière réunion : bilan des orientations (23 familles en deux ans), remerciements écrits, mention du partenariat dans le rapport annuel et accord pour reprendre contact si l'épicerie retrouvait des bénévoles. Un an plus tard, l'épicerie a repris les orientations.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.4

Une PMI oriente depuis six mois des familles vers les ateliers d'un centre social. L'infirmière puéricultrice se plaint : « On ne sait jamais si les familles sont venues, ni ce qu'elles en ont pensé. » Proposez trois mesures pour répondre à cette plainte, en respectant la confidentialité.

Corrigé

Exemples : transmettre chaque trimestre un bilan agrégé (nombre de familles orientées par la PMI, nombre venues, taux de présence, satisfaction globale), sans nom ; proposer aux familles, avec leur accord écrit, que le centre

social informe la PMI de leur participation ; inviter l'infirmière à un atelier ou au comité de pilotage et présenter les résultats lors d'une réunion commune ; prévoir ce retour dans la convention (article « suivi et évaluation »).

Repères – Les acteurs d'une politique de santé et le conducteur de séance (CNED)

- **Quatre types d'acteurs** (CNED, Essentiels, séquence 3) : les acteurs **consultatifs** donnent un avis (HCSP, CNS, CRSA, Conseil national de l'alimentation) ; les acteurs **décideurs** prennent les décisions (État, ministères, Parlement, ARS) ; les acteurs **opérateurs** mettent en œuvre (Santé publique France, collectivités, associations, professionnels de santé) ; les acteurs **financeurs** paient (Assurance maladie, État, collectivités, mutuelles). Dans la matrice pouvoir/intérêt, un même partenaire peut jouer plusieurs rôles : une ARS décide, finance par le FIR et siège au comité de pilotage.
- **Parties prenantes** (CNED, séquence 2) : l'équipe du projet, les partenaires (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier) et les usagers, futurs bénéficiaires du projet.
- **Conducteur de séance** (guide 2025, p. 63) : c'est le plan minuté d'une séance d'atelier (étapes, durées, activités, méthodes, rôles, matériel, évaluation). Le plan d'action dit **quels** ateliers ont lieu et **quand** ; le conducteur dit **comment** se déroule chacun. Il est traité en détail au chapitre 10.
- **Communication et valorisation** : elles accompagnent toute la vie du projet ; le plan de communication (8.3.7) les prévoit dès la conception.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.2 – Les parties prenantes et le partenariat

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre une partie prenante et un partenaire ?
2. Dans la matrice pouvoir/intérêt, que fait-on des parties prenantes à pouvoir fort et à intérêt faible ?
3. Dans une matrice RACI, combien de personnes peuvent être « A » pour une même tâche ?
4. Quel est le rôle du comité de pilotage ? Celui du comité technique ?
5. À quoi sert une lettre d'engagement dans un dossier de financement ?
6. Citez trois sujets fréquents de désaccord entre partenaires.

Corrigé – Point d'étape 8.3.2

1. Une partie prenante est concernée par le projet ou peut l'influencer ; un partenaire s'engage et apporte des ressources selon des modalités définies.
2. On les satisfait : on les informe des avancées et on les consulte sur les décisions qui les concernent.
3. Une seule.
4. Le comité de pilotage décide et arbitre ; le comité technique organise, suit le tableau de bord et prépare les décisions.
5. Elle prouve au financeur que le partenaire s'engage réellement (nature, durée, signature du responsable).
6. Le partage du travail, la visibilité, le calendrier, le retour sur les résultats (trois suffisent).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.3.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la matrice pouvoir/intérêt et la matrice RACI.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.2 et je refais les exercices d'application.

8.3.3 Les financements et les appels à projets

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S3 §1.1 (p. 13)

Qui finance la prévention en nutrition ?

Financeur · Ce qu'il finance · Modalités

ARS – fonds d'intervention régional (FIR) — *Ce qu'il finance :* Actions de prévention et de promotion de la santé conformes au PRS (nutrition, publics prioritaires, QPV) ; le FIR est prévu par l'article L. 1435-8 du CSP ; *Modalités :* Appels à projets annuels, subventions, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM)

Collectivités (commune, intercommunalité, département, région) — *Ce qu'il finance :* Actions inscrites dans le CLS, le contrat de ville, le PAT ; restauration collective ; protection maternelle et infantile (département) ; *Modalités :* Subventions, appels à projets, mise à disposition de locaux

Caisse d'allocations familiales (CAF) — *Ce qu'il finance :* Animation collective familles des centres sociaux, soutien à la parentalité (REAAP) ; *Modalités :* Prestations de service, appels à projets

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015) — *Ce qu'il finance :* Actions de prévention pour les 60 ans et plus (nutrition, activité physique, lien social) ; *Modalités :* Appels à projets départementaux

Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite — *Ce qu'il finance :* Prévention, ateliers collectifs, programmes « bien vieillir » ; *Modalités :* Appels à projets, partenariats

Fondations et mécénat — *Ce qu'il finance :* Projets innovants, précarité alimentaire, enfance ; *Modalités :* Appels à projets ; attention aux conflits d'intérêts (chapitre 6)

État (politique de la ville, alimentation) — *Ce qu'il finance :* Actions en QPV (contrat de ville) ; programmes de lutte contre la précarité alimentaire ; *Modalités :* Appels à projets nationaux ou déconcentrés

Définition – Appel à projets

Procédure par laquelle un financeur définit, dans un **cahier des charges**, des **priorités**, des **publics**, des **critères d'éligibilité et de sélection**, un **calendrier** et un **montant** disponible, et invite les porteurs à déposer

un dossier. Les dossiers sont évalués par un comité selon une grille ; les projets retenus reçoivent une subvention et s'engagent à rendre un **bilan** (compte rendu financier et d'activité).

Méthode pas à pas – Répondre à un appel à projets en 7 étapes

1. Lire le cahier des charges en entier et surligner : priorités, publics, territoires, actions éligibles et **exclues**, montant maximal, cofinancement exigé, date limite, pièces à joindre, critères de sélection.

2. Vérifier l'éligibilité du porteur (association déclarée, numéro SIRET, compte bancaire) et du projet.

3. Faire correspondre le projet aux priorités : reprendre le **vocabulaire** du financeur (PRS, publics prioritaires, réduction des inégalités).

4. Rédiger : contexte et diagnostic chiffré, objectifs SMART, actions détaillées, partenaires (lettres d'engagement), calendrier, évaluation (indicateurs), budget équilibré avec cofinancements.

5. Remplir le formulaire (souvent le Cerfa n° 12156 de demande de subvention des associations, ou la plateforme en ligne du financeur, par exemple Le Compte Asso).

6. Faire relire (référente, partenaire) et vérifier la cohérence entre objectifs, actions, indicateurs et budget.

7. Déposer avant la date limite et garder une preuve du dépôt ; préparer le bilan dès le début (indicateurs à suivre).

Ce qui fait gagner des points	Ce qui fait perdre un dossier
Diagnostic local chiffré et sourcé	Contexte général sans données locales
Objectifs SMART reliés aux constats	Objectifs flous (« sensibiliser »)
Public prioritaire du financeur, participation des personnes	Public non précisé
Partenariats concrets (lettres d'engagement)	Partenaires cités sans engagement
Évaluation prévue avec indicateurs	Évaluation absente ou vague
Budget détaillé, équilibré, cofinancé	Budget incohérent, financeur unique à 100 %
Pérennisation envisagée	Projet « one shot »

Analyser un cahier des charges avec une grille

Un cahier des charges se lit avec un crayon. Les dossiers rejetés le sont souvent pour une raison simple : un public hors cible, une action exclue, une durée trop longue, une pièce manquante ou un dépôt en retard. La grille suivante aide à ne rien oublier. On la remplit avant de rédiger, puis on la relit avant de déposer.

Rubrique	Question à se poser	Où trouver la réponse
Porteurs éligibles	Notre structure peut-elle déposer (statut, ancienneté, territoire) ?	Article « bénéficiaires » ou « éligibilité »
Publics prioritaires	Notre public correspond-il exactement ? Faut-il le préciser ou le recentrer ?	Article « publics »
Actions éligibles et exclues	Nos actions sont-elles financées ? Certaines sont-elles exclues (investissement, consultations individuelles, distribution seule) ?	Articles « actions » et « exclusions »
Durée et calendrier	Le projet tient-il dans la période ? Quand commence-t-il au plus tôt ?	Article « calendrier »
Montant	Quel taux, quel plafond, quelle assiette (base de calcul) ? Un cofinancement est-il exigé ?	Article « financement »
Dépenses éligibles	Les contributions en nature, le matériel, les frais de structure sont-ils pris en compte ?	Annexe financière
Critères de sélection	Sur quoi le comité note-t-il ? Avec quel poids ?	Article « sélection » ou grille jointe
Pièces et modalités	Quel formulaire, quelle plateforme, quelles pièces jointes, quelle date et quelle heure limite ?	Article « dépôt »
Engagements	Quel bilan, à quelle date, avec quels indicateurs ?	Article « suivi »

Calculer le montant à demander

Le montant d'une subvention dépend de trois éléments : l'**assiette** (les dépenses que le financeur accepte de prendre en compte), le **taux** maximal et le **plafond**. La subvention possible est le plus petit des deux montants : taux × assiette, ou plafond.

Exemple – Calcul détaillé : montant d'une subvention et cofinancement

Un appel à projets (fictif) finance 70 % au plus des dépenses éligibles, dans la limite de 5 000 €. Il exclut les contributions en nature et l'achat de matériel de plus de 300 €. Le projet compte 6 800 € de charges monétaires, dont un réfrigérateur de 400 €, et 900 € de contributions en nature.

- Dépenses éligibles : 6 800 − 400 = **6 400 €** (les contributions en nature ne sont pas dans les charges monétaires ; le réfrigérateur est exclu).
- Taux appliqué : 70 % × 6 400 = **4 480 €**, inférieur au plafond de 5 000 € : subvention maximale **4 480 €**.
- Cofinancement nécessaire pour les charges monétaires : 6 800 − 4 480 = **2 320 €**, soit 2 320 / 6 800 × 100 = **34,1 %**. Il viendra d'autres financeurs, de la participation des personnes et de l'autofinancement. Le réfrigérateur doit être financé par d'autres ressources.

Attention – Demander le maximum n'est pas toujours la meilleure stratégie

Un dossier qui demande exactement le plafond, sans

cofinancement solide, inquiète le comité : il montre une forte dépendance à un seul financeur. Un montant justifié ligne par ligne, avec des cofinancements acquis, est plus convaincant. Il faut aussi vérifier que la structure pourra avancer les dépenses avant le versement (8.3.10).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.5

Avec les règles de l'exemple (70 % des dépenses éligibles, plafond de 5 000 €, matériel de plus de 300 € exclu), calculez la subvention maximale d'un projet de 9 200 € de charges monétaires, dont un four de 600 €. Calculez ensuite le cofinancement nécessaire en euros et en pourcentage des charges monétaires.

Corrigé

Dépenses éligibles : 9 200 − 600 = **8 600 €** ; 70 % × 8 600 = 6 020 €, supérieur au plafond : subvention maximale **5 000 €**. Cofinancement : 9 200 − 5 000 = **4 200 €**, soit 4 200 / 9 200 × 100 = **45,7 %** des charges monétaires. Le plafond limite ici la subvention : le porteur doit trouver près de la moitié du financement ailleurs.

Le formulaire de demande et les pièces à joindre

Les associations qui demandent une subvention à l'État, à une collectivité ou à un organisme public utilisent le plus souvent le **formulaire Cerfa n° 12156** (« Demande de subvention(s) »), sur papier ou en ligne. Le service en ligne **Le Compte Asso** permet de remplir ce formulaire et de déposer les pièces une seule fois pour plusieurs financeurs. Certains financeurs (ARS, fondations, caisses) utilisent leur propre plateforme : le cahier des charges le précise.

Partie du dossier · Ce qu'on y met · Conseil

Identification de l'association — *Ce qu'on y met :* Nom, numéro RNA (répertoire national des associations), numéro SIRET, adresse, représentant légal, personne chargée du dossier ; *Conseil :* Vérifier que les numéros sont à jour avant la date limite : leur obtention peut prendre plusieurs semaines

Moyens humains — *Ce qu'on y met :* Nombre de salariés, de bénévoles, de personnes mises à disposition ; *Conseil :* Cohérence avec le budget du projet

Budget de l'association — *Ce qu'on y met :* Budget prévisionnel de l'année ; *Conseil :* Il montre la solidité financière du porteur

Description du projet — *Ce qu'on y met :* Contexte, objectifs, public, actions, partenaires, calendrier, moyens, évaluation ; *Conseil :* Reprendre la chaîne logique et le vocabulaire du financeur

Budget du projet — *Ce qu'on y met :* Charges et produits par compte, contributions en nature ; *Conseil :* Équilibré ; financements acquis et sollicités distingués

Attestations — *Ce qu'on y met :* Déclaration sur l'honneur du représentant, montant demandé, engagement à respecter le contrat d'engagement républicain ; *Conseil :* Signée par le représentant légal ou par une personne qu'il a déléguée

Pièces jointes — *Ce qu'on y met :* Statuts, liste des dirigeants, relevé d'identité bancaire, derniers comptes approuvés, rapport d'activité ; *Conseil :* Préparer un dossier de pièces à jour, réutilisable

Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, une association qui demande une subvention publique s'engage, en signant le **contrat d'engagement républicain**, à respecter notamment la liberté de conscience, l'égalité, la dignité de la personne et l'ordre public. Cet engagement figure dans le formulaire.

Rédiger la description du projet : ce qui convainc

Rubrique · Ce qui convainc le comité · Ce qui l'inquiète

Contexte — *Ce qui convainc le comité :* Trois ou quatre chiffres locaux, datés et sourcés ; les besoins exprimés par le public ; *Ce qui l'inquiète :* Des généralités nationales, des adjectifs (« alarmant »)

Objectifs — *Ce qui convainc le comité :* Un objectif général, des objectifs spécifiques SMART reliés aux constats ; *Ce qui l'inquiète :* « Sensibiliser », « informer », sans valeur cible

Actions — *Ce qui convainc le comité :* Des actions décrites (QQOQCCP), qui combinent plusieurs stratégies ; *Ce qui l'inquiète :* Une liste d'ateliers sans lien avec les objectifs

Public et participation — *Ce qui convainc le comité :* Un nombre de personnes, un mode de recrutement, une participation au choix des actions ; *Ce qui l'inquiète :* « Tout public », ou un public qui ne correspond pas aux priorités

Partenaires — *Ce qui convainc le comité :* Des engagements précis, avec lettres jointes ; *Ce qui l'inquiète :* Une liste de noms sans engagement

Évaluation — *Ce qui convainc le comité :* Des indicateurs de processus et de résultat, une méthode de recueil ; *Ce qui l'inquiète :* Une évaluation limitée à la satisfaction

Budget — *Ce qui convainc le comité :* Des lignes justifiées (quantité × coût unitaire), un cofinancement ; *Ce qui l'inquiète :* Une ligne « divers » importante, un financeur unique

Astuce – Le résumé en cinq lignes

Beaucoup de plateformes demandent un résumé du projet en quelques lignes. C'est souvent le seul texte que tous les membres du comité lisent en entier. Écrivez-le en dernier, et répondez dans l'ordre à cinq questions : quel problème, pour qui, quelles actions, avec qui, quels résultats attendus.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.6

Réécrivez ce résumé pour le rendre convaincant : « Notre association souhaite sensibiliser les habitants à l'importance d'une bonne alimentation, car la malbouffe est un fléau. Nous organiserons des ateliers. »

Données disponibles : quartier de 3 400 habitants ; 44 % des 120 familles interrogées en 2026 disent manquer d'idées de repas à petit prix ; projet de huit ateliers pour 12 familles, avec l'épicerie sociale et la PMI ; objectif : que la moitié des familles cuisinent au moins deux nouveaux plats à base de légumes chaque mois.

Corrigé

Exemple : « Dans le quartier des Peupliers (3 400 habitants), 44 % des 120 familles interrogées en 2026 disent manquer d'idées de repas à petit prix. Avec l'épicerie sociale et la PMI, notre association propose à 12

familles huit ateliers culinaires construits avec elles, à partir des produits disponibles à l'épicerie. Nous visons qu'à la fin du cycle, au moins la moitié des familles cuisinent chaque mois au moins deux nouveaux plats à base de légumes. Les présences et les pratiques seront mesurées avant et après le cycle. » Les mots « malbouffe » et « fléau » sont supprimés : ils jugent les personnes sans rien prouver.

Après la décision : convention, versements et compte rendu

Obtenir une subvention crée des **obligations**. Le porteur doit utiliser l'argent pour le projet décrit, dans la période prévue, et en rendre compte. Les connaître dès la conception évite de mauvaises surprises au moment du bilan.

Étape · Ce qui se passe · Ce que fait le porteur

Notification — *Ce qui se passe :* Le financeur informe de sa décision et du montant accordé, parfois inférieur à la demande ; *Ce que fait le porteur :* Si le montant est réduit, il ajuste le projet ou cherche un complément, et il le signale

Convention ou arrêté attributif — *Ce qui se passe :* Document qui fixe l'objet, le montant, le calendrier des versements et les obligations. Pour l'État et les collectivités, une convention est obligatoire au-delà de 23 000 € par an (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 10, et décret n° 2001-495 du 6 juin 2001) ; *Ce que fait le porteur :* Il la lit, la signe et note les dates de bilan

Versements — *Ce qui se passe :* Souvent un acompte à la signature, le solde après le bilan ; *Ce que fait le porteur :* Il met à jour le plan de trésorerie (8.3.10)

Mise en œuvre — *Ce qui se passe :* Le projet se déroule ; *Ce que fait le porteur :* Il conserve les justificatifs (factures, feuilles de temps, émargements) et signale toute modification importante

Compte rendu — *Ce qui se passe :* Un compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059 pour les subventions publiques) et un bilan d'activité ; *Ce que fait le porteur :* Il compare le prévu et le réalisé, explique les écarts et présente les résultats des indicateurs

Le compte rendu financier doit être transmis dans les **six mois** qui suivent la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée (article 10 de la loi du 12 avril 2000). Une subvention qui n'a pas été utilisée conformément à son objet peut devoir être **remboursée**. Les justificatifs sont conservés : le financeur peut les demander lors d'un contrôle.

Attention – Modifier un projet subventionné

Changer de public, réduire fortement le nombre d'actions, prolonger la durée ou utiliser une ligne de budget pour une autre dépense importante : ces modifications doivent être signalées au financeur **avant** d'être appliquées, par un courrier motivé. Selon leur importance, elles peuvent donner lieu à un avenant à la convention. Un financeur informé à temps accepte souvent un ajustement ; un financeur qui le découvre au bilan peut demander un remboursement.

Exemple – Un compte rendu financier commenté (extrait)

« La subvention de 2 400 € de la communauté de communes (projet fictif) a financé 85 % des denrées et la totalité des honoraires de la diététicienne. Le poste denrées présente un dépassement de 11,2 % (prix des fruits au printemps), compensé par une économie sur l'impression. Le total réalisé (5 960 €) est supérieur de 1,9 % au budget prévu. Sept ateliers sur huit ont eu lieu ; le huitième a été remplacé, avec l'accord écrit du financeur du 14 mai, par une visite du marché. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.7

Une association a reçu 3 000 € d'une collectivité pour six ateliers destinés à des personnes âgées. En cours de projet, la salle devient indisponible et l'association pense remplacer deux ateliers par une sortie au marché. Indiquez ce qu'elle doit faire, dans quel ordre, et ce qu'elle devra présenter dans son compte rendu.

Corrigé

1. Évaluer la modification : la sortie au marché sert-elle les mêmes objectifs ? Quel est son coût ? 2. Écrire au financeur **avant** la modification : constat (salle indisponible), proposition, effet sur le budget, demande d'accord. 3. Attendre sa réponse écrite (éventuellement un avenant), puis informer les participants et les partenaires. 4. Dans le compte rendu : quatre ateliers et la sortie réalisés, l'accord du financeur et sa date, les dépenses comparées au budget prévu avec l'explication des écarts, les résultats des indicateurs.

Les courriers qui accompagnent un projet

Au cours d'un projet, le chef de projet rédige plusieurs courriers : une **demande de lettre de soutien** à un partenaire, une **lettre de soutien** à faire signer, une **demande d'acompte** au financeur, un **courrier d'information** en cas de modification du projet. Ces écrits suivent les règles du courrier professionnel : expéditeur, destinataire, date, objet, formule d'appel, corps du texte en paragraphes courts, formule de politesse, signature de la personne habilitée.

Définition – Lettre de soutien

Courrier par lequel un partenaire (collectivité, association, professionnel) atteste qu'il connaît le projet, qu'il en partage les objectifs et, le plus souvent, qu'il s'engage à y contribuer d'une manière précise. Elle est jointe au dossier de financement. Une lettre de soutien utile est **précise** : elle dit ce que le partenaire apporte (orientation de familles, prêt de salle, temps de professionnel).

Exemple – Une demande d'acompte au financeur (structure et montants fictifs)

« Objet : demande de versement d'un acompte – projet

"Cuisiner ensemble à la Grange".

Madame la Directrice,

Par décision du 12 septembre 2027, vous avez attribué à notre association une subvention de 1 500 € pour le projet cité en objet, qui se déroule d'octobre 2027 à mai 2028. Les achats de matériel de cuisine, d'un montant de 650 €, doivent être réalisés en octobre, avant le premier atelier. Notre plan de trésorerie, joint à ce courrier, montre un solde négatif de 520 € fin octobre si la subvention est versée en totalité à la fin du projet.

Nous sollicitons donc le versement d'un acompte de 50 %, soit 750 €, dès la signature de la convention. Le solde serait versé après la remise du compte rendu financier.

Nous restons à votre disposition pour tout complément et vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de nos salutations distinguées.

La présidente de l'association »

Méthode – Informer un financeur d'une modification du projet

1. **Prévenir avant** de modifier, et non après, dès que l'écart est connu (8.3.6).
2. **Décrire** l'écart avec précision : ce qui était prévu, ce qui change, pourquoi.
3. **Montrer** que les objectifs restent atteignables, ou proposer de nouveaux objectifs réalistes.
4. **Chiffrer** l'effet sur le budget, en restant dans les règles de la convention (une modification importante peut nécessiter un avenant).
5. **Demander** l'accord écrit du financeur et le conserver avec la convention.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.8

Vous avez besoin d'une lettre de soutien de la PMI pour un projet d'ateliers « premiers repas » destinés aux parents de bébés de 4 à 12 mois. Rédigez les trois engagements précis que vous proposez à la PMI d'inscrire dans la lettre.

Corrigé

Exemples d'engagements précis : 1. Les puéricultrices de la PMI présentent les ateliers aux parents lors des consultations et remettent le flyer, pendant toute la durée du projet. 2. La PMI met à disposition sa salle d'activités un mercredi matin par mois, d'octobre à mars. 3. Une puéricultrice participe à deux ateliers sur six pour répondre aux questions sur le développement de l'enfant, et participe au comité de pilotage. Chaque engagement dit qui fait quoi, quand et combien, ce qui le rend vérifiable.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.3 – Les financements et les appels à projets

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous.

Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre financeurs possibles d'un projet de prévention en nutrition.
2. Quel financeur s'adresse spécifiquement aux actions de prévention pour les personnes de 60 ans et plus ?
3. Une subvention est plafonnée à 3 000 € et à 60 % de 4 000 € de dépenses éligibles. Quel montant peut-on demander au plus ?
4. Quel formulaire utilise-t-on le plus souvent pour une demande de subvention associative ? Et pour le compte rendu financier ?
5. Dans quel délai le compte rendu financier d'une subvention publique doit-il être transmis ?
6. Que faire si l'on doit modifier un projet subventionné ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.3

1. ARS (fonds d'intervention régional), collectivités, CAF, conférence des financeurs, Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite, fondations, État (quatre suffisent).
2. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015).
3. 60 % × 4 000 = 2 400 €, inférieur au plafond : **2 400 €**.
4. Le Cerfa n° 12156 pour la demande ; le Cerfa n° 15059 pour le compte rendu financier.
5. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée.
6. Le signaler au financeur avant de l'appliquer, par un courrier motivé, et attendre son accord (éventuellement un avenant).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.4.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la grille d'analyse du cahier des charges et le calcul de la subvention.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.3 et je refais les exercices d'application.

8.3.4 Planifier le projet

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le diagramme de Gantt

Définition – Diagramme de Gantt

Représentation graphique du calendrier d'un projet (Henry Gantt, vers 1910) : les **tâches** sont en lignes, le **temps** en colonnes ; chaque tâche est une barre dont la position et la longueur indiquent sa date de début et sa durée. On y ajoute les **jalons** (dates clés : dépôt du dossier, premier atelier, comité de pilotage) et les **dépendances** entre tâches (fiche **F5** ; tableur de stage, feuille Gantt).

Le réseau PERT et le chemin critique

Le réseau **PERT** (*Program Evaluation and Review Technique*, 1958) représente les tâches et leurs **antériorités** (« la tâche C ne peut commencer que lorsque B est terminée »). Il permet de calculer la **durée minimale** du projet et d'identifier le **chemin critique** : la suite de tâches sans marge, dont tout retard retarde le projet entier.

Tâche · Intitulé · Durée · Antériorités

A — *Intitulé :* Diagnostic ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* –

B — *Intitulé :* Objectifs et choix des actions ; *Durée :* 1 sem. ; *Antériorités :* A

C — *Intitulé :* Rédaction et dépôt du dossier d'appel à projets ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* B

D — *Intitulé :* Recherche et conventions de partenariat ; *Durée :* 3 sem. ; *Antériorités :* A

E — *Intitulé :* Communication et inscriptions ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* C, D

F — *Intitulé :* Préparation des ateliers (conducteurs, fiches, achats) ; *Durée :* 3 sem. ; *Antériorités :* C

G — *Intitulé :* Ateliers (6 séances + visite du marché) ; *Durée :* 10 sem. ; *Antériorités :* E, F

H — *Intitulé :* Évaluation et bilan ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* G

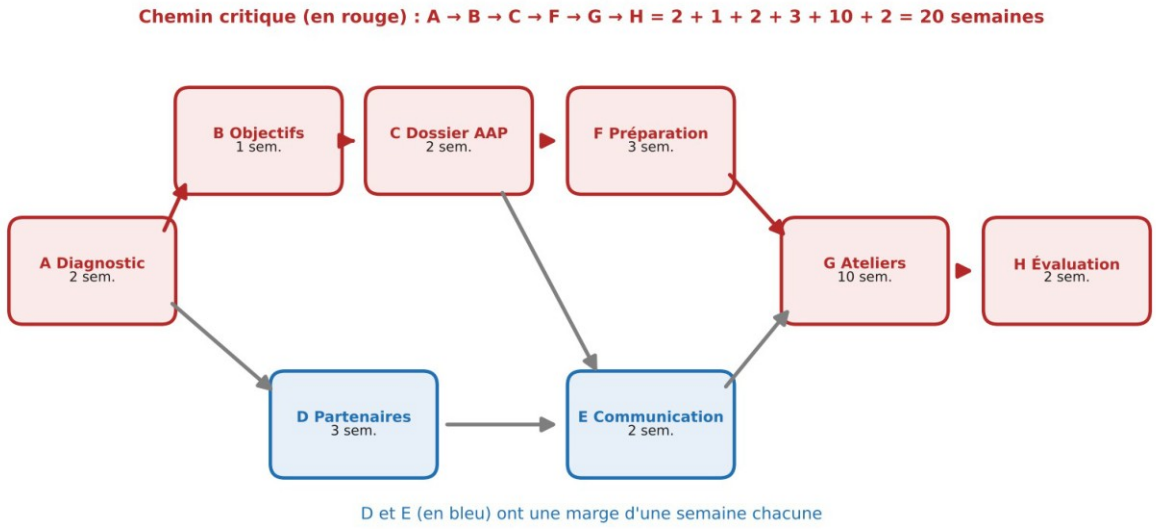


Figure 8.3 – Réseau PERT et chemin critique

Exemple – Calcul détaillé des dates au plus tôt, au plus tard et des marges

Dates au plus tôt (on avance de gauche à droite ; une tâche commence quand **toutes** ses antériorités sont finies, donc au **maximum** de leurs fins) :

- A : début 0, fin 0 + 2 = **2**. B : début 2, fin 3. D : début 2, fin 2 + 3 = **5**. C : début 3, fin 5.
- E : début = max(fin C ; fin D) = max(5 ; 5) = 5, fin **7**. F : début 5, fin **8**.
- G : début = max(fin E ; fin F) = max(7 ; 8) = 8, fin 8 + 10 = **18**. H : début 18, fin **20**.

Durée minimale du projet : 20 semaines. Dates au plus tard (on recule de droite à gauche ; fin au plus tard = **minimum** des débuts au plus tard des tâches suivantes) :

- H : fin 20, début 18. G : fin 18, début 8. F : fin 8, début 5. E : fin 8, début 6.
- C : fin = min(début F ; début E) = min(5 ; 6) = 5, début 3. D : fin = début E = 6, début 3. B : fin 3, début 2. A : fin = min(début B ; début D) = min(2 ; 3) = 2, début 0.

Marges (date au plus tard − date au plus tôt) : A, B, C, F, G, H : **0** → chemin critique **A → B → C → F → G → H** (2 + 1 + 2 + 3 + 10 + 2 = 20 semaines). D : 3 − 2 = **1 semaine** ; E : 6 − 5 = **1 semaine**. **Conséquence pratique** : un retard d'une semaine dans la recherche de partenaires (D) est absorbé ; un retard d'une semaine dans le dépôt du dossier (C) décale tout le projet. On surveille donc en priorité les tâches critiques.

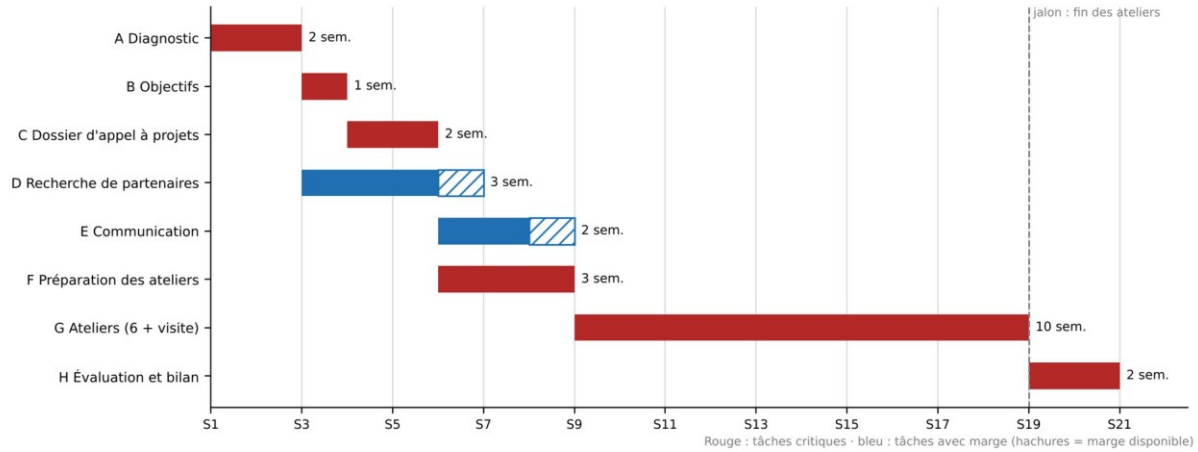


Figure 8.4 – Le diagramme de Gantt correspondant

Comprendre le schéma – Figure 8.4

1. Les tâches **critiques** (en rouge) s'enchaînent sans interruption de la semaine 1 à la semaine 20.
2. Les tâches **D** et **E** (en bleu) disposent d'une **marge** d'une semaine (hachures) : elles peuvent glisser sans retarder le projet.
3. Le **jalon** « fin des ateliers » (fin de la semaine 18) déclenche l'évaluation finale.
4. Dans la réalité, on ajoute les **contraintes de calendrier** : vacances scolaires (pas d'atelier parents-enfants), Ramadan (chapitre 4), dates du stage, date limite de l'appel à projets, disponibilité de la cuisine.

Astuce – Prévoir des marges

Ajoutez une **marge de sécurité** de 10 à 20 % sur les tâches dépendant d'autres personnes (signature de convention, réponse d'un financeur, impression) et fixez le dépôt d'un dossier **quelques jours avant** la date limite. Les délais de versement d'une subvention peuvent dépasser plusieurs mois : vérifiez la **trésorerie** de la structure.

Construire un diagramme de Gantt pas à pas

Le diagramme de Gantt est l'outil de planification le plus utilisé dans les structures, parce qu'il se lit d'un coup d'œil. On peut le construire sur papier quadrillé, dans un tableur (une colonne par semaine, des cellules colorées) ou dans un logiciel de gestion de projet (8.3.14).

Méthode pas à pas – Construire un Gantt en six étapes

1. Lister les tâches à partir du plan d'action, avec un verbe (« réserver la salle », « rédiger les fiches »).

2. Estimer la durée de chaque tâche, en semaines pour un projet de plusieurs mois, en jours pour un événement.

3. Noter les antériorités : quelles tâches doivent être finies avant de commencer celle-ci ?

4. Placer les tâches sur l'échelle de temps, en commençant par celles qui n'ont pas d'antériorité, puis en respectant les dépendances.

5. Ajouter les contraintes de calendrier : vacances, fêtes religieuses, fermeture des locaux, période de stage, date limite d'un appel à projets, disponibilité des partenaires.

6. Placer les jalons (losanges) : décisions du comité de pilotage, dépôt du dossier, premier atelier, fin des ateliers, bilan.

Le rétroplanning : partir de la date imposée

Quand une date est imposée (date limite d'un dossier, date d'un forum, date de l'épreuve), on construit le planning **à rebours** : on part de cette date et on remonte le temps, tâche par tâche, en ajoutant une marge de sécurité. C'est le **rétroplanning**.

Exemple – Rétroplanning d'un stand au forum santé d'une commune (samedi 9 octobre 2027)

Échéance · Tâche · Responsable

Lundi 6 septembre — *Tâche :* Valider le thème du stand et le message principal avec la tutrice ; *Responsable :* Étudiante

Lundi 13 septembre — *Tâche :* Réserver le matériel (tables, grilles d'exposition, balance) auprès de la mairie ; *Responsable :* Tutrice

Vendredi 17 septembre — *Tâche :* Concevoir le jeu « quel est le prix au kilo ? » et le tester avec deux collègues ; *Responsable :* Étudiante

Lundi 20 septembre — *Tâche :* Envoyer les fichiers des affiches à l'imprimeur (délai : 10 jours) ; *Responsable :* Étudiante

Vendredi 1er octobre — *Tâche :* Récupérer les affiches ; préparer la liste de courses de la dégustation ; *Responsable :* Étudiante

Mercredi 6 octobre — *Tâche :* Vérifier les inscriptions des bénévoles, imprimer les fiches recettes ; *Responsable :* Tutrice et étudiante

Vendredi 8 octobre — *Tâche :* Courses ; préparation des boîtes de dégustation, stockage au froid ; *Responsable :* Étudiante et bénévole

Samedi 9 octobre — *Tâche :* Forum santé ; *Responsable :* Équipe

Le rétroplanning montre que le **délai d'impression** (10 jours) commande toute la préparation : si les fichiers partent le 20 septembre, le jeu doit être prêt avant. C'est l'équivalent, en planification à rebours, du chemin critique.

Attention – Un planning se partage et se met à jour

Un Gantt construit au début du projet et jamais relu ne sert à rien. On le met à jour à chaque réunion du comité technique : tâches terminées, retards, nouvelles contraintes. On l'envoie aux partenaires qui ont des tâches à réaliser. Le décalage entre le planning prévu et le planning réel est un indicateur de pilotage (8.3.6).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.9

Une association organise une « semaine des légumes secs » dans un restaurant administratif, du lundi 7 au vendredi 11 juin 2027. Elle doit : valider les menus avec le chef (5 jours ouvrés avant la commande) ; commander les denrées (10 jours ouvrés avant la semaine) ; faire imprimer les affiches (7 jours ouvrés de délai) ; afficher une semaine avant. Construisez le rétroplanning en dates, sans compter les week-ends ni le lundi 17 mai 2027 (lundi de Pentecôte, jour non travaillé dans ce restaurant).

Corrigé

Affichage : au plus tard le **lundi 31 mai**. Commande : 10 jours ouvrés avant le lundi 7 juin, soit le **lundi 24 mai** (on compte en arrière : 4, 3, 2, 1 juin, 31 mai, 28, 27, 26, 25, 24 mai). Validation des menus : 5 jours ouvrés avant le 24 mai, en sautant le lundi 17 mai (on compte 21, 20, 19, 18 et 14 mai), soit le **vendredi 14 mai**. Impression : les affiches doivent être prêtes le 31 mai ; 7 jours ouvrés avant : 28, 27, 26, 25, 24, 21 et 20 mai, envoi des fichiers le **jeudi 20 mai**. On prévoit une marge : valider les menus dès le 12 mai et envoyer les fichiers le 18 mai.

Un deuxième réseau PERT : quand une tâche consomme sa marge

Le calcul des dates (8.3.4) ne sert pas seulement à trouver la durée du projet. Il permet surtout de savoir **où porter son attention** quand un incident survient. L'exemple suivant montre qu'une tâche non critique peut devenir critique si elle consomme toute sa marge.

Tâche · Intitulé · Durée (semaines) · Antériorités

A — *Intitulé :* Accord du lycée professionnel et des familles ; *Durée (semaines) :* 2 ; *Antériorités :* –

B — *Intitulé :* Conception des séances avec les enseignants ; *Durée (semaines) :* 3 ; *Antériorités :* A

C — *Intitulé :* Choix de l'emplacement du jardin ; *Durée (semaines) :* 1 ; *Antériorités :* A

D — *Intitulé :* Fabrication des bacs par la section menuiserie ; *Durée (semaines) :* 4 ; *Antériorités :* B

E — *Intitulé :* Rédaction des fiches de culture ; *Durée (semaines) :* 2 ; *Antériorités :* B, C

F — *Intitulé :* Achat des plants et du terreau ; *Durée (semaines) :* 3 ; *Antériorités :* C

G — *Intitulé :* Plantations et première dégustation ; *Durée (semaines) :* 2 ; *Antériorités :* D, E, F

Exemple – Calcul détaillé : dates, marges et effet d'un retard

Calcul aller. A : 0 → 2. B : 2 → 5. C : 2 → 3. D : 5 → 9. E : début = max(5 ; 3) = 5 → 7. F : 3 → 6. G : début = max(9 ; 7 ; 6) = 9 → **11**. Durée minimale : **11 semaines**.

Calcul retour. G : 9 → 11. D : fin au plus tard 9, début 5. E : fin 9, début 7. F : fin 9, début 6. B : fin = min(début D ; début E) = min(5 ; 7) = 5, début 2. C : fin = min(début E ; début F) = min(7 ; 6) = 6, début 5. A : fin = min(2 ; 5) = 2, début 0.

Marges. A, B, D, G : 0 → chemin critique **A → B → D → G** (2 + 3 + 4 + 2 = 11). C : 5 − 2 = **3 semaines** ; E : 7 − 5 = **2 semaines** ; F : 6 − 3 = **3 semaines**.

Incident. Le fournisseur de plants annonce un délai de 6 semaines au lieu de 3 (F = 6). F commence à 3 et finit à 9 : la fin du projet reste à **11 semaines**, car F avait 3 semaines de marge. Mais F et C deviennent **critiques** : il existe maintenant deux chemins critiques (A → B → D → G et A → C → F → G). Le moindre retard supplémentaire sur le choix de l'emplacement ou sur la livraison retarderait les plantations. L'équipe décide de choisir l'emplacement dès la semaine 2 et de relancer le fournisseur chaque semaine.

Attention – Marge totale et marge partagée

Les marges de tâches qui se suivent ne s'additionnent pas. Dans l'exemple, C et F ont chacune 3 semaines de marge, mais elles sont sur le même chemin : si C prend 3 semaines de retard, F n'a plus aucune marge. On parle de marge **totale** pour la marge calculée tâche par tâche ; elle est partagée par toutes les tâches d'un même chemin.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.10

Reprenez le réseau de l'exemple, avec les durées d'origine. La conception des séances (B) prend 4 semaines au lieu de 3. Calculez la nouvelle durée du projet et indiquez si le chemin critique change.

Corrigé

B est critique : B finit à 2 + 4 = 6 ; D : 6 → 10 ; E : début max(6 ; 3) = 6 → 8 ; G : début max(10 ; 8 ; 6) = 10 → **12 semaines**. Le projet prend une semaine de retard. Le chemin critique reste **A → B → D → G** (2 + 4 + 4 + 2 = 12). Pour rattraper la semaine, on peut demander à la section menuiserie de commencer les bacs dès que les plans sont prêts, sans attendre la fin de la conception des séances.

Estimer une durée incertaine : l'estimation à trois points

Certaines durées sont très incertaines : la réponse d'une mairie, le recrutement de participants, la livraison d'un matériel. Plutôt que de donner un seul chiffre, la méthode PERT d'origine (1958) propose trois estimations : une durée **optimiste** (O, tout se passe bien), une durée **la plus**

probable (M) et une durée **pessimiste** (P, tout se passe mal). On en tire une durée attendue et une mesure de l'incertitude.

Définition – Durée attendue et écart-type d'une tâche

Durée attendue = (O + 4 × M + P) / 6. Écart-type ≈ (P − O) / 6. Plus l'écart entre la durée optimiste et la durée pessimiste est grand, plus la tâche est incertaine, et plus il faut la surveiller ou la commencer tôt.

Exemple – Calcul détaillé : trois tâches incertaines d'un projet de jardin partagé

Tâche	O	M	P	Durée attendue	Écart-type
Obtenir l'accord écrit de la mairie	1	3	8	(1 + 12 + 8) / 6 = **3,5** sem.	(8 − 1) / 6 = **1,17** sem.
Aménager les parcelles	2	3	4	(2 + 12 + 4) / 6 = **3,0** sem.	(4 − 2) / 6 = **0,33** sem.
Recruter 12 familles jardinières	1	2	5	(1 + 8 + 5) / 6 = **2,33** sem.	(5 − 1) / 6 = **0,67** sem.

Si les trois tâches se suivent, la durée attendue est 3,5 + 3,0 + 2,33 = **8,83 semaines**. L'accord de la mairie est la tâche la plus incertaine (écart-type de 1,17 semaine) : c'est elle qu'il faut lancer le plus tôt possible et relancer. Pour fixer une date d'ouverture prudente, on ajoute une marge : environ deux écarts-types sur l'ensemble du chemin (calcul simplifié : $\sqrt{(1{,}17^2 + 0{,}33^2 + 0{,}67^2)} \approx 1{,}38$ semaine), soit 8,83 + 2 × 1,38 ≈ **11,6 semaines**, arrondies à 12 semaines. C'est un ordre de grandeur, pas une certitude.

Astuce – Demander les trois durées aux bonnes personnes

Les durées optimiste, probable et pessimiste se demandent à ceux qui connaissent le terrain : la secrétaire de mairie pour un accord, l'imprimeur pour une impression, l'animatrice pour un recrutement. Leur expérience vaut mieux qu'une estimation au hasard, et la question les implique dans le projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.11

L'impression d'un livret de recettes demande 1 semaine au mieux, 2 semaines le plus souvent et 5 semaines au pire (relectures, corrections). Calculez la durée attendue et l'écart-type, puis dites combien de semaines vous prévoyez dans le planning, et pourquoi.

Corrigé

Durée attendue : (1 + 4 × 2 + 5) / 6 = 14 / 6 = **2,33 semaines**. Écart-type : (5 − 1) / 6 = **0,67 semaine**. On peut prévoir 2,33 + 2 × 0,67 ≈ **3,7 semaines**, soit environ 4 semaines, car le livret doit être prêt pour une date fixe (dernier atelier) et le risque de retard vient surtout des relectures, que l'on peut anticiper en les programmant tôt.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.4 – La planification

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un jalon dans un diagramme de Gantt ?
2. Dans le calcul aller du PERT, prend-on le maximum ou le minimum des fins des tâches précédentes ? Pourquoi ?
3. Comment calcule-t-on la marge d'une tâche ?
4. Qu'est-ce que le chemin critique ?
5. Une tâche a 2 semaines de marge et prend 3 semaines de retard. De combien le projet est-il retardé ?
6. Donnez la formule de la durée attendue dans l'estimation à trois points.

Corrigé – Point d'étape 8.3.4

1. Une date clé (décision, dépôt, début ou fin d'une phase), représentée par un losange.
2. Le maximum : une tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches qui la précèdent sont finies.
3. Marge = début au plus tard − début au plus tôt.
4. La suite des tâches dont la marge est nulle ; sa durée est la durée minimale du projet.
5. D'une semaine (3 − 2), si aucune autre tâche ne change.
6. (O + 4 × M + P) / 6.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	*Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.5.
3 ou 4 sur 6	*Ce que je fais :* Je refais le calcul détaillé du réseau PERT.
Moins de 3 sur 6	*Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.4 et je refais les exercices d'application.

8.3.5 Construire et suivre le budget

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

La structure d'un budget prévisionnel

Le budget prévisionnel d'un projet associatif suit le **plan comptable associatif** simplifié (formulaire Cerfa n° 12156) : il est présenté en **charges** (dépenses) et **produits** (ressources), et il doit être **équilibré** (total des charges = total des produits).

Compte	Charges	Exemples
60	*Charges :* Achats	*Exemples :* Denrées, petit matériel, fournitures pédagogiques
61-62	*Charges :* Services extérieurs et autres services	*Exemples :* Location, assurance, impression, déplacements, honoraires d'intervenants extérieurs

63 — *Charges :* Impôts et taxes ; *Exemples :* Taxes sur salaires (rare pour un petit projet)

64 — *Charges :* Charges de personnel ; *Exemples :* Salaires et charges des salariés affectés au projet (au prorata du temps)

86 — *Charges :* Emplois des contributions volontaires en nature ; *Exemples :* Bénévolat, mise à disposition de locaux, dons de produits (valorisés)

Compte — *Charges :* Produits ; *Exemples :* Exemples

70 — *Charges :* Ventes, prestations ; *Exemples :* Participation des usagers

74 — *Charges :* Subventions d'exploitation ; *Exemples :* ARS (FIR), commune, département, CAF, fondations

75 — *Charges :* Autres produits de gestion courante ; *Exemples :* Cotisations, dons

87 — *Charges :* Contributions volontaires en nature ; *Exemples :* Contrepartie exacte du compte 86

Attention – Les règles d'or du budget

1. Équilibre : charges = produits ; l'autofinancement du porteur comble l'écart.

2. Comptes 86 = 87 : les contributions en nature apparaissent des deux côtés, pour le même montant.

3. Cofinancement : un financeur ne finance presque jamais 100 % ; montrer la diversité des ressources.

4. Cohérence : chaque ligne correspond à une action décrite (pas de « divers » important).

5. Justification : quantité × coût unitaire, avec des prix réalistes (devis, relevés de prix).

6. Prudence : distinguer les financements **acquis** et **sollicités**.

Exemple – Calcul détaillé : coût horaire d'une salariée affectée au projet

Une référente familles est rémunérée **2 000 € bruts par mois** ; les charges patronales représentent environ **42 %** du brut (ordre de grandeur à vérifier auprès de la structure ; il varie selon les allègements de cotisations).

- Coût employeur mensuel : 2 000 × 1,42 = **2 840 €**.
- Heures mensuelles (35 h par semaine) : 35 × 52 / 12 = **151,67 h**.
- Coût horaire : 2 840 / 151,67 = **18,73 €**.
- Temps affecté au projet : 30 h → 30 × 18,73 = **561,90 €** à inscrire au compte 64.

Dans le budget des Tilleuls (chapitre 1), la ligne « coordinatrice » a été valorisée à 24 € de l'heure, taux communiqué par la structure (il intègre une quote-part de frais de structure) : on utilise **toujours** le taux fourni par l'employeur et on le précise.

Le budget du projet des Tilleuls : ratios d'analyse

Rappel (fiche F6, chapitre 1) : charges totales **3 510 €**, dont personnel 1 520 + 720 = 2 240 € ; subvention ARS **1 500** € ; commune 600 € ; CAF 400 € ; participation des familles 144 € ; contributions en nature 450 € ; autofinancement 416 €.

Ratio · Calcul · Résultat

Part de la subvention ARS — *Calcul :* 1 500 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 42,7 %

Part des financements publics — *Calcul :* (1 500 + 600 + 400) / 3 510 × 100 = 2 500 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 71,2 %

Part du personnel — *Calcul :* 2 240 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 63,8 %

Coût par famille — *Calcul :* 3 510 / 12 ; *Résultat :* 292,50 €

Coût par heure d'atelier — *Calcul :* 3 510 / (6 × 3 h) = 3 510 / 18 ; *Résultat :* 195,00 €

Part des contributions en nature — *Calcul :* 450 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 12,8 %

Participation des familles par rapport au coût par famille — *Calcul :* 12 / 292,50 × 100 (12 € = 2 € × 6 ateliers) ; *Résultat :* 4,1 %

Interprétation : le projet est majoritairement financé par des fonds publics et repose surtout sur du **temps humain**, ce qui est habituel en éducation pour la santé ; la participation symbolique des familles (2 € par atelier) favorise l'engagement sans exclure ; le coût par famille (292,50 €) se justifie par l'intensité de l'accompagnement (6 ateliers de 3 heures, livret, visite).

Suivre le budget réalisé

Exemple – Calcul détaillé : écarts entre budget prévisionnel et réalisé

Poste · Prévu · Réalisé · Écart (€) · Écart (%)

Denrées — *Prévu :* 210,00 ; *Réalisé :* 236,40 ; *Écart (€) :* + 26,40 ; *Écart (%) :* + 12,6 %

Petit matériel — *Prévu :* 180,00 ; *Réalisé :* 172,50 ; *Écart (€) :* − 7,50 ; *Écart (%) :* − 4,2 %

Supports pédagogiques — *Prévu :* 150,00 ; *Réalisé :* 150,00 ; *Écart (€) :* 0,00 ; *Écart (%) :* 0,0 %

Impression, communication — *Prévu :* 220,00 ; *Réalisé :* 198,00 ; *Écart (€) :* − 22,00 ; *Écart (%) :* − 10,0 %

Déplacements — *Prévu :* 60,00 ; *Réalisé :* 48,00 ; *Écart (€) :* − 12,00 ; *Écart (%) :* − 20,0 %

Diététicienne — *Prévu :* 1 520,00 ; *Réalisé :* 1 520,00 ; *Écart (€) :* 0,00 ; *Écart (%) :* 0,0 %

Coordinatrice (32 h × 24 €) — *Prévu :* 720,00 ; *Réalisé :* 768,00 ; *Écart (€) :* + 48,00 ; *Écart (%) :* + 6,7 %

Locaux (valorisation) — *Prévu :* 210,00 ; *Réalisé :* 210,00 ; *Écart (€) :* 0,00 ; *Écart (%) :* 0,0 %

Bénévolat (24 h × 12 €) — *Prévu :* 240,00 ; *Réalisé :* 288,00 ; *Écart (€) :* + 48,00 ; *Écart (%) :* + 20,0 %

Total — *Prévu :* 3 510,00 ; *Réalisé :* 3 590,90 ; *Écart (€) :* + 80,90 ; *Écart (%) :* + 2,3 %

Formules : écart (€) = réalisé − prévu ; écart (%) = écart / prévu × 100. Exemple : denrées : 236,40 − 210,00 = 26,40 € ; 26,40 / 210,00 × 100 = **12,6 %**. **Total réalisé** : 236,40 + 172,50 + 150 + 198 + 48 + 1 520 + 768 + 210 + 288 = **3 590,90 €** ; écart : 3 590,90 − 3 510 = **80,90 €**, soit 80,90 / 3 510 × 100 = **2,3 %**. **Analyse** : le dépassement des denrées s'explique par la hausse des prix des fruits (+ 12,6 %) ; il est compensé en partie par les économies d'impression (impression au centre social) et de déplacements (covoiturage) ; le bénévolat supplémentaire (+ 4 h de mamans relais) est une bonne nouvelle

(participation) et ne coûte rien en trésorerie (il est valorisé aux comptes 86 et 87 : les produits en nature passent aussi à 210 + 288 = 498 €). L'écart réel de trésorerie est donc : 26,40 − 7,50 − 22 − 12 + 48 = **+ 32,90 €**, couvert par l'autofinancement. Un écart global inférieur à 5 % est généralement jugé satisfaisant ; les écarts importants sur un poste sont **expliqués** dans le compte rendu financier.

Valoriser les contributions volontaires en nature

Un projet de prévention mobilise souvent des ressources qui ne coûtent rien à la structure : du temps de bénévoles, une salle prêtée, des denrées données, du matériel mis à disposition. Ces **contributions volontaires en nature** ont pourtant une valeur. Les inscrire au budget montre le vrai coût du projet, l'engagement du territoire et, souvent, la capacité du porteur à mobiliser des partenaires. Le plan comptable des associations (règlement ANC n° 2018-06) prévoit de les présenter dans les comptes 86 (emplois) et 87 (contributions), ou de les décrire dans l'annexe des comptes.

Contribution · Méthode de valorisation · Justificatif

Bénévolat — *Méthode de valorisation :* Nombre d'heures × taux horaire choisi par la structure et justifié (souvent le coût d'un salarié qui ferait la même tâche) ; *Justificatif :* Feuille de présence ou de temps des bénévoles

Mise à disposition d'une salle — *Méthode de valorisation :* Nombre d'heures ou de demi-journées × tarif de location pratiqué par le propriétaire ; *Justificatif :* Attestation du propriétaire, grille tarifaire

Don de denrées ou de matériel — *Méthode de valorisation :* Valeur de marché (prix d'achat équivalent) ; *Justificatif :* Attestation du donateur, bon de livraison

Personnel mis à disposition par un partenaire — *Méthode de valorisation :* Heures × coût horaire communiqué par l'employeur ; *Justificatif :* Attestation de l'employeur

Exemple – Calcul détaillé : les contributions en nature d'un projet de repas partagés

Trois bénévoles donnent chacun 40 heures sur l'année ; l'association a fixé un taux de 14 € de l'heure (taux fictif, expliqué dans l'annexe). La mairie prête une salle pour 12 demi-journées, qu'elle loue habituellement 25 € la demi-journée. Un primeur donne des légumes d'une valeur de 150 €.

- Bénévolat : 3 × 40 × 14 = **1 680 €**.
- Salle : 12 × 25 = **300 €**.
- Denrées données : **150 €**.
- Total : 1 680 + 300 + 150 = **2 130 €**, inscrits au compte 86 (charges) et au compte 87 (produits).

Le budget reste équilibré : les contributions en nature apparaissent pour le même montant des deux côtés. Elles n'entrent pas dans le plan de trésorerie, puisqu'aucun argent ne circule.

Attention – Ne pas gonfler les valorisations

Une valorisation exagérée (un taux horaire très élevé pour du bénévolat, une salle comptée au prix d'un hôtel) fait perdre sa crédibilité au dossier. Le taux doit être justifié, cohérent d'une année sur l'autre, et appuyé sur des pièces. Certains financeurs excluent les contributions en nature du calcul de leur subvention ou du cofinancement : il faut le vérifier dans le cahier des charges (8.3.3).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.12

Une association organise 8 ateliers. Deux bénévoles sont présents à chaque atelier pendant 3 heures (taux retenu : 13 € de l'heure). Un supermarché donne des fruits pour une valeur de 20 € par atelier. Le centre social prête sa cuisine, qu'il loue 30 € l'atelier. Calculez le montant des contributions en nature et indiquez comment elles apparaissent dans le budget.

Corrigé

Bénévolat : 2 × 8 × 3 × 13 = **624 €** ; fruits : 8 × 20 = **160 €** ; cuisine : 8 × 30 = **240 €** ; total : 624 + 160 + 240 = **1 024 €**. Ce montant apparaît au **compte 86** (emplois des contributions volontaires en nature, côté charges) et au **compte 87** (contributions volontaires en nature, côté produits), avec le détail des trois lignes. Il ne figure pas dans le plan de trésorerie.

Construire un budget prévisionnel pas à pas

Un budget se construit à partir du plan d'action, ligne par ligne, et jamais en partant du montant que l'on espère obtenir. Chaque ligne s'écrit sous la forme **quantité × coût unitaire**, avec la source du coût (devis, tarif, relevé de prix, taux communiqué par l'employeur).

Méthode pas à pas – Construire le budget en sept étapes

1. Lister les moyens nécessaires à chaque action (fiches QQOQCCP, rubrique « combien ? »).

2. Chiffrer chaque moyen : quantité × coût unitaire, avec sa source.

3. Classer les charges dans les comptes (60, 61, 62, 63, 64) et ajouter les contributions en nature (86).

4. Additionner les charges monétaires, les contributions en nature et le total.

5. Inscrire les produits connus : subventions acquises et sollicitées, participation, mécénat, contributions en nature (87, même montant que le compte 86).

6. Calculer l'autofinancement qui équilibre le budget, et vérifier qu'il est supportable pour la structure.

7. Vérifier : total des charges = total des produits ; 86 = 87 ; règles des financeurs (plafond, taux, cofinancement) ; cohérence avec le plan d'action.

Exemple – Calcul détaillé : le budget du projet « Cuisine en pied d'immeuble » d'une régie de quartier (fictif)

Le projet comprend 10 ateliers de 3 heures pour 10 habitants, animés par une animatrice salariée et une diététicienne libérale.

- 60 – Denrées : 10 ateliers × 28 € = **280,00 €** (relevé de prix de deux magasins).
- 60 – Petit matériel : **240,00 €** (devis).
- 61 – Assurance complémentaire de l'activité : **60,00 €**.
- 62 – Impression des fiches et des affiches : **120,00 €** (devis de l'imprimeur).
- 62 – Honoraires de la diététicienne : 10 × 2,5 h × 50 € = **1 250,00 €**.
- 62 – Déplacements : 216 km × 0,40 € (taux fixé par la régie) = **86,40 €**.
- 64 – Animatrice : 70 h × 19,20 € (coût horaire chargé communiqué par la régie) = **1 344,00 €**.
- 86 – Bénévolat : 2 bénévoles × 10 ateliers × 3 h × 13 € = **780,00 €** ; 86 – Salle prêtée : 10 × 3 h × 20 € = **600,00 €**.

Charges monétaires : 280 + 240 + 60 + 120 + 1 250 + 86,40 + 1 344 = **3 380,40 €** ; contributions en nature : 780 + 600 = **1 380,00 €** ; total : **4 760,40 €**.

Produits	Montant	Statut
74 – Commune	1 500,00 €	Acquis
74 – Département	1 000,00 €	Sollicité
75 – Mécénat du bailleur social	600,00 €	Acquis
70 – Participation des habitants (1 € × 10 × 10)	100,00 €	Prévu
Autofinancement de la régie	180,40 €	Acquis
87 – Contributions volontaires en nature	1 380,00 €	Prévu
Total	**4 760,40 €**	

Autofinancement : 3 380,40 − (1 500 + 1 000 + 600 + 100) = **180,40 €**, soit 5,3 % des charges monétaires. Les financements publics représentent 2 500 / 4 760,40 × 100 = **52,5 %** du budget total. Si le département refuse, il manquera 1 000 € : la régie a prévu une version à six ateliers.

Astuce – Prévoir une version réduite

Quand un financement important est seulement sollicité, préparez dès le départ une version réduite du projet (moins d'ateliers, moins d'heures de diététicienne) et calculez son budget. Si la réponse est négative ou partielle, vous savez immédiatement ce que vous pouvez maintenir, et vous le présentez au comité de pilotage.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.13

Dans l'exemple, le département n'accorde que 600 € au lieu de 1 000 €. La régie décide de supprimer deux ateliers. Chaque atelier supprimé économise 28 € de denrées, 125 € d'honoraires et 7 heures d'animatrice ; la participation diminue de 10 € par atelier. Les autres charges ne changent pas. Calculez les nouvelles charges monétaires et le nouvel autofinancement.

Corrigé

Économie par atelier : 28 + 125 + 7 × 19,20 = 28 + 125 + 134,40 = **287,40 €** ; pour deux ateliers : **574,80 €**. Nouvelles charges monétaires : 3 380,40 − 574,80 = **2 805,60 €**. Produits monétaires hors autofinancement : 1 500 + 600 + 600 + (100 − 20) = **2 780,00 €**. Autofinancement : 2 805,60 − 2 780,00 = **25,60 €**. (Les contributions en nature baissent aussi si les bénévoles et la salle ne sont plus mobilisés pour ces deux ateliers ; les comptes 86 et 87 restent égaux.)

Coûts fixes, coûts variables et nombre minimal de participants

Certaines charges ne dépendent pas du nombre de participants : l'animatrice est payée pour l'atelier, que le groupe compte 5 ou 12 personnes. Ce sont des **coûts fixes**. D'autres augmentent avec chaque participant : les denrées, les fiches remises, parfois le transport. Ce sont des **coûts variables**. Distinguer les deux permet de calculer le **coût par participant** et le **nombre minimal de participants** pour qu'une action financée « à la personne » couvre ses coûts.

Définition – Coût par participant et seuil

Coût par participant = coûts fixes / nombre de participants + coût variable par participant. Quand chaque participant rapporte une recette R (forfait d'un financeur, participation), le **seuil** est le nombre de participants à partir duquel les recettes couvrent les coûts : seuil = coûts fixes / (R − coût variable par participant), arrondi à l'unité supérieure.

Exemple – Calcul détaillé : un atelier « cuisine et mémoire » financé à la personne

Coûts fixes d'un atelier : diététicienne 2 h × 55 € = 110,00 € ; animatrice 3 h × 19,20 € = 57,60 € ; salle 25,00 € ; total **192,60 €**. Coûts variables : denrées 1,90 € et fiche 0,30 €, soit **2,20 €** par participant. Une caisse de retraite (fictive) verse 16 € par participant présent, et chaque participant paie 2 € : recette **18 €** par participant.

Participants · Coût par participant · Résultat de l'atelier

5 — *Coût par participant :* 192,60 / 5 + 2,20 = 40,72 € ; *Résultat de l'atelier :* 5 × 18 − (192,60 + 5 × 2,20) = − 113,60 €

8 — *Coût par participant :* 192,60 / 8 + 2,20 = 26,28 € ; *Résultat de l'atelier :* − 66,20 €

10 — *Coût par participant :* 21,46 € ; *Résultat de l'atelier :* − 34,60 €

12 — *Coût par participant :* 18,25 € ; *Résultat de l'atelier :* − 3,00 €

15 — *Coût par participant :* 15,04 € ; *Résultat de l'atelier :* + 44,40 €

Seuil : 192,60 / (18 − 2,20) = 192,60 / 15,80 = **12,2**, soit **13**

participants. Avec une salle de 12 places, l'atelier ne peut pas couvrir ses coûts : il faut réduire les coûts fixes (salle prêtée gratuitement : seuil = 167,60 / 15,80 = 10,6, soit 11 participants) ou obtenir un autre financement.

Attention – Le seuil n'est pas un objectif pédagogique

Un atelier de 15 personnes couvre mieux ses coûts qu'un atelier de 8, mais il n'est pas forcément meilleur : chacun cuisine moins, l'animatrice accompagne moins. Le calcul du seuil éclaire une décision ; il ne la remplace pas. On cherche un équilibre entre la qualité de l'atelier, l'équité d'accès et la viabilité financière.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.14

Un atelier coûte 150 € de coûts fixes et 3 € de denrées par participant. Un financeur verse 15 € par participant. Calculez le coût par participant pour 8 et pour 12 participants, puis le seuil.

Corrigé

8 participants : 150 / 8 + 3 = 18,75 + 3 = **21,75 €**. 12 participants : 150 / 12 + 3 = 12,50 + 3 = **15,50 €**. Seuil : 150 / (15 − 3) = 150 / 12 = **12,5**, soit **13 participants**. Avec 12 participants, il manque 12 × 15 − (150 + 12 × 3) = 180 − 186 = **6 €** par atelier.

Acheter : comparer des devis avec une grille pondérée

Les achats importants du projet (matériel de cuisine, impression, transport) se font sur **devis**. La plupart des structures fixent une règle interne : au-delà d'un certain montant, on demande au moins **trois devis** et l'on garde une trace du choix. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur : on compare les devis avec une **grille pondérée**, comme pour hiérarchiser des priorités (chapitre 7).

Méthode – Comparer des devis en cinq étapes

1. Rédiger un **besoin précis** et le même pour tous les fournisseurs (quantités, caractéristiques, délai, livraison).
2. Choisir les **critères** (prix, délai, qualité, service après-vente, proximité, engagement social ou environnemental) et leur **poids**, avant de lire les devis.
3. **Noter** chaque devis sur 10 pour chaque critère.
4. Calculer la **note pondérée** : somme des notes multipliées par les poids.
5. **Conserver** la grille et les devis : ils justifient la dépense auprès du financeur et de la direction.

Exemple – Calcul détaillé : le choix d'un fournisseur de matériel de cuisine (données fictives)

Besoin : 4 plaques à induction mobiles, 4 lots de casseroles compatibles, 2 balances, livraison avant le 15 septembre. Poids des critères : prix 40 %, délai 20 %, qualité 30 %, service après-vente 10 %.

Critère (poids) · Fournisseur 1 · Fournisseur 2 · Fournisseur 3

Prix (0,4) — *Fournisseur 1 :* 8 ; *Fournisseur 2 :* 10 ; *Fournisseur 3 :* 6

Délai (0,2) — *Fournisseur 1 :* 6 ; *Fournisseur 2 :* 8 ; *Fournisseur 3 :* 9

Qualité (0,3) — *Fournisseur 1 :* 7 ; *Fournisseur 2 :* 5 ; *Fournisseur 3 :* 9

Service après-vente (0,1) — *Fournisseur 1 :* 9 ; *Fournisseur 2 :* 5 ; *Fournisseur 3 :* 8

Note pondérée — *Fournisseur 1 :* 7,4 ; *Fournisseur 2 :* 7,6 ; *Fournisseur 3 :* 7,7

- Fournisseur 1 : 0,4 × 8 + 0,2 × 6 + 0,3 × 7 + 0,1 × 9 = 3,2 + 1,2 + 2,1 + 0,9 = **7,4**.
- Fournisseur 2 : 0,4 × 10 + 0,2 × 8 + 0,3 × 5 + 0,1 × 5 = 4,0 + 1,6 + 1,5 + 0,5 = **7,6**.
- Fournisseur 3 : 0,4 × 6 + 0,2 × 9 + 0,3 × 9 + 0,1 × 8 = 2,4 + 1,8 + 2,7 + 0,8 = **7,7**.

Décision : le fournisseur 3, le plus cher, obtient la meilleure note grâce à sa qualité et à son délai. L'écart avec le fournisseur 2 est faible (0,1 point) : on vérifie que le budget permet ce choix, et l'on peut demander au fournisseur 3 s'il accepte une remise. Si le budget est trop juste, le fournisseur 2 reste un choix défendable.

Attention – Fixer les poids avant d'ouvrir les devis

Si l'on choisit les poids après avoir lu les devis, on risque, même sans le vouloir, de les ajuster pour favoriser un fournisseur. La grille doit être décidée à l'avance, si possible avec une autre personne (tutrice, trésorier de l'association).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.15

Reprenez la grille ci-dessus en changeant les poids : prix 60 %, délai 10 %, qualité 20 %, service 10 %. Recalculez les notes pondérées et indiquez le fournisseur retenu. Que montre cet exercice ?

Corrigé

Fournisseur 1 : 0,6 × 8 + 0,1 × 6 + 0,2 × 7 + 0,1 × 9 = 4,8 + 0,6 + 1,4 + 0,9 = 7,7. Fournisseur 2 : 0,6 × 10 + 0,1 × 8 + 0,2 × 5 + 0,1 × 5 = 6,0 + 0,8 + 1,0 + 0,5 = 8,3. Fournisseur 3 : 0,6 × 6 + 0,1 × 9 + 0,2 × 9 + 0,1 × 8 = 3,6 + 0,9 + 1,8 + 0,8 = 7,1. Le fournisseur 2 est retenu. L'exercice montre que le résultat dépend fortement des poids : c'est pourquoi on les fixe avant de lire les devis et on les justifie (par exemple, un budget très contraint justifie un poids élevé pour le prix).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.5 – Le budget

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous.

Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel compte inscrit-on les honoraires d'une diététicienne libérale ? Le salaire d'une animatrice ?
2. Pourquoi les comptes 86 et 87 doivent-ils être égaux ?
3. Calculez le coût horaire d'une salariée dont le coût employeur mensuel est de 2 730 € pour 151,67 heures.
4. Un poste prévu à 250 € est réalisé à 280 €. Calculez l'écart en euros et en pourcentage.
5. Comment valorise-t-on une salle prêtée gratuitement ?
6. Qu'est-ce qu'un coût fixe ? Donnez un exemple dans un atelier culinaire.

Corrigé – Point d'étape 8.3.5

1. Honoraires : compte 62 ; salaire et charges : compte 64.
2. Ce sont les deux faces d'une même contribution : on l'utilise (86, charge) et on la reçoit (87, produit) ; leur égalité garde le budget équilibré.
3. 2 730 / 151,67 = **18,00 €** de l'heure.
4. 280 − 250 = **+ 30 €** ; 30 / 250 × 100 = **+ 12,0 %**.
5. Nombre d'heures ou de demi-journées × tarif de location pratiqué par le propriétaire, avec une attestation.
6. Une charge qui ne dépend pas du nombre de participants, par exemple le temps de l'animatrice ou la location de la salle.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.6.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je refais le budget pas à pas de la régie de quartier.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.5 et je refais les exercices d'application.

8.3.6 Piloter le projet

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Définition – Pilotage

Ensemble des activités qui permettent de **suivre** l'avancement du projet (activités, délais, budget, participation), de **repérer** les écarts et les risques, de **décider** des ajustements et d'en **rendre compte** aux partenaires et financeurs.

Le tableau de bord de suivi

Indicateur de suivi · Prévu à mi-parcours · Réalisé à mi-parcours · Analyse

Ateliers réalisés — *Prévu à mi-parcours :* 3 / 6 ; *Réalisé à mi-parcours :* 3 / 6 ; *Analyse :* Conforme

Taux de présence — *Prévu à mi-parcours :* ≥ 80 % ; *Réalisé à mi-parcours :* 31 / 36 = 86,1 % ; *Analyse :* Conforme

Familles inscrites — *Prévu à mi-parcours :* 12 ; *Réalisé à mi-parcours :* 12 (dont 1 remplacement) ; *Analyse :* Liste d'attente utilisée

Budget consommé — *Prévu à mi-parcours :* ≈ 50 % ; *Réalisé à mi-parcours :* 1 650 / 3 510 = 47,0 % ; *Analyse :* Conforme

Questionnaires « avant » recueillis — *Prévu à mi-parcours :* 12 ; *Réalisé à mi-parcours :* 12 ; *Analyse :* Conforme

Supports validés — *Prévu à mi-parcours :* 6 fiches recettes ; *Réalisé à mi-parcours :* 4 ; *Analyse :* Retard : 2 fiches en relecture FALC

Calcul du taux de présence : 3 ateliers × 12 familles = 36 présences possibles ; 31 présences constatées (11 + 10 + **10.** ; 31 / 36 × 100 = **86,1 %** (objectif ≥ 80 % atteint).

Gérer les risques

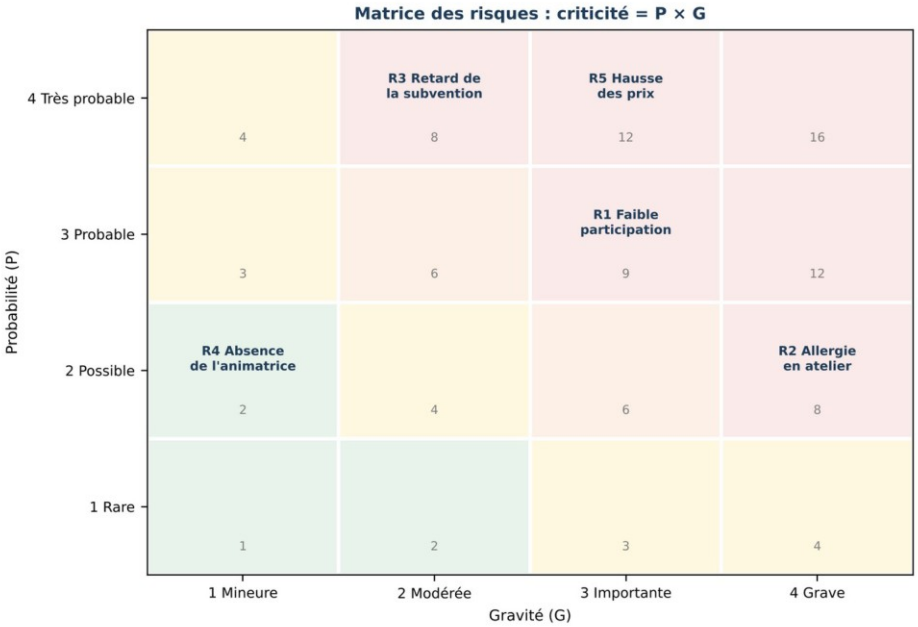


Figure 8.5 – La matrice des risques du projet des Tilleuls

Risque · P · G · P × G · Mesure de prévention ou de réduction

R1 – Faible participation — *P :* 3 ; *G :* 3 ; *P × G :* 9 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Inscription en face à face, rappel la veille (SMS, message vocal), horaires adaptés, garde d'enfants, liste d'attente

R2 – Réaction allergique en atelier — *P :* 2 ; *G :* 4 ; *P × G :* 8 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Recueil des allergies à l'inscription, étiquetage des 14 allergènes, variantes, trousse et protocole d'urgence

R3 – Retard de versement de la subvention — *P :* 4 ; *G :* 2 ; *P × G :* 8 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Vérifier la trésorerie, avance de la structure, achats échelonnés

R4 – Absence de l'animatrice — *P :* 2 ; *G :* 1 ; *P × G :* 2 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Conducteurs rédigés et partagés, binôme de remplacement

R5 – Hausse des prix des denrées — *P :* 4 ; *G :* 3 ; *P × G :* 12 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Recettes de saison, achats groupés, partenariat avec l'épicerie, marge de 10 % sur la ligne denrées

Lecture : la criticité (P × G, de 1 à 16) classe les risques : R5 (12), puis R1 (9), puis R2 et R3 (8). Un risque de gravité 4 (R2) appelle toujours des mesures, même si sa probabilité est faible.

Animer une réunion et en rendre compte

Méthode pas à pas – Réunion de pilotage efficace

Avant : ordre du jour envoyé une semaine avant, documents joints (tableau de bord, budget). **Pendant** : rappel des objectifs, point d'avancement (ce qui est fait, écarts, risques), décisions à prendre, répartition des tâches (qui fait quoi pour quand), date de la prochaine réunion ; respect du temps. **Après** : **compte rendu** sous 48 heures : présents et excusés, points abordés, **décisions** prises, **relevé des actions** (tâche, responsable, échéance).

Choisir et définir les indicateurs de suivi

Le tableau de bord ne contient pas tous les chiffres possibles : il en retient **quelques-uns**, choisis parce qu'ils permettent de décider. On distingue les indicateurs de **suivi** (ou de processus), qui disent si le projet se déroule comme prévu (activités réalisées, présence, budget, délais), et les indicateurs de **résultat**, qui disent si les objectifs sont atteints. Les premiers servent au pilotage en cours de route ; les seconds servent surtout à l'évaluation (chapitre 9). Un bon tableau de bord compte cinq à huit indicateurs.

Domaine · Indicateur de suivi · Formule · Fréquence

Activité — *Indicateur de suivi :* Taux de réalisation des ateliers ; *Formule :* Ateliers réalisés / ateliers prévus à cette date × 100 ; *Fréquence :* Chaque mois

Participation — *Indicateur de suivi :* Taux de présence ; *Formule :* Présences constatées / présences possibles × 100 ; *Fréquence :* Après chaque atelier

Participation — *Indicateur de suivi :* Taux de fidélisation ; *Formule :* Participants présents à au moins 4 ateliers sur 6 / inscrits × 100 ; *Fréquence :* À mi-parcours et à la fin

Budget — *Indicateur de suivi :* Taux de consommation du budget ; *Formule :* Dépenses réalisées / budget prévu × 100 ; *Fréquence :* Chaque mois

Délais — *Indicateur de suivi :* Nombre de tâches en retard ; *Formule :* Tâches non terminées à leur échéance ; *Fréquence :* À chaque comité technique

Partenariat — *Indicateur de suivi :* Orientations par les partenaires ; *Formule :* Nombre de personnes orientées par chaque partenaire ; *Fréquence :* Chaque mois

Définition – Fiche indicateur

Document court qui définit un indicateur pour que tout le monde le calcule de la même façon : **nom**, **définition**, **formule** (numérateur et dénominateur), **source** des données, **fréquence** de mesure, **responsable**, **valeur cible** et **seuil d'alerte** (valeur à partir de laquelle on réagit).

Exemple – Fiche indicateur « taux de présence »

Nom : taux de présence aux ateliers. **Définition** : part des places réservées effectivement occupées. **Formule** : nombre de présences constatées sur les feuilles d'émargement / (nombre d'inscrits × nombre d'ateliers réalisés) × 100. **Source** : feuilles d'émargement. **Fréquence** : après chaque atelier, cumul mensuel. **Responsable** : l'animatrice. **Valeur cible** : 80 % au moins. **Seuil d'alerte** : moins de 70 % sur deux ateliers consécutifs, ce qui déclenche des appels aux personnes absentes et un point au comité technique.

Attention – Un taux sans effectif ne dit rien

Un taux de présence de 50 % peut correspondre à 3 personnes sur 6 ou à 30 personnes sur 60. Dans le tableau de bord, on donne toujours le **nombre** et le **pourcentage**. Pour les petits groupes, une seule absence change fortement le taux : on regarde la tendance sur plusieurs ateliers plutôt qu'une valeur isolée.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.16

Rédigez la fiche indicateur du « taux de consommation du budget » d'un projet de 4 000 €, suivi chaque mois par la coordinatrice. Proposez une valeur cible à mi-parcours et un seuil d'alerte.

Corrigé

Nom : taux de consommation du budget. Définition : part du budget prévisionnel déjà dépensée. Formule : dépenses réalisées (factures et salaires imputés au projet) / 4 000 € × 100. Source : tableau de suivi budgétaire tenu dans le tableur, rapproché des factures. Fréquence : chaque mois. Responsable : la coordinatrice. Valeur cible : proche de l'avancement du projet (environ 50 % à mi-parcours). Seuil d'alerte : un écart de plus de 15 points avec l'avancement (moins de 35 % ou plus de 65 % à mi-parcours), qui conduit à analyser les postes concernés.

Analyser un écart et décider

Un écart entre le prévu et le réalisé n'est pas une faute : c'est une **information**. Le pilotage consiste à le repérer tôt, à en comprendre la cause et à décider d'un ajustement, puis à vérifier que l'ajustement a eu l'effet attendu.

Méthode pas à pas – De l'écart à la décision

1. Constater : quel indicateur, quel écart, depuis quand ? On donne les chiffres.

2. Chercher les causes : on interroge les personnes concernées (participants, animateurs, partenaires) et on vérifie les faits. On peut se demander plusieurs fois « pourquoi ? » pour remonter à la cause profonde.

3. Lister les options : continuer sans changer, ajuster (horaire, lieu, méthode, budget), renforcer (rappels, relais), ou modifier le projet (après accord du financeur).

4. Décider en comité technique ou en comité de pilotage, selon l'importance, et noter la décision (qui fait quoi, pour quand).

5. Vérifier l'effet au point suivant du tableau de bord.

Exemple – Calcul détaillé : une présence qui baisse

Un cycle de six ateliers accueille 12 inscrits. Présences aux quatre premiers ateliers : 11, 10, 8 et 6.

- Taux par atelier : 11 / 12 = **91,7 %** ; 10 / 12 = **83,3 %** ; 8 / 12 = **66,7 %** ; 6 / 12 = **50,0 %**.
- Taux cumulé : (11 + 10 + 8 + 6) / (4 × 12) = 35 / 48 = **72,9 %**, sous la cible de 80 %.
- Évolution entre le premier et le quatrième atelier : (6 – 11) / 11 × 100 = **– 45,5 %**.

Causes recherchées : l'animatrice appelle les six absents. Quatre expliquent que les ateliers 3 et 4 ont eu lieu pendant les vacances scolaires, avec les enfants à la maison ; deux ont repris un travail. **Options** : proposer un accueil des enfants pendant les vacances, ou décaler les deux derniers ateliers hors vacances ; envoyer les fiches recettes aux personnes qui travaillent. **Décision** du comité technique : les ateliers 5 et 6 sont placés hors vacances, avec un rappel par message vocal la veille ; les fiches sont envoyées aux deux personnes en emploi. **Vérification** : 10 et 11 présents aux ateliers 5 et 6 (taux cumulé final : 56 / 72 = 77,8 %).

Astuce – Écrire « on a appris » plutôt que « on a échoué »

Dans le compte rendu et devant le jury, un écart bien analysé est un point fort. La phrase « la présence a baissé pendant les vacances scolaires ; nous avons déplacé les ateliers et elle est remontée » montre une démarche de pilotage. Le jury attend cette capacité d'ajustement plus qu'un projet sans incident.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.17

Un groupe de 10 inscrits a eu les présences suivantes sur cinq ateliers : 9, 9, 7, 8, 6. Calculez le taux de présence de chaque atelier et le taux cumulé, puis proposez deux questions à poser aux personnes absentes au cinquième atelier.

Corrigé

Taux : 90,0 % ; 90,0 % ; 70,0 % ; 80,0 % ; 60,0 %. Taux cumulé : (9 + 9 + 7 + 8 + 6) / (5 × 10) = 39 / 50 = **78,0 %**. Questions : « Qu'est-ce qui vous a empêché de venir cette fois ? » ; « Qu'est-ce qui vous aiderait à venir au prochain atelier (horaire, lieu, garde d'enfants, rappel) ? ». On pose ces questions avec bienveillance, sans reproche, et on note les réponses de façon anonyme pour le comité technique.

Le registre des risques et le plan de repli

La matrice des risques (8.3.6) classe les risques par criticité. Le **registre des risques** va plus loin : pour chaque risque, il nomme un responsable, un **signal d'alerte** qui montre que le risque est en train de se produire, des mesures de **prévention** (pour qu'il n'arrive pas) et un **plan de repli** (ce que l'on fait s'il arrive quand même). On le relit à chaque comité technique.

Risque · Criticité (P × G) · Signal d'alerte · Prévention · Plan de repli · Responsable

Canicule le jour d'un atelier de cuisine — *Criticité (P × G) :* 3 × 3 = 9 ; *Signal d'alerte :* Alerte de Météo-France à J − 2 ; *Prévention :* Atelier le matin ; recette sans four ; eau fraîche disponible ; *Plan de repli :* Remplacer la cuisson par une recette crue ; décaler l'atelier ; *Responsable :* Animatrice

Absence de la diététicienne — *Criticité (P × G) :* 2 × 3 = 6 ; *Signal d'alerte :* Message la veille ou le matin ; *Prévention :* Conducteur écrit et partagé ; binôme formé ; *Plan de repli :* L'animatrice assure un atelier « recettes déjà testées » ; *Responsable :* Coordinatrice

Intoxication alimentaire — *Criticité (P × G) :* 1 × 4 = 4 ; *Signal d'alerte :* Symptômes signalés après l'atelier ; *Prévention :* Bonnes pratiques d'hygiène, températures, traçabilité des produits ; *Plan de repli :* Conserver les restes et les étiquettes ; prévenir le médecin et la direction ; une toxi-infection alimentaire collective (au moins deux cas groupés liés au même repas) est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS ; *Responsable :* Coordinatrice

Retrait d'un partenaire qui oriente le public — *Criticité (P × G) :* 2 × 3 = 6 ; *Signal d'alerte :* Baisse des orientations sur deux mois ; *Prévention :* Plusieurs partenaires orienteurs ; restitution régulière des résultats ; *Plan de repli :* Activer d'autres relais (mairie, associations) ; *Responsable :* Coordinatrice

Définition – Plan de continuité

Ensemble des solutions prévues à l'avance pour qu'une action essentielle continue malgré un incident : un lieu de repli, une personne de remplacement, une recette sans cuisson, une version à distance. Il évite d'improviser dans l'urgence et rassure les partenaires et les financeurs.

Attention – Les risques pour les personnes passent avant les risques pour le projet

Un projet peut accepter un retard ou une baisse de participation. Il ne peut pas accepter un risque pour la santé ou la sécurité des participants : allergie, brûlure,

coupure, intoxication, chute. Ces risques sont traités en priorité, même quand leur probabilité est faible, avec des règles écrites et connues de toute l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.18

Un projet prévoit trois sorties au marché avec un groupe de personnes âgées, en minibus prêté par la mairie. Identifiez deux risques, puis remplissez pour chacun le signal d'alerte, la prévention et le plan de repli.

Corrigé

Exemples. Minibus indisponible : signal, la mairie n'a pas confirmé la réservation à J − 7 ; prévention, réserver les trois dates dès le début et confirmer à J − 7 ; repli, covoiturage avec des bénévoles assurés, ou sortie remplacée par la venue d'un producteur. Chute d'une personne au marché : signal, sol mouillé, foule, fatigue d'un participant ; prévention, groupe de six au plus par accompagnateur, horaire calme, bancs repérés, chaussures adaptées conseillées ; repli, trousse de premiers secours, numéros d'urgence, fiche de contact de chaque participant.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.6 – Le pilotage

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre un indicateur de suivi et un indicateur de résultat ?
2. Que contient une fiche indicateur ? Citez cinq éléments.
3. Calculez le taux de présence cumulé de trois ateliers de 12 places avec 10, 9 et 8 présents.
4. Citez les cinq étapes qui mènent d'un écart à une décision.
5. Qu'est-ce qu'un plan de repli ?
6. Pourquoi traite-t-on un risque d'allergie même s'il est peu probable ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.6

1. L'indicateur de suivi dit si le projet se déroule comme prévu (activités, présence, budget, délais) ; l'indicateur de résultat dit si les objectifs sont atteints.
2. Nom, définition, formule, source, fréquence, responsable, valeur cible, seuil d'alerte (cinq suffisent).
3. (10 + 9 + 8) / (3 × 12) = 27 / 36 = **75,0 %**.
4. Constater, chercher les causes, lister les options, décider, vérifier l'effet.
5. La solution prévue à l'avance si un risque se réalise, pour que l'action continue.
6. Parce que sa gravité est maximale : il met en danger la santé d'une personne.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.7.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la fiche indicateur et la méthode de l'écart à la décision.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.6 et je refais les exercices d'application.

8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 12)

Le référentiel cite explicitement le **plan de communication** parmi les indicateurs de la compétence C3.1. Il organise la manière dont on fait connaître le projet, on mobilise le public et les partenaires, et on valorise les résultats (fiche **F10** ; les techniques de communication sont approfondies aux chapitres 14 et 15).

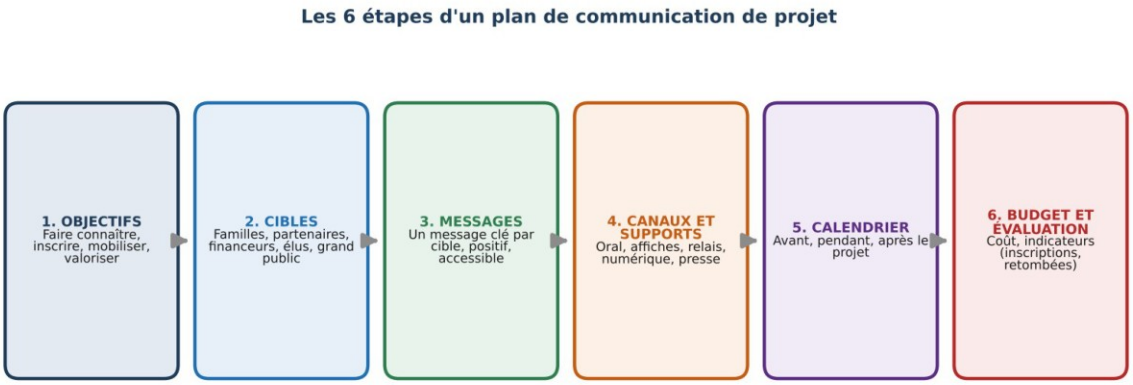


Figure 8.8 – Les étapes d'un plan de communication

Comprendre le schéma – Figure 8.8

1. Objectifs de communication : faire connaître le projet, susciter les inscriptions, mobiliser les partenaires, informer les financeurs, valoriser les résultats ; ils se distinguent des objectifs de santé du projet.

2. Cibles : public bénéficiaire (familles), relais (enseignants, travailleurs sociaux, mamans relais), partenaires, financeurs, élus, grand public.

3. Messages : un message clé par cible (« Venez cuisiner à petit prix avec vos enfants » pour les familles ; « Un projet qui réduit les inégalités d'accès à une alimentation favorable » pour les financeurs), clair et non stigmatisant (chapitres 5 et 6).

4. Canaux et supports : bouche-à-oreille et relais (souvent les plus efficaces auprès des publics éloignés), affiches et flyers imagés, messages vocaux, réseaux sociaux de la structure, presse locale, réunions.

5. Calendrier : avant (lancement, inscriptions), pendant (rappels, informations aux partenaires), après (restitution, valorisation, chapitre 9).

6. Budget et évaluation : coût des supports, temps humain ; indicateurs (nombre d'inscriptions par canal, fréquentation, retombées presse).

Cible · Objectif · Message · Canal, support · Quand

Familles du quartier — *Objectif :* S'inscrire aux ateliers ; *Message :* « Cuisinons ensemble des repas bons et pas chers » ; *Canal, support :* Mamans relais, affiches imagées, message vocal, inscription à l'accueil ; *Quand :* 3 semaines avant

Enseignants, PMI, épicerie — *Objectif :* Orienter les familles ; *Message :* « Un cycle gratuit d'ateliers pour vos familles » ; *Canal, support :* Réunion, courriel, flyer ; *Quand :* 4 semaines avant

Financeurs (ARS, commune, CAF) — *Objectif :* Informer, rendre compte ; *Message :* « Le projet avance : 6 ateliers, 12 familles » ; *Canal, support :* Point d'étape, bilan ; *Quand :* Mi-parcours, fin

Élus, grand public — *Objectif :* Faire connaître, valoriser ; *Message :* « Le quartier cuisine ! » ; *Canal, support :* Journal municipal, temps fort, réseaux de la structure ; *Quand :* Fin du cycle

Exemple – Calcul détaillé : efficacité des canaux de recrutement

Pour un cycle d'ateliers, 31 familles ont pris contact. Origine : mamans relais 14 ; affiche au centre social 6 ; orientation par l'épicerie solidaire 7 ; publication sur la page de la structure 2 ; flyer distribué à la sortie de l'école (300 flyers) 2.

- Vérification : 14 + 6 + 7 + 2 + 2 = **31** (vérifié).
- Parts : mamans relais 14 / 31 = **45,2 %** ; épicerie 7 / 31 = **22,6 %** ; affiche 6 / 31 = **19,4 %** ; page de la structure 2 / 31 = **6,5 %** ; flyers 2 / 31 = **6,5 %**.
- Rendement des flyers : 2 contacts pour 300 flyers = 2 / 300 × 100 = **0,67 %** ; coût d'impression 45 € : 45 / 2 = **22,50 € par contact**.

Conclusion : auprès de ce public, les **relais humains** (mamans relais, épicerie) apportent deux tiers des contacts (21 / 31 = 67,7 %) ; les flyers sont peu efficaces : on réoriente le budget vers la formation des relais.

Rédiger un message clair et non stigmatisant

Le meilleur canal ne sert à rien si le message n'est pas compris ou s'il blesse. Un message de projet doit être **court**, **concret**, **positif** et **adapté** à la cible. Il dit ce que la personne va trouver, pas ce qui ne va pas chez elle. Les techniques de communication et l'écriture en facile à lire et à comprendre (FALC) sont développées aux chapitres 14 et 15 ; on retient ici ce qui concerne le projet.

Message à éviter · Pourquoi · Message reformulé

« Atelier pour les familles en difficulté » — *Pourquoi :* Il désigne et stigmatise ; les personnes concernées ne viendront pas ; *Message reformulé :* « Atelier cuisine du mardi : des repas bons et pas chers, à faire en famille »

« Venez apprendre à bien manger » — *Pourquoi :* Il suppose que les personnes mangent mal ; *Message reformulé :* « Venez découvrir des recettes rapides et partager vos astuces »

« Lutte contre l'obésité infantile » — *Pourquoi :* Il étiquette les enfants et inquiète les parents ; *Message reformulé :* « Bouger et goûter : un mercredi par mois pour les 6-10 ans et leurs parents »

« Conférence sur les recommandations du PNNS » — *Pourquoi :* Il est abstrait et peu attirant ; *Message reformulé :* « Les légumes secs, ça se cuisine comment ? Dégustation offerte »

Méthode pas à pas – Vérifier un message avant de le diffuser

1. Une seule idée principale, dite dans la première phrase ou le titre.

2. Les informations pratiques visibles : quoi, quand, où, combien (gratuit ?), comment s'inscrire, avec qui.

3. Des mots simples, des phrases courtes, des chiffres écrits en chiffres, une image qui montre l'activité (et non un aliment « interdit » barré).

4. Aucun mot qui juge les personnes ou leurs habitudes.

5. Un test auprès de deux ou trois personnes du public : ont-elles compris ? Ont-elles envie de venir ?

Exemple – Une affiche reformulée avec les habitantes

Une première affiche annonçait : « Programme nutrition : prévention du surpoids et des maladies cardiovasculaires ». Testée auprès de quatre habitantes, elle a été jugée « triste » et « pour les malades ». Avec elles, l'équipe a choisi un titre (« Cuisine du monde, petit budget »), une photo d'un atelier précédent (avec l'accord écrit des personnes photographiées) et trois informations en gros caractères : « Le mardi, 9 h 30 – 12 h », « Gratuit », « Inscription à l'accueil ou au 06… ». Les inscriptions ont été complètes en dix jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.19

Reformulez ce message destiné à des retraités vivant seuls : « Le CCAS organise un programme de prévention de la

dénutrition chez les personnes âgées isolées. » Donnez un titre, une phrase d'accroche et les trois informations pratiques à faire figurer.

Corrigé

Exemple. Titre : « Les jeudis gourmands ». Accroche : « Un repas cuisiné ensemble, une fois par mois, pour le plaisir de partager et de découvrir des recettes simples. » Informations pratiques : « Un jeudi par mois, de 10 h à 14 h, à la salle des fêtes » ; « Participation : 3 € le repas » ; « Inscription au CCAS ou par téléphone ; transport possible sur demande ». Les mots « dénutrition », « personnes âgées » et « isolées » ne figurent pas : ils décrivent l'objectif de santé, pas l'activité, et risquent de faire fuir les personnes visées.

Communiquer avec les financeurs, les partenaires et les médias

Le plan de communication ne s'adresse pas seulement au public. Les financeurs et les partenaires attendent d'être **informés** et **cités** ; les élus et la presse peuvent **valoriser** le projet et faciliter sa pérennisation.

Destinataire · Ce qu'il attend · Bonnes pratiques

Financeurs — *Ce qu'il attend :* Que leur soutien soit visible et que le projet avance comme prévu ; *Bonnes pratiques :* Apposer leur logo ou la mention prévue par la convention ; envoyer un point d'étape à mi-parcours ; les inviter au temps fort ; respecter leur charte graphique

Partenaires — *Ce qu'il attend :* Que leur rôle soit reconnu ; *Bonnes pratiques :* Les citer sur les supports, valider avec eux les documents qui les concernent, leur transmettre les résultats agrégés

Élus — *Ce qu'il attend :* Des résultats concrets pour leur territoire ; *Bonnes pratiques :* Une note courte, deux ou trois chiffres, une photo du temps fort, une proposition pour la suite

Presse locale — *Ce qu'il attend :* Une histoire, des personnes, une date ; *Bonnes pratiques :* Un communiqué court, envoyé une semaine avant l'événement, avec un contact disponible

Définition – Communiqué de presse

Texte court (une page au plus) envoyé aux journalistes pour annoncer un événement ou un résultat. Il répond dès le premier paragraphe aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi ; il contient une citation d'un responsable, les informations pratiques et un contact. Le titre est informatif et concret.

Attention – Image des personnes et données

Une photo d'atelier publiée dans la presse ou sur un réseau social nécessite l'**accord écrit** des personnes reconnaissables (et des titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), pour un usage précis. On ne publie jamais une information qui permet d'identifier la situation de santé ou sociale d'une personne. On peut photographier les mains, les plats, ou le groupe de dos (chapitre 6).

Exemple – Un communiqué de presse (extrait, projet fictif)

« **Les habitants du quartier des Peupliers ouvrent leur cuisine le 18 juin.** Samedi 18 juin, de 11 h à 14 h, sur la place du marché, douze familles qui ont suivi les ateliers "Cuisine du monde, petit budget" proposent une dégustation gratuite de leurs recettes. Le projet, porté par le centre social avec l'épicerie sociale et la PMI, a été soutenu par la commune et la caisse d'allocations familiales. "Nous avons appris à cuisiner les lentilles, et maintenant nous apprenons aux autres", explique une participante. Contact : coordinatrice du projet, centre social, 06… »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.20

Un projet financé par l'ARS et la commune se termine par un repas partagé. Indiquez trois actions de communication à prévoir envers les financeurs, et une précaution à prendre si un journaliste vient photographier le repas.

Corrigé

Exemples : inviter les représentants de l'ARS et de la commune au repas, avec un carton d'invitation envoyé trois semaines avant ; faire figurer leurs logos ou la mention de soutien sur l'affiche et sur le livret de recettes, selon les conventions ; leur adresser une note de bilan avec les principaux chiffres dans le mois qui suit. Précaution : recueillir l'accord écrit des personnes avant toute photo où elles sont reconnaissables, prévoir un espace sans photo pour ceux qui refusent, et relire les légendes pour qu'aucune information personnelle n'apparaisse.

Planifier et évaluer les actions de communication

Le plan de communication a besoin d'un **calendrier** et d'un **suivi**, comme le reste du projet. On construit le calendrier à rebours à partir de la date de l'action (8.3.4), puis on mesure, pour chaque canal, combien de personnes il a permis de toucher ou d'inscrire.

Échéance · Action de communication · Responsable

J − 6 semaines — *Action de communication :* Rencontre des relais (centre social, PMI, association de quartier) ; remise du message clé ; *Responsable :* Chef de projet

J − 4 semaines — *Action de communication :* Article dans le bulletin municipal (délai de bouclage à vérifier) ; affiches dans les commerces ; *Responsable :* Commune, bénévoles

J − 3 semaines — *Action de communication :* Publication sur les réseaux de la structure ; ouverture des inscriptions ; *Responsable :* Chargée de communication

J − 1 semaine — *Action de communication :* Communiqué de presse ; point sur les inscriptions et relance si besoin ; *Responsable :* Chef de projet

J − 1 jour — *Action de communication :* Rappel individuel des inscrits (message ou appel) ; *Responsable :* Animatrice

J + 1 semaine — *Action de communication :* Remerciements aux partenaires ; photos (avec accord) et chiffres clés ; *Responsable :* Chef de projet

Exemple – Calcul détaillé : quel canal a le mieux fonctionné ? (données fictives)

À l'inscription, on a demandé à chaque participant comment il avait connu l'atelier. Résultats pour 27 inscrits :

Canal · Dépense · Inscrits · Part des inscrits · Coût par inscrit

Affiches — *Dépense :* 60 € ; *Inscrits :* 4 ; *Part des inscrits :* 14,8 % ; *Coût par inscrit :* 15,00 €

Bulletin municipal — *Dépense :* 0 € ; *Inscrits :* 6 ; *Part des inscrits :* 22,2 % ; *Coût par inscrit :* 0 €

Relais formés (2 séances × 2 h × 45 €) — *Dépense :* 180 € ; *Inscrits :* 14 ; *Part des inscrits :* 51,9 % ; *Coût par inscrit :* 12,86 €

Réseau social (publication sponsorisée) — *Dépense :* 40 € ; *Inscrits :* 3 ; *Part des inscrits :* 11,1 % ; *Coût par inscrit :* 13,33 €

Total — *Dépense :* 280 € ; *Inscrits :* 27 ; *Part des inscrits :* 100 % ; *Coût par inscrit :* 10,37 €

- Parts : 4 / 27 = 14,8 % ; 6 / 27 = 22,2 % ; 14 / 27 = 51,9 % ; 3 / 27 = 11,1 %.
- Coûts par inscrit : 60 / 4 = **15,00 €** ; 180 / 14 = **12,86 €** ; 40 / 3 = **13,33 €** ; coût moyen 280 / 27 = **10,37 €**.

Interprétation : les relais apportent plus de la moitié des inscrits, pour un coût par inscrit inférieur à celui des affiches. Le bulletin municipal ne coûte rien et apporte 6 inscrits : on le garde. Pour le cycle suivant, on peut réduire les affiches et renforcer les relais. Attention : la formation des relais a aussi un effet durable (ils pourront relayer d'autres actions), que ce calcul ne mesure pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.21

Pour un second cycle, la structure dispose de 200 € pour la communication. Elle envisage de supprimer les affiches et la publication sponsorisée, et de consacrer tout le budget aux relais. Calculez le nombre d'inscrits attendu si le coût par inscrit des relais reste de 12,86 €, ajoutez les inscrits du bulletin municipal (6), puis discutez la limite de ce raisonnement.

Corrigé

Inscrits attendus par les relais : 200 / 12,86 = 15,55, soit environ 15 inscrits (on arrondit à l'entier inférieur pour rester prudent). Avec le bulletin municipal : 15 + 6 = 21 inscrits environ. Limite : le coût par inscrit n'est pas forcément constant ; les relais ont peut-être déjà mobilisé les personnes les plus faciles à toucher, et le nombre de relais disponibles est limité. Supprimer les affiches et les réseaux sociaux prive aussi le projet de publics que les relais ne connaissent pas. Il vaut mieux garder un petit budget pour un canal de diffusion large et suivre de nouveau l'origine des inscriptions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.7 – Le plan de communication

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six éléments d'un plan de communication.
2. Pourquoi un objectif de communication est-il différent d'un objectif de santé ? Donnez un exemple.
3. Reformulez sans stigmatiser : « Atelier pour les personnes en surpoids ».
4. Quel canal est souvent le plus efficace auprès des publics éloignés des institutions ?
5. Que doit contenir le premier paragraphe d'un communiqué de presse ?
6. Que faut-il obtenir avant de publier la photo d'un participant ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.7

1. Objectifs de communication, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation.
2. L'objectif de communication porte sur la connaissance du projet ou la mobilisation (par exemple « remplir les 12 places en trois semaines ») ; l'objectif de santé porte sur un changement chez le public (par exemple « augmenter la consommation de légumes »).
3. Par exemple : « Bouger et cuisiner léger : un atelier convivial le jeudi soir ».
4. Les relais humains : pairs, relais formés, professionnels de confiance, bouche-à-oreille.
5. Qui, quoi, où, quand, pourquoi.
6. L'accord écrit de la personne (et des titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), pour un usage précis.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.8.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le tableau des messages à éviter.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.7 et je refais les exercices d'application.

8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques

Module · Référentiel et guide : voir 8.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le plan d'action précise **comment** les objectifs éducatifs seront atteints. Le choix de la méthode dépend du **type d'objectif** (savoir, savoir-faire, savoir-être), du **public** et des **moyens**.

Méthode · Principe · Usage en nutrition

Expositive (transmissive) — *Principe :* L'intervenant présente, explique ; *Usage en nutrition :* Courte présentation des repères ; efficace pour des connaissances simples, insuffisante seule

Interrogative — *Principe :* L'intervenant fait découvrir par des questions ; *Usage en nutrition :* Quiz, « selon vous, pourquoi… ? » ; fait émerger les représentations

Démonstrative — *Principe :* L'intervenant montre, l'apprenant reproduit ; *Usage en nutrition :* Technique culinaire (cuisson des légumes secs), lecture d'étiquette

Active, expérientielle — *Principe :* L'apprenant agit, expérimente, puis analyse ; *Usage en nutrition :* Atelier culinaire, dégustation, jeu de rôle, défi, enquête de terrain

Coopérative — *Principe :* Travail en petits groupes, entraide ; *Usage en nutrition :* Cuisine en équipes, création collective d'un livret

Attention – Le mythe de la « pyramide de l'apprentissage »

On lit souvent que l'on retiendrait « 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on entend… 90 % de ce qu'on fait ». Ces pourcentages, attribués à tort à Edgar Dale, ne reposent sur aucune étude. Il est en revanche bien établi que l'**engagement actif**, la **pratique répétée** et le **retour d'information** favorisent l'apprentissage : c'est ce qui justifie les ateliers pratiques.

Type d'objectif · Méthodes et outils adaptés

Connaissances (citer les repères) — *Méthodes et outils adaptés :* Exposé court illustré, quiz, jeux de cartes, photolangage

Savoir-faire (cuisiner, lire une étiquette) — *Méthodes et outils adaptés :* Démonstration puis pratique, atelier culinaire, mise en situation en magasin

Attitudes (oser goûter, critiquer une publicité) — *Méthodes et outils adaptés :* Dégustation sans pression, débat, analyse de publicités, témoignages de pairs

Comportements (consommer des légumes secs 2 fois par semaine) — *Méthodes et outils adaptés :* Combinaison : pratique, défis à la maison, rappel, soutien du groupe, accès aux produits (environnement)

Formuler des objectifs pédagogiques

Une séance éducative se prépare à partir d'**objectifs pédagogiques**. Ils sont plus précis que les objectifs opérationnels du projet : ils décrivent ce que le participant saura **faire** à la fin de la séance. Un objectif pédagogique commence par un **verbe d'action observable** (citer, choisir, préparer, comparer), et non par un verbe vague (connaître, comprendre, prendre conscience).

Définition – Objectif pédagogique

Énoncé de ce que l'apprenant sera capable de faire à l'issue d'une séquence, formulé avec un verbe d'action observable, dans des conditions précisées, avec un critère de réussite. Exemple : « À la fin de l'atelier, chaque participant choisit, parmi cinq céréales du petit-déjeuner, celle qui contient le moins de sucres, en lisant le tableau nutritionnel pour 100 g. »

La **taxonomie de Bloom** (Bloom, 1956), révisée par Anderson et Krathwohl (2001), classe les objectifs cognitifs du plus simple au plus complexe. Elle aide à choisir le bon verbe et à vérifier que la séance ne se limite pas à la mémorisation.

Niveau (version révisée, 2001) · Ce que fait le participant · Verbes utiles · Exemple en nutrition

Se souvenir — *Ce que fait le participant :* Il retrouve une information ; *Verbes utiles :* Citer, nommer, lister ; *Exemple en nutrition :* Citer trois légumes secs

Comprendre — *Ce que fait le participant :* Il explique avec ses mots ; *Verbes utiles :* Expliquer, reformuler, classer ; *Exemple en nutrition :* Expliquer pourquoi les légumes secs rassasient

Appliquer — *Ce que fait le participant :* Il utilise une règle dans une situation ; *Verbes utiles :* Calculer, préparer, utiliser ; *Exemple en nutrition :* Préparer une portion de lentilles pour un adulte

Analyser — *Ce que fait le participant :* Il décompose, compare ; *Verbes utiles :* Comparer, distinguer, repérer ; *Exemple en nutrition :* Comparer deux étiquettes de plats préparés

Évaluer — *Ce que fait le participant :* Il juge selon des critères ; *Verbes utiles :* Justifier, choisir, critiquer ; *Exemple en nutrition :* Choisir le menu le plus équilibré et justifier son choix

Créer — *Ce que fait le participant :* Il produit quelque chose de nouveau ; *Verbes utiles :* Concevoir, composer, inventer ; *Exemple en nutrition :* Composer les menus d'une semaine avec un budget donné

Méthode – Rédiger un objectif pédagogique en quatre éléments

1. **Qui ?** Le participant (et non l'animateur : « présenter les repères » est une activité de l'animateur, pas un objectif).
2. **Quoi ?** Un verbe d'action observable et son complément.
3. **Dans quelles conditions ?** Avec quel support, quel matériel, quelle aide.
4. **Avec quel critère de réussite ?** Un seuil vérifiable (« sans erreur », « au moins trois sur cinq », « en moins de 10 minutes »).

Formulation à éviter · Pourquoi · Formulation correcte

« Sensibiliser les parents au sucre » — *Pourquoi :* Verbe vague, centré sur l'animateur ; *Formulation correcte :* « Chaque parent estime, avec des morceaux de sucre, la quantité de sucres contenue dans trois boissons courantes, avec au plus une erreur »

« Que les jeunes comprennent l'équilibre alimentaire » — *Pourquoi :* Non observable ; *Formulation correcte :* « Chaque jeune compose un plateau repas comportant les composantes du repère, à partir d'un choix d'images »

« Faire un atelier cuisine » — *Pourquoi :* C'est une activité, pas un objectif ; *Formulation correcte :* « Les participants préparent en binôme une soupe de légumes de saison en suivant une fiche recette illustrée »

Construire le conducteur de séance

Le **conducteur** (ou déroulé) est le document qui organise la séance minute par minute. Il permet à un autre animateur de reprendre la séance, il sert de support au bilan et il est souvent demandé dans un dossier de financement.

Exemple – Conducteur d'un atelier de 90 minutes « Goûters malins » (public : parents d'enfants de 6 à 10 ans, projet fictif)

Objectif pédagogique principal : « À la fin de l'atelier, chaque parent compose trois goûters associant un produit céréalier, un fruit et un produit laitier ou une boisson

sans sucre ajouté, pour un coût inférieur à 0,80 € par enfant. »

Temps · Durée · Activité · Méthode · Matériel · Rôle de l'animateur

0 – 10 min — *Durée :* 10 ; *Activité :* Accueil, présentation, règles du groupe ; *Méthode :* Tour de table ; *Matériel :* Badges, feuille d'émargement ; *Rôle de l'animateur :* Accueillir, rappeler la confidentialité

10 – 25 min — *Durée :* 15 ; *Activité :* « Le goûter de mon enfant » : chacun décrit un goûter habituel ; *Méthode :* Photolangage ; *Matériel :* Photos de goûters ; *Rôle de l'animateur :* Faire émerger les représentations, ne pas juger

25 – 40 min — *Durée :* 15 ; *Activité :* Repères : rôle du goûter, composition, sucres cachés ; *Méthode :* Exposé court interactif ; *Matériel :* Affiche, emballages vides ; *Rôle de l'animateur :* Reformuler les apports du groupe

40 – 70 min — *Durée :* 30 ; *Activité :* Préparation de trois goûters en équipes ; *Méthode :* Atelier pratique coopératif ; *Matériel :* Denrées, ustensiles, fiches recettes ; *Rôle de l'animateur :* Circuler, aider, vérifier l'hygiène

70 – 80 min — *Durée :* 10 ; *Activité :* Dégustation et calcul du coût par enfant ; *Méthode :* Calcul guidé ; *Matériel :* Tickets de caisse, calculatrice ; *Rôle de l'animateur :* Valoriser chaque équipe

80 – 90 min — *Durée :* 10 ; *Activité :* Bilan : « ce que je vais essayer cette semaine », questionnaire ; *Méthode :* Écrit court et oral ; *Matériel :* Questionnaire, livret ; *Rôle de l'animateur :* Recueillir les données d'évaluation

Astuce – Équilibrer la séance

Une règle pratique consiste à limiter l'exposé à **15 minutes d'affilée** et à alterner les temps où l'animateur parle et ceux où les participants agissent. Le temps de bilan final n'est jamais supprimé : c'est lui qui fournit les données de l'évaluation de processus et de résultats (chapitre 9).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.22

Réécrivez ces trois énoncés sous la forme d'objectifs pédagogiques, puis indiquez le niveau de la taxonomie révisée de Bloom correspondant.

a) « Informer les seniors sur les protéines. »

b) « Apprendre aux étudiants à faire leurs courses. »

c) « Que les participants connaissent les féculents. »

Corrigé

a) « À la fin de la séance, chaque participant cite au moins trois aliments sources de protéines qu'il peut consommer au dîner, dont un d'origine végétale. » (Se souvenir.) On peut viser plus haut : « … compose un dîner apportant une source de protéines à partir d'une liste d'aliments » (Créer ou Appliquer).

b) « À partir d'un budget de 25 € et d'une liste de prix, chaque étudiant établit une liste de courses pour quatre repas, comprenant des légumes et un féculent à chaque repas. » (Créer.)

c) « Chaque participant classe dix aliments en "féculents" et "autres", avec au plus une erreur. » (Comprendre.)

Dans les trois cas, le verbe vague (informer, apprendre, connaître) est remplacé par une action observable, et un critère de réussite est ajouté.

Choisir et analyser un outil pédagogique

Un **outil pédagogique** (jeu, exposition, mallette, vidéo, photolangage, application) est un support qui aide l'animateur à atteindre un objectif. Avant de l'utiliser, on vérifie qu'il est **fiable**, **adapté au public** et **cohérent avec l'objectif**. Un outil séduisant mais dépassé ou culpabilisant peut produire l'effet inverse de celui recherché.

En France, l'INPES a publié en 2005 un référentiel de critères de qualité des outils d'intervention en éducation pour la santé (Lemonnier et al., *Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité*, INPES, 2005). Il organise l'analyse autour de quatre axes : le **contenu**, la **pédagogie**, le **support** et la **conception** de l'outil. Les centres de ressources documentaires du réseau Promotion Santé (anciennes Ireps) prêtent des outils et accompagnent leur choix.

Axe · Questions à se poser · Exemple de point faible

Contenu — *Questions à se poser :* Les informations sont-elles exactes, à jour, sourcées ? Sont-elles cohérentes avec les recommandations actuelles (PNNS, Santé publique France) ? ; *Exemple de point faible :* Un jeu qui présente encore la « pyramide alimentaire » des années 1990

Pédagogie — *Questions à se poser :* L'outil fait-il participer ? Laisse-t-il de la place aux représentations ? Évite-t-il la culpabilisation et la peur ? ; *Exemple de point faible :* Des cartes « bons » et « mauvais » aliments, qui moralisent

Support — *Questions à se poser :* Est-il lisible, solide, transportable, accessible (langue, illustrations, handicap) ? ; *Exemple de point faible :* Des textes longs pour un public peu lecteur

Conception — *Questions à se poser :* Qui l'a conçu, avec quel financement, a-t-il été testé auprès du public ? Y a-t-il un intérêt commercial ? ; *Exemple de point faible :* Un outil fourni gratuitement par une marque qui met ses produits en avant

Attention – Les outils offerts par l'industrie

Un outil financé par une entreprise agroalimentaire n'est pas forcément faux, mais il présente un **risque de conflit d'intérêts** : messages orientés, logos, produits mis en scène. En éducation pour la santé, on privilégie les outils d'organismes publics ou associatifs indépendants et on vérifie systématiquement la présence de marques. Ce point est attendu à l'épreuve E5.

Méthode – Analyser un outil en six questions

1. Quel est l'**objectif** de l'outil, et correspond-il à mon objectif pédagogique ?
2. À quel **public** est-il destiné (âge, niveau de lecture, culture) ?
3. Le **contenu** est-il exact et daté ? Qui l'a conçu, et y a-t-il un intérêt commercial ?
4. Quelle **démarche** propose-t-il : transmettre, faire

découvrir, faire débattre, faire pratiquer ?

5. Quelles **conditions** d'utilisation : durée, nombre de participants, matériel, formation de l'animateur ?
6. Quelles **adaptations** sont nécessaires, et comment évaluer son effet ?

Exemple – Analyse d'un outil fictif : le jeu « Le marché de Léo »

Jeu de plateau pour enfants de 8 à 11 ans : chaque équipe dispose d'un budget fictif et doit « acheter » un repas équilibré. Conçu en 2019 par une association de consommateurs, testé dans quatre écoles. Contenu : repères alimentaires de Santé publique France publiés en 2019, sans marques. Points forts : démarche active, travail en équipe, lien avec le budget. Points faibles : prix des cartes datés de 2019, à actualiser ; une carte présente les jus de fruits comme pouvant remplacer tous les fruits de la journée, alors que les repères actuels demandent de limiter les jus de fruits à un petit verre par jour au plus. Conclusion : outil retenu, après correction des prix et retrait de la carte sur les jus.

Contexte · Outil souvent adapté · Précaution

Public peu lecteur ou allophone — *Outil souvent adapté :* Photolangage, aliments réels, pictogrammes ; *Précaution :* Vérifier que les images correspondent aux habitudes culturelles du groupe

Adolescents — *Outil souvent adapté :* Défi, quiz sur smartphone, analyse de publicités, jeu de rôle ; *Précaution :* Éviter le ton moralisateur, laisser débattre

Personnes âgées — *Outil souvent adapté :* Atelier cuisine, dégustation, souvenirs alimentaires ; *Précaution :* Adapter les gestes (préhension), la lisibilité et la durée

Groupe nombreux en événement — *Outil souvent adapté :* Stand interactif, roue des questions, exposition ; *Précaution :* Prévoir un relais humain pour répondre aux questions

À vous de jouer – Exercice d'application 8.23

Une enseigne de boissons propose gratuitement à un collège un kit pédagogique intitulé « Bien s'hydrater », avec affiches et quiz. Les affiches portent le logo de la marque, et le quiz présente une boisson aromatisée de la marque comme « idéale pour le sport ». Analysez ce kit selon les quatre axes du référentiel de 2005, puis donnez votre décision argumentée.

Corrigé

Contenu : le message « boisson aromatisée idéale pour le sport » est contraire au repère (l'eau est la seule boisson indispensable ; les boissons sucrées sont à limiter). Pédagogie : le quiz peut être participatif, mais il oriente les réponses vers un produit. Support : probablement attractif. Conception : outil conçu par une entreprise, avec un intérêt commercial évident (logo, produit cité). Décision : on refuse le kit ; on le remplace par un outil indépendant (centre de ressources du réseau Promotion Santé, Santé publique France) ou on construit un quiz sur l'eau et les boissons sucrées avec les élèves. On informe la direction de la raison du refus.

Animer un groupe : posture et situations délicates

La meilleure séance sur le papier peut échouer si l'animation ne permet pas à chacun de participer. En éducation pour la santé, l'animateur n'est pas un « expert qui sait » face à des participants « qui ne savent pas » : il **facilite** les échanges, part de ce que vivent les participants et les aide à trouver leurs propres solutions.

Technique d'animation · Comment faire · Effet recherché

Questions ouvertes — *Comment faire :* « Comment faites-vous pour… ? », « Qu'est-ce qui vous aide ? » plutôt que « Est-ce que vous mangez des légumes ? » ; *Effet recherché :* Faire parler, recueillir des expériences

Reformulation — *Comment faire :* « Si je comprends bien, le soir, vous manquez de temps pour cuisiner » ; *Effet recherché :* Montrer que l'on a écouté, vérifier sa compréhension

Valorisation — *Comment faire :* Souligner une idée, un effort, une réussite ; *Effet recherché :* Renforcer la confiance en soi et l'envie de continuer

Faire circuler la parole — *Comment faire :* Tour de table, travail en binôme, « qui n'a pas encore donné son avis ? » ; *Effet recherché :* Éviter que quelques personnes monopolisent l'échange

Synthèse — *Comment faire :* Résumer les idées du groupe à la fin de chaque temps ; *Effet recherché :* Fixer les acquis, faire le lien avec la suite

Définition – Écoute active

Attitude qui consiste à écouter sans interrompre ni juger, à montrer son attention (regard, hochements de tête), à reformuler et à poser des questions ouvertes pour aider la personne à préciser sa pensée. Elle est issue des travaux de Carl Rogers sur l'approche centrée sur la personne et elle est à la base de l'entretien motivationnel.

Situation délicate · Réponse possible de l'animateur

Un participant monopolise la parole — *Réponse possible de l'animateur :* Le remercier, résumer son idée, puis s'adresser aux autres : « Merci, c'est une piste. Qu'en pensent les autres ? » ; si besoin, proposer un tour de parole

Un participant conteste les repères (« les nutritionnistes changent d'avis tout le temps ») — *Réponse possible de l'animateur :* Accueillir l'objection sans se braquer, expliquer simplement d'où viennent les repères et pourquoi ils évoluent, revenir à l'expérience concrète du groupe

Une personne raconte une situation personnelle difficile — *Réponse possible de l'animateur :* L'écouter brièvement, la remercier de sa confiance, proposer d'en parler après la séance, l'orienter si besoin vers un professionnel adapté

Un participant se moque d'un autre (poids, habitudes) — *Réponse possible de l'animateur :* Rappeler calmement les règles du groupe fixées au début (respect, non-jugement, confidentialité)

Le groupe ne participe pas — *Réponse possible de l'animateur :* Changer de méthode : travail en binôme, activité pratique, question plus concrète, photolangage

Attention – Rester dans son rôle

Dans un atelier collectif, on ne donne pas de conseil diététique individuel sur une pathologie : on oriente vers une consultation. On évite aussi de juger les aliments (« bons » ou « mauvais ») et les personnes. Une remarque culpabilisante peut suffire à faire partir un participant, souvent celui qui avait le plus besoin de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.24

Pendant un atelier pour des parents, une mère déclare : « De toute façon, mes enfants ne mangent que des pâtes, j'ai tout essayé. » Proposez une réponse de l'animateur qui utilise l'écoute active, puis une façon d'impliquer le groupe.

Corrigé

Réponse : « Vous avez déjà beaucoup essayé, et c'est décourageant quand les enfants refusent. Qu'est-ce que vous avez tenté jusqu'ici ? » La reformulation montre que l'on a compris la difficulté, sans juger, et la question ouverte invite à préciser. Implication du groupe : « Est-ce que d'autres parents ont vécu la même chose ? Qu'est-ce qui a marché chez vous ? » Le groupe partage ses astuces (ajouter des légumes dans la sauce des pâtes, faire participer les enfants à la cuisine, proposer plusieurs fois sans forcer). L'animateur complète en rappelant que l'acceptation d'un aliment nouveau demande souvent plusieurs présentations.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.8 – Les méthodes et les outils pédagogiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi « sensibiliser les participants » n'est-il pas un objectif pédagogique ?
2. Citez les quatre éléments d'un objectif pédagogique bien rédigé.
3. Classez du plus simple au plus complexe : évaluer, se souvenir, appliquer.
4. Quelle méthode convient le mieux pour apprendre à cuisiner des légumes secs ?
5. Citez les quatre axes d'analyse d'un outil pédagogique.
6. Quel risque présente un outil offert par une entreprise agroalimentaire ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.8

1. Le verbe est vague et non observable, et il décrit l'action de l'animateur, pas ce que le participant saura faire.
2. Qui (le participant), quoi (un verbe d'action observable), dans quelles conditions, avec quel critère de réussite.
3. Se souvenir, appliquer, évaluer.
4. Une méthode démonstrative suivie d'une pratique (atelier culinaire, méthode active).
5. Le contenu, la pédagogie, le support et la conception.
6. Un conflit d'intérêts : messages orientés vers ses produits, présence de marques.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.9.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la méthode de rédaction d'un objectif et le tableau des axes.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.8 et je refais les exercices d'application.

8.3.9 Organiser la logistique des ateliers

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Prévoir les quantités : mise à l'échelle et rendement

Pour un atelier culinaire, on calcule les quantités à acheter à partir des recettes de base (fiche F8) en tenant compte du **nombre de portions** et du **rendement** des produits (part comestible après épluchage, parage, cuisson).

Exemple – Calcul détaillé : liste de courses pour un cycle de 3 ateliers

Recette de base pour 4 personnes ; chaque atelier sert **12 portions** (coefficient 12 / 4 = **3**) ; rendements usuels (ordres de grandeur) : carottes 85 % de partie comestible après épluchage ; pommes de terre 80 % ; oignons 90 % ; pommes 85 %.

- **Carottes** (300 g épluchés pour 4 personnes dans la recette) : 300 × 3 = 900 g épluchés par atelier ; poids brut = 900 / 0,85 = **1 059 g**, soit environ **1,1 kg** ; pour 3 ateliers utilisant la recette : 1,059 × 3 = **3,18 kg**, arrondis à **3,2 kg**.
- **Pommes de terre** (600 g épluchés) : 600 × 3 / 0,80 = 1 800 / 0,80 = **2 250 g** brut par atelier.
- **Lentilles corail** (160 g secs) : 160 × 3 = **480 g** (pas de perte).
- **Coût** des carottes : 3,2 kg × 1,40 €/kg = **4,48 €**.

Pourquoi c'est important : oublier le rendement conduit à manquer d'ingrédients (900 g achetés ne donnent que 765 g épluchés : 900 × 0,85) ; surestimer conduit au gaspillage.

La check-list logistique

Avant l'atelier (J − 7 à J − 1) · Commandes et courses (liste chiffrée), vérification du matériel (balance, ustensiles, four), réservation de la salle, confirmation des inscriptions (rappel la veille), impression des fiches, fiche d'allergies, trousse de secours

Jour J — *Commandes et courses (liste chiffrée), vérification du matériel (balance, ustensiles, four), réservation de la salle, confirmation des inscriptions (rappel la veille), impression des fiches, fiche d'allergies, trousse de secours :* Installation 30 minutes avant, mise en place par poste, affichage des recettes et des allergènes, émargement

Après — *Commandes et courses (liste chiffrée), vérification du matériel (balance, ustensiles, four), réservation de la salle, confirmation des inscriptions (rappel la veille), impression des fiches, fiche d'allergies, trousse de secours :* Rangement, nettoyage, inventaire du matériel et des restes de denrées, bilan à chaud, saisie des données d'évaluation, compte rendu

Maîtriser l'hygiène pendant un atelier culinaire

Un atelier culinaire manipule des denrées périssables, souvent dans une salle qui n'est pas une cuisine professionnelle. Le diététicien est responsable de la **sécurité sanitaire** de ce qu'il fait préparer et goûter. Les règles générales d'hygiène des denrées sont fixées par le **règlement (CE) n° 852/2004** du 29 avril 2004 ; les températures et les règles de la remise directe au consommateur sont précisées en France par l'**arrêté du 21 décembre 2009** relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail.

Un atelier où les participants préparent et consomment ensemble leur propre repas n'a pas toujours le même statut qu'un restaurant. Les bonnes pratiques d'hygiène s'appliquent néanmoins dans tous les cas, et elles deviennent indispensables dès que des denrées sont servies à un public extérieur (dégustation lors d'un forum, buffet de fin de projet). En cas de doute, on se renseigne auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations (DDPP ou DDETSPP).

Point de maîtrise · Règle à appliquer · Pourquoi

Lavage des mains — *Règle à appliquer :* À l'arrivée, après être allé aux toilettes, après avoir touché des œufs crus, de la viande ou des déchets ; savon, essuie-mains à usage unique ; *Pourquoi :* Les mains sont le premier vecteur de contamination

Tenue — *Règle à appliquer :* Cheveux attachés ou charlotte, tablier propre, bijoux retirés, plaie protégée par un pansement et un gant ; *Pourquoi :* Éviter les contaminations physiques et microbiennes

Chaîne du froid — *Règle à appliquer :* Transport en sac isotherme ; denrées très périssables stockées entre 0 et + 4 °C ; temps hors du froid le plus court possible ; *Pourquoi :* Limiter la multiplication des bactéries

Marche en avant — *Règle à appliquer :* Séparer les zones et les ustensiles « sale » (épluchage, viande crue) et « propre » (produits prêts à consommer) ; *Pourquoi :* Éviter les contaminations croisées

Cuisson — *Règle à appliquer :* Cuire à cœur les viandes hachées et les volailles ; ne pas servir d'œufs crus ou peu cuits aux publics fragiles ; *Pourquoi :* Détruire les bactéries pathogènes

Maintien au chaud — *Règle à appliquer :* Au moins + 63 °C jusqu'au service ; *Pourquoi :* Empêcher la multiplication bactérienne

Refroidissement — *Règle à appliquer :* Passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures, puis stocker entre 0 et + 3 °C (arrêté du 21 décembre 2009) ; *Pourquoi :* Traverser vite la zone de températures dangereuse

Restes — *Règle à appliquer :* Ne pas redonner les restes servis ; jeter ce qui est resté à température ambiante ; *Pourquoi :* Éviter les toxi-infections

Définition – Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Apparition d'au moins deux cas groupés de symptômes similaires, en général digestifs, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. La TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** auprès de l'agence régionale de santé (ARS). Le registre des risques du projet (8.3.6) prévoit la conduite à tenir.

Attention – Les publics fragiles

Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont plus vulnérables à certaines bactéries (*Listeria*, salmonelles). Pour ces publics, on évite dans les ateliers les produits à risque : œufs crus (mousse au chocolat, mayonnaise maison), lait cru, fromages au lait cru pour les femmes enceintes, poissons crus, graines germées crues.

Informer sur les allergènes

Le **règlement (UE) n° 1169/2011** (règlement INCO) liste en annexe II **14 substances ou produits** provoquant des allergies ou des intolérances, qui doivent être signalés au consommateur. Pour les denrées non préemballées, comme un buffet ou une dégustation, le **décret n° 2015-447 du 17 avril 2015** impose que l'information soit donnée **par écrit** ou rendue accessible au consommateur.

Les 14 allergènes à déclarer (annexe II du règlement 1169/2011)	
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut)	Crustacés
Œufs	Poissons
Arachides	Soja
Lait (y compris le lactose)	Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, de pécan, du Brésil, pistaches, noix de Macadamia)
Céleri	Moutarde
Graines de sésame	Anhydride sulfureux et sulfites (au-delà de 10 mg par kg ou par litre)
Lupin	Mollusques

Méthode – Gérer les allergies dans un atelier

1. Demander les allergies et les régimes particuliers **à l'inscription**, par écrit, et les reporter sur une fiche confidentielle.
2. Choisir des recettes compatibles avec le groupe, ou prévoir une variante préparée à part, avec des ustensiles propres.
3. Lire **toutes** les étiquettes des produits achetés : les allergènes sont mis en évidence dans la liste des ingrédients.
4. Afficher le jour même, pour chaque recette, la liste des allergènes présents.
5. Connaître la conduite à tenir en cas de réaction (appel du 15 ou du 112) et savoir si la personne dispose d'un stylo d'adrénaline.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.25

Pour un buffet de fin de projet ouvert aux familles, vous prévoyez : un houmous (pois chiches, crème de sésame, citron, huile d'olive), des bâtonnets de carottes, un pain aux noix et un taboulé (semoule de blé, persil, tomates). Établissez l'affichage des allergènes, puis indiquez deux précautions d'hygiène pour le service.

Corrigé

Houmous : sésame (crème de sésame). Bâtonnets de carottes : aucun des 14 allergènes. Pain aux noix : gluten (blé) et fruits à coque (noix) ; vérifier l'étiquette du pain pour d'éventuels œufs, lait ou sésame. Taboulé : gluten (semoule de blé). L'affichage est écrit, placé à côté de chaque plat. Précautions : garder le houmous et le taboulé au froid jusqu'au service et ne pas les laisser plus de deux heures à température ambiante ; prévoir une cuillère par plat pour éviter qu'un allergène passe d'un plat à l'autre ; jeter les restes du buffet.

Commander, réceptionner et stocker les denrées

La logistique d'un atelier repose sur trois documents simples : le **bon de commande** (ou la liste de courses chiffrée), la **fiche de réception** et la **fiche de stock**. Ils évitent les oublis et le gaspillage, et ils servent de justificatifs pour le budget réalisé (8.3.5).

Exemple – Calcul détaillé : bon de commande d'un velouté pour 30 portions (prix fictifs)

Recette de base pour 10 portions : 1,2 kg de potimarron épépiné, 150 g d'oignons épluchés, 0,5 L de lait demi-écrémé, épices et bouillon. Coefficient : 30 / 10 = **3**. Rendements retenus (ordres de grandeur) : potimarron 75 % après épépinage, oignons 90 %.

- **Potimarron** : 1,2 × 3 = 3,6 kg épépiné ; poids brut = 3,6 / 0,75 = **4,8 kg** ; coût 4,8 × 2,20 = **10,56 €**.
- **Oignons** : 0,150 × 3 = 0,450 kg épluché ; poids brut = 0,450 / 0,90 = **0,5 kg** ; coût 0,5 × 1,80 = **0,90 €**.
- **Lait** : 0,5 × 3 = 1,5 L, mais il est vendu en bouteilles de 1 L : on achète **2 L**, soit 2 × 1,05 = **2,10 €**.
- **Épices et bouillon** (forfait) : **0,60 €**.
- **Total** : 10,56 + 0,90 + 2,10 + 0,60 = **14,16 €**, soit 14,16 / 30 = **0,47 €** par portion (0,472 arrondi).

Ce qu'il faut retenir : le conditionnement de vente oblige parfois à acheter plus que le besoin ; le demi-litre de lait restant est prévu pour une autre recette ou rendu à la structure.

Étape · Ce que l'on vérifie · Document

Commande — *Ce que l'on vérifie :* Quantités calculées avec le coefficient et le rendement ; budget disponible ; délai de livraison ; *Document :* Bon de commande, devis

Réception — *Ce que l'on vérifie :* Température des produits frais (au toucher ou avec un thermomètre), état des emballages, dates, conformité à la commande ; *Document :* Fiche de réception, bon de livraison

Stockage — *Ce que l'on vérifie :* Froid entre 0 et + 4 °C pour les produits frais ; produits secs à l'abri de l'humidité, au-dessus du sol ; produits d'entretien séparés des aliments ; *Document :* Fiche de stock, relevé de température du réfrigérateur

Utilisation — *Ce que l'on vérifie :* Rotation des stocks : premier entré, premier sorti ; contrôle des dates avant usage ; *Document :* Fiche de stock mise à jour

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (DLC), mentionnée « à consommer jusqu'au », concerne les denrées très périssables : au-delà, le produit peut présenter un danger et ne doit pas être utilisé. La **date de durabilité minimale** (DDM), mentionnée « à consommer de préférence avant », concerne les produits stables (pâtes, conserves, biscuits) : au-delà, le produit peut perdre en qualité, mais il ne présente pas de danger s'il a été bien conservé et si l'emballage est intact.

Astuce – Réduire le gaspillage dans un projet

Les produits secs à DDM dépassée de peu, donnés par une épicerie solidaire, peuvent être utilisés en atelier s'ils sont en bon état. Les restes de légumes crus peuvent servir à un bouillon préparé le jour même. Les quantités réellement consommées sont notées à chaque atelier : elles servent à ajuster les commandes suivantes et constituent un indicateur du projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.26

Une recette de salade de lentilles pour 6 personnes demande 240 g de lentilles vertes sèches, 300 g de carottes épluchées (rendement 85 %) et 90 g d'oignons rouges épluchés (rendement 90 %). Calculez les quantités à acheter pour un atelier de 18 personnes, sachant que les lentilles sont vendues en sachets de 500 g. Indiquez ensuite où et comment stocker chaque produit avant l'atelier.

Corrigé

Coefficient : 18 / 6 = 3. Lentilles : 240 × 3 = 720 g, soit 2 sachets de 500 g (1 000 g achetés, 280 g de reste à stocker). Carottes : 300 × 3 = 900 g épluchées, soit 900 / 0,85 = 1 058,8 g, environ 1,06 kg brut. Oignons rouges : 90 × 3 = 270 g épluchés, soit 270 / 0,90 = 300 g brut. Stockage : les lentilles dans un placard sec, au-dessus du sol, sachet refermé ; les carottes au réfrigérateur ou dans un local frais ; les oignons dans un endroit sec, frais et aéré, à l'abri de la lumière.

Rendre les ateliers accessibles à tous

Un atelier conçu pour « tout le monde » peut exclure sans le vouloir : salle à l'étage sans ascenseur, fiches recettes écrites en petits caractères, recette incompatible avec les habitudes alimentaires d'une partie du groupe, horaire incompatible

avec le travail. La logistique fait partie de la lutte contre les inégalités sociales de santé (chapitre 7).

Obstacle · Adaptation possible

Mobilité réduite — *Adaptation possible :* Salle de plain-pied ou accessible par ascenseur, plan de travail à hauteur adaptée, transport solidaire, chaises pendant les temps longs

Troubles de la vue — *Adaptation possible :* Fiches en gros caractères, contrastes forts, description orale des gestes, ustensiles faciles à repérer

Difficultés de lecture ou de compréhension — *Adaptation possible :* Recettes illustrées étape par étape, pictogrammes, documents en « facile à lire et à comprendre » (FALC)

Langue — *Adaptation possible :* Interprète ou participant relais, supports visuels, aliments réels plutôt que des mots

Habitudes alimentaires culturelles ou religieuses — *Adaptation possible :* Recettes sans porc ou sans alcool, version végétarienne, recettes proposées par les participants

Contraintes horaires — *Adaptation possible :* Créneaux variés (soir, samedi), garde d'enfants pendant l'atelier

Coût — *Adaptation possible :* Gratuité ou participation symbolique, produits accessibles dans les commerces proches

Définition – Facile à lire et à comprendre (FALC)

Méthode de rédaction qui rend l'information accessible aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et utile aussi aux personnes qui lisent difficilement : phrases courtes, un message par phrase, mots simples, illustrations, mise en page aérée. Les règles européennes du FALC ont été établies par l'association Inclusion Europe ; un document FALC est relu par des personnes concernées.

Exemple – Une recette réécrite pour être accessible

Version initiale : « Faire revenir l'oignon émincé dans l'huile, ajouter les lentilles préalablement rincées et mouiller à hauteur. » Version accessible, avec une photo par étape : « 1. Coupez l'oignon en petits morceaux. 2. Mettez 1 cuillère d'huile dans la casserole. 3. Faites cuire l'oignon 5 minutes. 4. Lavez les lentilles dans une passoire. 5. Mettez les lentilles dans la casserole. 6. Ajoutez de l'eau : l'eau doit couvrir les lentilles. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.27

Un atelier est prévu dans la salle du premier étage d'une mairie (sans ascenseur), le mardi à 14 h, avec une recette de rôti de porc au cidre et des fiches recettes en texte continu. Le public : des familles d'un quartier où vivent beaucoup de personnes qui travaillent en horaires décalés, dont certaines sont arrivées récemment en France. Relevez quatre obstacles et proposez une adaptation pour chacun.

Corrigé

1. Salle à l'étage sans ascenseur : choisir une salle de plain-pied (centre social, cuisine d'une école). 2. Horaire unique en semaine : proposer un créneau le samedi matin ou en fin de journée, et une garde d'enfants. 3. Recette au porc et à l'alcool : choisir une recette compatible avec tous (par exemple un plat de légumes secs) ou proposer une variante, et associer les familles au choix. 4. Fiches en texte continu : recettes illustrées étape par étape, pictogrammes, mots simples, éventuellement traduites ou expliquées par un participant relais.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.9 – La logistique et l'hygiène des ateliers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pour 24 portions d'une recette prévue pour 8, avec 400 g de carottes épluchées et un rendement de 80 %, quel poids brut faut-il acheter ?

2. Quelle température minimale faut-il respecter pour le maintien au chaud ?

3. En combien de temps un plat doit-il passer de + 63 °C à moins de + 10 °C ?

4. Combien d'allergènes doivent être signalés selon le règlement INCO ? Citez-en quatre.

5. Quelle est la différence entre une DLC et une DDM ?

6. Que signifie « premier entré, premier sorti » ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.9

1. Coefficient 24 / 8 = 3 ; 400 × 3 = 1 200 g épluchés ; 1 200 / 0,80 = 1 500 g, soit 1,5 kg brut.

2. Au moins + 63 °C.

3. En moins de 2 heures.

4. Quatorze ; par exemple gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque, sésame, soja, moutarde, céleri, poissons, crustacés, mollusques, lupin, sulfites.

5. Après la DLC, le produit peut être dangereux et ne doit pas être consommé ; après la DDM, il peut perdre en qualité mais reste sans danger s'il a été bien conservé.

6. On utilise d'abord les produits arrivés les premiers (rotation des stocks), pour éviter de dépasser les dates.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.10.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le tableau des points de maîtrise et la liste des allergènes.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.9 et je refais les exercices d'application.

8.3.10 Anticiper la trésorerie du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Un budget peut être **équilibré** sur l'année et pourtant poser un problème de **trésorerie** : les dépenses arrivent avant les recettes (les subventions sont souvent versées plusieurs mois

après la notification). Le **plan de trésorerie** prévoit, mois par mois, les encaissements, les décaissements et le solde.

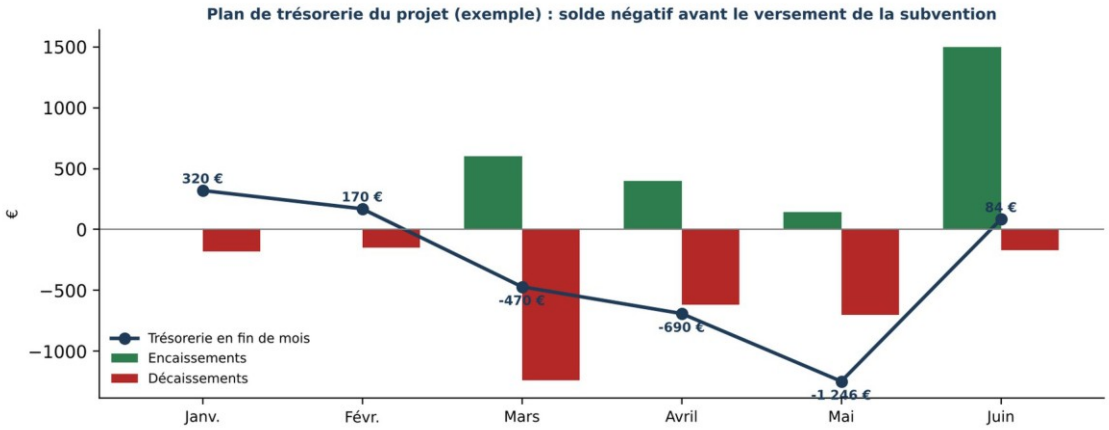


Figure 8.9 – Un plan de trésorerie mois par mois

Exemple – Calcul détaillé : le plan de trésorerie du projet des Tilleuls (hors contributions en nature)

Trésorerie disponible au départ (réserve affectée par le centre social) : **500 €**. Dépenses monétaires prévues : 3 060 € (3 510 € – 450 € de contributions en nature) ; recettes : commune 600 € (mars), CAF 400 € (avril), familles 144 € (mai), ARS 1 500 € (juin).

Mois · Encaissements · Décaissements · Calcul · Solde fin de mois

Janvier — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 180 ; *Calcul :* 500 + 0 − 180 ; *Solde fin de mois :* 320

Février — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 150 ; *Calcul :* 320 − 150 ; *Solde fin de mois :* 170

Mars — *Encaissements :* 600 ; *Décaissements :* 1 240 ; *Calcul :* 170 + 600 − 1 240 ; *Solde fin de mois :* − 470

Avril — *Encaissements :* 400 ; *Décaissements :* 620 ; *Calcul :* – 470 + 400 − 620 ; *Solde fin de mois :* − 690

Mai — *Encaissements :* 144 ; *Décaissements :* 700 ; *Calcul :* − 690 + 144 − 700 ; *Solde fin de mois :* − 1 246

Juin — *Encaissements :* 1 500 ; *Décaissements :* 170 ; *Calcul :* − 1 246 + 1 500 − 170 ; *Solde fin de mois :* 84

- Vérification : décaissements 180 + 150 + 1 240 + 620 + 700 + 170 = **3 060 €** ; encaissements 600 + 400 + 144 + 1 500 = **2 644 €** ; 500 + 2 644 − 3 060 = **84 €** (la différence 3 060 − 2 644 = **416 €** est l'autofinancement).
- **Besoin de trésorerie maximal** : **1 246 €** fin mai.

Solutions : demander une **avance** sur subvention (certains financeurs versent un acompte à la notification), décaler des achats, mobiliser la trésorerie générale de la structure, solliciter le versement anticipé de la part communale. Ce risque (R3, 8.3.6) doit être anticipé avec la direction dès la conception.

Comparer les solutions à un besoin de trésorerie

Quand le plan de trésorerie fait apparaître un solde négatif, le chef de projet ne se contente pas de le constater : il **chiffre plusieurs solutions**, les compare et propose la plus réaliste à la direction. Chaque solution a un coût ou une contrainte.

Solution · Effet sur la trésorerie · Contrainte

Demander une avance (acompte) au financeur — *Effet sur la trésorerie :* Encaissement plus tôt ; *Contrainte :* Dépend des règles du financeur ; à prévoir dans la convention

Décaler des achats non urgents — *Effet sur la trésorerie :* Décaissement plus tard ; *Contrainte :* Ne doit pas retarder une tâche du chemin critique (8.3.4)

Échelonner un paiement avec un fournisseur — *Effet sur la trésorerie :* Décaissement étalé ; *Contrainte :* Accord du fournisseur

Mobiliser la trésorerie générale de la structure — *Effet sur la trésorerie :* Couvre le creux ; *Contrainte :* Possible seulement si la structure a des réserves ; accord de la direction ou du bureau

Emprunter (prêt de trésorerie, découvert autorisé) — *Effet sur la trésorerie :* Couvre le creux ; *Contrainte :* Coût des intérêts, garanties ; rarement adapté à un petit projet associatif

Exemple – Calcul détaillé : le plan de trésorerie d'un projet « Bien manger pour mieux jouer » (club de football amateur, données fictives)

Le club porte un projet d'ateliers pour ses licenciés de 11 à 14 ans, de septembre à février. Trésorerie de départ : **300 €**. Recettes : participation des familles 240 € (octobre), commune 800 € (novembre), mécénat d'un commerce local 360 € (décembre), conseil départemental 1 600 € (février, après le bilan intermédiaire).

Mois · Encaissements · Décaissements · Calcul · Solde fin de mois

Septembre — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 250 ; *Calcul :* 300 + 0 − 250 ; *Solde fin de mois :* 50

Octobre — *Encaissements :* 240 ; *Décaissements :* 900 ; *Calcul :* 50 + 240 − 900 ; *Solde fin de mois :* − 610

Novembre — *Encaissements :* 800 ; *Décaissements :* 650 ; *Calcul :* − 610 + 800 − 650 ; *Solde fin de mois :* − 460

Décembre — *Encaissements :* 360 ; *Décaissements :* 400 ; *Calcul :* − 460 + 360 − 400 ; *Solde fin de mois :* − 500

Janvier — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 700 ; *Calcul :* − 500 + 0 − 700 ; *Solde fin de mois :* − 1 200

Février — *Encaissements :* 1 600 ; *Décaissements :* 300 ; *Calcul :* − 1 200 + 1 600 − 300 ; *Solde fin de mois :* 100

- Vérification : décaissements 250 + 900 + 650 + 400 + 700 + 300 = **3 200 €** ; encaissements 240 + 800 + 360 + 1 600 = **3 000 €** ; 300 + 3 000 − 3 200 = **100 €**.
- **Besoin de trésorerie maximal** : **1 200 €** fin janvier.

Le solde est négatif pendant quatre mois.

Solution A : avance de 50 % du conseil départemental en octobre (800 € en octobre, 800 € en février). Soldes : 50 ; 190 ; 340 ; 300 ; **– 400** ; 100. Le besoin maximal tombe à **400 €**, en janvier seulement.

Solution B : décaler l'achat du matériel pédagogique (400 €) d'octobre à février, sans changer les recettes. Soldes : 50 ; – 210 ; – 60 ; – 100 ; **– 800** ; 100. Le besoin maximal tombe à **800 €**, mais le solde reste négatif quatre mois, et le matériel arrive tard.

Solutions A et B combinées. Soldes : 50 ; 590 ; 740 ; 700 ; **0** ; 100. Le solde n'est jamais négatif.

Conclusion argumentée : la solution A est la plus efficace, mais elle dépend de l'accord du conseil départemental. Le chef de projet la demande dès le dépôt du dossier. Si elle est refusée, il combine la solution B (pour une partie seulement du matériel, afin de ne pas pénaliser les premiers ateliers) avec une mobilisation de la trésorerie du club, à faire valider par le bureau.

Attention – Budget et trésorerie ne se confondent pas

Le budget répond à la question « le projet est-il financé ? » ; le plan de trésorerie répond à la question « aura-t-on l'argent au moment de payer ? ». Les contributions en nature (8.3.5) figurent au budget mais jamais dans le plan de trésorerie, puisqu'elles ne donnent lieu à aucun mouvement d'argent.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.28

Reprenez le plan de trésorerie du club de football. Le commerce local propose de verser son mécénat de 360 € en octobre au lieu de décembre. Recalculez les soldes mensuels sans avance du conseil départemental, puis indiquez le nouveau besoin maximal.

Corrigé

Encaissements : octobre 240 + 360 = 600 ; décembre 0. Soldes : septembre 300 – 250 = 50 ; octobre 50 + 600 – 900 = – 250 ; novembre – 250 + 800 – 650 = – 100 ; décembre – 100 + 0 – 400 = – 500 ; janvier – 500 – 700 = – 1 200 ; février – 1 200 + 1 600 – 300 = 100. Le besoin maximal reste de **1 200 €** en janvier : avancer le mécénat améliore octobre et novembre, mais pas le creux de janvier, qui vient du versement tardif du conseil départemental. La seule solution efficace pour janvier est d'avancer une recette importante ou de décaler une dépense de janvier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.10 – La trésorerie du projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un budget équilibré peut-il poser un problème de trésorerie ?
2. Comment calcule-t-on le solde de fin de mois ?
3. Trésorerie de départ 200 €, encaissements du mois 500 €, décaissements 900 € : quel est le solde ?
4. Les contributions en nature figurent-elles dans le plan de trésorerie ? Pourquoi ?
5. Citez trois solutions à un besoin de trésorerie.
6. Quelle précaution prendre avant de décaler un achat ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.10

1. Parce que les dépenses arrivent souvent avant les recettes, les subventions étant versées plusieurs mois après la notification.
2. Solde du mois précédent + encaissements du mois – décaissements du mois.
3. 200 + 500 – 900 = – 200 €.
4. Non, car elles ne donnent lieu à aucun mouvement d'argent.
5. Par exemple : demander une avance au financeur, décaler des achats non urgents, échelonner un paiement, mobiliser la trésorerie de la structure.
6. Vérifier que l'achat ne concerne pas une tâche du chemin critique, pour ne pas retarder le projet.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.11.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je refais le calcul du plan de trésorerie du club de football.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.10 et je refais les exercices d'application.

8.3.11 Rédiger un dossier de demande de financement : exemple commenté

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Exemple – Extraits commentés de la réponse du centre social à l'appel à projets de l'ARS

Contexte et constats (½ page) : « Le quartier des Tilleuls (4 200 habitants, quartier prioritaire) présente un taux de pauvreté de 41 % (15 % à Valmont) et 14 % d'enfants de grande section en surpoids (9 % dans le département). L'enquête menée auprès de 48 parents en juin 2027 montre que 71 % jugent qu'une alimentation équilibrée coûte cher et que 58 % ne savent pas cuisiner les légumes secs ; 54 % souhaitent des ateliers. L'environnement alimentaire est dominé par la restauration rapide (indice d'environnement favorable de 28,6 / 100). » → *Commentaire : données locales chiffrées, sourcées et datées, besoins exprimés et normatifs.* **Inscription dans les politiques** : « Le projet répond à l'axe 2 du PNNS 5, à la priorité du PRS sur la nutrition des enfants en quartier prioritaire et à la fiche-action 3 du contrat local de santé. » → *Reprise du vocabulaire du financeur.* **Objectifs** : objectif général et 4 objectifs spécifiques SMART (fiche F3). → *Indicateurs et valeurs initiales mentionnés.* **Actions et méthodes** : « 6 ateliers

culinaires participatifs (méthodes actives et démonstratives), une visite accompagnée du marché, un livret de 12 recettes testées, un partenariat avec l'épicerie solidaire (convention) pour l'accès aux produits. » → *Combinaison éducation et environnement.* **Public et participation** : « 12 familles orientées par l'épicerie, les écoles et la PMI ; recettes du monde choisies par les familles ; deux mamans relais associées au comité de pilotage. » → *Participation et universalisme proportionné.* **Évaluation** : « Processus (ateliers réalisés, taux de présence ≥ 80 %) ; résultats (questionnaire avant/après : légumes secs, connaissances ; satisfaction). » → *Indicateurs alignés sur les objectifs.* **Budget** : « Coût total 3 510 €, dont 450 € de contributions en nature ; subvention sollicitée 1 500 € (42,7 %) ; cofinancements de la commune (600 €), de la CAF (400 €), participation des familles (144 €) et autofinancement (416 €). » → *Budget équilibré, cofinancé.* **Pérennisation** : « Formation de deux mamans relais et de la référente, conducteurs réutilisables, intégration au projet social. » → *Argument souvent décisif.*

Attention – Un dossier de financement n'est pas un dossier d'examen

Le dossier de financement est rédigé **avant** l'action, pour convaincre ; le dossier de l'épreuve E5 rend compte de **votre** démarche et de **votre** analyse, y compris des difficultés et des ajustements. Les mêmes données peuvent servir aux deux, mais la rédaction, personnelle, et l'analyse critique sont propres au dossier d'examen.

8.3.12 La convention de partenariat : un modèle commenté

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 12)

Exemple – Convention entre le centre social des Tilleuls et l'épicerie solidaire « Le Panier partagé » (extraits

commentés) Article 1 – Objet : « La présente convention définit les modalités de collaboration entre les parties pour la mise en œuvre du projet "Bien manger, petit budget, grand plaisir" (mars-mai 2028). » → *Un objet précis, limité dans le temps.* **Article 2 – Engagements du centre social** : « Concevoir et animer 6 ateliers culinaires ; réserver 6 places aux familles orientées par l'épicerie ; transmettre un bilan agrégé ; mentionner le partenariat sur les supports. » → *Engagements concrets et vérifiables.* **Article 3 – Engagements de l'épicerie** : « Orienter les familles intéressées ; fournir les légumes secs et produits de base des ateliers dans la limite de 60 € ; proposer en rayon les produits utilisés dans les recettes ; participer au comité de pilotage. » → *Chaque partenaire apporte quelque chose et y trouve un intérêt (chapitre 8.3.2).* **Article 4 – Communication** : « Les supports mentionnent les deux structures ; toute publication est validée conjointement. » → *Évite les malentendus sur l'image.* **Article 5 – Données personnelles et confidentialité** : « Aucune donnée nominative n'est échangée sans l'accord écrit des personnes ; les bilans sont agrégés et anonymes. » → *Conformité RGPD (chapitre 6).* **Article 6 – Suivi et évaluation** : « Un point d'étape à mi-parcours ; bilan commun en juin. » **Article 7 – Durée, modification, résiliation** : « La convention prend effet à la signature et s'achève le 30 juin 2028 ; elle peut être modifiée par avenant ou résiliée par l'une des parties avec un préavis d'un mois. » **Signatures** des représentants légaux (présidente de l'association du centre social, président du CCAS ou son délégué).

Attention – Ce qui fragilise un partenariat

Des engagements flous (« participer au projet »), un déséquilibre (un partenaire qui donne sans rien recevoir), l'absence de point d'étape, une communication non concertée, un départ de la personne référente sans passation. Une convention ne remplace pas la **relation** : rencontres régulières, remerciements, restitution des résultats.

Relire son dossier avant le dépôt : la grille d'autocontrôle

Un dossier de financement est souvent lu rapidement, par un instructeur qui en examine plusieurs dizaines. Un dossier incomplet ou incohérent est écarté, même si le projet est bon. Avant le dépôt, le chef de projet relit donc le dossier avec une **grille d'autocontrôle**, idéalement avec une autre personne qui ne l'a pas rédigé.

Critère	Question de contrôle	Oui / Non
Éligibilité	Le porteur, le public, le territoire et les dates correspondent-ils au cahier des charges ?	
Complétude	Toutes les rubriques sont-elles remplies ? Toutes les pièces sont-elles jointes (statuts, RIB, budget, comptes, attestations) ?	
Cohérence	Les constats justifient-ils les objectifs ? Les actions permettent-elles d'atteindre les objectifs ?	
Chiffres	Les chiffres sont-ils identiques partout (nombre de bénéficiaires, montants, dates) ? Le budget est-il équilibré ?	
Indicateurs	Chaque objectif opérationnel a-t-il au moins un indicateur, une valeur cible et une source ?	
Partenariats	Les partenaires cités ont-ils donné leur accord écrit (lettre de soutien, convention) ?	
Lisibilité	Les phrases sont-elles courtes, sans jargon ? Les sigles sont-ils expliqués ? Un résumé ouvre-t-il le dossier ?	
Calendrier	Le dépôt est-il fait avant la date limite, avec une marge pour les problèmes techniques ?	

Erreurs fréquentes – Ce qui fait écarter un dossier

- Un projet qui ne correspond pas aux **priorités** de l'appel (public ou thème hors champ).
- Un budget **déséquilibré**, ou une demande qui dépasse le plafond ou le taux maximal de financement.
- Des **objectifs** formulés comme des activités (« faire six ateliers ») et sans indicateurs.
- Des chiffres qui changent d'une page à l'autre : 12 familles dans la présentation, 15 dans le budget.
- Des partenaires cités sans leur accord, ou une absence totale de partenariat quand l'appel le demande.
- Un dépôt la dernière heure, bloqué par une plateforme saturée.

Méthode – Rédiger le résumé du projet en dix lignes

Le résumé est souvent la seule partie lue en entier par tous les membres du comité de sélection. Il tient en dix lignes au plus et répond, dans l'ordre, à cinq questions :

1. **Quel problème ?** Un constat chiffré et sourcé.
2. **Pour qui ?** Le public et le territoire.
3. **Quoi ?** Les actions principales et leur calendrier.
4. **Avec qui ?** Les partenaires et leur rôle.
5. **Pour quels résultats ?** Les objectifs et deux ou trois indicateurs, et le montant demandé.

Exemple – Un résumé de projet (projet fictif)

« Dans la résidence autonomie des Glycines (52 résidents), le diagnostic réalisé en 2027 montre que 23 % des résidents ont perdu plus de 5 % de leur poids en un an et que 40 % sautent régulièrement le dîner. Le projet "Le dîner, ça se partage" propose, d'octobre 2027 à juin 2028, un dîner partagé mensuel préparé avec les résidents, six ateliers "dîners faciles" animés par une diététicienne et la formation de deux agents à la surveillance du poids. Il associe le CCAS, le service d'aide à domicile et une association de bénévoles. Objectifs : 30 résidents participants, une baisse de moitié du nombre de résidents sautant le dîner, une pesée mensuelle pour tous. Montant demandé : 6 200 €, soit 62 % d'un budget de 10 000 €. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.29

Relisez ce passage d'un dossier et relevez au moins quatre défauts, en vous aidant de la grille d'autocontrôle : « Le projet s'adresse aux jeunes du quartier. Il s'agit de sensibiliser à l'alimentation par des ateliers. Nous accueillerons 20 jeunes (budget établi pour 25 participants). Partenaires : collège, mission locale, supermarché voisin (contact prévu en septembre). Montant demandé : 9 000 €, soit 90 % du budget (taux maximal de l'appel : 80 %). »

Corrigé

1. Le public est flou (« les jeunes du quartier ») : il faut préciser l'âge, le nombre et les critères. 2. L'objectif est vague (« sensibiliser ») et sans indicateur. 3. Les chiffres sont incohérents : 20 jeunes dans le texte, 25 dans le budget. 4. Les partenaires ne sont pas engagés (un contact « prévu » n'est pas un accord) et le supermarché pose une question de conflit d'intérêts. 5. Le taux demandé (90 %) dépasse le maximum de l'appel (80 %) : le dossier est inéligible tant que le cofinancement n'est pas augmenté. Pour 10 000 € de budget, la demande ne peut pas dépasser 10 000 × 0,80 = 8 000 €.

Les clauses sensibles d'une convention

Le modèle commenté ci-dessus (8.3.12) présente les clauses de base d'une convention : objet, engagements de chaque partie, durée, suivi. D'autres clauses sont souvent oubliées alors qu'elles évitent les conflits. Le diététicien ne rédige pas seul les clauses juridiques : il les prépare avec la direction de la structure, qui signe la convention.

Clause · Ce qu'elle prévoit · Question à se poser

Durée et renouvellement — *Ce qu'elle prévoit :* Date de début, date de fin, renouvellement exprès ou tacite ; *Question à se poser :* Que se passe-t-il à la fin du projet ?

Moyens mis à disposition — *Ce qu'elle prévoit :* Locaux, matériel, temps de personnel, denrées, avec leur valorisation ; *Question à se poser :* Qui assure le matériel prêté en cas de casse ?

Responsabilité et assurance — *Ce qu'elle prévoit :* Chaque partie garantit les dommages causés par ses salariés et ses bénévoles ; attestation d'assurance ; *Question à se poser :* L'assurance de la structure couvre-t-elle les activités culinaires et les bénévoles ?

Données personnelles — *Ce qu'elle prévoit :* Qui collecte, qui conserve, pendant combien de temps, qui peut consulter (règlement général sur la protection des données, chapitre 6) ; *Question à se poser :* Les données des participants circulent-elles entre partenaires ? Avec quel accord ?

Communication et propriété des supports — *Ce qu'elle prévoit :* Logos, mention des partenaires, droit d'utiliser les recettes, photos et livrets après le projet ; *Question à se poser :* Qui peut réutiliser le livret de recettes ? Sous quelle forme ?

Résiliation — *Ce qu'elle prévoit :* Conditions dans lesquelles une partie peut mettre fin à la convention (préavis, motif) ; *Question à se poser :* Que devient l'action si un partenaire se retire ?

Règlement des litiges — *Ce qu'elle prévoit :* Recherche d'une solution amiable d'abord, puis tribunal compétent ; *Question à se poser :* Qui contacter en cas de désaccord ?

Définition – Tacite reconduction

Clause selon laquelle une convention est renouvelée automatiquement à son échéance, pour la même durée, si aucune des parties ne la dénonce. Pour un projet limité dans le temps, on préfère souvent un **renouvellement exprès** (une nouvelle signature), qui oblige à faire le bilan avant de continuer.

Attention – Convention de partenariat et convention de financement

La convention de partenariat organise une **collaboration** entre structures (qui fait quoi). La convention de financement (ou d'attribution de subvention, 8.3.3) fixe les **obligations liées à l'argent** : montant, modalités de versement, compte rendu financier, éventuel reversement

des sommes non utilisées. Les deux documents ne se confondent pas, même si l'un peut citer l'autre.

Exemple – Une clause « données » rédigée simplement (projet fictif)

« Article 7 – Données personnelles. Le centre social est seul responsable de la collecte des données des participants (nom, téléphone, réponses aux questionnaires). Ces données sont conservées sur son serveur, accessibles à la coordinatrice et à la diététicienne du projet, et supprimées douze mois après la fin du projet. L'association partenaire ne reçoit que des résultats agrégés, sans nom. Chaque participant est informé de ses droits (accès, rectification, effacement) au moment de l'inscription. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.30

Une association de jardins familiaux prête une parcelle et deux bénévoles à un centre social pour des ateliers « du jardin à l'assiette ». Proposez le contenu de trois clauses sensibles de la convention : assurance, communication, résiliation.

Corrigé

Assurance : chaque structure assure ses salariés et ses bénévoles ; le centre social vérifie que son contrat couvre les activités extérieures (jardin) et les participants ; les deux parties échangent leurs attestations avant le premier atelier. Communication : le nom et le logo de l'association figurent sur l'affiche et le livret ; les photos prises au jardin ne sont diffusées qu'avec l'accord écrit des personnes ; le livret de recettes peut être réutilisé par les deux parties, avec mention de l'autre. Résiliation : chaque partie peut mettre fin à la convention avec un préavis d'un mois, par écrit ; les ateliers déjà programmés sont maintenus ou reportés en accord avec les participants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.12 – Le dossier et la convention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi faire relire un dossier de financement par une personne qui ne l'a pas rédigé ?
2. Citez trois erreurs qui font écarter un dossier.
3. À quelles cinq questions répond le résumé d'un projet ?
4. Un appel à projets finance au plus 70 % d'un budget de 8 000 €. Quel montant maximal peut-on demander ?
5. Qu'est-ce qu'une clause de tacite reconduction ?
6. Quelle différence y a-t-il entre une convention de partenariat et une convention de financement ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.12

1. Parce qu'un regard extérieur repère plus facilement les incohérences, les oublis et les passages peu clairs.
2. Par exemple : projet hors des priorités de l'appel, budget déséquilibré ou taux dépassé, objectifs sans indicateurs, chiffres incohérents, partenaires non engagés, dépôt hors délai.
3. Quel problème ? Pour qui ? Quoi ? Avec qui ? Pour quels résultats (et quel montant) ?
4. 8 000 × 0,70 = 5 600 €.
5. Une clause qui renouvelle automatiquement la convention à son échéance si aucune partie ne la dénonce.
6. La convention de partenariat organise la collaboration (qui fait quoi) ; la convention de financement fixe les obligations liées à la subvention (montant, versement, compte rendu).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.13.
3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la grille d'autocontrôle et le tableau des clauses.
Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les parties 8.3.11 et 8.3.12 et je refais les exercices d'application.

8.3.13 Estimer la charge de travail et tenir une feuille de temps

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Un plan d'action réaliste suppose d'estimer le **temps** nécessaire à chaque tâche : c'est souvent la ressource la plus rare (et le premier poste du budget, chapitre 8.3.5). La **feuille de temps** (fiche F5) permet ensuite de comparer le temps prévu et le temps réellement passé.

Méthode pas à pas – Estimer la charge d'une tâche

1. Décomposer chaque action en tâches élémentaires (préparer un atelier = conducteur + fiche technique + courses + installation + animation + rangement + bilan).

2. Estimer la durée de chaque tâche à partir de l'expérience (ou de celle de la tutrice).

3. Multiplier par le nombre de répétitions (6 ateliers).

4. Ajouter une marge pour les imprévus (en général 15 à 25 %).

5. Comparer au temps disponible (heures de stage, temps des partenaires) et arbitrer.

Exemple – Calcul détaillé : charge de préparation et d'animation d'un cycle de 6 ateliers

Tâche	Durée unitaire (h)	Nombre	Total (h)	Remarque
Conducteur et fiche technique	2,5	6	15	Moins long à partir du 3e atelier

Tâche	Durée unitaire (h)	Nombre	Total (h)	Remarque
Courses	1	6	6	
Installation et rangement	1	6	6	
Animation	3	6	18	
Bilan à chaud et saisie	0,5	6	3	
Questionnaires (conception, saisie, analyse)	–	–	10	Avant et après
Réunions (tutrice, COPIL)	1,5	4	6	
Sous-total			64	

- Sous-total : 15 + 6 + 6 + 18 + 3 + 10 + 6 = **64 h**.
- Marge de 20 % : 64 × 0,20 = **12,8 h** ; total prévisionnel : 64 + 12,8 = **76,8 h**, soit environ **77 h**.
- Temps disponible (période 2 de stage, 4 semaines de 35 h, dont 30 % consacrés à d'autres activités de la structure) : 140 × 0,70 = **98 h** ; le cycle tient dans le temps disponible, avec 98 − 77 = **21 h** pour la communication et le livret.
- **Comparaison au réalisé** (chapitre 1, feuille de temps d'Inès) : la préparation des ateliers a pris 38 h au lieu de 25 h prévues au départ, soit (38 − 25) / 25 × 100 = **+ 52 %** : sans marge, le planning aurait dérapé ; c'est un point d'auto-évaluation (fiche F14).

Attention – Le temps des partenaires compte aussi

Un projet mobilise le temps de la tutrice, de la diététicienne, des bénévoles et des partenaires : il faut le **prévoir**, le **demander** explicitement (convention) et le **valoriser** dans le budget (comptes 64 ou 86-87). Un partenaire surchargé est un risque pour le projet.

8.3.14 Utiliser les outils numériques du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le référentiel cite, parmi les outils et moyens de la démarche de projet, les **logiciels de gestion de projet**, le **mind-mapping** (carte mentale), le **tableur** et le **formulaire en ligne**. Ces outils ne remplacent pas la méthode : ils la rendent plus rapide, plus lisible et plus facile à partager. Leur usage est encadré par les règles de protection des données (chapitre 6) et de sécurité numérique (chapitre 21).

Outil · À quoi il sert dans le projet · Exemples d'usage · Points de vigilance

Carte mentale (mind- mapping) — *À quoi il sert dans le projet :* Organiser des idées autour d'un thème central, en branches et sous-branches ; visualiser un problème ou un plan ; *Exemples d'usage :* Brainstorming du diagnostic, préparation de l'arbre à problèmes, plan du dossier E5, carte des partenaires ; *Points de vigilance :* Rester lisible (un mot-clé par branche) ; ne pas confondre une carte d'idées avec un diagnostic validé par des données

Logiciel de gestion de projet — *À quoi il sert dans le projet :* Lister les tâches, les attribuer, fixer des échéances, suivre l'avancement (liste, tableau à colonnes « à faire / en cours / fait », diagramme de Gantt) ; *Exemples d'usage :* Planning des ateliers, suivi des tâches entre la stagiaire, la tutrice et les partenaires, jalons du comité de pilotage ; *Points de vigilance :* Choisir un outil autorisé par la structure ; ne pas y déposer de données personnelles des participants

Tableur — *À quoi il sert dans le projet :* Calculer, organiser des données, produire des graphiques ; *Exemples d'usage :* Budget prévisionnel et réalisé, plan de trésorerie, tableau de bord, saisie et dépouillement des questionnaires, feuille de temps ; *Points de vigilance :* Formules vérifiées, cellules protégées, une version de référence datée ; pseudonymiser les données des participants

Formulaire en ligne — *À quoi il sert dans le projet :* Recueillir des réponses à distance, dans un format directement exploitable par le tableur ; *Exemples d'usage :* Questionnaire de diagnostic, inscription aux ateliers, questionnaire de satisfaction ; *Points de vigilance :* RGPD : information des personnes, minimisation des données, durée de conservation, hébergement ; pas de données de santé sans cadre adapté

Plateforme collaborative et espace de stockage partagé — *À quoi il sert dans le projet :* Partager et co-écrire des documents, garder une version unique à jour ; *Exemples d'usage :* Fiches projet, conducteurs de séance, comptes rendus ; *Points de vigilance :* Droits d'accès limités aux personnes concernées ; liens de partage non publics (chapitre 21)

La carte mentale

Définition – Carte mentale (mind map)

Représentation graphique, rayonnante, de la pensée : un **thème central** au milieu de la page, des **branches principales** (idées clés), puis des **sous-branches** (détails), avec des mots-clés, des couleurs et parfois des pictogrammes. La méthode a été popularisée par Tony Buzan dans les années 1970. Elle se réalise sur papier ou avec un logiciel de cartographie mentale (il en existe des versions libres et gratuites).

Méthode pas à pas – Construire la carte mentale d'un diagnostic en 4 étapes

1. Écrire au centre le **sujet** : « Alimentation des familles du quartier des Tilleuls ».
2. Créer une **branche par type de données** : données objectives, besoins exprimés, besoins ressentis, besoins observés, ressources du territoire, politiques publiques.
3. Ajouter sur chaque branche les **constats** en mots-clés, avec leur source (« 71 % : manger équilibré coûte cher
   – questionnaire »).
4. **Relier** par des flèches les constats qui s'expliquent mutuellement : la carte prépare l'arbre à problèmes (chapitre 7).

Le logiciel de gestion de projet

Un logiciel de gestion de projet permet de découper le projet en **tâches**, de leur affecter un **responsable**, une **échéance**, une **durée** et des **dépendances** (une tâche ne peut commencer qu'après une autre), puis de visualiser l'ensemble sous forme de **liste**, de **tableau à colonnes** (méthode inspirée du kanban : « à faire », « en cours », « fait

») ou de **diagramme de Gantt** (8.3.4). L'outil calcule automatiquement les dates et signale les retards.

Exemple – Le tableau à colonnes d'Inès (extrait, semaine du 13 mars 2028)

À faire	En cours	Fait
Commander les denrées de l'atelier 3 (Inès, avant le 24/03)	Rédiger le conducteur de l'atelier 3 (Inès, 21/03)	Atelier 1 « légumes secs » animé le 7/03
Réserver le bus pour la visite du marché (Mme Martin, 20/03)	Saisir les questionnaires « avant » dans le tableur (Inès, 17/03)	Atelier 2 « légumes de saison » animé le 14/03
Préparer l'ordre du jour du comité de pilotage (Inès, 27/03)		Affiches et flyers diffusés

Lecture : chaque carte porte une tâche, un responsable et une échéance ; en réunion d'équipe, on déplace les cartes d'une colonne à l'autre. Le nombre de tâches « en cours » doit rester limité pour éviter la dispersion.

Le tableur

Le tableur est l'outil le plus utilisé dans un projet de santé publique : budget (fiche F6), tableau de bord (F12), dépouillement des questionnaires (F11), feuille de temps. Quelques fonctions suffisent dans la plupart des cas.

Fonction · Ce qu'elle fait · Exemple dans le projet

=B2*C2 — *Ce qu'elle fait :* Multiplie deux cellules ; *Exemple dans le projet :* Montant d'une ligne de budget = quantité × coût unitaire

=SOMME(D2:D10) — *Ce qu'elle fait :* Additionne une plage ; *Exemple dans le projet :* Total des charges

=MOYENNE(B2:B13) — *Ce qu'elle fait :* Calcule la moyenne ; *Exemple dans le projet :* Score moyen de connaissances des 12 participants

=MEDIANE(B2:B13) — *Ce qu'elle fait :* Calcule la médiane ; *Exemple dans le projet :* Score médian, moins sensible aux valeurs extrêmes

=NB.SI(C2:C49;"Oui") — *Ce qu'elle fait :* Compte les cellules qui remplissent une condition ; *Exemple dans le projet :* Nombre de parents qui souhaitent des ateliers

=NB.SI(C2:C49;"Oui")/ NBVAL(C2:C49) — *Ce qu'elle fait :* Calcule une proportion ; *Exemple dans le projet :* Part des parents qui souhaitent des ateliers (format %)

=D2-C2 et =(D2-C2)/C2 — *Ce qu'elle fait :* Calcule un écart absolu et un écart relatif ; *Exemple dans le projet :* Écart entre le budget réalisé et le budget prévu

Exemple – Calcul détaillé : un tableau de bord dans le tableur

Dans la feuille « tableau de bord », la colonne B contient la valeur prévue, la colonne C la valeur réalisée.

- Ligne 2, ateliers réalisés : prévu 6, réalisé 6 ; taux de réalisation =C2/B2 → 6 / 6 = **100 %**.
- Ligne 3, présences : prévu 72 (12 familles × 6 ateliers), réalisé 61 ; taux =C3/B3 → 61 / 72 = 0,847, soit **84,7** % (objectif ≥ 80 % atteint).
- Ligne 4, dépenses de denrées : prévu 210 €, réalisé 236 € ; écart =C4-B4 → **+ 26 €** ; écart relatif =(C4-B4)/B4 → 26 / 210 = 0,124, soit **+ 12,4 %**.
- Une **mise en forme conditionnelle** (cellule verte si l'objectif est atteint, orange sinon) rend le tableau lisible en comité de pilotage.

(Données fictives.)

Le formulaire en ligne

Le formulaire en ligne (questionnaire diffusé par un lien ou un QR code) facilite le recueil et le dépouillement : les réponses arrivent directement dans un tableur. Il ne convient pas à tous les publics : prévoir **toujours** une version papier ou une passation accompagnée pour les personnes éloignées du numérique (précarité numérique, chapitres 5 et 15).

Attention – Formulaire en ligne et RGPD : la liste de contrôle

- **Utiliser l'outil validé par la structure** : vérifier où sont hébergées les données (de préférence dans l'Union européenne) et qui y a accès.
- **Minimiser** : ne demander que les informations utiles à l'objectif ; un questionnaire de satisfaction peut être **anonyme** (pas de nom, pas d'adresse électronique obligatoire).
- **Informer** les personnes en tête du formulaire : responsable du traitement, finalité, caractère facultatif, durée de conservation, droits (accès, rectification, effacement) et contact.
- **Données de santé** (poids, maladie, traitement) : ce sont des données sensibles (article 9 du RGPD) ; ne pas les recueillir par un formulaire grand public sans cadre adapté (consentement explicite, hébergement et sécurité appropriés), demander l'avis du responsable de la structure ou du délégué à la protection des données.
- **Sécuriser et supprimer** : accès protégé par mot de passe, export dans un dossier sécurisé, suppression des réponses à la fin de la durée annoncée.

À vous de jouer – Exercice d'application – Choisir l'outil numérique adapté

Pour chacun des besoins suivants, indiquez l'outil le plus adapté et une précaution : a) préparer, avec l'équipe, le plan du dossier de projet ; b) suivre qui fait quoi et pour quand pendant les six semaines d'ateliers ; c) calculer le coût par famille et l'écart au budget prévu ; d) recueillir l'avis de 80 parents d'élèves sur le goûter.

Corrigé

a) Carte mentale (sur papier ou logiciel), partagée sur l'espace collaboratif de la structure ; précaution : la faire valider par la tutrice avant de rédiger. **b) Logiciel de gestion de projet** (tableau à colonnes ou Gantt) ; précaution : outil autorisé par la structure, aucune donnée personnelle des familles. **c) Tableur** : =SOMME() pour le total, =total/12 pour le coût par famille, =(réalisé − prévu)/prévu pour l'écart relatif ; précaution : vérifier

les formules et dater la version. **d) Formulaire en ligne** diffusé par le cahier de liaison ou un QR code, **avec une version papier** ; précaution : questionnaire anonyme, information RGPD en tête, durée de conservation annoncée.

Travailler en équipe avec des documents partagés

Un projet de prévention se mène à plusieurs : chef de projet, tutrice, animateurs, partenaires, parfois bénévoles. Les documents circulent (tableau de bord, budget, conducteurs, questionnaires). Sans règles communes, on perd du temps à chercher la bonne version, et l'on risque de diffuser des données personnelles par erreur.

Méthode – Organiser les fichiers du projet en quatre règles

1. **Une arborescence simple et partagée**, décidée au lancement : par exemple 01_Diagnostic, 02_Conception, 03_Financement, 04_Ateliers, 05_Communication, 06_Évaluation, 07_Bilan.
2. **Un nommage normalisé** des fichiers : date à l'envers, objet, version. Exemple : 2028-03-14_conducteur_atelier2_v3. La date à l'envers permet de classer les fichiers dans l'ordre chronologique.
3. **Une seule version de référence** : on travaille dans le document partagé, ou l'on indique clairement qui détient la version en cours de modification. La version validée est marquée « VALIDÉ » ou déposée dans un dossier à part.
4. **Des accès limités** : les fichiers contenant des données personnelles (listes d'inscrits, questionnaires nominatifs) sont rangés dans un dossier à accès restreint, sur un espace de la structure, jamais sur une messagerie personnelle.

Situation · Mauvaise pratique · Bonne pratique

Un partenaire envoie ses corrections — *Mauvaise pratique :* Trois fichiers « budget_final », « budget_final2 », « budget_final_OK » ; *Bonne pratique :* Un fichier versionné (v1, v2, v3) et un tableau des modifications

Un animateur absent doit être remplacé — *Mauvaise pratique :* Le conducteur est dans sa messagerie ; *Bonne pratique :* Le conducteur est dans le dossier partagé, à jour

Le financeur demande un bilan intermédiaire — *Mauvaise pratique :* On reconstitue les chiffres à partir des feuilles papier ; *Bonne pratique :* Le tableau de bord est mis à jour chaque semaine dans le tableur partagé

On doit envoyer les résultats à un partenaire — *Mauvaise pratique :* On transfère le fichier des questionnaires nominatifs ; *Bonne pratique :* On envoie un tableau de résultats agrégés, sans nom

Définition – Compte rendu de réunion et relevé de décisions

Le **compte rendu** résume les échanges d'une réunion. Le **relevé de décisions**, plus court, ne retient que ce qui a été décidé : pour chaque décision, l'action à mener, le responsable et l'échéance. En projet, le relevé de décisions est souvent plus utile, car il se transforme directement en tâches dans le planning (8.3.6).

Exemple – Un relevé de décisions de comité de pilotage (projet fictif)

Comité de pilotage du 12 mars 2028, présents : 5 membres sur 6.

Décision · Action · Responsable · Échéance

Ouvrir un troisième créneau d'atelier le samedi matin — *Action :* Réserver la salle, informer les familles de la liste d'attente ; *Responsable :* Coordinatrice ; *Échéance :* 20 mars

Remplacer les flyers par une formation des relais — *Action :* Organiser deux séances de formation de 2 heures ; *Responsable :* Diététicienne ; *Échéance :* 15 avril

Demander une avance au financeur — *Action :* Rédiger le courrier, le faire signer par la direction ; *Responsable :* Chef de projet ; *Échéance :* 18 mars

Attention – Les messageries instantanées

Les groupes de messagerie sont pratiques pour rappeler un horaire, mais ils ne conviennent pas pour échanger des informations de santé, des listes nominatives ou des documents de travail : les données sortent du contrôle de la structure, et les décisions s'y perdent. On y renvoie vers le dossier partagé et vers le relevé de décisions.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.31

Votre dossier de projet contient les fichiers suivants : « questionnaire.xlsx », « questionnaire bis.xlsx », « budget définitif.xlsx », « budget définitif 2.xlsx », « photo atelier.jpg », « CR réunion.docx ». Proposez une arborescence et un nommage pour ces fichiers, et indiquez lesquels doivent être placés dans un dossier à accès restreint.

Corrigé

Arborescence possible : 03_Financement (budget), 04_Ateliers (photos), 06_Évaluation (questionnaires), 08_Pilotage (relevés de décisions). Nommage : 2028-02-03_questionnaire_avant_v1 et 2028-02-10_questionnaire_avant_v2 (ou suppression de l'ancienne version après validation) ; 2028-01-20_budget_previsionnel_v1 et 2028-03-12_budget_previsionnel_v2_VALIDÉ ; 2028-03-02_atelier1_photo_groupe ; 2028-03-12_COPIL_releve_decisions. Accès restreint : les questionnaires s'ils sont nominatifs, et la photo si des personnes sont reconnaissables (avec l'accord écrit conservé à côté).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.14 – Temps de travail et outils numériques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous.

Comptez 1 point par réponse juste.

1. Une tâche est estimée à 40 h. Avec une marge de 20 %, quel temps prévoit-on ?
2. Pourquoi tenir une feuille de temps pendant le projet ?
3. À quoi sert une carte mentale dans la démarche de projet ?
4. Pourquoi écrire la date à l'envers (année-mois-jour) dans le nom d'un fichier ?
5. Quelle différence y a-t-il entre un compte rendu et un relevé de décisions ?
6. Où ranger une liste d'inscrits avec leurs coordonnées ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.14

1. 40 × 1,20 = 48 h.
2. Pour comparer le temps prévu et le temps réellement passé, ajuster le planning et nourrir le bilan.
3. À organiser des idées autour d'un thème central : brainstorming, plan du dossier, carte des partenaires.
4. Pour que les fichiers se classent automatiquement dans l'ordre chronologique.
5. Le compte rendu résume les échanges ; le relevé de décisions ne retient que les décisions, avec l'action, le responsable et l'échéance.
6. Dans un dossier à accès restreint, sur un espace de la structure, jamais sur une messagerie personnelle.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe au fil rouge 8.3.15.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la méthode d'estimation de la charge et les règles de rangement.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les parties 8.3.13 et 8.3.14 et je refais les exercices d'application.

8.3.15 Fil rouge : le plan d'action d'Inès

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a mis en place

- **Stratégies combinées** : 6 ateliers (éducation) ; partenariat avec l'épicerie pour que les légumes secs des recettes soient disponibles à petit prix (environnement) ; mamans relais (renforcement) ; recettes du monde choisies par les familles (participation) ; note au CLS sur l'offre du quartier (plaidoyer).
- **Parties prenantes** : 14 identifiées et placées sur la matrice ; COPIL de 6 membres (direction du centre social, référente, diététicienne, CCAS-épicerie, représentante de la commune, une maman relais) réuni 3 fois (janvier, mars, juin).
- **Convention** signée avec l'épicerie solidaire (orientation des familles, fourniture des légumes secs, mention sur les supports).
- **Appel à projets ARS** : dossier déposé le 31 janvier 2028 (date limite : 15 février) ; demande de 1 500 € ; notification reçue le 2 mai ; versement en juin : le centre social a avancé les dépenses (risque R3).
- **Pilotage** : tableau de bord mis à jour chaque semaine dans le tableur ; un écart a conduit à remplacer une famille (déménagement) par une famille de la liste d'attente.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : communication, logistique et trésorerie aux Tilleuls

- **Plan de communication** : 31 familles ont pris contact pour 12 places (liste d'attente de 19 familles) ; 45 % par les mamans relais, 23 % par l'épicerie ; les 300 flyers n'ont apporté que 2 contacts : pour le cycle suivant, le budget des flyers (45 €) finance un temps de formation des relais.
- **Méthodes** : chaque atelier combinait une courte présentation (10 minutes au plus), une démonstration du geste clé, la pratique en équipes, la dégustation et un temps de faire dire.
- **Logistique** : liste de courses calculée avec les rendements (par exemple 1,1 kg de carottes brutes pour 900 g épluchés), courses à l'épicerie solidaire et au marché, rappel des familles la veille par message vocal.
- **Trésorerie** : besoin maximal de 1 246 € fin mai ; la direction du centre social a mobilisé sa trésorerie générale ; Inès a obtenu que la commune verse sa participation dès mars.

8.4 Approfondissements

8.4.1 Le cadre logique, outil des financeurs

Niveau · Description · Indicateurs · Sources de vérification · Hypothèses

Objectif général — *Description :* Contribuer à améliorer l'alimentation des familles du QPV ; *Indicateurs :* Consommation de légumes secs (enquête locale) ; *Sources de vérification :* Enquête à 1 an ; *Hypothèses :* Contexte économique stable

Objectif spécifique — *Description :* 60 % des familles consomment des légumes secs ≥ 2 fois/semaine ; *Indicateurs :* % de familles ; *Sources de vérification :* Questionnaire avant/après ; *Hypothèses :* Disponibilité à l'épicerie

Résultats — *Description :* Familles capables de cuisiner 3 recettes de légumes secs ; *Indicateurs :* Recettes refaites déclarées ; *Sources de vérification :* Questionnaire, échanges ; *Hypothèses :* Équipement de cuisine à domicile

Activités — *Description :* 6 ateliers, visite du marché, livret ; *Indicateurs :* Ateliers réalisés, présences ; *Sources de vérification :* Émargements, livret ; *Hypothèses :* Locaux disponibles, financement obtenu

Le cadre logique oblige à expliciter les **hypothèses** (ce qui ne dépend pas du projet mais conditionne son succès) et les **sources de vérification** des indicateurs : il prépare directement l'évaluation (chapitre 9).

Construire un cadre logique pas à pas

Le cadre logique se construit à partir de l'**arbre à problèmes** du diagnostic (chapitre 7) : le problème central devient l'objectif spécifique, ses causes deviennent les résultats attendus, et ses conséquences renvoient à l'objectif général. On remplit ensuite la matrice **de haut en bas** pour la colonne des objectifs, puis **de bas en haut** pour vérifier la logique.

Méthode pas à pas – Remplir la matrice du cadre logique

1. Objectif général : la contribution à long terme, que le projet seul ne peut pas garantir (souvent formulée avec « contribuer à »).

2. Objectif spécifique : le changement principal attendu chez le public à la fin du projet ; il n'y en a qu'un, ou très peu.

3. Résultats : les produits concrets du projet, qui, ensemble, permettent d'atteindre l'objectif spécifique (capacités acquises, outils produits, environnement modifié).

4. Activités : ce que l'équipe fait pour obtenir chaque résultat ; on les numérote comme les résultats (activités 1.1, 1.2 pour le résultat 1).

5. Hypothèses : pour chaque niveau, les conditions extérieures nécessaires, qui ne dépendent pas du projet.

6. Indicateurs et sources : pour chaque niveau, un indicateur mesurable, une valeur cible et la source qui permettra de le vérifier.

7. Vérification de bas en haut : « si les activités sont réalisées **et** si les hypothèses se vérifient, **alors** les résultats sont obtenus ; si les résultats sont obtenus et si les hypothèses se vérifient, alors l'objectif spécifique est atteint ».

Définition – Hypothèse et condition préalable

Une **hypothèse** est une condition extérieure au projet, nécessaire à sa réussite, que l'équipe ne maîtrise pas mais qu'elle surveille (par exemple : « l'épicerie solidaire continue à proposer des légumes secs à petit prix »). Une **condition préalable** doit être remplie avant même de commencer (par exemple : « la salle équipée est disponible »). Si une hypothèse est très peu probable et essentielle, on parle d'**hypothèse fatale** : il faut alors modifier le projet.

Exemple – De l'arbre à problèmes au cadre logique (projet fictif, résidence autonomie)

Problème central de l'arbre : « Beaucoup de résidents sautent le dîner ». Causes : isolement le soir, difficulté à cuisiner pour une personne, méconnaissance de dîners simples. Conséquences : perte de poids, risque de dénutrition.

Niveau · Contenu · Indicateur et cible · Source · Hypothèses

Objectif général — *Contenu :* Contribuer à prévenir la dénutrition des résidents ; *Indicateur et cible :* Part des résidents ayant perdu plus de 5 % de leur poids en un an ; *Source :* Pesées mensuelles ; *Hypothèses :* Pas d'épidémie majeure pendant l'année

Objectif spécifique — *Contenu :* Réduire de moitié la part des résidents qui sautent le dîner (de 40 % à 20 %) ; *Indicateur et cible :* Part des résidents sautant le dîner au moins 3 fois par semaine ; *Source :* Questionnaire avant et après ; *Hypothèses :* Les résidents restent dans la résidence

Résultat 1 — *Contenu :* Les résidents savent préparer trois dîners simples pour une personne ; *Indicateur et cible :* Nombre de dîners refaits déclarés ; *Source :* Questionnaire, échanges ; *Hypothèses :* Les logements disposent d'un équipement minimal

Résultat 2 — *Contenu :* Un dîner partagé mensuel est installé ; *Indicateur et cible :* Nombre de dîners organisés, participants ; *Source :* Émargements ; *Hypothèses :* La salle commune reste disponible

Activités — *Contenu :* 1.1 Six ateliers « dîners faciles » ; 1.2 livret de recettes ; 2.1 organisation des dîners avec les bénévoles ; *Indicateur et cible :* Ateliers réalisés, livret diffusé ; *Source :* Comptes rendus ; *Hypothèses :* Les bénévoles restent mobilisés

Attention – Les pièges du cadre logique

Placer une activité au niveau des objectifs (« organiser six ateliers » n'est pas un objectif spécifique) ; écrire plusieurs objectifs spécifiques sans lien entre eux ; oublier les hypothèses ; choisir des indicateurs sans source réaliste. Le cadre logique est un outil de **cohérence** : il ne remplace ni le diagnostic ni le plan d'action détaillé.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.32

Classez ces éléments dans les niveaux du cadre logique (objectif général, objectif spécifique, résultat, activité, hypothèse) : a) former deux agents à la pesée ; b) contribuer à améliorer l'état nutritionnel des résidents ; c) le service d'aide à domicile accepte de transmettre les pesées ; d) 80 % des résidents sont pesés chaque mois ; e) les agents savent repérer une perte de poids inquiétante.

Corrigé

a) Activité. b) Objectif général. c) Hypothèse (condition extérieure que l'équipe ne maîtrise pas). d) Indicateur et cible de l'objectif spécifique ou d'un résultat, selon la construction choisie : ici, on peut le lier au résultat « un suivi mensuel du poids est en place ». e) Résultat (capacité acquise grâce à la formation). On vérifie la logique de bas en haut : si les agents sont formés (a) et si le service transmet les pesées (c), alors les agents savent repérer une perte de poids (e) et le suivi est assuré (d).

8.4.2 Le travail en réseau et la coordination territoriale

Sur un territoire, de nombreux acteurs agissent sur l'alimentation (centres sociaux, PMI, écoles, épiceries solidaires, associations, collectivités). Les **coordinations** (CLS, ateliers santé ville, PAT, réseaux régionaux de promotion de la santé comme les instances régionales

d'éducation et de promotion de la santé) évitent les doublons, mutualisent les ressources et permettent un **parcours** cohérent pour les habitants. Le diététicien gagne à participer aux groupes de travail locaux : ils sont aussi une source de partenaires et de financements.

Les dispositifs de coordination à connaître

Le diététicien qui monte un projet de prévention gagne à l'inscrire dans les dispositifs existants du territoire. Il y trouve des partenaires, des données, parfois des financements, et son action a plus de chances d'être poursuivie. Le tableau présente les principaux dispositifs et leur base juridique.

Dispositif · Ce que c'est · Base juridique · Intérêt pour un projet nutrition

Contrat local de santé (CLS) — *Ce que c'est :* Contrat entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour des actions de santé adaptées au territoire ; *Base juridique :* Code de la santé publique, art. L. 1434-10 ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Fiches actions « alimentation » ; mise en relation avec les acteurs ; légitimité auprès des financeurs

Atelier santé ville (ASV) — *Ce que c'est :* Démarche de coordination santé dans les quartiers de la politique de la ville ; *Base juridique :* Politique de la ville ; souvent intégré au volet santé du contrat de ville ou au CLS ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Accès aux habitants des quartiers prioritaires, aux relais et aux données locales

Projet alimentaire territorial (PAT) — *Ce que c'est :* Projet construit par les acteurs d'un territoire pour relocaliser l'agriculture et l'alimentation ; *Base juridique :* Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 ; Code rural, art. L. 111-2-2 ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Approvisionnement local, accessibilité alimentaire, lutte contre le gaspillage, éducation alimentaire

Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) — *Ce que c'est :* Regroupement de professionnels de santé d'un territoire autour d'un projet de santé commun ; *Base juridique :* Code de la santé publique, art. L. 1434-12 ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Missions de prévention ; lien avec les médecins, infirmiers et pharmaciens du territoire

Conseil local de santé mentale, réseaux de périnatalité, dispositifs d'appui à la coordination — *Ce que c'est :* Coordinations thématiques ; *Base juridique :* Textes propres à chaque dispositif ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Relais vers des publics spécifiques (santé mentale, périnatalité, situations complexes)

Lien avec le chapitre 7 – Le diagnostic partagé

Un CLS ou un PAT s'appuie lui-même sur un diagnostic du territoire. Avant de lancer son propre diagnostic, le diététicien consulte ces documents : ils fournissent des données et montrent quelles priorités ont déjà été retenues par les acteurs locaux.

Méthode – S'inscrire dans un dispositif territorial

1. **Repérer** les dispositifs du territoire : site de l'ARS, de la collectivité, de la préfecture (politique de la ville), de la direction régionale de l'agriculture (PAT).
2. **Lire** le document de référence (contrat, projet de santé, plan d'action du PAT) et repérer les fiches actions liées à l'alimentation.
3. **Rencontrer** le coordonnateur (coordinateur CLS, chargé de mission PAT) pour présenter le projet et vérifier sa cohérence avec les priorités.
4. **Valoriser** ce lien dans le dossier de financement : « le projet répond à la fiche action n° 3 du CLS ».
5. **Participer** aux réunions de réseau et transmettre les résultats : c'est un gage de crédibilité et de pérennité.

Exemple – Un projet relié à trois dispositifs (projet fictif)

Une diététicienne prévoit des ateliers « cuisine de saison » dans une communauté de communes rurale. Elle découvre que le CLS comporte une fiche action « favoriser une alimentation favorable à la santé des familles », que le PAT de la communauté de communes finance l'approvisionnement des cantines en légumes locaux, et que la CPTS du territoire a inscrit la prévention du diabète dans son projet de santé. Elle construit ses ateliers avec un maraîcher du PAT, propose à la CPTS d'orienter des patients à risque, et cite la fiche action du CLS dans son dossier : trois partenaires et trois sources de légitimité pour un même projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.33

Pour chacune des situations suivantes, indiquez le dispositif à contacter en priorité : a) un projet d'éducation alimentaire lié aux produits des agriculteurs locaux ; b) un projet dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; c) un projet de repérage du risque de diabète avec les médecins généralistes du secteur.

Corrigé

a) Le projet alimentaire territorial (PAT), qui rassemble les producteurs, les collectivités et les acteurs de l'alimentation. b) L'atelier santé ville ou le volet santé du contrat de ville, souvent articulé avec le contrat local de santé. c) La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), qui réunit les professionnels de santé du territoire et porte des missions de prévention. Dans les trois cas, le contrat local de santé, s'il existe, est aussi un point d'entrée utile.

8.4.3 La pérennisation dès la conception

Un projet financé sur un an risque de s'arrêter faute de moyens. La pérennisation se prépare **dès la conception** : former des relais (animatrices, mamans relais) qui pourront poursuivre l'action ; intégrer l'action dans le projet de la structure ; rechercher des financements pluriannuels (CPOM) ; produire des outils réutilisables (livret, conducteurs) ; inscrire l'action dans le CLS ou le PAT ; évaluer pour démontrer l'utilité (chapitre 9).

Les étapes de la pérennisation

Pérenniser ne veut pas dire répéter le même projet à l'identique, avec les mêmes financements. C'est faire en sorte que **les effets** et **les compétences** acquises durent, et que l'action, éventuellement transformée, soit **portée par d'autres** quand le financement initial s'arrête.

Étape · Moment · Actions
1. Prévoir — *Moment :* Dès la conception ; *Actions :* Identifier qui pourra poursuivre l'action ; prévoir la formation de relais ; choisir des activités peu coûteuses à reconduire
2. Transférer — *Moment :* Pendant le projet ; *Actions :* Associer les relais à l'animation ; rédiger des outils réutilisables (conducteurs, livret, fiches recettes) ; documenter les choix
3. Démontrer — *Moment :* Fin du projet ; *Actions :* Évaluer les résultats et les coûts ; présenter le bilan aux décideurs ; proposer des scénarios de suite chiffrés
4. Intégrer — *Moment :* Après le projet ; *Actions :* Inscrire l'action dans le projet de la structure, dans un CLS ou un PAT ; rechercher un financement pluriannuel

Définition – Transférabilité

Capacité d'une action à être reproduite dans un autre lieu ou par d'autres intervenants, avec des résultats comparables. Elle suppose une description précise de l'action (objectifs, public, contenu des séances, moyens) et l'identification de ses **fonctions clés**, c'est-à-dire de ce qui doit être conservé pour que l'action reste efficace (8.3.1).

Exemple – Trois scénarios de suite chiffrés (projet fictif)

À la fin d'un cycle de 6 ateliers qui a coûté 3 060 € en dépenses monétaires, la diététicienne présente trois scénarios au comité de pilotage :

- **Scénario 1, reconduction à l'identique** : 3 060 € par an, financement à trouver en totalité.
- **Scénario 2, animation par deux relais formées, avec deux interventions de la diététicienne** : 2 × 3 h × 45 € = 270 € d'honoraires, plus les denrées et le petit matériel (environ 600 €), soit environ 870 € par an.
- **Scénario 3, intégration au programme du centre social** : les ateliers sont animés par l'animatrice salariée du centre ; seules les denrées sont à financer.

Le comité retient le scénario 2 pour un an, avec une évaluation à mi-parcours : il maintient l'expertise diététique tout en divisant le coût par plus de trois (3 060 / 870 = 3,5).

Attention – La dépendance à une seule personne

Un projet qui repose entièrement sur une personne (stagiaire, salarié en contrat court, bénévole très investi) s'arrête souvent avec son départ. La passation (documents, contacts, relevés de décisions) et la formation d'au moins deux relais sont des conditions de la pérennisation.

8.4.4 Les contrats pluriannuels et les fonds européens

Pour pérenniser une action, les structures cherchent des financements **pluriannuels** : contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) avec l'ARS, conventions pluriannuelles avec les collectivités, financements de la CAF (prestations de service). Les **fonds européens** (Fonds social européen plus, FSE+, programmes régionaux) peuvent financer des projets d'inclusion ou d'aide alimentaire (une partie de l'aide alimentaire européenne relève du FSE+), avec des exigences administratives importantes (justificatifs, suivi des participants). Un projet de stage ne mobilise généralement pas ces fonds, mais le diététicien en poste peut y contribuer.

Les exigences des financements pluriannuels et européens

Les financements pluriannuels sécurisent une action, mais ils demandent une gestion plus rigoureuse. Le chef de projet doit les connaître pour éviter de s'engager dans un financement que la structure ne pourra pas gérer.

Exigence · Ce qu'elle implique · Conséquence pour la structure
Objectifs et indicateurs sur plusieurs années — *Ce qu'elle implique :* Un dialogue de gestion annuel avec le financeur, sur la base des indicateurs ; *Conséquence pour la structure :* Disposer d'un tableau de bord fiable et d'une évaluation continue
Justification des dépenses — *Ce qu'elle implique :* Factures, feuilles de temps, preuves de publicité du soutien ; *Conséquence pour la structure :* Archiver les pièces pendant la durée exigée par le financeur
Versements différés — *Ce qu'elle implique :* Souvent un acompte, puis des versements après contrôle des justificatifs ; *Conséquence pour la structure :* Prévoir un plan de trésorerie sur toute la durée (8.3.10)
Cofinancement — *Ce qu'elle implique :* Une part du budget doit venir d'autres financeurs ; *Conséquence pour la structure :* Rechercher plusieurs financeurs en même temps
Contrôle — *Ce qu'elle implique :* Contrôle sur pièces ou sur place ; reversement des sommes non justifiées ; *Conséquence pour la structure :* Organiser les dossiers dès le début du projet

Attention – Les fonds européens demandent une structure solide

Le Fonds social européen Plus (FSE+, programmation 2021-2027) peut financer des actions d'inclusion sociale, y compris en lien avec l'alimentation. Mais les dossiers sont lourds, les versements interviennent souvent longtemps après les dépenses et les contrôles sont stricts. Une petite association a intérêt à passer par une structure intermédiaire ou à commencer par des financements plus simples (commune, CAF, fondations, ARS).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.34

Une association reçoit une proposition de financement sur trois ans : 6 000 € par an, avec un acompte de 30 % au début de chaque année et le solde après justification des dépenses, environ six mois après la fin de l'année. Calculez l'acompte et le solde annuels, puis expliquez la conséquence pour la trésorerie de l'association.

Corrigé

Acompte : 6 000 × 0,30 = 1 800 € au début de chaque année. Solde : 6 000 − 1 800 = 4 200 €, versé environ six mois après la fin de l'année. L'association doit donc avancer 4 200 € de dépenses chaque année, et pendant six

mois de plus le temps du versement. Au début de la deuxième année, elle reçoit l'acompte de la deuxième année alors que le solde de la première n'est pas encore versé : elle doit avoir une trésorerie suffisante ou négocier un calendrier de versement plus favorable, et suivre un plan de trésorerie sur les trois ans.

8.4.5 La gestion des bénévoles

De nombreux projets reposent sur des **bénévoles** (aide en cuisine, accueil, mamans relais). Leur engagement est précieux mais fragile : il suppose un **accueil** (présentation du projet, des règles d'hygiène et de confidentialité), un **rôle clair** (fiche de mission), une **formation** courte, une **reconnaissance** (remerciements, attestation, participation aux temps forts) et un **suivi** (points réguliers). Le bénévolat se valorise dans le budget (comptes 86 et

87. et se distingue du travail salarié : pas de lien de subordination ni de rémunération.

Accueillir des bénévoles : cadre pratique

Les bénévoles apportent du temps, des compétences et un lien avec les habitants. Leur place doit être organisée : un bénévole mal accueilli ou sans rôle précis s'en va ; un bénévole mal assuré expose la structure à des risques.

Question · Réponse pratique

Faut-il un contrat ? — *Réponse pratique :* Non : le bénévolat ne crée pas de lien de subordination. On utilise une **fiche de mission** et, souvent, une **charte du bénévole** signée (valeurs, confidentialité, règles d'hygiène).

Les bénévoles sont-ils assurés ? — *Réponse pratique :* La structure vérifie que son contrat d'assurance couvre la responsabilité civile et les accidents des bénévoles pendant les activités, y compris les trajets si nécessaire.

Peut-on les rembourser ? — *Réponse pratique :* Oui, les frais réellement engagés pour l'association (achats, déplacements) peuvent être remboursés sur justificatifs. Un remboursement forfaitaire sans justificatif risque d'être considéré comme une rémunération.

Que se passe-t-il s'ils renoncent au remboursement ? — *Réponse pratique :* Les frais engagés et non remboursés peuvent être considérés comme un **don** à une association d'intérêt général : ils ouvrent droit à une réduction d'impôt (article 200 du Code général des impôts).

Comment valoriser leur temps ? — *Réponse pratique :* Dans les contributions volontaires en nature du budget (8.3.5), avec un taux horaire justifié.

Exemple – Calcul détaillé : l'abandon de frais d'une bénévole

Une bénévole a engagé 300 € de frais justifiés (achats de denrées et déplacements) pour une association d'intérêt général, qui a constaté ces frais dans ses comptes. Elle renonce par écrit à leur remboursement. L'association lui délivre un reçu fiscal de 300 €. La réduction d'impôt est de 66 % du montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable : 300 × 0,66 = **198 €**. Le coût réel pour la bénévole est de 300 − 198 = **102 €**.

Méthode – Rédiger une fiche de mission de bénévole

1. **Intitulé** de la mission (« aide en cuisine lors des ateliers du jeudi »).
2. **Objectif** de la mission dans le projet.
3. **Activités** confiées, et ce qui n'est pas confié (par exemple : pas de conseil nutritionnel individuel).
4. **Disponibilité** attendue (jour, horaire, fréquence) et durée de l'engagement.
5. **Formation** et accompagnement prévus (hygiène, confidentialité, posture d'écoute).
6. **Référent** de la structure, à contacter en cas de question.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.35

Un bénévole demande à recevoir 20 € par atelier « pour ses frais », sans justificatif. Expliquez pourquoi la structure refuse, puis proposez deux solutions conformes.

Corrigé

Un versement forfaitaire sans justificatif peut être considéré comme une rémunération : le bénévole deviendrait un salarié de fait, avec des obligations sociales pour la structure, et le caractère bénévole serait remis en cause. Solutions : rembourser les frais réels sur présentation de justificatifs (tickets de caisse, trajets déclarés selon les règles de la structure) ; ou proposer au bénévole d'abandonner le remboursement de ses frais justifiés et de recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt de 66 %.

8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Gestion de projet : méthodes prédictives et agiles

La planification présentée (Gantt, PERT) relève des méthodes **prédictives** : on fixe le plan au départ. Les méthodes **agiles** (issues de l'informatique, manifeste agile de 2001) procèdent par **itérations** courtes, avec des retours fréquents des utilisateurs et des ajustements continus. En santé publique, une approche « hybride » est fréquente : un cadre fixé (objectifs, budget, calendrier du financeur) et des séances ajustées après chaque retour des participants (cycle « planifier, faire, vérifier, agir » de Deming, ou PDCA).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Coût, efficience et analyse médico-économique

L'**efficience** rapporte les résultats obtenus aux ressources mobilisées. Les évaluations médico-économiques comparent des interventions : analyse coût-efficacité (coût par unité de résultat, par exemple coût par famille ayant atteint l'objectif), coût-utilité (coût par année de vie

ajustée sur la qualité, QALY), coût-bénéfice (résultats exprimés en euros). Exemple simple : si 9 familles sur 12 atteignent l'objectif « légumes secs », le coût par famille ayant atteint l'objectif est de 3 510 / 9 = **390 €**. Ces calculs restent fragiles à petite échelle, mais ils intéressent de plus en plus les financeurs.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Sociologie de la traduction et partenariats

La **sociologie de la traduction** (Callon, Latour, années 1980) analyse la manière dont un projet « enrôle » des acteurs aux intérêts différents en traduisant le problème dans les termes de chacun (pour l'épicerie : écouler des produits ; pour l'école : associer les parents ; pour l'ARS : réduire les inégalités). Un porteur de projet efficace construit des « points de passage obligés » où les intérêts convergent.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer le coût d'opportunité et le retour social sur investissement

Le **coût d'opportunité** d'un projet est la valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce en y consacrant des ressources (le temps de la diététicienne aurait pu servir à des consultations). Le **retour social sur investissement** (SROI) tente de traduire en valeur monétaire les effets sociaux d'un projet (économies de santé, gain de qualité de vie, réduction du gaspillage) et de les rapporter à l'investissement : un ratio de 3 signifie 3 € de valeur sociale créée pour 1 € investi. La méthode est discutée (choix des valeurs, attribution des effets), mais elle oblige à expliciter la **chaîne des effets** attendus et intéresse les financeurs.

8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Du soin au collectif

Un diététicien libéral, constatant les besoins de ses patients diabétiques, monte avec une maison de santé un programme d'ateliers collectifs financé par l'ARS ; il rédige la réponse à l'appel à projets et un budget incluant ses honoraires d'animation.

Situation bc2 – Budget et restauration

En restauration collective, le diététicien prépare le budget d'une animation « semaine du goût » (denrées, supports, temps de personnel) et suit les écarts entre prévu et réalisé, avec les mêmes outils qu'un projet BC3.

Situation bc3 – Une demande à la conférence des financeurs

Un CCAS sollicite la conférence des financeurs pour des ateliers « bien manger après 60 ans » : le diététicien lit le cahier des charges, vérifie l'éligibilité (public de 60 ans et plus, territoire), adapte les objectifs et construit le budget.

Situation bc3 – Un projet en retard

À mi-parcours, seules 2 des 4 écoles prévues ont commencé les ateliers. Le diététicien analyse les causes (calendrier scolaire, changement de directeur), réunit le COPIL, propose un nouveau calendrier et informe le financeur.

Situation bc3 – Une communication qui ne touche pas le public

Après trois semaines, un atelier n'a que 3 inscrits malgré 500 flyers distribués. Le diététicien analyse les canaux, rencontre l'animatrice du centre social et une association de quartier, forme deux habitantes relais : 11 inscriptions en une semaine.

Situation bc3 – Une subvention versée tardivement

Un projet financé par une fondation doit avancer 2 000 € d'achats avant le versement. Le diététicien établit un plan de trésorerie, propose à la direction un échelonnement des achats et demande un acompte de 30 % au financeur.

Cas guidé : un tiers-lieu nourricier en milieu rural

Ce cas guidé reprend toutes les étapes du chapitre sur un projet complet. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. Les données sont **fictives**.

Document – La situation

La commune de Saint-Aubin-des-Prés compte 1 900 habitants ; le supermarché le plus proche est à 14 km, et le bus ne passe que deux fois par jour. Une association a ouvert dans une ancienne grange un **tiers-lieu** : café associatif, atelier de réparation, cuisine partagée équipée. Un maraîcher bio s'est installé à 3 km. L'association souhaite monter un projet « Cuisiner ensemble à la Grange » pour deux publics : les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules (environ 180 dans la commune) et les parents de jeunes enfants. Une enquête menée par l'association auprès de 64 habitants en 2027 indique que 47 % des plus de 65 ans interrogés mangent seuls tous les soirs et que 38 % des parents déclarent « ne pas savoir quoi cuisiner avec des légumes de saison ». Vous êtes diététicien et vous accompagnez l'association.

Étape 1 – Choisir les stratégies. Quelles stratégies combiner, et pourquoi ?

Réponse commentée – Étape 1

On combine au moins trois stratégies (8.3.1). L'**éducation** : des ateliers culinaires de saison. L'action sur l'**environnement** : un accès facilité aux légumes du maraîcher (paniers à prix solidaire, dépôt à la Grange) et un transport solidaire pour les personnes âgées sans voiture. Le **lien social et la participation** : des repas partagés intergénérationnels, des recettes choisies par les participants. Le diagnostic montre en effet un problème d'accès (distance, transport), de savoir-faire et d'isolement : une seule stratégie ne suffirait pas.

Étape 2 – Formuler un objectif spécifique et deux objectifs opérationnels.

Réponse commentée – Étape 2

Objectif spécifique : « D'ici juin 2028, la moitié des participants au moins déclarent préparer un repas avec des légumes de saison au moins trois fois par semaine. » Objectifs opérationnels : « Organiser 8 ateliers culinaires de 12 participants entre octobre 2027 et mai 2028, avec au moins un tiers de personnes de plus de 65 ans » ; « Mettre en place un dépôt hebdomadaire de paniers du maraîcher à la Grange à partir de novembre 2027 ». Chaque objectif est mesurable, daté et réaliste.

Étape 3 – Identifier les parties prenantes. Citez cinq partenaires et leur rôle.

Réponse commentée – Étape 3

L'association du tiers-lieu (porteur, locaux, bénévoles) ; le maraîcher (produits, visite de l'exploitation, prix solidaire) ; la commune (financement, communication par le bulletin municipal, transport solidaire) ; le CCAS ou le service d'aide à domicile (repérage des personnes âgées isolées) ; la PMI ou le relais petite enfance (repérage des parents). On peut ajouter le projet alimentaire territorial de la communauté de communes, s'il existe (8.4.2), et le centre de ressources du réseau Promotion Santé pour les outils.

Étape 4 – Construire le budget prévisionnel. Données : diététicienne 8 ateliers × 4 h × 45 € ; denrées 8 ateliers × 12 portions × 2,10 € ; petit matériel 650 € ; communication 180 € ; transport solidaire 8 × 35 € ; assurance complémentaire 120 €. Contributions en nature : 3 bénévoles × 3 h × 8 ateliers au taux de 13 € de l'heure (taux fictif) ; cuisine de la Grange, valeur locative 40 € par atelier ; légumes donnés par le maraîcher, 15 € par atelier. Recettes : ARS 1 500 € ; commune 600 € ; fondation 600 € ; participation de 1 € par participant et par atelier.

Réponse commentée – Étape 4

Charges monétaires : diététicienne 8 × 4 × 45 = **1 440 €** ; denrées 8 × 12 × 2,10 = **201,60 €** ; petit matériel **650 €** ; communication **180 €** ; transport 8 × 35 = **280 €** ; assurance **120 €**. Total monétaire : 1 440 + 201,60 + 650 + 180 + 280 + 120 = **2 871,60 €**.

Contributions en nature : bénévoles 3 × 3 × 8 × 13 = **936 €** ; cuisine 8 × 40 = **320 €** ; légumes 8 × 15 = **120 €** ; total **1 376 €**.

Total des charges : 2 871,60 + 1 376 = **4 247,60 €**.

Recettes monétaires : 1 500 + 600 + 600 + 96 (8 × 12 × 1 €) = **2 796 €**. Autofinancement de l'association : 2 871,60 − 2 796 = **75,60 €**. Le budget s'équilibre à 4 247,60 € en ajoutant les 1 376 € de contributions en nature aux recettes (comptes 86 et 87).

Ratios : l'ARS finance 1 500 / 4 247,60 = **35,3 %** du budget total ; les contributions en nature représentent 1 376 / 4 247,60 = **32,4 %** du total, ce qui montre l'importance de l'engagement local. Coût monétaire par participation : 2 871,60 / 96 = **29,91 €**.

Étape 5 – Choisir trois indicateurs de suivi.

Réponse commentée – Étape 5

Un indicateur de **réalisation** : nombre d'ateliers réalisés sur 8 prévus. Un indicateur de **participation** : taux de présence (présences / places proposées). Par exemple, avec 12, 11, 12, 10, 9, 12, 11 et 12 présents, on obtient 89 présences sur 96 places, soit 89 / 96 = **92,7 %**. Un indicateur de **résultat** : part des participants déclarant cuisiner des légumes de saison au moins trois fois par semaine, mesurée par un questionnaire avant et après. On peut ajouter un indicateur sur l'environnement : nombre de paniers vendus chaque semaine au dépôt.

Étape 6 – Repérer deux risques et prévoir leur traitement.

Réponse commentée – Étape 6

Risque 1 : les personnes âgées ne viennent pas faute de transport (probabilité élevée, impact fort). Traitement : transport solidaire organisé avec la commune, inscription par téléphone, rappel la veille. Risque 2 : le financement de l'ARS est notifié tardivement, alors que les achats de matériel ont lieu en octobre (probabilité moyenne, impact moyen). Traitement : plan de trésorerie, demande d'acompte, achat progressif du matériel (8.3.10). On peut aussi citer le risque sanitaire en cuisine partagée (formation hygiène des bénévoles, fiche allergies, 8.3.9).

Étape 7 – Préparer la pérennisation.

Réponse commentée – Étape 7

Former deux bénévoles du tiers-lieu à l'animation d'ateliers simples, avec un livret de recettes de saison construit avec les participants ; présenter le bilan à la commune et au projet alimentaire territorial ; proposer pour l'année suivante un scénario où la diététicienne n'intervient plus qu'à deux ateliers sur huit, et où le dépôt de paniers devient autonome (8.4.3).

Ce que le jury attend sur la conception et le pilotage

À l'épreuve E5, le jury ne vérifie pas seulement que vous connaissez les outils : il vérifie que vous savez les **choisir**, les **justifier** et les **adapter** à votre projet. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes et la manière d'y répondre.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Un lien clair entre le diagnostic et le plan d'action	Chaque action renvoie à une cause identifiée dans l'arbre à problèmes	Des actions choisies « parce que ça marche bien » sans lien avec les constats
Des objectifs bien formulés	Des objectifs mesurables, datés, avec des indicateurs et des cibles	Des objectifs vagues ou confondus avec des activités
Des stratégies combinées	Au moins une action sur l'environnement en plus de l'éducation	Uniquement des ateliers d'information
Un partenariat réel	Des partenaires nommés, avec un rôle précis et un accord écrit	Une liste de structures « à contacter »
Un budget juste et expliqué	Des calculs détaillés, des contributions en nature valorisées, un budget équilibré	Des montants ronds sans justification, un budget déséquilibré
Un pilotage effectif	Un tableau de bord, des écarts repérés, des décisions prises	Un planning théorique jamais confronté au réalisé
Une posture réflexive	Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous changeriez	Un récit sans analyse critique
Le respect de l'éthique	Messages non stigmatisants, consentement, données protégées, absence de conflit d'intérêts	Photos sans accord, outils sponsorisés par une marque

Astuce – Une phrase de justification par choix

Pour chaque choix important (stratégie, méthode, outil, partenaire, indicateur), écrivez une phrase qui commence par « J'ai choisi… parce que… ». Elle oblige à relier le choix au diagnostic, au public ou aux contraintes, et c'est exactement ce que le jury cherche à l'oral.

Erreurs fréquentes – Conception et pilotage du projet

- **Confondre objectif et activité** : « organiser six ateliers » est une activité ; l'objectif dit ce qui change chez le public.
- **Oublier le rendement et le conditionnement** dans les quantités, ce qui fausse les courses et le budget.
- **Mélanger budget et trésorerie** : un budget équilibré n'empêche pas un manque d'argent en cours de projet ; les contributions en nature n'entrent pas dans le plan de trésorerie.
- **Calculer un chemin critique sans vérifier les dépendances** : une tâche oubliée peut changer la durée totale du projet.
- **Négliger le temps** : le temps de préparation, de réunion et de saisie est souvent sous-estimé de moitié ; une marge de 15 à 25 % est prudente.
- **Citer des partenaires sans engagement écrit**, ou accepter un partenaire commercial sans analyser le conflit d'intérêts.
- **Utiliser des messages stigmatisants** (« obèses », « mauvaises habitudes ») ou des images de personnes sans accord écrit.
- **Oublier l'hygiène et les allergènes** dans un atelier culinaire ou un buffet de fin de projet.
- **Ne pas prévoir la suite** : un projet sans relais formé ni scénario de pérennisation s'arrête avec son financement.

8.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concevoir le plan d'action

- **Combiner les stratégies** : éducation + environnement + lien social + participation + plaidoyer + formation de relais.
- **Choisir une action** : cohérence, efficacité (données probantes), adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique.
- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi ; **fiche projet** (F4).
- **Parties prenantes** : matrice pouvoir/intérêt (gérer étroitement, satisfaire, associer, surveiller) ; **RACI** (réalise, approuve, consulté, informé) ; **convention** ; **COPIL** (décide) / comité technique (organise) / comité d'usagers.
- **Financeurs** : ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP), collectivités, CAF, conférence des financeurs (loi du 28 décembre 2015), assurance maladie, mutuelles, fondations ; **appel à projets** : lire le cahier des charges, éligibilité, correspondance aux priorités, dossier complet (Cerfa n° 12156), dépôt avant la date limite, bilan.

À retenir – Planifier, budgéter, piloter

- **Gantt** : tâches × temps, jalons, dépendances. **PERT** : dates au plus tôt (max des fins des antériorités), au plus tard (min des débuts suivants), **marge** = au plus tard – au plus tôt ; **chemin critique** = tâches à marge nulle.
- **Budget** : charges (60, 61-62, 64, 86) = produits (70, 74, 75, 87) ; 86 = 87 ; cofinancement ; quantité × coût unitaire ; coût horaire = coût employeur / heures (151,67 h par mois).
- **Ratios** : part d'un financeur, part du personnel, coût par participant, coût par heure.
- **Écarts** : réalisé – prévu ; écart / prévu × 100 ; expliquer les écarts.
- **Pilotage** : tableau de bord (activité, présence, budget, délais) ; **risques** : criticité = probabilité × gravité ; réunion avec ordre du jour, décisions et relevé d'actions.

À retenir – Compléments : communication, pédagogie, logistique, trésorerie, dossier

- **Plan de communication** (F10) : objectifs, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation ; relais humains souvent plus efficaces que les supports ; coût par contact.
- **Méthodes pédagogiques** : expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative ; choisir selon le type d'objectif ; la « pyramide de l'apprentissage » est un mythe.
- **Logistique** : quantité brute = quantité nette × coefficient / rendement ; check-list avant, jour J, après.
- **Trésorerie** : solde = solde précédent + encaissements − décaissements ; besoin maximal ; acompte, échelonnement.
- **Dossier de financement** : constats chiffrés, politiques, objectifs SMART, actions, participation, évaluation, budget cofinancé, pérennisation.

8.8 Entraînement

8.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une action sur l'environnement alimentaire :

a) mettre l'eau en carafe à la cantine **b)** une conférence sur le sucre **c)** un partenariat avec une épicerie solidaire **d)** un quiz sur les repères

QCM 2 – La méthode QQOQCCP permet :

a) de décrire précisément une action **b)** de calculer un budget **c)** de vérifier qu'aucune dimension n'est oubliée **d)** de prioriser des problèmes

QCM 3 – Dans la matrice pouvoir/intérêt, les familles du public :

a) ont généralement un intérêt fort **b)** sont à associer et tenir informées **c)** sont à surveiller seulement **d)** peuvent siéger dans un comité d'usagers

QCM 4 – Dans une matrice RACI :

a) R = réalise **b)** A = approuve (une seule personne par tâche) **c)** C = contrôle **d)** I = informé

QCM 5 – Le comité de pilotage :

a) décide des orientations **b)** se réunit chaque jour **c)** valide les étapes et le budget **d)** peut inclure des usagers

QCM 6 – Le fonds d'intervention régional :

a) est géré par l'ARS **b)** finance des actions de prévention **c)** est prévu par le Code de la santé publique **d)** est réservé aux hôpitaux

QCM 7 – La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie :

a) concerne les 60 ans et plus **b)** a été créée par la loi du 28 décembre 2015 **c)** finance les crèches **d)** lance des appels à projets départementaux

QCM 8 – Le chemin critique :

a) est la suite de tâches sans marge **b)** détermine la durée minimale du projet **c)** contient les tâches les moins importantes **d)** se calcule avec un réseau PERT

QCM 9 – Si A dure 2 semaines, B 3 semaines (après A) et C 4 semaines (après A), et D (2 semaines) suit B et C, la durée minimale est :

a) 7 semaines **b)** 8 semaines **c)** 11 semaines **d)** 9 semaines

QCM 10 – Un budget prévisionnel associatif :

a) doit être équilibré **b)** présente les contributions en nature aux comptes 86 et 87 **c)** peut être financé à 100 % par un seul financeur sans difficulté **d)** distingue charges et produits

QCM 11 – Les charges de personnel figurent au compte :

a) 60 **b)** 62 **c)** 64 **d)** 74

QCM 12 – Une subvention de l'ARS figure au compte :

a) 70 **b)** 74 **c)** 86 **d)** 87

QCM 13 – Un poste prévu à 400 € et réalisé à 460 € présente un écart de :

a) + 60 € **b)** + 15 % **c)** + 13 % **d)** − 60 €

QCM 14 – Dans une matrice des risques, la criticité :

a) = probabilité × gravité **b)** = probabilité + gravité **c)** permet de hiérarchiser les risques **d)** dispense de traiter les risques graves peu probables

QCM 15 – Le compte rendu d'une réunion de pilotage contient :

a) les présents et excusés **b)** les décisions prises **c)** le relevé des actions (qui, quoi, quand) **d)** la retranscription mot à mot des échanges

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **a, c**. 3. **a, b, d**. 4. **a, b, d**. 5. **a, c, d**. 6. **a, b, c**. 7. **a, b, d**. 8. **a, b, d**. 9. **b** (A 2 + max(B 3 ; C 4) + D 2 = 2 + 4 + 2 = 8). 10. **a, b, d**. 11. **c**. 12. **b**. 13. **a, b** (60 / 400 × 100 = 15 %). 14. **a, c**. 15. **a, b, c**.

QCM 16 – Un plan de communication précise :

a) les cibles **b)** les messages **c)** les canaux et le calendrier **d)** les valeurs nutritionnelles des recettes

QCM 17 – Pour obtenir 900 g de carottes épluchées avec un rendement de 85 %, il faut acheter environ :

a) 765 g **b)** 900 g **c)** 1 059 g **d)** 1 500 g

QCM 18 – Un problème de trésorerie peut survenir :

a) même si le budget est équilibré **b)** quand les subventions sont versées après les dépenses **c)** uniquement si le budget est déficitaire **d)** quand le solde mensuel devient négatif

QCM 19 – Une méthode démonstrative :

a) consiste à montrer un geste puis à le faire reproduire **b)** convient aux savoir-faire **c)** se limite à un exposé **d)** peut être utilisée pour la cuisson des légumes secs

QCM 20 – Les bénévoles d'un projet :

a) sont valorisés aux comptes 86 et 87 **b)** sont rémunérés **c)** ont besoin d'une mission claire et d'une reconnaissance **d)** ne sont pas concernés par les règles d'hygiène

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b, c. 17. **c** (900 / 0,85). 18. **a, b, d**. 19. **a, b, d**. 20. **a, c**.

8.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : la matrice pouvoir/intérêt

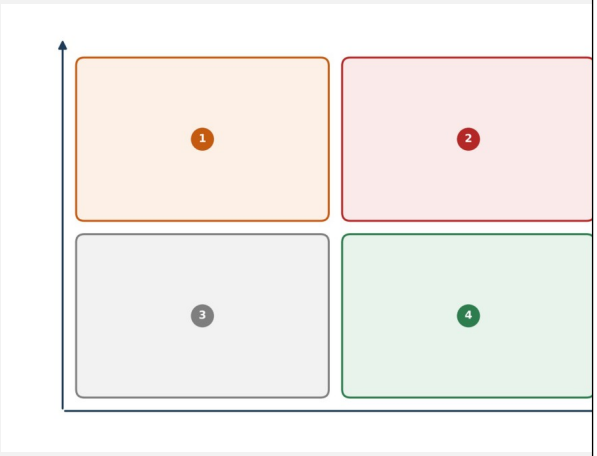


Figure 8.6 – Schéma à légender

Nommez les quadrants 1 à 4 (stratégie à adopter) et placez : a) le maire adjoint à la santé ; b) les parents d'élèves ; c) l'ARS ; d) la boulangerie du quartier ; e) la directrice de l'école partenaire.

Corrigé

1. Satisfaire (pouvoir fort, intérêt faible) : a) le maire adjoint (s'il ne suit pas le projet de près). 2. **Gérer étroitement** : c) l'ARS (financeur) ; e) la directrice de l'école (si l'action s'y déroule). 3. **Surveiller** : d) la boulangerie. 4. **Associer, tenir informés** : b) les parents. Le placement peut varier selon le contexte : il se justifie.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la matrice des risques

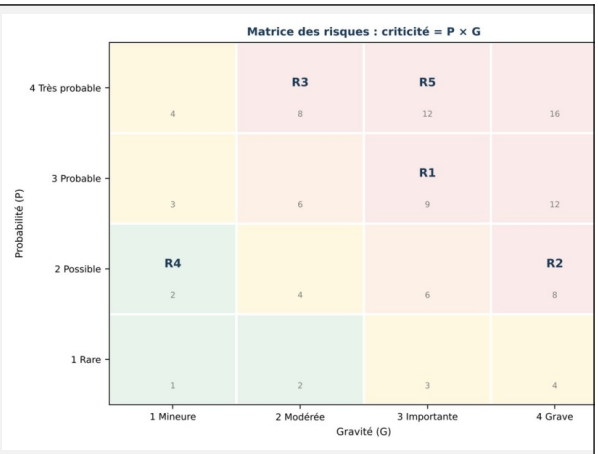


Figure 8.7 – Schéma à légender

Identifiez les risques R1 à R5 placés sur la matrice (probabilité, gravité), calculez leur criticité et classez-les.

Corrigé

R1 (P 3, G 3) = **9** ; R2 (P 2, G 4) = **8** ; R3 (P 4, G 2) = **8** ; R4 (P 2, G 1) = **2** ; R5 (P 4, G 3) = **12**. Classement : R5 > R1 > R2 = R3 > R4. R2 (allergie), grave, est traité en priorité malgré sa probabilité moyenne.

À vous de jouer – Exercice 3 – Réseau PERT

Un projet comprend : A recrutement des participants (2 sem.) ; B formation des animateurs (3 sem.) ; C préparation des supports (2 sem., après B) ; D atelier pilote (1 sem., après A et C) ; E ajustements (1 sem., après D) ; F cycle d'ateliers (8 sem., après E). Calculez les dates au plus tôt, la durée minimale, le chemin critique et la marge de A.

Corrigé

A : 0 → 2. B : 0 → 3. C : 3 → 5. D : début max(2 ; 5) = 5 → 6. E : 6 → 7. F : 7 → **15**. Durée minimale : **15 semaines**. Chemin critique : **B → C → D → E → F** (3 + 2 + 1 + 1 + 8 = 15). A : au plus tard, doit finir à 5 (début de D), donc commencer à 3 ; marge = 3 − 0 = **3 semaines**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Construire un budget prévisionnel

Construisez le budget équilibré d'un cycle de 8 ateliers pour 10 seniors : denrées 2,50 € par personne et par atelier ; diététicienne 8 ateliers × 3 h à 40 €/h ; supports 120 € ; assurance 60 € ; salle prêtée par la mairie (valorisée 25 € par atelier) ; bénévolat 16 h à 12 €/h. Produits : conférence des financeurs 1 200 € ; caisse de retraite 400 € ; participation 1 € par personne et par atelier.

Corrigé

Charges : denrées 2,50 × 10 × 8 = **200 €** ; diététicienne 8 ×

3 × 40 = **960 €** ; supports **120 €** ; assurance **60 €** ; salle (86) 25 × 8 = **200 €** ; bénévolat (86) 16 × 12 = **192 €** ; total = 200 + 960 + 120 + 60 + 200 + 192 = **1 732 €**. **Produits** : conférence des financeurs **1 200 €** ; caisse de retraite **400 €** ; participation 1 × 10 × 8 = **80 €** ; contributions en nature (87) 200 + 192 = **392 €** ; sous-total = 1 200 + 400 + 80 + 392 = 2 072 €. **Constat** : les produits dépassent les charges de 2 072 − 1 732 = **340 €** : le budget n'est pas équilibré. Il faut **réduire la demande** à la conférence des financeurs à 1 200 − 340 = **860 €** (ou ajouter des charges justifiées, par exemple du temps de coordination). Budget équilibré : 1 732 € = 860 + 400 + 80 + 392.

À vous de jouer – Exercice 5 – Calculer un coût horaire

Une animatrice est payée 1 900 € bruts par mois ; la structure indique un taux de charges patronales de 40 %. Calculez son coût horaire et le coût de 25 h consacrées au projet.

Corrigé

Coût employeur : 1 900 × 1,40 = **2 660 €** ; heures mensuelles : 151,67 ; coût horaire : 2 660 / 151,67 = **17,54 €** ; 25 h : 25 × 17,54 = **438,50 €**.

À vous de jouer – Exercice 6 – Analyser des écarts

Prévu / réalisé : denrées 300 / 342 ; impression 150 / 120 ; intervenant 800 / 800 ; déplacements 100 / 64. Calculez les écarts en euros et en pourcentage, le total, et commentez.

Corrigé

Denrées : + 42 € ; 42 / 300 × 100 = **+ 14,0 %**. Impression : − 30 € ; − 30 / 150 × 100 = **− 20,0 %**. Intervenant : **0**. Déplacements : − 36 € ; − 36 / 100 × 100 = **− 36,0 %**. Total prévu : 300 + 150 + 800 + 100 = **1 350 €** ; réalisé : 342 + 120 + 800 + 64 = **1 326 €** ; écart : − 24 €, soit − 24 / 1 350 × 100 = **− 1,8 %**. Commentaire : budget respecté globalement ; hausse des denrées (prix, participants supplémentaires ?) compensée par les économies d'impression et de déplacements ; écarts à expliquer dans le compte rendu financier.

À vous de jouer – Exercice 7 – Lire un cahier des charges

Extrait d'un appel à projets ARS : « Publics prioritaires : enfants de 0 à 6 ans et leurs parents résidant en QPV ; actions de plus de 3 séances ; cofinancement obligatoire ; montant maximal 5 000 € et 70 % du coût total ; exclus : actions ponctuelles, achat de matériel au-delà de 10 % du budget. » Un projet de 6 ateliers pour des parents d'enfants de 3 à 10 ans d'un QPV coûte 4 800 €, dont 700 € de matériel. Vérifiez l'éligibilité et calculez le montant maximal sollicitable.

Corrigé

Public : enfants de 3 à 10 ans → **partiellement** hors cible (0-6 ans) : recentrer sur les parents d'enfants de 3 à 6 ans ou justifier. Nombre de séances : 6 > 3 . Matériel : 700 / 4 800 × 100 = **14,6 %** > 10 % → **non conforme** : ramener le matériel à 480 € au plus (10 % × 4 800). Montant maximal : 70 % × 4 800 = **3 360 €** (< 5 000 €) ; cofinancement minimal : 4 800 − 3 360 = **1 440 €**.

À vous de jouer – Exercice 8 – Rédiger une fiche action avec le QQOQCCP

Rédigez la fiche action d'une visite accompagnée du marché pour 10 familles.

Corrigé

Quoi : visite accompagnée du marché, repérage des produits de saison et des prix. **Qui** : 10 familles inscrites ; diététicienne et référente ; placier du marché informé. **Où** : marché du centre-ville (2,5 km), trajet en bus. **Quand** : samedi 25 mars, 9 h 30 – 11 h 30. **Comment** : jeu de piste « 5 légumes de saison à moins de 2 €/kg », relevé de prix, achat collectif avec 15 € pour l'atelier suivant, retour avec recettes. **Combien** : 2 animatrices × 4 h ; tickets de bus 10 × 2 × 1,60 € = 32 € ; 15 € de denrées. **Pourquoi** : objectif spécifique 3 (connaître et utiliser l'offre à petit prix).

À vous de jouer – Exercice 9 – Matrice RACI

Construisez la matrice RACI de la préparation d'un atelier (achats, fiche technique, communication, accueil, évaluation) pour : diététicienne, animatrice, étudiante, directrice.

Corrigé

Achats : étudiante R, animatrice C, directrice A, diététicienne I. Fiche technique : étudiante R, diététicienne A (validation technique), animatrice C. Communication : animatrice R, étudiante C, directrice A. Accueil : animatrice R, étudiante R, directrice A (une seule personne A). Évaluation : étudiante R, diététicienne C, directrice A, animatrice I.

À vous de jouer – Exercice 10 – Tableau de bord

À mi-parcours d'un projet de 10 ateliers pour 15 personnes : 5 ateliers réalisés, 58 présences, 2 300 € dépensés sur 5 200 €. Calculez les indicateurs et commentez.

Corrigé

Ateliers : 5 / 10 = **50 %** (conforme au temps écoulé). Présences : 58 / (5 × 15) = 58 / 75 × 100 = **77,3 %** (légèrement sous l'objectif usuel de 80 % : relancer, analyser les absences). Budget : 2 300 / 5 200 × 100 = **44,2**

% (légère sous-consommation, à surveiller : dépenses à venir ? économies ?).

8.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi les financeurs exigent-ils un cofinancement ?

Corrigé

Pour partager le risque, vérifier l'ancrage local du projet (d'autres acteurs y croient), éviter la dépendance à un seul financeur, favoriser la pérennisation et multiplier les projets financés avec une enveloppe limitée.

À vous de jouer – Question 2

Un projet très bien planifié peut-il échouer ?

Corrigé

Oui, si le diagnostic était erroné, si le public n'a pas été associé, si les partenaires ne s'engagent pas, si un risque n'a pas été anticipé ou si le plan est appliqué sans écoute des participants. Le pilotage (suivi, ajustements) et la participation sont aussi importants que la planification.

À vous de jouer – Question 3

Faut-il valoriser le bénévolat dans le budget ?

Corrigé

Oui : il montre la contribution réelle des acteurs (habitants, bénévoles), donne une image juste du coût du projet et renforce le dossier (ancrage local) ; il s'inscrit aux comptes 86 et 87, pour le même montant, sans effet sur la trésorerie.

8.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le projet « Petit-déjeuner pour tous » d'un collège en REP

Un collège de réseau d'éducation prioritaire (480 élèves) veut proposer un petit-déjeuner éducatif deux matins par semaine pendant 24 semaines pour les élèves de 6e (120 élèves, participation estimée à 60 %), avec 6 ateliers parents. Ressources : agents de restauration (3 h par matin à 20 €/h), infirmière (temps institutionnel non valorisé), diététicienne (6 ateliers × 2 h + 10 h de préparation à 40 €/h). Coût des denrées : 0,80 € par petit-déjeuner. Supports : 300 €.

1. Identifiez les parties prenantes et placez-les sur la matrice pouvoir/intérêt.
2. Calculez le nombre de petits-déjeuners servis et le budget prévisionnel des charges.
3. Proposez un plan de financement équilibré (au moins 3 financeurs) et calculez la part de chacun.
4. Construisez le Gantt simplifié (préparation, lancement, ateliers parents, évaluation).
5. Identifiez trois risques, évaluez leur criticité et proposez des mesures.

Corrigé

1. Gérer étroitement : principal, infirmière, gestionnaire, ARS ou collectivité financeuse. Satisfaire : département (propriétaire du collège, restauration), rectorat. Associer : élèves (délégués), parents, agents de restauration. Surveiller : fournisseurs.
2. Élèves participants : 120 × 0,60 = **72** ; matins : 2 × 24 = **48** ; petits-déjeuners : 72 × 48 = **3 456**. Denrées : 3 456 × 0,80 = **2 764,80 €**. Agents : 48 × 3 × 20 = **2 880 €**. Diététicienne : (6 × 2 + 10) × 40 = 22 × 40 = **880 €**. Supports : **300 €**. Total charges : 2 764,80 + 2 880 + 880 + 300 = **6 824,80 €**.
3. Exemple : département 2 880 € (temps des agents : 42,2 %) ; ARS (FIR) 2 500 € (36,6 %) ; programme national de petits-déjeuners à l'école, ou commune, 1 144,80 € (16,8 %) ; collège (fonds propres) 300 € (4,4 %) ; total 6 824,80 € . Calculs : 2 880 / 6 824,80 = 42,2 % ; 2 500 / 6 824,80 = 36,6 % ; 1 144,80 / 6 824,80 = 16,8 % ; 300 / 6 824,80 = 4,4 %.
4. Mai-juin : diagnostic et conventions ; septembre : achats, information des familles, formation des agents ; octobre à avril : petits-déjeuners (24 semaines hors vacances) ; ateliers parents en novembre, janvier, février, mars, avril, mai ; mai-juin : évaluation et bilan au COPIL.
5. Faible participation des élèves (P 3, G 3 = 9 : horaires de bus, communication par les délégués) ; allergies (P 2, G 4 = 8 : PAI, liste des allergènes) ; absence d'agents (P 2, G 3 = 6 : planning de remplacement).

8.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous choisi vos partenaires ? »

Corrigé

À partir du diagnostic (ressources du territoire) et de la matrice pouvoir/intérêt ; j'ai retenu ceux dont la mission rejoignait nos objectifs (l'épicerie pour l'accès aux légumes secs) et formalisé leur engagement dans une convention.

Mise en situation – MSE 2

La date limite de l'appel à projets est dans 5 jours et le budget n'est pas équilibré.

Corrigé

J'identifie l'écart, j'ajuste le montant sollicité ou l'autofinancement avec la direction, je vérifie que chaque ligne est justifiée, je fais relire et je dépose au moins un jour avant la date limite.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Qu'est-ce que le chemin critique ? »

Corrigé

C'est la suite des tâches sans marge qui détermine la durée minimale du projet ; tout retard sur l'une d'elles retarde l'ensemble. Dans mon projet, c'était le dépôt du dossier, la préparation des ateliers et le cycle d'ateliers.

Mise en situation – MSE 4

Un partenaire ne vient plus aux réunions.

Corrigé

Je le contacte pour comprendre (disponibilité, intérêt), je lui propose une forme de participation plus légère (point téléphonique, compte rendu), je lui montre ce que le projet lui apporte ; si besoin, j'ajuste la convention.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Pourquoi avez-vous valorisé le bénévolat ? »

Corrigé

Pour montrer la contribution réelle des mamans relais et le coût complet du projet ; elle figure aux comptes 86 et 87 pour le même montant, sans effet sur la trésorerie.

Mise en situation – MSE 6

Le financeur vous demande pourquoi vous avez dépensé 12 % de plus en denrées.

Corrigé

J'explique la cause (hausse des prix des fruits), je montre la compensation par d'autres postes et l'écart global de 2,3 %, avec le tableau prévu/réalisé.

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Quelle différence entre le COPIL et le comité technique ? »

Corrigé

Le COPIL décide (orientations, validation, budget) et se réunit peu ; le comité technique organise et met en œuvre, avec des réunions fréquentes.

Mise en situation – MSE 8

Une animatrice tombe malade la veille d'un atelier.

Corrigé

J'applique le plan prévu : binôme de remplacement qui dispose du conducteur et de la fiche technique ; sinon, je réduis l'atelier à un format réalisable en sécurité ou je reporte en prévenant les familles.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Qui a financé votre projet ? »

Corrigé

L'ARS (FIR) pour 42,7 %, la commune, la CAF, la participation des familles, l'autofinancement du centre social et des contributions en nature ; 71,2 % de financements publics.

Mise en situation – MSE 10

Le jury : « Votre projet est-il pérenne ? »

Corrigé

Des relais ont été formés (référente, mamans relais), les conducteurs et le livret sont réutilisables, l'action est inscrite au projet du centre social et une nouvelle demande est prévue dans le cadre du CLS.

Mise en situation – MSE 11

Une entreprise propose de financer tout le projet.

Corrigé

J'analyse le conflit d'intérêts (chapitre 6) et je préfère un cofinancement diversifié ; si le mécénat est accepté, c'est sans contrepartie sur le contenu, avec une convention et une mention transparente.

Mise en situation – MSE 12

Le jury : « Comment avez-vous suivi votre projet ? »

Corrigé

Avec un tableau de bord hebdomadaire (ateliers réalisés,

présences, budget consommé, supports), une matrice des risques et trois réunions du COPIL avec comptes rendus et relevés d'actions.

8.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Schéma à légender : le plan de communication




Figure 8.10 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 6, puis complétez-les pour un atelier « goûters » destiné aux parents d'une école.

Corrigé

1. Objectifs : 15 inscriptions. 2. **Cibles** : parents de l'école, enseignants (relais). 3. **Messages** : « Des goûters maison, bons et pas chers : venez les préparer avec nous ». 4. **Canaux** : cahier de liaison, affichage à l'entrée, mot des enseignants, parents relais. 5. **Calendrier** : 3 semaines avant, rappel la veille. 6. **Budget et évaluation** : impression 20 € ; inscriptions par canal.

À vous de jouer – Exercice 12 – Efficacité des canaux

Origine de 40 inscriptions : réseaux sociaux de la mairie 6 ; affiche en pharmacie 3 ; médecins et infirmières 9 ; associations de quartier 15 ; bouche-à-oreille 7. Calculez les parts et le coût par inscription de la campagne d'affichage (12 affiches, 54 € d'impression) et des réseaux sociaux (publication sponsorisée : 60 €).

Corrigé

Vérification : 6 + 3 + 9 + 15 + 7 = **40**. Parts : réseaux **15 %** ; affiches **7,5 %** ; soignants **22,5 %** ; associations **37,5 %** ; bouche-à-oreille **17,5 %**. Coût par inscription : affiches 54 / 3 = **18 €** ; réseaux 60 / 6 = **10 €**. Les relais humains (associations, soignants, bouche-à-oreille) apportent 31 / 40 = **77,5 %** des inscriptions.

À vous de jouer – Exercice 13 – Quantités brutes

Pour 30 portions d'une soupe (recette pour 6 : 600 g de potiron épluché, 200 g de pommes de terre épluchées, 100 g d'oignon épluché), calculez les quantités brutes (rendements : potiron 70 %, pommes de terre 80 %, oignon 90 %) et le coût (potiron 1,80 €/kg ; pommes de terre 1,30 €/kg ; oignons 1,60 €/kg).

Corrigé

Coefficient : 30 / 6 = **5**. Potiron : 600 × 5 / 0,70 = 3 000 / 0,70 = **4 286 g** ; pommes de terre : 200 × 5 / 0,80 = 1 000 / 0,80 = **1 250 g** ; oignon : 100 × 5 / 0,90 = 500 / 0,90 = **556 g**. Coût : 4,286 × 1,80 = **7,71 €** ; 1,25 × 1,30 = **1,63 €** ; 0,556 × 1,60 = **0,89 €** ; total **10,23 €**, soit 10,23 / 30 = **0,34 €** la portion (hors bouillon et épices).

À vous de jouer – Exercice 14 – Plan de trésorerie

Un projet : trésorerie de départ 300 € ; dépenses : sept. 400, oct. 600, nov. 600, déc. 300 ; recettes : oct. 500 (commune), janv. 1 500 (fondation). Calculez les soldes de fin de mois de septembre à janvier et le besoin maximal.

Corrigé

Sept. : 300 − 400 = **− 100** ; oct. : − 100 + 500 − 600 = **− 200** ; nov. : − 200 − 600 = **− 800** ; déc. : − 800 − 300 = **− 1 100** ; janv. : − 1 100 + 1 500 = **400**. Besoin maximal : **1 100 €** fin décembre ; solutions : acompte de la fondation, décalage des achats, trésorerie de la structure.

À vous de jouer – Exercice 15 – Choisir des méthodes

Pour chaque objectif, proposez une méthode et un outil : a) citer 3 sources de protéines végétales ; b) savoir cuire des pois chiches secs ; c) oser goûter un légume inconnu ; d) analyser une publicité pour des céréales.

Corrigé

a) Méthode interrogative : jeu de cartes-aliments à classer. b) Démonstrative puis active : trempage et cuisson en atelier, fiche en photos. c) Active, sans pression : dégustation à l'aveugle, vocabulaire sensoriel, modèle de l'animateur qui goûte. d) Active et coopérative : analyse en groupes avec une grille (biais, cibles, allégations), restitution.

À vous de jouer – Exercice 16 – Analyser un dossier de financement

Un dossier contient : « Les enfants mangent mal. Nous voulons sensibiliser les familles. Budget : 5 000 € demandés à l'ARS. » Listez 6 faiblesses et proposez une réécriture du premier paragraphe.

Corrigé

Faiblesses : constat sans donnée ni source ; jugement stigmatisant ; objectif non SMART (« sensibiliser ») ; pas d'actions décrites ; pas d'évaluation ; budget non détaillé et financé à 100 % par un seul financeur ; pas de partenaires ni de pérennisation. Réécriture : « Dans les

> deux écoles du quartier X (420 élèves), 13 % des enfants de grande section sont en surpoids contre 8 % dans le département (santé scolaire, 2026) ; 46 % des parents interrogés (n = 62) déclarent que leurs enfants boivent une boisson sucrée chaque jour. »

8.9 Glossaire

Terme	Définition
Appel à projets	Procédure par laquelle un financeur sélectionne des projets selon un cahier des charges
Autofinancement	Part du budget financée par les fonds propres du porteur
Cahier des charges	Document fixant priorités, publics, critères, montants et calendrier d'un appel à projets
Chemin critique	Suite des tâches sans marge déterminant la durée minimale du projet
Cofinancement	Financement d'un projet par plusieurs financeurs
Comité de pilotage (COPIL)	Instance de décision d'un projet
Contributions volontaires en nature	Bénévolat, prêts de locaux, dons valorisés (comptes 86 et 87)
Convention de partenariat	Document écrit fixant les engagements des partenaires
Criticité	Produit de la probabilité et de la gravité d'un risque
Diagramme de Gantt	Représentation des tâches sur une échelle de temps
FIR	Fonds d'intervention régional géré par l'ARS (art. L. 1435-8 CSP)
Jalon	Date clé d'un projet (dépôt, lancement, comité)
Marge	Retard possible d'une tâche sans retarder le projet
Matrice pouvoir/intérêt	Outil de classement des parties prenantes
Partie prenante	Acteur concerné par le projet ou pouvant l'influencer
PERT	Réseau des tâches et de leurs antériorités
Pilotage	Suivi, anticipation, décision et compte rendu tout au long du projet
QQOQCCP	Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi
RACI	Réalise, approuve, consulté, informé
Tableau de bord	Ensemble d'indicateurs de suivi mis à jour régulièrement
Acompte	Versement partiel d'une subvention avant la fin de l'action
Coût par contact	Coût d'un support de communication rapporté au nombre de contacts obtenus
Méthode démonstrative	Méthode pédagogique où l'on montre un geste avant de le faire reproduire
Plan de communication	Organisation des objectifs, cibles, messages, canaux, calendrier et budget de la communication
Plan de trésorerie	Prévision mois par mois des encaissements, décaissements et du solde
Rendement (culinaire)	Part comestible d'un produit après épluchage, parage ou cuisson
SROI	Retour social sur investissement : valeur sociale créée rapportée à l'investissement

8.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Stratégies, données probantes	[1] Charte d'Ottawa ; [2] Santé publique France, interventions probantes
Partenariat, parties prenantes	[3] Mendelow ; [4] Callon
Financements	[5] CSP L. 1435-8 ; [6] loi du 28 décembre 2015 ; [7] Cerfa 12156 ; [8] Le Compte Asso
Planification	[9] Gantt ; [10] PERT (US Navy)
Budget	[11] Plan comptable associatif (règlement ANC 2018-06)
Démarche qualité	[12] INPES guide d'autoévaluation ; [13] Deming

8.12 Bibliographie numérotée

1. OMS. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*. 1986.

2. Santé publique France. *Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé*, *santepubliquefrance.fr*.

3. Mendelow A. « Stakeholder mapping ». *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*, Cambridge (MA), 1991.

4. Callon M. « Éléments pour une sociologie de la traduction ». *L'Année sociologique*, 1986, 36, p. 169-208.

5. Code de la santé publique, article L. 1435-8 (fonds d'intervention régional).

6. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

7. Formulaire Cerfa n° 12156 « Demande de subvention(s) » des associations, *service-public.fr*.

8. Le Compte Asso, *lecompteasso.associations.gouv.fr*.

9. Gantt H. L. *Work, Wages and Profits*. New York, 1910.

10. Malcolm D. G. et coll. « Application of a technique for research and development program evaluation » (PERT). *Operations Research*, 1959, 7 (5), p. 646-669.

11. Autorité des normes comptables. Règlement n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

12. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ?* 2009.

13. Deming W. E. *Out of the Crisis*. MIT Press, 1986.

14. Santé publique France. *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. 2018.

15. Masters K. « Edgar Dale's Pyramid of Learning in medical education: a literature review ». *Medical Teacher*, 2013, 35 (11), e1584-e1593.

16. Social Value International. *A Guide to Social Return on Investment*. 2012.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 8.2.2)

17. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 8



Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 8

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 8

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action, pilotage, appels à projets et parties prenantes

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 8

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (2); Stratégies; Partenaires; Financements; Calendrier; Budget; Pilotage

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ; décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ; identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ; connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ; planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ; construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé.

Contenu. 1. Les définitions à savoir ; 2. Les outils ; 3. Les formules ; 4. Les financeurs ; 5. Les pièges ; 6. Auto-test ; 7. Flashcards ; Compléments du chapitre enrichi ; O8.1 – Fiche action QQOQCCP ; O8.2 – Cartographie des parties prenantes.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ;

■ décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ;

■ identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ;

■ connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ;

■ planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ;


Sommaire

Fiche de révision du chapitre 8 70
1. Les définitions à savoir 70
2. Les outils 70
3. Les formules 70
4. Les financeurs 71
5. Les pièges 71
6. Auto-test 71
7. Flashcards 71
Compléments du chapitre enrichi 71

Fiches-outils du chapitre 8 71
O8.1 – Fiche action QQOQCCP 71
O8.2 – Cartographie des parties prenantes 71
O8.3 – Matrice RACI 71
O8.4 – Analyse d'un cahier des charges 71
O8.5 – Calcul PERT 72
O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé 72
O8.7 – Registre des risques 72
O8.8 – Compte rendu de réunion 72

Fiche de révision du chapitre 8

Démarche de projet (2) : plan d'action, partenaires, financements, pilotage

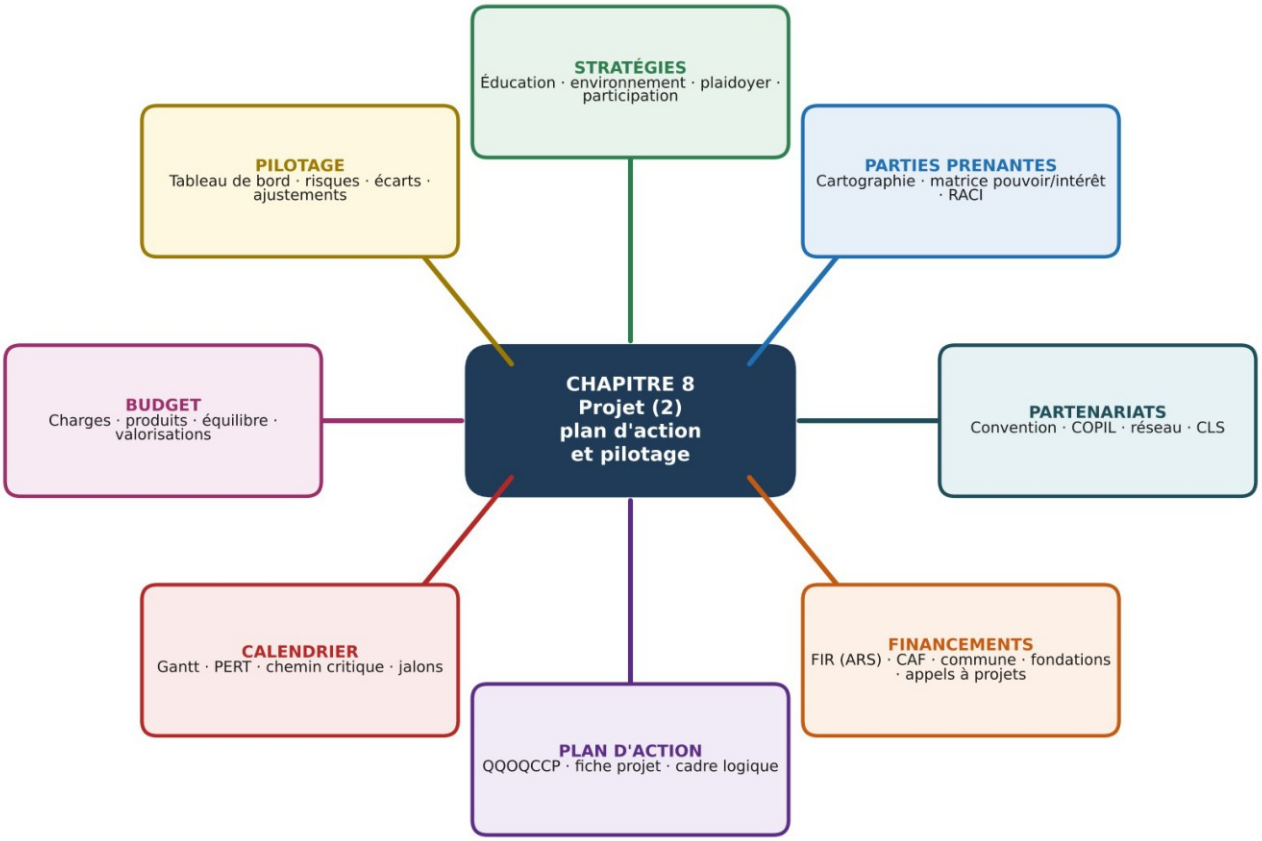

Carte mentale du chapitre 8

1. Les définitions à savoir

Notion · Définition
Partie prenante / partenaire — *Définition :* Acteur concerné ou influent / acteur qui s'engage avec des ressources
COPIL / comité technique — *Définition :* Décide / organise et met en œuvre
Appel à projets — *Définition :* Sélection de projets selon un cahier des charges
Chemin critique — *Définition :* Tâches à marge nulle ; fixe la durée minimale
Marge — *Définition :* Date au plus tard − date au plus tôt
Criticité — *Définition :* Probabilité × gravité
Contributions en nature — *Définition :* Comptes 86 (charges) = 87 (produits)

2. Les outils

- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi.
- **Matrice pouvoir/intérêt** : gérer étroitement · satisfaire · associer · surveiller.
- **RACI** : réalise · approuve (un seul) · consulté · informé.
- **Gantt** (tâches × temps, jalons) et **PERT** (antériorités, chemin critique).
- **Budget** : charges 60, 61-62, 64, 86 / produits 70, 74, 75, 87 ; équilibre ; cofinancement.
- **Tableau de bord** : ateliers, présences, budget consommé, délais.
- **Matrice des risques** : P × G de 1 à 16.

3. Les formules

Calcul · Formule et exemple
Ligne de budget — *Formule et exemple :* quantité × coût unitaire : 40 h × 38 € = 1 520 €
Coût horaire — *Formule et exemple :* coût employeur / 151,67 h : 2 840 / 151,67 = 18,73 €
Autofinancement — *Formule et exemple :* charges − autres produits : 3 510 − 3 094 = 416 €
Part d'un financeur — *Formule et exemple :* montant / total × 100 : 1 500 / 3 510 = 42,7 %
Écart budgétaire — *Formule et exemple :* (réalisé − prévu) / prévu × 100 : 26,40 / 210 = + 12,6 %
Date au plus tôt — *Formule et exemple :* max des fins des antériorités
Taux de présence — *Formule et exemple :* présences / (séances × inscrits) : 31 / 36 = 86,1 %

4. Les financeurs

ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP) · collectivités (CLS, contrat de ville, PAT) · CAF · conférence des financeurs (60 ans et plus, loi du 28/12/2015) · assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite · fondations (vigilance conflits d'intérêts).

5. Les pièges

Attention

- Budget non équilibré ou 86 ≠ 87.
- Un seul financeur à 100 %.
- Plusieurs personnes « A » dans la RACI.
- Oublier les contraintes du calendrier (vacances, Ramadan, stage).
- Ne pas expliquer les écarts budgétaires.
- Déposer le dossier le dernier jour.

6. Auto-test

1. Que signifie QQOQCCP ? 2. Article du FIR ? 3. Public de la conférence des financeurs ? 4. Formule de la criticité ? 5. Comment calcule-t-on une date au plus tôt ? 6. Compte des subventions ? 7. Compte du personnel ? 8. Coût horaire de 2 660 € par mois ? 9. Rôle du COPIL ? 10. Que contient un compte rendu ?

Réponses : 1. Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi – 2. L. 1435-8 CSP – 3. 60 ans et plus – 4. Probabilité × gravité – 5. Maximum des fins des tâches antérieures – 6. 74 – 7. 64 – 8. 2 660 / 151,67 = 17,54 € – 9. Décider – 10. Présents, décisions, relevé d'actions.

7. Flashcards

Recto : Cadre logique ? · Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses

Recto : Cerfa des subventions ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : n° 12156 (ou plateforme Le Compte Asso)

Recto : CPOM ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

Recto : PDCA ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : Planifier, faire, vérifier, agir (Deming)

Recto : Coût par résultat ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : 3 510 / 9 familles = 390 € (efficience)

Recto : Pérennisation ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : Relais formés, outils réutilisables, financements pluriannuels

Compléments du chapitre enrichi

Notion · À retenir

Plan de communication — *À retenir :* Objectifs, cibles, messages, canaux, calendrier, budget, évaluation ; relais humains ; coût par contact

Méthodes — *À retenir :* Expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative ; selon le type d'objectif ; « pyramide de l'apprentissage » = mythe

Logistique — *À retenir :* Brut = net × coefficient / rendement (carottes 85 %, pommes de terre 80 %) ; check-list avant / J / après

Trésorerie — *À retenir :* Solde = précédent + encaissements − décaissements ; besoin maximal ; acompte

Dossier de financement — *À retenir :* Constats chiffrés, politiques, objectifs SMART, actions, participation, évaluation, budget cofinancé, pérennisation

Bénévoles — *À retenir :* Mission, formation, reconnaissance ; comptes 86/87

Fiches-outils du chapitre 8

Outil · Intitulé · Utilité

O8.1 — *Intitulé :* Fiche action QQOQCCP ; *Utilité :* Décrire chaque action du plan

O8.2 — *Intitulé :* Cartographie des parties prenantes ; *Utilité :* Matrice pouvoir/intérêt et stratégie

O8.3 — *Intitulé :* Matrice RACI ; *Utilité :* Répartir les rôles

O8.4 — *Intitulé :* Analyse d'un cahier des charges ; *Utilité :* Vérifier l'éligibilité avant de répondre

O8.5 — *Intitulé :* Calcul PERT ; *Utilité :* Dates, marges, chemin critique

O8.6 — *Intitulé :* Suivi budgétaire prévu / réalisé ; *Utilité :* Analyser les écarts

O8.7 — *Intitulé :* Registre des risques ; *Utilité :* Anticiper et réduire les risques

O8.8 — *Intitulé :* Compte rendu de réunion ; *Utilité :* Décisions et relevé d'actions

O8.1 – Fiche action QQOQCCP

Question	Réponse
Quoi ?	
Qui ? (public, animateurs,	
partenaires)	
Où ?	
Quand ?	
Comment ? (méthodes,	
outils)	
Combien ? (moyens, coût)	
Pourquoi ? (objectif visé)	

O8.2 – Cartographie des parties prenantes

O8.3 – Matrice RACI

Inscrire les acteurs en en-tête ; R = réalise, A = approuve (un seul par tâche), C = consulté, I = informé.

O8.4 – Analyse d'un cahier des charges

Critère	Exigence de l'appel à projets	Mon projet conforme ?
Financeur, intitulé, date limite		

Critère	Exigence de l'appel à projets	Mon projet conforme ?
Publics et territoires prioritaires		
Actions éligibles / exclues		
Montant maximal, taux maximal		
Cofinancement exigé		
Durée, calendrier		
Évaluation demandée		
Pièces à joindre		
Critères de sélection		

O8.5 – Calcul PERT

Début au plus tôt = max des fins des antériorités ; fin au plus tard = min des débuts au plus tard des tâches suivantes ; marge = fin tard − fin tôt ; chemin critique = marges nulles.

O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé

Poste	Prévu (€)	Réalisé (€)	Écart (€ et %)	Explication
Total				

O8.7 – Registre des risques

O8.8 – Compte rendu de réunion

Réunion : **.....** ***Date :*** **.....** ***Lieu :*** **.....**
Présents : **.....**
Excusés : **.....**

1.

2.

3.

Prochaine réunion : **.....**

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 8

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 8

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 8

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action, pilotage, appels à projets et parties prenantes

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 8

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (2); Stratégies; Partenaires; Financements; Calendrier; Budget; Pilotage

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 8 : choix des stratégies et des actions, fiche action (QQOQCCP), parties prenantes et partenariat, pilotage, financements et appels à projets, planification (Gantt, PERT), budget, trésorerie, logistique, méthodes pédagogiques, tableau de bord, risques, communication, pérennisation (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : les stratégies d'intervention, le QQOQCCP, la matrice pouvoir/intérêt, l'organisation du pilotage, la réponse à un appel à projets, la tâche PERT, la structure d'un budget, le plan de trésorerie, la matrice des risques, le plan de communication, la boucle du pilotage ; Calculer et interpréter : coût d'une action, coût horaire chargé, budget équilibré, ratios, écarts prévu/réalisé, subvention selon un plafond et un taux, dates au plus tôt et au plus tard, marges, solde de trésorerie, quantités brutes, taux de présence, criticité, coût par contact, apports d'une recette (Ciqual 2025) ; Rédiger les parties « plan d'action », « partenariat », « budget » et « pilotage » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 8.1 – Les stratégies d'intervention (10 points) ; Exercice 8.2 – Rédiger une fiche action QQOQCCP (10 points) ; Exercice 8.3 – Choisir une action avec des critères (12 points) ; Exercice 8.4 – Relier les actions aux objectifs (12 points) ; Exercice 8.5 – Adapter une action à un public (12 points) ; Exercice 8.6 – Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 8.7 – La matrice pouvoir/intérêt (10 points) ; Exercice 8.8 – Organiser le pilotage du projet (10 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 8 : choix des stratégies et des actions, fiche action (QQOQCCP), parties prenantes et partenariat, pilotage, financements et appels à projets, plan

■ Légender des schémas : les stratégies d'intervention, le QQOQCCP, la matrice pouvoir/intérêt, l'organisation du pilotage, la réponse à un

appel à projets, la tâche PERT, la structure d'un budget, le plan de trésorerie, l

■ Calculer et interpréter : coût d'une action, coût horaire chargé, budget équilibré, ratios, écarts prévu/réalisé, subvention selon un plafond et un taux, dates au plus tôt et au plus tard, marges, solde de trésorerie, qu

■ Rédiger les parties « plan d'action », « partenariat », « budget » et « pilotage » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 8 79
Mode d'emploi du cahier 79
Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action 80
Exercice 8.1 – Les stratégies d'intervention (10 points) 81
Exercice 8.2 – Rédiger une fiche action QQOQCCP (10 points) 83
Exercice 8.3 – Choisir une action avec des critères (12 points) 85
Exercice 8.4 – Relier les actions aux objectifs (12 points) 86
Exercice 8.5 – Adapter une action à un public (12 points) 87
Exercice 8.6 – Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier (16 points) 88
Corrigés de la partie 1 89
Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage 92
Exercice 8.7 – La matrice pouvoir/intérêt (10 points) 93
Exercice 8.8 – Organiser le pilotage du projet (10 points) 95
Exercice 8.9 – Corriger une matrice RACI (12 points) 96
Exercice 8.10 – Corriger une convention de partenariat (12 points) 97
Exercice 8.11 – Convaincre un partenaire réticent (12 points) 98
Exercice 8.12 – Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage (16 points) 99
Corrigés de la partie 2 100
Partie 3 – Les financements et les appels à projets 103
Exercice 8.13 – Les étapes de la réponse à un appel à projets (10 points) 104
Exercice 8.14 – Qui finance quoi ? (10 points) 105
Exercice 8.15 – Lire un cahier des charges (12 points) 106
Exercice 8.16 – Construire un plan de financement (12 points) 107
Exercice 8.17 – Évaluer des dossiers avec une grille de sélection (12 points) 108
Exercice 8.18 – Relire un dossier de demande de subvention (16 points) 109
Corrigés de la partie 3 110
Partie 4 – Planifier le projet 113
Exercice 8.19 – Lire une tâche du réseau PERT (10 points) 114
Exercice 8.20 – Construire un diagramme de Gantt (10 points) 115
Exercice 8.21 – Calculer un réseau PERT complet (12 points) 116
Exercice 8.22 – Mesurer l'effet d'un retard (12 points) 117
Exercice 8.23 – Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps (12 points) 118
Exercice 8.24 – Fixer les dates réelles d'un cycle d'ateliers (16 points) 119
Corrigés de la partie 4 120
Partie 5 – Construire et suivre le budget 123
Exercice 8.25 – La structure d'un budget prévisionnel (10 points) 124
Exercice 8.26 – Calculer un coût horaire chargé (10 points) 125
Exercice 8.27 – Construire un budget équilibré (12 points) 126
Exercice 8.28 – Analyser un budget avec des ratios (12 points) 127
Exercice 8.29 – Analyser les écarts entre le prévu et le réalisé (12 points) 128
Exercice 8.30 – Calculer le coût complet d'un atelier et le seuil de participants (16 points) 129
Corrigés de la partie 5 130
Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques 132
Exercice 8.31 – Le principe du plan de trésorerie (10 points) 133
Exercice 8.32 – Construire un plan de trésorerie sur huit mois (12 points) 134
Exercice 8.33 – Calculer les quantités à acheter (12 points) 135
Exercice 8.34 – Préparer la logistique d'un atelier (12 points) 136
Exercice 8.35 – Choisir une méthode pédagogique (10 points) 137
Exercice 8.36 – Coût et apports d'une recette d'atelier (16 points) 138
Corrigés de la partie 6 140
Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication 143

Exercice 8.37 – La boucle du pilotage (10 points) 144
Exercice 8.38 – Construire une matrice des risques (12 points) 146
Exercice 8.39 – Analyser un tableau de bord multisite (12 points) 148
Exercice 8.40 – Construire un plan de communication (12 points) 149
Exercice 8.41 – Mesurer l'efficacité des canaux de communication (12 points) 150
Exercice 8.42 – Réagir à un imprévu en cours de projet (16 points) 151
Corrigés de la partie 7 152

Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet 155
Exercice 8.43 – Compléter un cadre logique (10 points) 156
Exercice 8.44 – Préparer la pérennisation (12 points) 157
Exercice 8.45 – Organiser et valoriser le bénévolat (12 points) 158
Exercice 8.46 – Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie (12 points) 159
Exercice 8.47 – Défendre son plan d'action devant le jury (14 points) 160
Exercice 8.48 – Cas complet : le « bol du bénévole » d'un festival de musique (40 points) 161
Corrigés de la partie 8 164

Bilan : grille d'auto-évaluation 168

Cahier d'exercices – Chapitre 8

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 8 : choix des stratégies et des actions, fiche action (QQOQCCP), parties prenantes et partenariat, pilotage, financements et appels à projets, planification (Gantt, PERT), budget, trésorerie, logistique, méthodes pédagogiques, tableau de bord, risques, communication, pérennisation (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les stratégies d'intervention, le QQOQCCP, la matrice pouvoir/intérêt, l'organisation du pilotage, la réponse à un appel à projets, la tâche PERT, la structure d'un budget, le plan de trésorerie, la matrice des risques, le plan de communication, la boucle du pilotage.
- Calculer et interpréter : coût d'une action, coût horaire chargé, budget équilibré, ratios, écarts prévu/réalisé, subvention selon un plafond et un taux, dates au plus tôt et au plus tard, marges, solde de trésorerie, quantités brutes, taux de présence, criticité, coût par contact, apports d'une recette (Ciqual 2025).
- Rédiger les parties « plan d'action », « partenariat », « budget » et « pilotage » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de dossiers), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, appels à projets, prix, salaires et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de plan d'action à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans les documents les objectifs, le public, les ressources et les règles imposées (budget, financeur, calendrier). Ensuite, faites les calculs en posant la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité (euros, heures, semaines, pourcentage). Puis vérifiez la cohérence : budget équilibré, comptes 86 et 87 égaux, dépendances du planning respectées, trésorerie jamais négative sans solution. Enfin, concluez par une décision argumentée. Une copie qui donne un chiffre sans le vérifier, ou une décision sans chiffre, perd des points.

Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les six grandes stratégies d'intervention et classer une action dans la bonne stratégie.
- Décrire une action avec la méthode QQOQCCP et chiffrer ses moyens.
- Choisir une action avec des critères explicites (cohérence, efficacité, adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique).
- Relier chaque action à un objectif spécifique et repérer les actions « orphelines ».
- Adapter une action aux capacités et à la culture d'un public.
- Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier de projet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les objectifs spécifiques disent ce qui doit changer ; les stratégies disent par quels leviers ; les actions disent ce que l'on fait concrètement.
- Six stratégies : éducation pour la santé ; action sur l'environnement ; lien social et entourage ; participation et développement du pouvoir d'agir ; plaidoyer ; formation des relais. Les interventions efficaces en nutrition combinent plusieurs stratégies (Charte d'Ottawa, 1986).
- QQOQCCP : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? Une fiche action complète répond aux sept questions.
- Six questions pour choisir une action : cohérence avec un objectif, efficacité prouvée, adaptation au public, faisabilité, acceptabilité et participation, éthique.
- Une action sans objectif est une action « orpheline » : on la supprime ou on la rattache à un objectif. Un objectif sans action ne sera pas atteint.

Exercice 8.1 – Les stratégies d'intervention (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de quartier des Coteaux (structure fictive) a posé son diagnostic : les familles du quartier consomment peu de fruits et de légumes, le seul commerce alimentaire est une supérette chère, et les parents se sentent seuls face aux refus des enfants. L'équipe a listé huit idées d'actions. Votre tutrice vous demande de vérifier que le projet combine plusieurs stratégies.

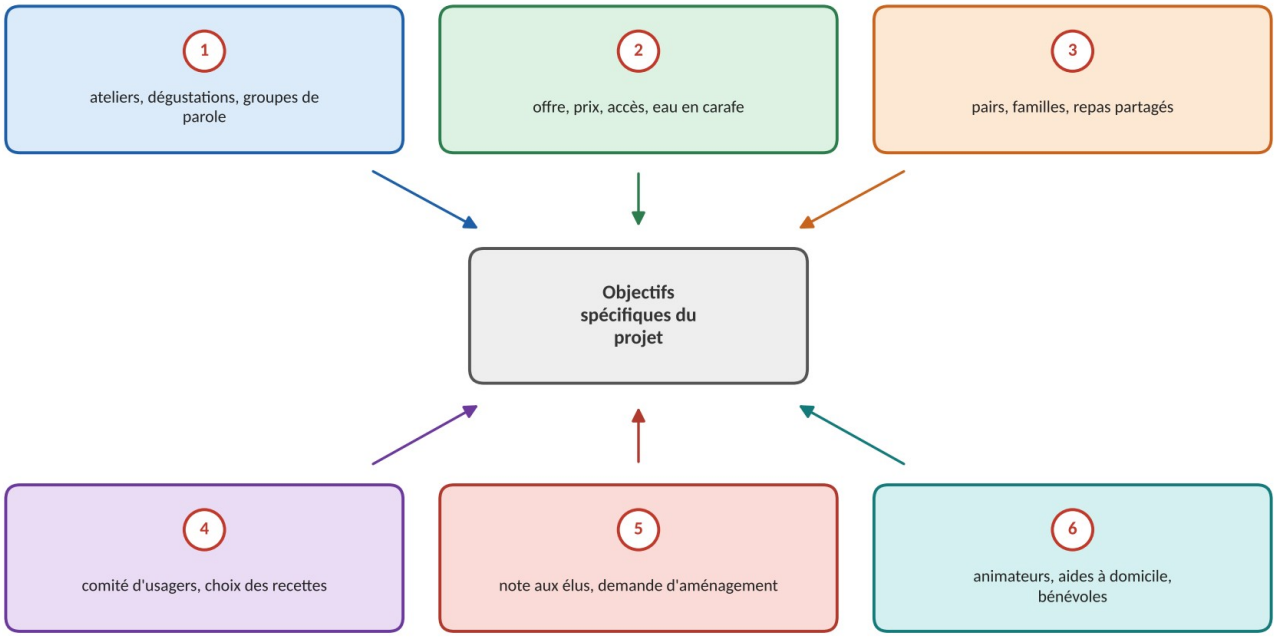


Figure 8.1 – Document 1 – Six stratégies au service des objectifs spécifiques (schéma à légender)

Document 2 – Huit idées d'actions

a) Trois ateliers « cuisiner les légumes de saison » avec dégustation.

b) Un marché de producteurs une fois par mois sur la place, avec des prix négociés.

c) Un groupe de parole de parents sur les refus alimentaires des enfants, animé avec la PMI.

d) Un comité de quatre parents qui choisit les recettes et les thèmes des ateliers.

e) Une note aux élus pour demander un arrêt de bus près du supermarché de la zone commerciale.

f) La formation des quatre animateurs du périscolaire à la découverte sensorielle.

g) Un « goûter des familles » mensuel où chaque famille apporte un plat.

h) Une exposition d'affiches sur les repères du PNNS dans le hall.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez les huit actions du document 2 dans ces six stratégies. (4 pts)

3. Dites quelle action risque d'être la moins efficace si elle est menée seule, et pourquoi. (1,5 pt)

4. Expliquez pourquoi il faut combiner plusieurs stratégies dans un projet de nutrition. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 8.2 – Rédiger une fiche action QQOQCCP (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le relais petite enfance (RPE) de Saint-Ombre (structure fictive) veut proposer aux assistantes maternelles un atelier « goûters faits maison pour les tout-petits ». L'animatrice du RPE vous transmet ses notes en vrac et vous demande une fiche action propre.

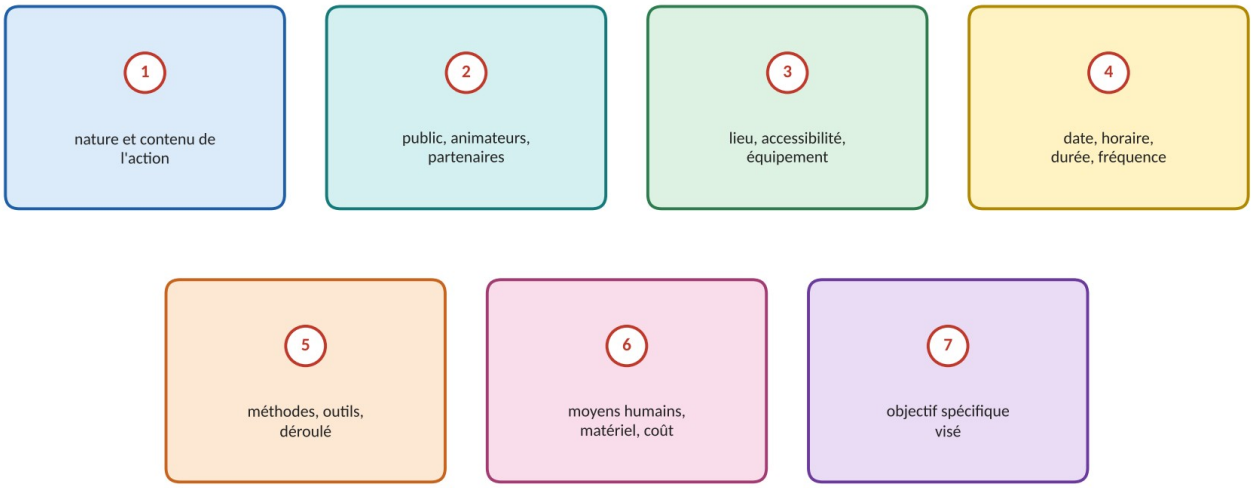


Figure 8.2 – Document 1 – Les sept questions de la méthode QQOQCCP (schéma à légender)

Document 2 – Notes de l'animatrice

« Ce serait un samedi matin, le 13 mars 2027, de 9 h 30 à 12 h, dans la salle d'activités du RPE (il y a un four et deux plaques). On prend 10 assistantes maternelles maximum, inscription au RPE. Je co-anime avec vous. Elles veulent des idées de goûters sans biscuits industriels, parce que 7 sur 12 interrogées en janvier disent acheter des biscuits par manque d'idées. On ferait trois recettes : compote pomme-banane, petits pancakes aux flocons d'avoine, yaourt nature et fruits. Puis on goûte et on échange sur les quantités adaptées à l'âge. Préparation : une heure à deux la veille ; rangement : 30 minutes à deux. Objectif spécifique 2 du projet : augmenter la part de goûters faits maison servis aux enfants accueillis. »

Document 3 – Liste des denrées (prix fictifs)

Denrée	Quantité	Prix
Farine de blé T65	400 g	1,10 € le kg
Œufs	6	0,30 € l'œuf
Yaourts nature	4 pots	0,25 € le pot
Pommes	1,5 kg	2,40 € le kg
Flocons d'avoine	300 g	2,60 € le kg
Lait demi-écrémé	1 L	1,05 € le litre
Bananes	1 kg	1,90 € le kg
Huile de colza	10 cl	2,80 € le litre

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Calculez le coût des denrées de l'atelier et le coût par participante. (2,5 pts)

3. Calculez le temps de travail des deux animatrices pour cet atelier. (1 pt)

4. Rédigez la fiche action sous la forme d'un tableau QQOQCCP. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.3 – Choisir une action avec des critères (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La résidence sociale Les Platanes (structure fictive) héberge 85 hommes âgés de 58 à 84 ans, pour la plupart arrivés d'Afrique du Nord pour travailler dans les années 1970. Ils disposent d'une cuisine commune par étage. Le diagnostic montre que beaucoup sont traités pour un diabète de type 2, mangent seuls, et lisent peu le français. L'équipe hésite entre quatre actions et a noté chacune de 0 (pas du tout) à 3 (tout à fait) sur les six critères de choix.

Document 1 – Notes de l'équipe (0 à 3)

Action	Cohérence	Efficacité	Adaptation	Faisabilité	Acceptabilité	Éthique
A – Conférence d'un médecin sur le diabète, dans la salle commune	1	1	0	3	1	2
B – Ateliers de cuisine collective : plats du pays adaptés, cuisinés et partagés	3	2	3	2	3	3
C – Distribution de dépliants nationaux sur le diabète, en français	1	0	0	3	1	2
D – Partenariat avec l'épicier voisin pour un panier hebdomadaire de légumes à prix réduit	3	2	2	1	2	2

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez la question que pose chacun des six critères. (3 pts)

2. Calculez le score total de chaque action et classez-les. (2 pts)

3. Justifiez les notes « adaptation » des actions A et C. (2 pts)

4. Proposez une combinaison de deux actions et dites à quelles stratégies elles appartiennent. (2 pts)

5. Proposez une modification de l'action A qui améliore sa note d'adaptation et d'acceptabilité. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.4 – Relier les actions aux objectifs (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Le club des retraités de la vallée du Lizon (association fictive, 140 adhérents en zone rurale) prépare un projet « Bien manger, bien vieillir ». Le bureau a écrit les objectifs et une liste d'actions, mais personne n'a vérifié qu'elles correspondent.

Document 1 – Objectifs spécifiques (à 12 mois)

OS1 – Augmenter de 35 % à 55 % la part des adhérents qui consomment un produit laitier à chaque repas.

OS2 – Augmenter de 20 % à 40 % la part des adhérents vivant seuls qui partagent au moins un repas par semaine.

OS3 – Faire passer de 3 à 8 le nombre de pesées mensuelles proposées par les relais du club, pour repérer les pertes de poids.

Document 2 – Actions proposées par le bureau

a) Un repas partagé mensuel au foyer rural, préparé par un groupe de volontaires.

b) Une formation de deux heures pour huit bénévoles relais : peser, noter, orienter vers le médecin traitant.

c) Une sortie annuelle au salon de l'agriculture.

d) Quatre ateliers « desserts lactés faciles et peu coûteux ».

e) Un concours de belote.

f) Un covoiturage solidaire vers le repas partagé.

g) L'achat d'un pèse-personne par relais.

h) Une conférence sur l'ostéoporose avec un rhumatologue.

À vous de jouer – Questions

1. Rattachez chaque action à un objectif spécifique quand c'est possible. (4 pts)
2. Repérez les actions « orphelines » et dites ce que vous en faites. (2 pts)
3. Classez les actions retenues selon les facteurs du modèle PRECEDE (prédisposants, facilitants, de renforcement). (3 pts)
4. Un objectif est-il mal couvert ? Proposez une action complémentaire. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.5 – Adapter une action à un public (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Mains et Voix (structure fictive) accompagne des adultes sourds qui communiquent en langue des signes française (LSF). Sa coordinatrice voudrait reprendre un atelier « lire les étiquettes au supermarché » conçu par une mutuelle pour le grand public. Vous devez l'adapter.

Document 1 – L'atelier tel qu'il est conçu pour le grand public

Séquence	Contenu	Durée
1	Exposé oral avec diaporama : la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel, le Nutri-Score	30 min
2	Quiz à main levée : « Quel produit contient le plus de sucre ? »	15 min
3	Visite du supermarché en groupe de 15 : l'animatrice commente au micro portatif	45 min
4	Questionnaire de satisfaction écrit	10 min

Document 2 – Ce que dit la coordinatrice

« Nos adhérents lisent le français avec des niveaux très variables. Beaucoup ont eu une scolarité difficile. Une interprète LSF coûte 60 € de l'heure (tarif fictif) et il faut la réserver trois semaines avant. Dans un supermarché, on ne peut pas tous regarder l'animatrice en même temps : il faut se voir. Et nos adhérents détestent qu'on parle d'eux à la troisième personne devant eux. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez trois obstacles de l'atelier actuel pour ce public. (3 pts)

2. Proposez un nouveau déroulé en quatre séquences, avec les méthodes et les supports. (5 pts)

3. Calculez le coût de l'interprète pour un atelier de 2 h 30 avec 30 minutes de préparation commune. (1 pt)

4. Proposez une façon d'associer les adhérents à la conception de l'atelier. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.6 – Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre communal d'action sociale (CCAS) de Mérovel (commune fictive de 9 000 habitants, ancienne cité minière). Le diagnostic a été validé. Vous devez rédiger la partie « plan d'action » du dossier de projet, en une page et demie.

Document 1 – Extrait du diagnostic validé (données fictives, 2026)

- 62 % des 48 bénéficiaires de l'épicerie sociale interrogés ne cuisinent jamais de légumes secs ; 71 % disent « ne pas savoir les préparer ».
- L'épicerie sociale reçoit des légumes secs de la banque alimentaire, mais 40 % sont jetés ou redonnés faute de demande.
- Les bénéficiaires demandent « des recettes rapides » et « pouvoir goûter avant d'acheter ».
- Ressources : cuisine pédagogique au centre social (12 places), une conseillère en économie sociale et familiale (CESF), deux bénévoles qui cuisinent volontiers, une diététicienne libérale qui accepte quatre interventions.

Document 2 – Objectifs validés par le comité de pilotage

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation des bénéficiaires de l'épicerie sociale de Mérovel.

OS1 – Dans un an, 40 % des bénéficiaires interrogés cuisinent des légumes secs au moins une fois par semaine (valeur initiale : 0 % chaque semaine, 38 % au moins de temps en temps).

OS2 – Dans un an, réduire de 40 % à 15 % la part des légumes secs jetés ou redonnés par l'épicerie.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez trois actions qui combinent au moins deux stratégies, et rattachez chacune à un objectif. (4 pts)

2. Rédigez la fiche QQOQCCP de l'action principale. (4 pts)

3. Calculez le nombre de places offertes si l'on organise quatre ateliers de 12 places, et la part des 48 bénéficiaires interrogés qu'il permet de toucher si chaque personne ne vient qu'une fois. Commentez. (2 pts)

4. Proposez deux objectifs opérationnels SMART. (3 pts)

5. Rédigez le paragraphe d'introduction du plan d'action (6 à 8 lignes). (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 8.1

1. Légendes : 1 Éducation pour la santé ; 2 Action sur l'environnement ; 3 Lien social et entourage ; 4 Participation et pouvoir d'agir ; 5 Plaidoyer ; 6 Formation des relais.

2. Éducation pour la santé : a) ateliers de cuisine, h) exposition d'affiches. Action sur l'environnement : b) marché de producteurs à prix négociés. Lien social et entourage : c) groupe de parole de parents, g) goûter des familles. Participation : d) comité de parents. Plaidoyer : e) note aux élus pour un arrêt de bus. Formation des relais : f) formation des animateurs du périscolaire. Une action peut relever de deux stratégies : le groupe de parole (c) relève aussi de l'éducation pour la santé.

3. L'**exposition d'affiches** (h) : elle transmet une information, mais elle ne donne ni compétence, ni accès, ni soutien. Une information seule change peu les comportements, surtout chez les publics qui ont peu de moyens.

4. Les comportements alimentaires dépendent de facteurs individuels (savoir cuisiner), environnementaux (prix, offre, transport) et sociaux (soutien de l'entourage). Agir sur un seul facteur laisse les autres freins en place. La Charte d'Ottawa (1986) recommande d'agir à la fois sur les aptitudes individuelles, les milieux, l'action communautaire et les politiques.

Corrigé – Exercice 8.2

1. Légendes : 1 Quoi ? ; 2 Qui ? ; 3 Où ? ; 4 Quand ? ; 5 Comment ? ; 6 Combien ? ; 7 Pourquoi ?

2. Farine : 0,4 × 1,10 = 0,44 € ; œufs : 6 × 0,30 = 1,80 € ; yaourts : 4 × 0,25 = 1,00 € ; pommes : 1,5 × 2,40 = 3,60 € ; flocons : 0,3 × 2,60 = 0,78 € ; lait : 1,05 € ; bananes : 1,90 € ; huile : 0,1 × 2,80 = 0,28 €. **Total : 10,85 €**, soit 10,85 / 10 = **1,09 € par participante** (1,085 arrondi).

3. Par animatrice : 1 h de préparation + 2 h 30 d'atelier + 30 min de rangement = 4 h ; pour deux animatrices : **8 heures**.

4. Fiche action (exemple) :

Question	Réponse
Quoi ?	Atelier « goûters faits maison pour les tout-petits » : trois recettes (compote pomme-banane, pancakes aux flocons d'avoine, yaourt nature et fruits), dégustation, échange sur les quantités adaptées à l'âge
Qui ?	10 assistantes maternelles au plus, inscrites au RPE ; animatrice du RPE et stagiaire en diététique
Où ?	Salle d'activités du RPE (four, deux plaques)
Quand ?	Samedi 13 mars 2027, de 9 h 30 à 12 h
Comment ?	Démonstration courte puis réalisation en trois groupes, dégustation, échange ; fiches recettes illustrées remises à la fin
Combien ?	10,85 € de denrées (1,09 € par participante) ; 8 heures de travail pour deux animatrices ; matériel du RPE
Pourquoi ?	Objectif spécifique 2 : augmenter la part de goûters faits maison servis aux enfants accueillis (7 assistantes maternelles sur 12 achètent des biscuits par manque d'idées)

Corrigé – Exercice 8.3

1. Cohérence : l'action répond-elle à un objectif spécifique et à une cause du diagnostic ? Efficacité : existe-t-il des preuves ou des retours d'expérience ? Adaptation : convient-elle à la langue, à la culture, à la littératie, aux horaires et au budget du public ? Faisabilité : a-t-on les compétences, les locaux, le temps et l'argent ? Acceptabilité : le public la souhaite-t-il, a-t-il été consulté ? Éthique : est-elle non stigmatisante, équitable, indépendante ?

2. A : 1 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 = **8** ; B : 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 = **16** ; C : 1 + 0 + 0 + 3 + 1 + 2 = **7** ; D : 3 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = **12**. Classement : **B (16), D (12), A (8), C (7)**.

3. A : une conférence en français, sans support visuel adapté, ne convient pas à des hommes qui lisent peu le français et qui ont l'habitude de cuisiner leurs plats ; elle ne tient pas compte de leurs habitudes. C : des dépliants nationaux en français sont illisibles pour une partie des résidents ; ils ne parlent ni de leurs plats, ni de leur cuisine commune.

4. Exemple : **B + D**. Les ateliers de cuisine relèvent de l'éducation pour la santé et du lien social (repas partagés) ; le panier de légumes à prix réduit relève de l'action sur l'environnement (accès, prix). Les ateliers donnent l'envie et le savoir-faire, le panier donne l'accès aux produits.

5. Exemple : remplacer la conférence par un **temps d'échange autour d'un thé**, animé par le médecin et un résident relais qui traduit en arabe ; partir des questions des résidents (« Puis-je manger du couscous ? ») ; utiliser des photos de leurs plats et des portions réelles ; inviter par le bouche-à-oreille du conseil de concertation des résidents.

Corrigé – Exercice 8.4

1. OS1 (produits laitiers) : d) ateliers desserts lactés ; h) conférence sur l'ostéoporose (lien indirect avec le calcium). OS2 (repas partagés) : a) repas partagé mensuel ; f) covoiturage vers le repas. OS3 (pesées) : b) formation des bénévoles relais ; g) achat de pèse-personnes.

2. Actions orphelines : c) sortie au salon de l'agriculture et e) concours de belote. Elles ne répondent à aucun objectif du projet. On les sort du projet (elles peuvent rester des activités du club, financées autrement), ou on les transforme : un concours de belote suivi d'un goûter lacté pourrait servir OS1 et OS2, à condition de le décrire comme tel.

3. Prédisposants (connaissances, motivations) : h) conférence, d) ateliers (découvrir des recettes). Facilitants (compétences, accès, ressources) : d) ateliers (savoir-faire), f) covoiturage, g) pèse-personnes, b) formation des relais. De renforcement (soutien, entourage) : a) repas partagé, b) relais qui encouragent et suivent.

4. L'OS2 vise les adhérents **vivant seuls**, mais rien ne garantit qu'ils viendront au repas mensuel ; un seul repas par mois ne suffit pas pour atteindre « un repas partagé par semaine ». Action complémentaire : des binômes « repas à deux » chaque semaine entre adhérents voisins, avec un relais qui les met en contact, ou un repas hebdomadaire tournant chez les adhérents volontaires.

Corrigé – Exercice 8.5

1. Exemples : l'exposé oral de 30 minutes repose sur l'écoute (inaccessible sans interprète) et sur la lecture d'un diaporama (difficile pour une partie du public) ; la visite commentée au micro, en groupe de 15, est impossible à suivre puisqu'il faut voir l'animatrice ou l'interprète ; le questionnaire écrit exclut ceux qui lisent mal ; le quiz à main levée suppose de suivre une question orale.

2. Exemple de déroulé :

Séquence	Contenu, méthode et supports	Durée
1	Accueil en LSF avec l'interprète ; jeu de tri d'emballages réels apportés par les adhérents (méthode active)	25 min
2	Démonstration visuelle : repérer le sucre et le sel sur trois emballages agrandis, pictogrammes, Nutri-Score en couleurs (méthode démonstrative)	25 min
3	Visite du supermarché en deux groupes de 5 à 6, en arc de cercle pour se voir ; chaque groupe compare deux produits et note sa réponse avec des pictogrammes (méthode active et coopérative)	1 h
4	Retour en salle : chaque groupe présente sa découverte en LSF ; évaluation avec des cartes de couleur (vert, orange, rouge)	40 min

3. Durée de présence de l'interprète : 2 h 30 + 30 min = 3 h ; coût : 3 × 60 = **180 €**.

4. Exemples : réunir trois adhérents volontaires avant l'atelier pour choisir les produits à comparer et tester les supports ; former un adhérent pair qui co-anime en LSF ; parler aux personnes directement (et non à l'interprète), comme le demande la coordinatrice.

Corrigé – Exercice 8.6

1. Exemples : A1 – quatre ateliers « légumes secs en 30 minutes » avec dégustation (éducation pour la santé) → OS1 ; A2 – dégustation mensuelle à l'épicerie sociale, avec fiche recette et sachet de légumes secs à emporter (action sur l'environnement et éducation) → OS1 et OS2 ; A3 – un comité de trois bénéficiaires et deux bénévoles qui choisit et teste les recettes (participation) → OS1 et OS2.

2. Fiche QQOQCCP de A1 (exemple) : Quoi ? quatre ateliers de cuisine « légumes secs en 30 minutes » ; Qui ? 12 bénéficiaires par atelier, la CESF, la diététicienne, deux bénévoles ; Où ? cuisine pédagogique du centre social ; Quand ? un mardi matin par mois, de 9 h 30 à 12 h, de février à mai 2027 ; Comment ? démonstration, réalisation en trois groupes, dégustation, recette illustrée, sachet de légumes secs offert par l'épicerie ; Combien ? 4 interventions de la diététicienne, temps de la CESF, denrées issues de l'épicerie ; Pourquoi ? OS1 et OS2.

3. Places : 4 × 12 = **48 places**. Si chaque personne vient une fois, on peut toucher au plus 48 personnes, soit 48 / 48 × 100 = **100 %** des bénéficiaires interrogés. Commentaire : c'est un maximum théorique ; en pratique, certaines personnes reviendront et d'autres ne viendront pas. Il faut compléter par une action qui touche tous les bénéficiaires sur place (dégustations à l'épicerie).

4. Exemples : « Organiser 4 ateliers de 12 places entre février et mai 2027 au centre social, avec un taux de remplissage d'au moins 75 %. » « Proposer une dégustation de légumes secs à l'épicerie sociale le premier jeudi de chaque mois, de mars à décembre 2027, soit 10 dégustations. »

5. Exemple : « Le plan d'action répond aux deux objectifs spécifiques validés par le comité de pilotage. Il combine l'éducation pour la santé (ateliers culinaires), l'action sur l'environnement (dégustations et sachets de légumes secs à l'épicerie sociale) et la participation (comité de recettes). Ce choix s'appuie sur le diagnostic : 71 % des bénéficiaires

> disent ne pas savoir préparer les légumes secs, alors que l'épicerie en dispose et en perd 40 %. Les actions mobilisent les ressources du territoire : la cuisine pédagogique, la CESF, deux bénévoles et une diététicienne. Elles sont décrites ci-dessous avec la méthode QQOQCCP. »

Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage

Objectifs – Objectifs de la partie

- Placer les parties prenantes dans la matrice pouvoir/intérêt et en déduire la façon de les associer.
- Organiser les instances du projet : comité de pilotage, comité technique, comité d'usagers.
- Construire et corriger une matrice RACI.
- Rédiger et corriger les articles d'une convention de partenariat.
- Convaincre un partenaire en montrant ce que le projet lui apporte.
- Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage avec un relevé de décisions.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Partie prenante : personne ou organisation concernée par le projet ou capable de l'influencer. Partenaire : partie prenante qui s'engage et apporte des ressources selon des modalités définies.
- Matrice pouvoir/intérêt (d'après Mendelow, 1991) : pouvoir fort et intérêt fort, gérer étroitement ; pouvoir fort et intérêt faible, satisfaire ; pouvoir faible et intérêt fort, associer et informer ; pouvoir faible et intérêt faible, surveiller.
- Matrice RACI : R réalise ; A approuve et rend compte (une seule personne A par tâche) ; C consulté ; I informé. Chaque tâche a au moins un R et exactement un A.
- Comité de pilotage : il décide (2 à 3 réunions). Comité technique : il organise et suit le tableau de bord. Comité d'usagers : il donne l'avis des personnes concernées.
- Convention de partenariat : objet, engagements de chaque partie, durée, communication, données personnelles, suivi, modification et résiliation, signatures.
- Compte rendu : envoyé sous 48 heures ; présents et excusés, points abordés, décisions, relevé des actions (quoi, qui, pour quand).

Exercice 8.7 – La matrice pouvoir/intérêt (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La commune du Val-d'Orbe (fictive) veut installer un réfrigérateur solidaire devant la salle des fêtes : les commerçants et les habitants y déposent des produits frais, et chacun peut se servir librement. Une association de bénévoles gérerait le nettoyage et le contrôle des dates. Vous préparez la cartographie des parties prenantes.

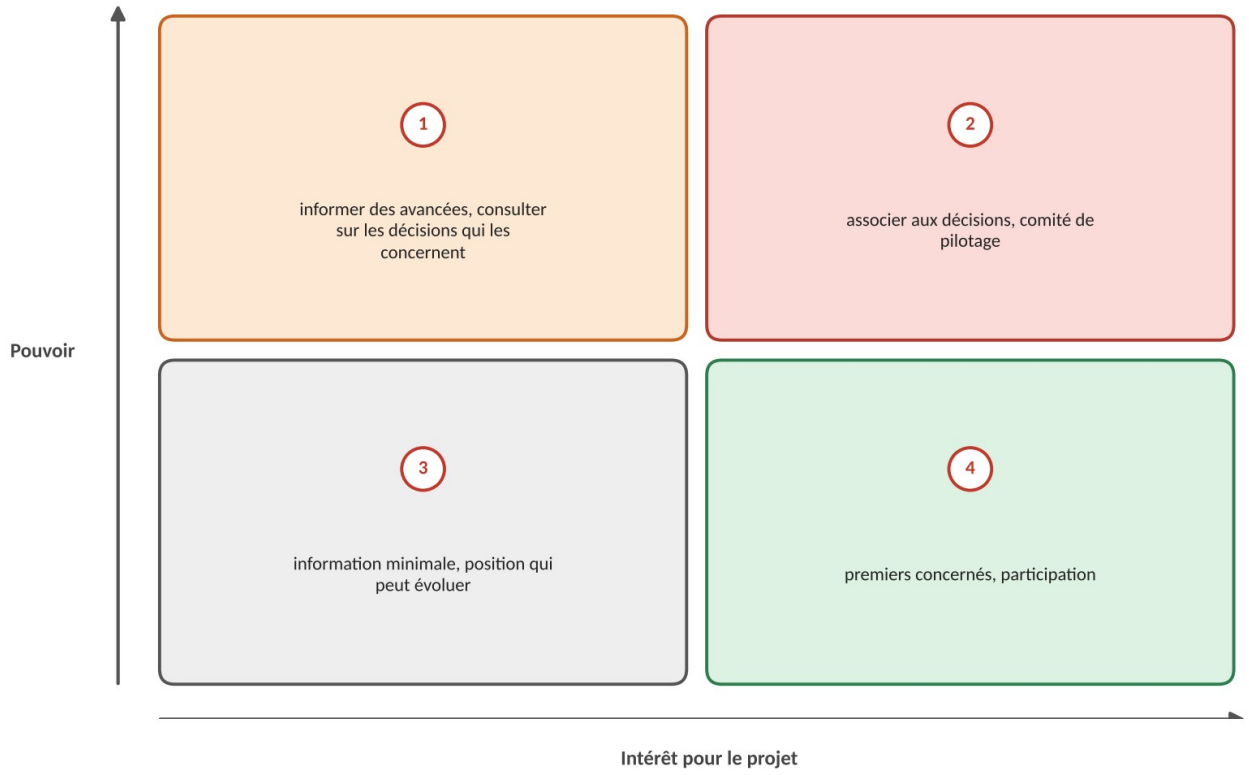


Figure 8.3 – Document 1 – La matrice pouvoir/intérêt (schéma à légender)

Document 2 – Dix parties prenantes

a) Le maire et le conseil municipal, qui financent l'achat du réfrigérateur.

b) La direction départementale de la protection des populations (DDPP), qui contrôle l'hygiène des denrées.

c) Les habitants qui utiliseront le réfrigérateur.

d) Les bénévoles de l'association qui le gérera.

e) Le supermarché qui donnera ses invendus.

f) Les riverains de la salle des fêtes.

g) La fondation qui pourrait financer l'entretien.

h) Le journal local.

i) La boulangerie, qui hésite à donner son pain de la veille.

j) La directrice du CCAS, qui oriente les personnes en difficulté et copilote le projet.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)

2. Placez les dix parties prenantes dans la matrice. (5 pts)

3. Dites comment associer concrètement les habitants (c) et les riverains (f). (2 pts)

4. Expliquez pourquoi la matrice doit être mise à jour en cours de projet, avec un exemple tiré du document 2. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 8.8 – Organiser le pilotage du projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bailleur social Habitat du Causse (structure fictive) lance, avec le centre social et la diététicienne de la maison de santé, un projet « Cuisiner dans un petit logement » pour les locataires de la résidence des Genêts (180 logements). Il vous demande de proposer l'organisation des instances du projet.

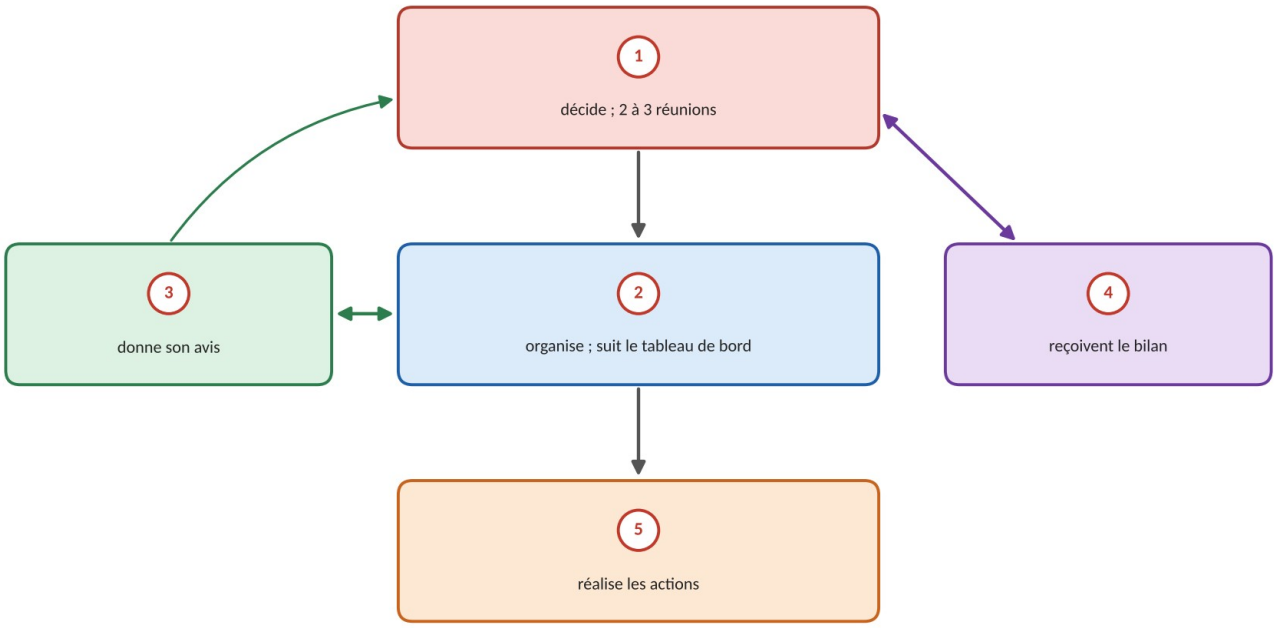


Figure 8.4 – Document 1 – L'organisation du pilotage d'un projet (schéma à légender)

Document 2 – Personnes et structures disponibles

La responsable territoriale du bailleur ; la directrice du centre social ; la référente familles du centre social ; la diététicienne de la maison de santé ; l'amicale des locataires (présidente et deux membres) ; la gardienne de la résidence ; la chargée de mission du contrat de ville ; vous-même (stagiaire) ; la caisse d'allocations familiales (financeur) ; huit locataires volontaires.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Proposez la composition du comité de pilotage et du comité technique. (3 pts)
3. Indiquez le rôle et la fréquence de réunion de chaque instance. (2,5 pts)
4. Expliquez pourquoi il est utile que l'amicale des locataires siège au comité de pilotage, et non seulement au comité d'usagers. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.9 – Corriger une matrice RACI (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association d'aide aux devoirs Coup de Pouce Saint-Rémi (fictive) accueille 40 enfants de 6 à 11 ans après l'école et leur sert un goûter. Elle lance un projet « goûters équilibrés et faits ensemble ». La coordinatrice a rempli une matrice RACI et vous demande de la vérifier.

Document 1 – La matrice RACI proposée

Tâche	Coordinatrice	Stagiaire en diététique	Animateurs (3)	Parents volontaires	Bureau de l'association
Diagnostic (goûters servis, avis des enfants)	A	R	C	C	A
Choix des goûters du trimestre	C	C	C	C	I
Achats des denrées	R	I	R	–	A
Préparation des goûters avec les enfants	A	C	R	R	–
Animation d'un atelier « goût » par mois	I	–	C	–	–
Évaluation (questionnaire, relevé des goûters)	A	R	C	I	I
Validation du budget	C	–	–	–	A

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez la signification des quatre lettres et les deux règles de construction d'une matrice RACI. (3 pts)

2. Repérez les trois tâches qui ne respectent pas ces règles et expliquez l'erreur. (3 pts)

3. Proposez une matrice corrigée. (4 pts)

4. Expliquez l'intérêt de la matrice RACI pour un projet qui associe des bénévoles et des parents. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.10 – Corriger une convention de partenariat (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

La maison des jeunes et de la culture (MJC) des Rives (fictive) organise un cycle de six ateliers « cuisiner à 15 ans » pour des adolescents. Un supermarché voisin propose d'offrir les denrées. Son responsable a envoyé un projet de convention. La directrice de la MJC vous demande votre avis avant de signer.

Document 1 – Projet de convention (extraits)

Article 1 – Objet : « Le supermarché soutient les activités de la MJC. »

Article 2 – Engagements de la MJC : « La MJC fait apparaître le logo du supermarché sur tous ses supports, y compris les fiches recettes remises aux jeunes. Les recettes utilisent les produits de la marque du distributeur. »

Article 3 – Engagements du supermarché : « Le supermarché fournit des denrées. »

Article 4 – Données : « La MJC transmet la liste des participants et leurs adresses électroniques pour l'envoi d'offres promotionnelles. »

Article 5 – Durée : « La convention est conclue sans limite de durée. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les cinq faiblesses de ce projet de convention. (5 pts)

2. Réécrivez les articles 1, 3 et 4. (4 pts)

3. Citez les articles qui manquent dans cette convention. (2 pts)

4. La directrice doit-elle refuser le partenariat ? Donnez votre avis argumenté. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 8.11 – Convaincre un partenaire réticent (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la zone d'activités des Trois-Chênes (fictive), le service de prévention et de santé au travail interentreprises veut lancer un projet sur le déjeuner des salariés. La plupart déjeunent au restaurant interentreprises, géré par un prestataire. Le chef de cuisine est réticent : « Encore un projet qui va me dire que ma cuisine est trop grasse. » Votre tutrice vous demande de préparer l'entretien avec lui.

Document 1 – Données utiles (fictives, 2026)

- Le restaurant sert en moyenne 420 repas par jour, 5 jours par semaine.
- Le relevé des retours de plateaux montre que 31 % des accompagnements de légumes sont jetés.
- Le prestataire a perdu 8 % de couverts en un an, au profit des boulangeries et de la livraison.
- Le projet demande au chef : 2 réunions d'une heure et demie, la co-animation de 3 dégustations d'une heure, la mise au point de 4 recettes (2 heures chacune).
- Coût horaire chargé du chef, communiqué par le prestataire : 27 €.

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez ce que le projet peut apporter au chef et au prestataire. (3 pts)

2. Calculez le temps demandé au chef et sa valorisation. Dites dans quels comptes du budget du projet elle apparaît si le prestataire ne facture pas ce temps. (3 pts)

3. Les 420 repas actuels correspondent à la fréquentation après la baisse de 8 %. Calculez le nombre de couverts perdus chaque jour en un an (arrondi à l'unité) et le nombre de repas que ces pertes représentent sur une semaine. (2 pts)

4. Rédigez les trois premières phrases que vous direz au chef pour ouvrir l'entretien. (2 pts)

5. Proposez deux engagements réciproques à inscrire dans une convention. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.12 – Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de la Haute-Sorne (fictive) conduit un projet de six ateliers pour des patients à risque de diabète. Vous avez assisté au comité de pilotage de mi-parcours et vous devez en rédiger le compte rendu.

Document 1 – Vos notes de réunion, 14 janvier 2027, 18 h – 19 h 30, salle de réunion de la MSP

Présents : Dr Mallet (médecin coordinateur), Mme Bataille (infirmière Asalée), M. Ortiz (diététicien), Mme Leroux (patiente représentante), vous-même. Excusées : Mme Faure (pharmacienne), Mme Henri (chargée de mission du contrat local de santé).

- Dr Mallet ouvre la séance, rappelle l'objectif : 3 ateliers sur 6 réalisés.
- Mme Bataille : 36 places possibles pour les 3 ateliers (12 par atelier) ; 25 présences. Deux patients ont arrêté à cause de l'horaire (14 h).
- M. Ortiz : le budget est consommé à 41 % (820 € sur 2 000 €). La salle de cuisine du lycée hôtelier n'est plus disponible en mars.
- Mme Leroux : « Les patients aimeraient un atelier le samedi matin. Et la fiche sur les étiquettes est trop petite pour les lire. »
- Décision : les ateliers 4 à 6 auront lieu le samedi de 10 h à 12 h 30. M. Ortiz cherche une autre cuisine avant le 31 janvier. Mme Bataille rappelle les patients absents d'ici le 21 janvier. La fiche sera réimprimée en grands caractères par vous, avant le 28 janvier. Mme Leroux relit la nouvelle fiche.
- Prochaine réunion : jeudi 6 mai 2027, 18 h, même salle (bilan final).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence aux trois premiers ateliers et commentez-le au regard de l'objectif de 80 %. (2 pts)

2. Comparez la consommation du budget à l'avancement du projet. (2 pts)

3. Rédigez le compte rendu complet de la réunion, avec un relevé des actions sous forme de tableau. (8 pts)

4. Dites à qui vous envoyez le compte rendu, et dans quel délai. (2 pts)

5. Expliquez ce qu'apporte la présence d'une patiente représentante au comité de pilotage. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 8.7

1. Légendes : 1 Satisfaire (pouvoir fort, intérêt faible) ; 2 Gérer étroitement (pouvoir fort, intérêt fort) ; 3 Surveiller (pouvoir faible, intérêt faible) ; 4 Associer et informer (pouvoir faible, intérêt fort).

2. Placement (exemple justifié) :

Quadrant	Parties prenantes
Gérer étroitement	a) maire et conseil municipal (financent et décident) ; j) directrice du CCAS (copilote) ; d) association des bénévoles (gère le réfrigérateur, peut tout arrêter)
Satisfaire	b) DDPP (peut interdire si l'hygiène n'est pas respectée, mais n'est pas porteuse) ; g) fondation (peut financer, intérêt encore faible)
Associer et informer	c) habitants utilisateurs (premiers concernés) ; e) supermarché donateur (intérêt fort : réduire le gaspillage, pouvoir limité sur le projet)
Surveiller	f) riverains ; h) journal local ; i) boulangerie hésitante

On accepte d'autres placements s'ils sont justifiés : les bénévoles peuvent aussi être placés en « associer » ; les riverains peuvent devenir un risque (plaintes pour le bruit ou les déchets).

3. Habitants : les inviter à choisir l'emplacement et les règles d'usage, créer un petit groupe d'utilisateurs qui fait remonter les problèmes, afficher les règles avec des pictogrammes. Riverains : les informer avant l'installation (courrier, rencontre), leur donner un contact en cas de problème, les inviter à l'inauguration.

4. Les positions changent : la boulangerie (i), aujourd'hui hésitante, peut devenir donatrice et passer en « associer » ; la fondation (g) peut accorder un financement et prendre un intérêt fort. La matrice se met à jour à chaque comité de pilotage.

Corrigé – Exercice 8.8

1. Légendes : 1 Comité de pilotage ; 2 Comité technique ; 3 Comité d'usagers ; 4 Financeurs ; 5 Équipe d'animation.

2. Comité de pilotage (exemple) : la responsable territoriale du bailleur, la directrice du centre social, la chargée de mission du contrat de ville, la présidente de l'amicale des locataires, un représentant de la CAF (financeur), la diététicienne. Comité technique : la référente familles, la diététicienne, la gardienne, vous-même, un membre de l'amicale.

3. Comité de pilotage : il valide les objectifs, le budget et les grandes décisions, et arbitre en cas de difficulté ; 3 réunions (lancement, mi-parcours, bilan). Comité technique : il organise les ateliers, suit le tableau de bord et prépare les décisions du comité de pilotage ; une réunion par mois. Comité d'usagers (les huit locataires volontaires) : il donne son avis sur les thèmes, les horaires, les recettes et les supports ; une réunion avant chaque série d'ateliers.

4. Au comité d'usagers, les locataires donnent un avis ; au comité de pilotage, ils participent aux **décisions** (budget, priorités). La présence de l'amicale garantit que les choix tiennent compte de la vie réelle de la résidence, renforce la légitimité du projet et favorise la mobilisation des autres locataires. C'est un niveau de participation plus élevé.

Corrigé – Exercice 8.9

1. R : réalise la tâche ; A : approuve et rend compte du résultat ; C : consulté avant la décision ; I : informé du résultat. Règles : **un seul A par tâche** ; **au moins un R par tâche**.

2. Diagnostic : **deux A** (coordinatrice et bureau) : on ne sait pas qui valide. Choix des goûters : **aucun R ni A** : personne n'est chargé de choisir. Animation de l'atelier « goût » : **aucun R ni A** : personne ne l'anime. (Les autres lignes respectent les règles ; la ligne « achats » a deux R, ce qui est permis.)

3. Matrice corrigée (exemple) :

Tâche	Coordinatrice	Stagiaire	Animateurs	Parents	Bureau
Diagnostic	A	R	C	C	I
Choix des goûters du trimestre	A	R	C	C	I
Achats des denrées	R	I	R	–	A
Préparation des goûters avec les enfants	A	C	R	R	–
Animation d'un atelier « goût » par mois	A	R	C	I	–
Évaluation	A	R	C	I	I
Validation du budget	C	–	–	–	A

4. Quand des bénévoles, des parents et des salariés travaillent ensemble, les rôles sont flous et chacun peut croire qu'un

autre s'occupe d'une tâche. La matrice rend visible qui fait quoi, évite les oublis et les doublons, et permet aux parents de savoir quand ils sont consultés et quand ils sont seulement informés.

Corrigé – Exercice 8.10

1. Faiblesses : article 1, objet flou (aucune action, aucune période) ; article 2, logo sur les fiches recettes et recettes imposées avec la marque du distributeur : c'est de la publicité auprès de mineurs et une perte d'indépendance ; article 3, engagement vague (quelles denrées, quelle quantité, quel montant ?) ; article 4, transmission de données personnelles de mineurs à des fins commerciales, contraire au RGPD et à l'éthique ; article 5, durée illimitée, sans possibilité de sortie.

2. Article 1 : « La présente convention définit les modalités du soutien du supermarché au cycle de six ateliers "cuisiner à 15 ans" organisé par la MJC des Rives de janvier à juin 2027. » Article 3 : « Le supermarché fournit gratuitement les denrées des six ateliers, dans la limite de 60 € par atelier, selon la liste transmise par la MJC une semaine avant chaque atelier. Le choix des recettes et des produits reste de la seule responsabilité de la MJC. » Article 4 : « Aucune donnée personnelle des participants n'est transmise au supermarché. La MJC transmet un bilan agrégé et anonyme du cycle. »

3. Il manque : la communication (mention sobre du soutien, par exemple « avec le soutien de… » sur l'affiche, jamais sur les supports éducatifs, validation commune) ; le suivi et l'évaluation (point à mi-parcours, bilan) ; la modification et la résiliation (avenant, préavis) ; les signatures des représentants légaux.

4. Non : le partenariat avec un commerce local peut être utile (accès aux produits, ancrage dans le quartier). La directrice doit en revanche refuser ce texte et proposer une convention qui protège l'indépendance pédagogique et les données des jeunes. Si le supermarché refuse ces conditions, elle renonce au partenariat.

Corrigé – Exercice 8.11

1. Apports : pour le chef, la reconnaissance de son savoir-faire (il co-anime et crée les recettes), moins de légumes jetés (31 % aujourd'hui), un travail valorisé auprès des salariés ; pour le prestataire, un argument pour reconquérir des couverts (– 8 % en un an), une image d'entreprise engagée, des économies sur les denrées jetées.

2. Temps : 2 × 1,5 + 3 × 1 + 4 × 2 = 3 + 3 + 8 = **14 heures** ; valorisation : 14 × 27 = **378 €**. Si le prestataire ne facture pas ce temps, c'est une **contribution volontaire en nature** : 378 € au **compte 86** (emplois, côté charges) et 378 € au **compte 87** (contributions, côté produits).

3. Les 420 repas correspondent à la situation actuelle après une perte de 8 % : les repas d'il y a un an étaient 420 / 0,92 = 456,5, soit environ **457 repas** ; perte : 457 − 420 = **37 couverts par jour** (36,5 arrondi). Sur une semaine de 5 jours : 36,5 × 5 = 182,6, soit environ **183 repas**. On accepte aussi le calcul simplifié 420 × 0,08 = 33,6, soit 34 couverts par jour et 168 par semaine, s'il est expliqué.

4. Exemple : « Merci de me recevoir. Je ne viens pas juger votre cuisine : je viens vous demander votre aide, parce que vous connaissez mieux que personne ce que les salariés mangent et ce qu'ils laissent. Nous aimerions construire avec vous quelques recettes de légumes qui reviennent moins sur les plateaux. »

5. Exemples : le service de santé au travail s'engage à présenter le chef comme co-auteur des recettes et à financer les supports de dégustation ; le prestataire s'engage à proposer les quatre recettes au menu au moins une fois par mois et à transmettre le relevé des retours de plateaux chaque mois.

Corrigé – Exercice 8.12

1. Taux de présence : 25 / 36 × 100 = **69,4 %**. Il est inférieur à l'objectif de 80 % (écart de 10,6 points). Les abandons liés à l'horaire de 14 h expliquent une partie de l'écart ; le passage au samedi matin répond à cette cause.

2. Avancement : 3 ateliers sur 6, soit 50 %. Budget consommé : 820 / 2 000 × 100 = **41 %**. La consommation est inférieure à l'avancement : il reste 2 000 − 820 = **1 180 €** pour la seconde moitié, ce qui laisse une marge, par exemple pour louer une autre cuisine.

3. Compte rendu (exemple) :

Comité de pilotage du projet « Prévenir le diabète en cuisinant » – MSP de la Haute-Sorne – jeudi 14 janvier 2027, 18 h – 19 h 30.

Présents : Dr Mallet (médecin coordinateur), Mme Bataille (infirmière Asalée), M. Ortiz (diététicien), Mme Leroux (patiente représentante), la stagiaire en diététique (rédactrice). Excusées : Mme Faure (pharmacienne), Mme Henri (chargée de mission du contrat local de santé).

Points abordés : 1. Avancement : 3 ateliers sur 6 réalisés. 2. Participation : 25 présences sur 36 possibles (69,4 %, objectif 80 %) ; deux patients ont arrêté à cause de l'horaire. 3. Budget : 820 € consommés sur 2 000 € (41 %). 4. Logistique : la cuisine du lycée hôtelier n'est plus disponible en mars. 5. Avis des patients : demande d'un atelier le samedi ; fiche « étiquettes » difficile à lire.

Décisions : les ateliers 4 à 6 auront lieu le samedi de 10 h à 12 h 30 ; la fiche « étiquettes » est réimprimée en grands caractères.

Action	Responsable	Échéance
Rappeler les patients absents	Mme Bataille	21 janvier 2027
Réimprimer la fiche « étiquettes » en grands caractères	La stagiaire	28 janvier 2027
Relire la nouvelle fiche	Mme Leroux	28 janvier 2027
Trouver une autre cuisine pour mars	M. Ortiz	31 janvier 2027

Prochaine réunion : jeudi 6 mai 2027, 18 h, salle de réunion de la MSP (bilan final).

4. À tous les membres du comité, présents **et excusés** (Mme Faure et Mme Henri doivent connaître les décisions), dans les **48 heures**, après relecture rapide par le médecin coordinateur.

5. Elle apporte le point de vue des patients (horaires, lisibilité des documents), que les professionnels n'avaient pas vu ; ses propositions ont conduit à deux décisions. Sa présence rend le projet plus acceptable et applique le principe de participation des personnes concernées.

Partie 3 – Les financements et les appels à projets

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les étapes de la réponse à un appel à projets.
- Associer un projet au financeur adapté.
- Lire un cahier des charges : éligibilité, exclusions, plafond, taux.
- Calculer une subvention et construire un plan de financement qui respecte les règles de plusieurs financeurs.
- Utiliser une grille de sélection comme un membre de comité.
- Relire un dossier de demande et repérer ses incohérences.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Appel à projets : un financeur fixe dans un cahier des charges ses priorités, ses publics, ses critères d'éligibilité et de sélection, son calendrier et son montant ; les porteurs déposent un dossier ; un comité choisit selon une grille ; le porteur retenu rend un bilan.
- Sept étapes : lire le cahier des charges ; vérifier l'éligibilité ; faire correspondre le projet aux priorités ; rédiger ; remplir le formulaire (souvent le Cerfa n° 12156 ou Le Compte Asso) ; faire relire ; déposer avant la date limite.
- Financeurs : ARS (fonds d'intervention régional, article L. 1435-8 du Code de la santé publique) ; collectivités ; CAF ; conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015) pour les 60 ans et plus ; Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite ; fondations ; État (politique de la ville).
- Subvention = minimum (plafond ; taux × assiette). L'assiette est la base de calcul fixée par le financeur (souvent les dépenses éligibles, hors contributions en nature).
- Un financeur ne finance presque jamais 100 % : on montre un cofinancement et on distingue les financements acquis et sollicités.

Exercice 8.13 – Les étapes de la réponse à un appel à projets (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Jardins de la Combe (fictive) découvre le 1er février 2027 un appel à projets dont la date limite est le lundi 15 mars 2027 à midi. Le trésorier a noté en désordre ce qu'il faut faire.

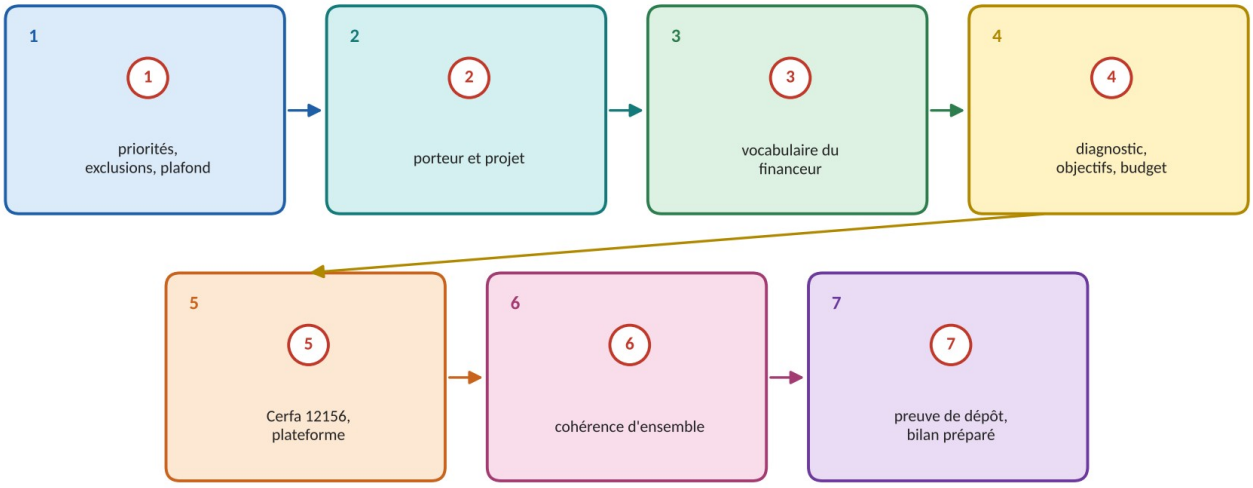


Figure 8.5 – Document 1 – Répondre à un appel à projets en sept étapes (schéma à légender)

Document 2 – Les notes du trésorier, en désordre

a) Demander à la présidente et au partenaire de relire le dossier.

b) Vérifier que l'association est déclarée, qu'elle a un numéro SIRET et un compte bancaire.

c) Créer le compte de l'association sur la plateforme et saisir le formulaire.

d) Déposer le dossier et enregistrer l'accusé de réception.

e) Lire tout le cahier des charges et surligner les actions exclues.

f) Rédiger le diagnostic, les objectifs, les actions et le budget.

g) Reprendre les mots du financeur : « publics prioritaires », « réduction des inégalités ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Remettez les notes du document 2 dans l'ordre des sept étapes. (3,5 pts)

3. Proposez une date de dépôt et justifiez-la. (1,5 pt)

4. Expliquez pourquoi il faut préparer le bilan dès le dépôt du dossier. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 8.14 – Qui finance quoi ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion du réseau des diététiciens de prévention d'un département, chacun présente un projet en recherche de financement. Vous devez proposer, pour chaque projet, le financeur le plus adapté.

Document 1 – Huit projets en recherche de financement

a) Des ateliers « bien manger après 70 ans » dans trois résidences autonomie.

b) Des ateliers parents-enfants dans un centre social, dans le cadre de l'animation collective familles.

c) Un programme de prévention de l'obésité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, inscrit dans le contrat de ville.

d) Des actions de nutrition pour des personnes en situation de précarité, inscrites dans le projet régional de santé.

e) L'amélioration des menus de la restauration scolaire d'une commune.

f) Un projet innovant de cuisine mobile pour les zones rurales isolées.

g) Des ateliers « retraite active et alimentation » pour des retraités du régime général qui vivent à domicile.

h) Un programme d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques, déclaré à l'ARS.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez un financeur pour chaque projet et justifiez en une ligne. (8 pts)

2. Pour le projet f), citez une précaution à prendre si le financeur est une fondation d'entreprise. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.15 – Lire un cahier des charges (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le conseil départemental de Brenne-et-Loir (collectivité fictive) publie un appel à projets « Bien manger en Brenne-et-Loir 2027 ». La date limite de dépôt est le 31 mars 2027. Vous aidez une animatrice territoriale de santé à analyser cinq projets avant de conseiller leurs porteurs.

Document 1 – Extraits du cahier des charges (fictif)

- Porteurs éligibles : associations déclarées depuis au moins un an à la date limite de dépôt ; communes ; CCAS.
- Publics prioritaires : familles avec au moins un enfant de moins de 6 ans ; personnes de 60 ans et plus vivant à domicile.
- Actions éligibles : actions collectives d'éducation pour la santé, actions sur l'environnement alimentaire.
- Actions exclues : consultations individuelles ; distribution de denrées seule ; investissements de plus de 500 € par équipement.
- Durée : 12 mois au plus.
- Montant : 50 % au plus des dépenses éligibles (dépenses monétaires hors investissements exclus), dans la limite de 4 000 € par projet.

Document 2 – Cinq projets

Projet	Porteur	Contenu	Durée	Budget total (dont contributions en nature)
P1	Association créée en 2019	8 ateliers parents-enfants de moins de 6 ans	10 mois	7 200 € (900 €)
P2	Association créée en mai 2026	Ateliers culinaires pour des seniors à domicile	9 mois	5 000 € (400 €)
P3	CCAS	Consultations diététiques individuelles pour les plus de 60 ans	12 mois	6 000 € (0 €)
P4	Commune	Jardins partagés et ateliers pour les familles	18 mois	8 500 € (1 200 €)
P5	Association créée en 2010	Ateliers dans un club de seniors, dont l'achat d'un four à 650 €	12 mois	11 000 € (1 000 €)

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque projet est éligible, et justifiez. (5 pts)

2. Calculez la subvention maximale du projet P1. (2 pts)

3. Calculez la subvention maximale du projet P5, en tenant compte de l'achat du four. (3 pts)

4. Proposez un conseil au porteur du projet P4 pour qu'il puisse déposer un dossier. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.16 – Construire un plan de financement (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

L'association Âge d'Or en Cuisine (fictive) prépare huit ateliers « bien manger chez soi » pour 15 personnes de plus de 60 ans vivant à domicile. Le coût total du projet est de 9 600 €, dont 1 200 € de contributions en nature (bénévolat et salle prêtée). Vous construisez le plan de financement.

Document 1 – Règles des financeurs (fictives)

- Conférence des financeurs : 60 % au plus des charges monétaires, dans la limite de 5 000 €.
- Caisse de retraite : 1 500 € au plus.
- Commune : 1 000 €, déjà accordés (financement acquis).
- Participation des personnes : 2 € par atelier et par personne.
- Exigence de la conférence des financeurs : l'autofinancement de l'association doit représenter au moins 10 % des charges monétaires.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les charges monétaires du projet. (1 pt)

2. Calculez la subvention maximale de la conférence des financeurs et la participation totale des personnes. (2 pts)

3. Si l'on demande le maximum à chaque financeur, calculez l'autofinancement nécessaire et vérifiez la règle des 10 %. (3 pts)

4. Proposez un plan de financement équilibré qui respecte toutes les règles, sous forme de tableau, contributions en nature comprises. (4 pts)

5. Indiquez quels financements sont acquis et lesquels sont sollicités, et pourquoi il faut le préciser. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.17 – Évaluer des dossiers avec une grille de sélection (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice siège au comité de sélection d'un appel à projets intercommunal (fictif) doté de 8 000 €. Elle vous demande de préparer la notation de trois dossiers. Chaque critère est noté de 0 à 4 ; les points obtenus sont égaux au poids × note / 4. Un dossier doit obtenir au moins 60 points sur 100 pour être financé.

Document 1 – Grille et notes proposées

Critère	Poids	Dossier X	Dossier Y	Dossier Z
Diagnostic chiffré et sourcé	20	3	4	2
Objectifs SMART reliés aux constats	15	2	4	1
Public prioritaire	15	4	2	3
Qualité et cohérence des actions	20	3	3	2
Partenariats engagés	10	2	4	1
Évaluation prévue	10	1	3	0
Budget équilibré et cofinancé	10	3	2	2

Document 2 – Montants demandés

Dossier X : 3 500 € (familles en quartier prioritaire). Dossier Y : 4 000 € (salariés d'une zone d'activités). Dossier Z : 3 000 € (jeunes d'un foyer rural).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de points de chaque dossier, critère par critère, puis le total. (5 pts)
2. Indiquez les dossiers qui peuvent être financés et vérifiez l'enveloppe. (2 pts)
3. Le dossier X touche le public le plus prioritaire mais prévoit mal son évaluation. Rédigez le conseil que le comité peut lui adresser. (2 pts)
4. Rédigez deux conseils au porteur du dossier Z pour un prochain dépôt. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.18 – Relire un dossier de demande de subvention (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue a rédigé la réponse de l'association Tables Ouvertes (fictive) à un appel à projets de l'ARS (fictif) dont le plafond est de 3 500 € par projet. Le public prioritaire de l'appel à projets est : « personnes en situation de précarité ». Elle vous demande une relecture critique avant le dépôt.

Document 1 – Extraits du dossier

Contexte : « Beaucoup de personnes ont du mal à bien manger dans notre ville. »

Public : « Tout public. »

Objectif : « Sensibiliser la population à l'équilibre alimentaire. »

Actions : « Six ateliers de cuisine et une conférence. »

Évaluation : « Un questionnaire de satisfaction. »

Calendrier : « De janvier 2027 à juin 2028. »

Document 2 – Budget prévisionnel du dossier

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Achats (denrées, petit matériel)	1 240 €	74 – Subvention ARS sollicitée	4 000 €
62 – Honoraires d'une diététicienne	2 100 €	74 – Commune (acquise)	1 500 €
64 – Personnel (coordination)	3 600 €	70 – Participation des personnes	300 €
86 – Bénévolat valorisé	800 €	87 – Bénévolat valorisé	600 €
		Autofinancement	1 140 €
Total	7 740 €	Total	7 540 €

Phrase du dossier : « La subvention ARS représente 45 % du budget total. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez les faiblesses du texte (document 1) et proposez une correction pour chacune. (6 pts)

2. Vérifiez le budget : totaux, équilibre, comptes 86 et 87. (3 pts)

3. Calculez la part réelle de la subvention de l'ARS dans le budget et comparez-la au plafond. (3 pts)

4. Proposez un budget corrigé, équilibré, qui respecte le plafond, sans changer les charges. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 8.13

1. Légendes : 1 Lire le cahier des charges ; 2 Vérifier l'éligibilité ; 3 Faire correspondre ; 4 Rédiger ; 5 Remplir le formulaire ; 6 Faire relire ; 7 Déposer avant la date.

2. Ordre : e) lire le cahier des charges → b) vérifier l'éligibilité → g) reprendre les mots du financeur → f) rédiger → c) saisir le formulaire sur la plateforme → a) faire relire → d) déposer et garder l'accusé de réception.

3. Exemple : déposer le **mercredi 10 mars 2027**, soit quelques jours avant la date limite, pour faire face à une panne de la plateforme, à une pièce manquante (relevé d'identité bancaire, statuts) ou à une signature en retard. Un dépôt le dernier jour expose au refus si un incident survient.

4. Le financeur demandera un bilan (compte rendu d'activité et compte rendu financier) avec les indicateurs annoncés dans le dossier. Si l'on ne recueille pas les données dès le début (présences, questionnaires « avant »), on ne pourra pas les reconstituer à la fin.

Corrigé – Exercice 8.14

1. Propositions :

Projet	Financeur	Justification
a) Ateliers en résidences autonomie	Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie	Prévention pour les 60 ans et plus (loi du 28 décembre 2015) ; les résidences autonomie en relèvent
b) Ateliers parents-enfants	CAF	Animation collective familles des centres sociaux, soutien à la parentalité
c) Quartier prioritaire	État (crédits de la politique de la ville) et commune	Action inscrite dans le contrat de ville
d) Nutrition et précarité	ARS (fonds d'intervention régional)	Prévention conforme au projet régional de santé, publics prioritaires
e) Menus de la cantine	Commune	La restauration scolaire du premier degré relève de la commune
f) Cuisine mobile en zone rurale	Fondation, ou programme européen de développement rural	Projet innovant ; les fondations financent souvent l'innovation
g) Retraités du régime général	Caisse de retraite (action sociale)	Prévention « bien vieillir » pour ses retraités à domicile
h) Éducation thérapeutique	ARS	Depuis le décret du 31 décembre 2020, les programmes d'ETP sont déclarés à l'ARS ; ils peuvent être financés par le fonds d'intervention régional

2. Vérifier l'absence de **conflit d'intérêts** : la fondation ne doit pas imposer ses produits, son logo sur les supports éducatifs ou ses messages ; prévoir une convention qui garantit l'indépendance du contenu et la transparence du financement (chapitre 6).

Corrigé – Exercice 8.15

1. P1 : **éligible** (association de plus d'un an, public prioritaire des familles avec enfants de moins de 6 ans, action collective, 10 mois). P2 : **non éligible** : l'association a été créée en mai 2026, elle aura moins d'un an au 31 mars 2027. P3 : **non éligible** : les consultations individuelles sont exclues. P4 : **non éligible en l'état** : 18 mois dépasse la durée maximale de 12 mois. P5 : **éligible**, mais l'achat du four (650 €, plus de 500 €) est exclu des dépenses éligibles.

2. P1 : dépenses éligibles = 7 200 − 900 = **6 300 €** ; 50 % × 6 300 = **3 150 €** ; inférieur au plafond de 4 000 € : subvention maximale **3 150 €**.

3. P5 : dépenses éligibles = 11 000 − 1 000 − 650 = **9 350 €** ; 50 % × 9 350 = **4 675 €** ; supérieur au plafond : subvention maximale **4 000 €**. Le four doit être financé autrement (fonds propres, autre financeur).

4. Découper le projet : déposer une première phase de 12 mois au plus (par exemple la création des jardins et les ateliers de la première saison), puis une seconde phase l'année suivante ; ou réduire la durée du projet à 12 mois.

Corrigé – Exercice 8.16

1. Charges monétaires : 9 600 − 1 200 = **8 400 €**.

2. Conférence des financeurs : 60 % × 8 400 = 5 040 €, supérieur au plafond : **5 000 €**. Participation : 2 € × 8 ateliers × 15

personnes = **240 €**.

3. Financements maximaux : 5 000 + 1 500 + 1 000 + 240 = **7 740 €** ; autofinancement nécessaire : 8 400 − 7 740 = **660 €**, soit 660 / 8 400 × 100 = **7,9 %** : la règle des 10 % **n'est pas respectée**. Il faut au moins 10 % × 8 400 = **840 €** d'autofinancement.

4. On porte l'autofinancement à 840 € et l'on réduit d'autant la demande à la caisse de retraite : 8 400 − 5 000 − 1 000 − 240 − 840 = **1 320 €**.

Produits	Montant	Statut
74 – Conférence des financeurs	5 000 €	Sollicité
74 – Caisse de retraite	1 320 €	Sollicité
74 – Commune	1 000 €	Acquis
70 – Participation des personnes	240 €	Prévu
Autofinancement de l'association	840 €	Acquis
87 – Contributions volontaires en nature	1 200 €	Prévu
Total	**9 600 €**	

Vérification : 5 000 + 1 320 + 1 000 + 240 + 840 = 8 400 € de produits monétaires, plus 1 200 € de contributions en nature (comptes 86 et 87 égaux) = 9 600 €, égal aux charges.

5. Acquis : la commune (déjà accordée) et l'autofinancement. Sollicités : la conférence des financeurs et la caisse de retraite. Le financeur doit savoir ce qui est certain et ce qui dépend d'autres décisions ; si une demande est refusée, le projet devra être réduit ou financé autrement. C'est une règle de **prudence**.

Corrigé – Exercice 8.17

1. Points (poids × note / 4) :

Critère	X	Y	Z
Diagnostic (20)	15	20	10
Objectifs (15)	7,5	15	3,75
Public prioritaire (15)	15	7,5	11,25
Actions (20)	15	15	10
Partenariats (10)	5	10	2,5
Évaluation (10)	2,5	7,5	0
Budget (10)	7,5	5	5
Total	**67,5**	**80**	**42,5**

2. X (67,5) et Y (80) dépassent le seuil de 60 points ; Z (42,5) ne l'atteint pas. Enveloppe : 3 500 + 4 000 = **7 500 €** ≤ 8 000 € : les deux dossiers peuvent être financés ; il reste 500 €.

3. Exemple : « Le comité retient votre projet, qui touche un public prioritaire. Il vous demande de préciser avant le premier versement les indicateurs d'évaluation (présence, questionnaire avant/après sur les pratiques), leurs valeurs cibles et la façon de les recueillir. »

4. Exemples : appuyer le diagnostic sur des données locales chiffrées et datées (enquête auprès des jeunes du foyer, données de la structure) ; rédiger des objectifs SMART reliés aux constats et prévoir des indicateurs d'évaluation ; joindre des lettres d'engagement des partenaires.

Corrigé – Exercice 8.18

1. Faiblesses et corrections :

Élément	Faiblesse	Correction
Contexte	Aucune donnée, aucune source	Données locales chiffrées et datées (Insee, enquête auprès des personnes accueillies)
Public	« Tout public » : ne correspond pas au public prioritaire	Personnes en situation de précarité accueillies par l'association, nombre prévu
Objectif	« Sensibiliser » : verbe flou, non mesurable	Objectifs SMART, par exemple : « Dans 12 mois, 50 % des participants cuisinent un repas à base de légumes au moins deux fois par semaine (valeur initiale à mesurer) »

Élément	Faiblesse	Correction
Actions	Pas de détail ; la conférence convient mal au public	Fiche QQOQCCP de chaque atelier ; remplacer la conférence par une action plus active
Évaluation	Satisfaction seulement	Indicateurs de processus (présence) et de résultats (pratiques avant/après)
Calendrier	18 mois	À vérifier dans le cahier des charges, qui limite souvent la durée à 12 mois

2. Total des charges : 1 240 + 2 100 + 3 600 + 800 = **7 740 €** (exact). Total des produits : 4 000 + 1 500 + 300 + 600 + 1 140 = **7 540 €** (exact). Le budget **n'est pas équilibré** : il manque 200 €. La cause : le compte 87 (600 €) n'est pas égal au compte 86 (800 €).

3. Part réelle : 4 000 / 7 740 × 100 = **51,7 %**, et non 45 %. De plus, 4 000 € **dépasse le plafond** de 3 500 €.

4. Budget corrigé (exemple) : charges inchangées (7 740 €). Produits : ARS 3 500 € ; commune 1 500 € ; participation 300 € ; 87 – bénévolat 800 € ; autofinancement 1 640 €. Total : 3 500 + 1 500 + 300 + 800 + 1 640 = **7 740 €**. Part de l'ARS : 3 500 / 7 740 × 100 = **45,2 %**. Si l'association ne peut pas apporter 1 640 €, elle cherche un autre cofinancement (CAF, fondation) ou réduit les charges.

Partie 4 – Planifier le projet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Lire une tâche du réseau PERT et calculer les dates au plus tôt, au plus tard et les marges.
- Construire un diagramme de Gantt avec des jalons et des contraintes de calendrier.
- Trouver le chemin critique d'un projet et la durée minimale.
- Mesurer l'effet d'un retard et décider d'un ajustement.
- Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps.
- Fixer des dates réelles en tenant compte des contraintes du public et des lieux.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diagramme de Gantt (Henry Gantt, vers 1910) : les tâches en lignes, le temps en colonnes ; chaque tâche est une barre ; on ajoute les jalons (dates clés) et les dépendances.
- Réseau PERT (1958) : il représente les tâches et leurs antériorités. Calcul aller : début au plus tôt d'une tâche = maximum des fins au plus tôt des tâches qui la précèdent. Calcul retour : fin au plus tard = minimum des débuts au plus tard des tâches qui la suivent.
- Marge = début au plus tard − début au plus tôt. Chemin critique : suite des tâches de marge nulle ; sa durée est la durée minimale du projet.
- Un retard sur une tâche critique retarde tout le projet ; un retard sur une tâche qui a une marge n'a d'effet que s'il dépasse la marge.
- Marge de sécurité : 10 à 20 % sur les tâches qui dépendent d'autres personnes ; dépôt d'un dossier quelques jours avant la date limite.

Exercice 8.19 – Lire une tâche du réseau PERT (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer un projet court dans une association de quartier (fictive), votre tutrice vous demande de maîtriser la lecture d'une tâche PERT, puis de calculer un petit réseau.

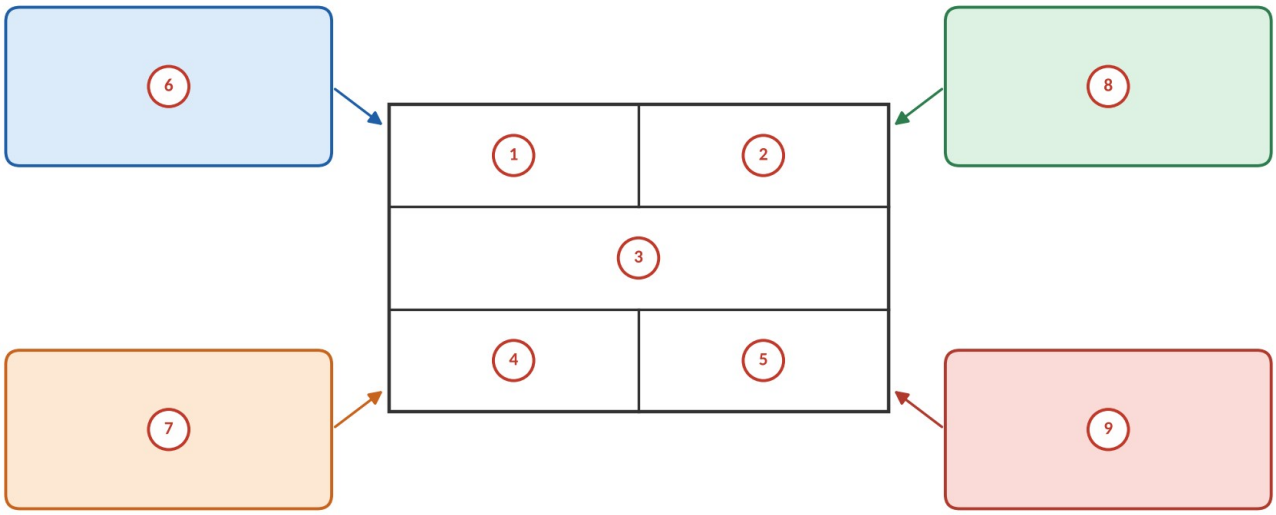


Figure 8.6 – Document 1 – Lire une tâche du réseau PERT (schéma à légender)

Document 2 – Un petit projet de cinq tâches (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Réunion de lancement	1	–
B	Conception des ateliers	4	A
C	Réservation de la salle et du matériel	2	A
D	Trois ateliers	3	B, C
E	Commande des fiches recettes imprimées	2	C

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)

2. Calculez les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche du document 2. (3 pts)

3. Calculez les marges, donnez le chemin critique et la durée minimale du projet. (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 8.20 – Construire un diagramme de Gantt (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de santé communautaire du Mail (structure fictive) prépare un cycle de cinq ateliers hebdomadaires « marcher et cuisiner ». Le projet commence la semaine 1. Le centre est fermé la semaine 10 (congés du personnel). Le comité de pilotage de bilan doit se réunir au plus tard la semaine 15.

Document 1 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic complémentaire	2	–
B	Conception des ateliers	2	A
C	Réservation de la salle et du matériel	1	A
D	Communication et inscriptions	3	B
E	Achat du petit matériel	1	C
F	Cinq ateliers, un par semaine	5	D, E
G	Évaluation et bilan	2	F

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez pour chaque tâche la semaine de début et la semaine de fin, sans tenir compte de la fermeture. (3 pts)

2. Construisez le diagramme de Gantt sur 15 semaines en tenant compte de la fermeture de la semaine 10. (3 pts)

3. Placez trois jalons sur le diagramme. (2 pts)

4. Le comité de bilan peut-il se réunir la semaine 15 ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.21 – Calculer un réseau PERT complet (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

L'association Bocal et Compagnie (fictive) monte une épicerie itinérante qui proposera aussi des ateliers culinaires dans six villages. Le projet commence à la semaine 0. Vous devez calculer sa durée et repérer les tâches à surveiller.

Document 1 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic dans les six villages	3	–
B	Choix des actions	1	A
C	Dossier de financement	2	B
D	Recherche de partenaires (mairies, producteurs)	3	A
E	Conception des ateliers	3	B
F	Formation des bénévoles	2	D, E
G	Communication dans les villages	1	C, E
H	Tournée et ateliers	8	F, G
I	Évaluation et bilan	2	H

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les dates de début et de fin au plus tôt de chaque tâche. (4 pts)

2. Calculez les dates de début et de fin au plus tard. (3 pts)

3. Calculez les marges, donnez le chemin critique et la durée minimale du projet. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi le dossier de financement (C) n'est pas critique, et pourquoi il faut pourtant le surveiller. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.22 – Mesurer l'effet d'un retard (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Reprenez le réseau de l'exercice 8.21 (durée minimale : 19 semaines). Au cours du projet, plusieurs incidents sont envisagés. On les étudie un par un.

Document 1 – Quatre incidents possibles

- Incident 1 : la recherche de partenaires (D) prend 5 semaines au lieu de 3, car deux mairies tardent à répondre.
- Incident 2 : le dossier de financement (C) prend 4 semaines au lieu de 2.
- Incident 3 : la formation des bénévoles (F) prend 3 semaines au lieu de 2.
- Incident 4 : la communication (G) prend 2 semaines au lieu de 1.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, calculez la nouvelle durée du projet. (6 pts)

2. Pour l'incident 1, donnez le nouveau chemin critique. (2 pts)

3. Pour l'incident 2, expliquez ce qui change dans le réseau même si la durée du projet ne change pas. (2 pts)

4. Proposez une mesure pour éviter l'incident 1. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.23 – Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

La conseillère en économie sociale et familiale (CESF) d'un centre social (fictif) anime un cycle de six ateliers culinaires. Son employeur lui demande d'estimer le temps qu'elle y consacrera, puis de le comparer au temps réel. Son coût horaire chargé, communiqué par l'employeur, est de 23 €.

Document 1 – Estimation de la charge de travail

Tâche	Base de calcul
Préparation (conducteur, fiches)	3 h par atelier
Achats	1 h par atelier
Animation	2 h 30 par atelier
Rangement et bilan à chaud	30 min par atelier
Réunions du comité technique	3 réunions d'1 h 30
Communication et inscriptions	6 h au total
Évaluation et bilan écrit	8 h au total

Document 2 – Feuille de temps réelle à la fin du cycle

Total des heures notées par la CESF : 72 heures. Elle signale que les inscriptions ont demandé de nombreux appels téléphoniques et que deux fiches recettes ont été réécrites en facile à lire et à comprendre (FALC).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures prévues pour chaque tâche et le total. (4 pts)

2. Calculez le coût prévu et le coût réel du temps de la CESF. (2 pts)

3. Calculez l'écart en heures et en pourcentage, et interprétez-le. (3 pts)

4. Expliquez l'intérêt d'une feuille de temps pour le prochain projet et pour le bilan financier. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.24 – Fixer les dates réelles d'un cycle d'ateliers (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social des Hauts-Prés (fictif) prépare six ateliers hebdomadaires « cuisiner en famille », le mardi de 14 h à 16 h 30, pour des mères de famille du quartier. Le comité de pilotage de bilan est fixé au mardi 1er juin 2027 ; l'évaluation demande une semaine après le dernier atelier. Vous devez proposer les dates.

Document 1 – Contraintes recueillies

- Les ateliers peuvent commencer à partir du mardi 2 mars 2027.
- Plusieurs participantes jeûnent pendant le mois de Ramadan, attendu du 8 février au 9 mars 2027 environ ; elles souhaitent que le cycle commence après.
- La cuisine est réservée pour une formation le mardi 6 avril 2027.
- Le centre social est fermé du lundi 19 au vendredi 30 avril 2027 (congés du personnel, dates fictives).
- Les participantes demandent que les ateliers se suivent, sans plus de deux semaines d'interruption.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez les six dates du cycle et justifiez chacune. (5 pts)

2. Vérifiez que le calendrier permet l'évaluation avant le comité de bilan. (2 pts)

3. Identifiez l'interruption la plus longue et proposez une action pour garder le lien avec les participantes pendant cette période. (3 pts)

4. Construisez un rétroplanning des tâches de préparation, en partant du premier atelier. (4 pts)

5. Expliquez pourquoi le calendrier doit être construit avec les participantes plutôt que pour elles. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 8.19

1. Légendes : 1 Début au plus tôt ; 2 Fin au plus tôt ; 3 Tâche et durée ; 4 Début au plus tard ; 5 Fin au plus tard ; 6 Calcul aller : on prend le maximum des fins ; 7 Calcul retour : on prend le minimum des débuts ; 8 Marge = début au plus tard − début au plus tôt ; 9 Chemin critique : tâches de marge nulle.

2. et 3. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (1)	0	1	0	1	0
B (4)	1	5	1	5	0
C (2)	1	3	3	5	2
D (3)	max(5 ; 3) = 5	8	5	8	0
E (2)	3	5	6	8	3

Calcul retour : D et E finissent au plus tard à 8 ; C doit finir avant le début au plus tard de D (5) et de E (6) : minimum = 5. A doit finir avant le début au plus tard de B (1) et de C (3) : minimum = 1. Chemin critique : **A → B → D**, durée minimale **8 semaines** (1 + 4 + 3). C a une marge de 2 semaines, E de 3 semaines.

Corrigé – Exercice 8.20

1. A : semaines 1 à 2. B : 3 à 4. C : semaine 3. D : 5 à 7 (après B). E : semaine 4 (après C). F : 8 à 12 (après D, qui finit en semaine 7, et E). G : 13 à 14.

2. Avec la fermeture de la semaine 10, les ateliers ont lieu les semaines 8, 9, 11, 12 et 13 ; l'évaluation se fait les semaines 14 et 15.

Tâche	Semaines occupées
A – Diagnostic	1, 2
B – Conception	3, 4
C – Réservation	3
D – Communication	5, 6, 7
E – Achat du matériel	4 (marge jusqu'à la semaine 7)
F – Ateliers	8, 9, (fermeture en 10), 11, 12, 13
G – Évaluation	14, 15

3. Exemples de jalons : fin de la semaine 4, « ateliers conçus et validés » ; fin de la semaine 7, « inscriptions closes » ; fin de la semaine 13, « fin des ateliers » ; fin de la semaine 15, « comité de bilan ».

4. Oui, mais **sans aucune marge** : l'évaluation se termine en fin de semaine 15. Le comité doit se réunir à la fin de la semaine 15 ; le moindre retard d'une tâche critique (A, B, D, F, G) le reporterait. Il faut surveiller ces tâches ou prévoir de présenter un bilan provisoire.

Corrigé – Exercice 8.21

1. à 3. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (3)	0	3	0	3	0
B (1)	3	4	3	4	0
C (2)	4	6	6	8	2
D (3)	3	6	4	7	1
E (3)	4	7	4	7	0
F (2)	max(6 ; 7) = 7	9	7	9	0
G (1)	max(6 ; 7) = 7	8	8	9	1
H (8)	max(9 ; 8) = 9	17	9	17	0
I (2)	17	19	17	19	0

Calcul retour (exemples) : H commence au plus tard à 17 − 8 = 9 ; F et G doivent finir à 9 ; E doit finir avant le début au plus tard de F (7) et de G (8) : minimum = 7 ; B doit finir avant le début au plus tard de C (6) et de E (4) : minimum = 4 ; A doit finir avant le début au plus tard de B (3) et de D (4) : minimum = 3.

Chemin critique : **A → B → E → F → H → I**, soit 3 + 1 + 3 + 2 + 8 + 2 = **19 semaines**.

4. C a une marge de 2 semaines : il peut glisser de 2 semaines sans retarder le projet. Mais un dossier de financement dépend d'une date limite fixée par le financeur et d'une réponse qui conditionne les achats et la trésorerie : un retard au-delà de la marge, ou un refus, compromettrait toute la tournée. On le surveille donc comme une tâche à risque.

Corrigé – Exercice 8.22

1. Incident 1 (D = 5) : D finit à 3 + 5 = 8 ; F commence à max(8 ; 7) = 8 et finit à 10 ; H : 10 à 18 ; I : 18 à 20. **Durée : 20 semaines** (+ 1 semaine : la marge de D, 1 semaine, absorbe une partie du retard). Incident 2 (C = 4) : C finit à 8 ; G commence à max(8 ; 7) = 8 et finit à 9 ; H commence toujours à 9. **Durée : 19 semaines** (la marge de C, 2 semaines, absorbe le retard). Incident 3 (F = 3) : F est critique ; F finit à 10 ; **durée : 20 semaines**. Incident 4 (G = 2) : G finit à 9 ; H commence toujours à 9 ; **durée : 19 semaines** (marge de G : 1 semaine).

2. Incident 1 : nouveau chemin critique **A → D → F → H → I** (3 + 5 + 2 + 8 + 2 = 20 semaines). B et E ne sont plus critiques (marge d'une semaine).

3. Incident 2 : la marge de C est entièrement consommée ; C et G deviennent **critiques** (il existe alors un second chemin critique A → B → C → G → H → I de 19 semaines). Le moindre retard supplémentaire sur C ou G retarderait tout le projet.

4. Exemples : contacter les mairies dès la fin du diagnostic, avec un courrier et un rendez-vous fixé à l'avance ; s'appuyer sur un élu relais ; prévoir une relance à date fixe ; démarrer la recherche de partenaires en parallèle de la fin du diagnostic.

Corrigé – Exercice 8.23

1. Préparation : 6 × 3 = **18 h** ; achats : 6 × 1 = **6 h** ; animation : 6 × 2,5 = **15 h** ; rangement : 6 × 0,5 = **3 h** ; réunions : 3 × 1,5 = **4,5 h** ; communication : **6 h** ; évaluation : **8 h**. Total : 18 + 6 + 15 + 3 + 4,5 + 6 + 8 = **60,5 heures**.

2. Coût prévu : 60,5 × 23 = **1 391,50 €** ; coût réel : 72 × 23 = **1 656,00 €**.

3. Écart : 72 − 60,5 = **+ 11,5 heures**, soit 11,5 / 60,5 × 100 = **+ 19,0 %** (264,50 € de plus). Le temps a été sous-estimé, surtout pour les inscriptions (appels téléphoniques) et pour l'adaptation des fiches en FALC. Ces tâches sont réelles et utiles ; il faut les prévoir dans le prochain projet.

4. La feuille de temps permet de mieux estimer les prochains projets (on connaît le temps réel par tâche), de justifier les charges de personnel dans le compte rendu financier remis au financeur, et de repérer les tâches qui prennent plus de temps que prévu pour les organiser autrement.

Corrigé – Exercice 8.24

1. Dates proposées : **mardi 16 mars** (premier mardi après la fin du Ramadan, le 9 mars environ ; le 2 et le 9 mars sont exclus) ; **23 mars** ; **30 mars** ; le 6 avril est exclu (formation) ; **13 avril** ; les 20 et 27 avril sont exclus (fermeture du centre) ; **4 mai** ; **11 mai 2027**.

2. Dernier atelier le 11 mai ; évaluation du 12 au 18 mai ; il reste deux semaines avant le comité du 1er juin. Le calendrier convient, avec une marge de deux semaines.

3. L'interruption la plus longue va du 13 avril au 4 mai : trois semaines entre deux ateliers, soit deux mardis sans atelier, ce qui respecte tout juste la demande des participantes. Pour garder le lien : un défi « recette à la maison » donné le 13 avril, avec une photo du plat à partager si elles le souhaitent, et un message de rappel la veille du 4 mai.

4. Rétroplanning (exemple) :

Échéance	Tâche
Semaine du 8 février	Réunion avec trois participantes pour choisir les thèmes et les dates
Semaine du 15 février	Réservation de la cuisine pour les six dates ; vérification du matériel
Semaine du 22 février	Affiches et bouche-à-oreille ; début des inscriptions
Semaine du 1er mars	Conducteurs et fiches recettes des trois premiers ateliers ; recueil des allergies
Vendredi 12 mars	Achats du premier atelier ; confirmation des inscriptions
Lundi 15 mars	Rappel téléphonique aux participantes

5. Les participantes connaissent leurs contraintes (jeûne, enfants, travail, transports) ; un calendrier construit avec elles réduit les absences et montre que leur avis compte. C'est une application du principe de participation et un moyen

> d'augmenter le taux de présence.

Partie 5 – Construire et suivre le budget

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer des charges et des produits dans les comptes du plan comptable associatif.
- Calculer un coût horaire chargé et le coût du temps affecté au projet.
- Construire un budget prévisionnel équilibré, contributions en nature comprises.
- Calculer et interpréter des ratios d'analyse.
- Calculer des écarts entre le prévu et le réalisé et les expliquer.
- Calculer le coût complet d'un atelier et le nombre minimal de participants.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Plan comptable associatif (règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018) ; formulaire de demande de subvention : Cerfa n° 12156.
- Charges : 60 achats ; 61 services extérieurs (locations, assurances) ; 62 autres services extérieurs (honoraires, publicité et impressions, déplacements) ; 63 impôts et taxes ; 64 charges de personnel ; 86 emplois des contributions volontaires en nature.
- Produits : 70 ventes et participations ; 74 subventions d'exploitation ; 75 cotisations et dons ; 87 contributions volontaires en nature ; l'autofinancement du porteur complète.
- Règles d'or : équilibre (total des charges = total des produits) ; compte 86 = compte 87 ; cofinancement ; cohérence avec les actions ; justification (quantité × coût unitaire) ; prudence (acquis et sollicités).
- Coût horaire chargé = brut mensuel × (1 + taux de charges patronales) / heures mensuelles ; à 35 h par semaine : 35 × 52 / 12 = 151,67 h. On utilise toujours le taux fourni par l'employeur.
- Écart (€) = réalisé − prévu ; écart (%) = écart / prévu × 100. Un écart global inférieur à 5 % est en général jugé satisfaisant ; chaque écart important est expliqué.

Exercice 8.25 – La structure d'un budget prévisionnel (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des familles du Clos-Fleuri (fictive) prépare son premier budget de projet. Le trésorier a listé les lignes, mais ne sait pas où les placer.

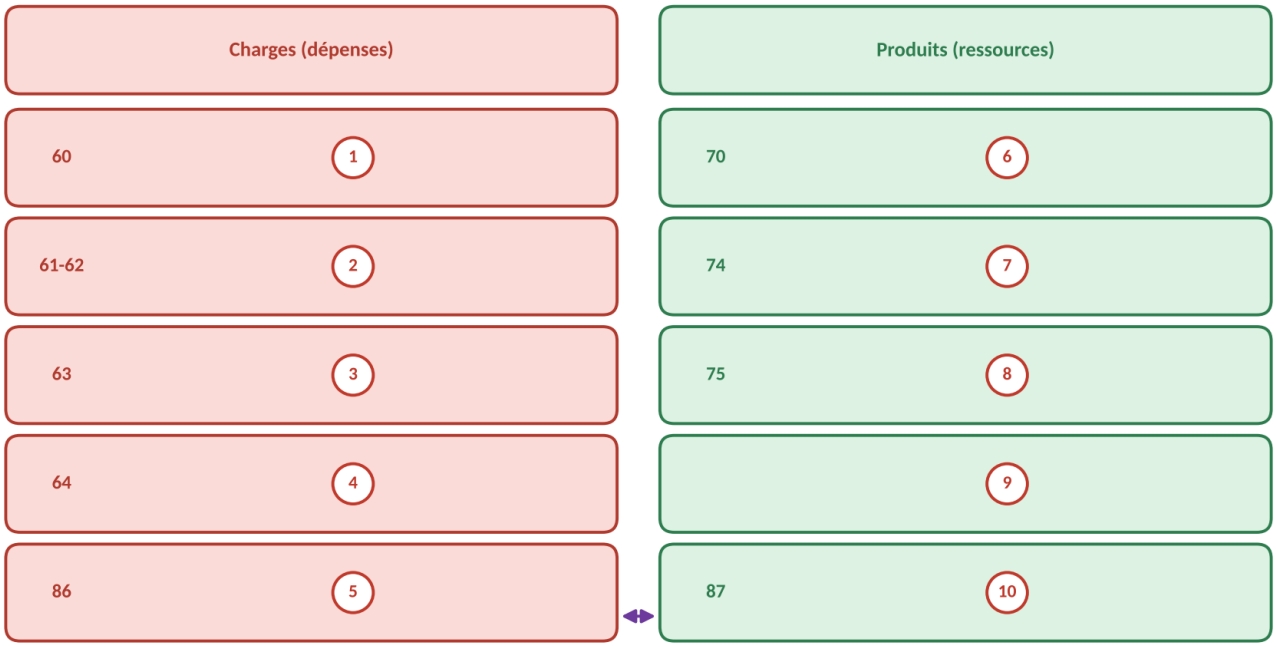


Figure 8.7 – Document 1 – La structure d'un budget prévisionnel associatif (schéma à légender)

Document 2 – Seize lignes à classer

a) Denrées alimentaires des ateliers. b) Petit matériel de cuisine. c) Location d'une salle. d) Assurance de l'activité. e) Impression des affiches. f) Honoraires d'une diététicienne libérale. g) Remboursement des déplacements. h) Salaire brut d'une animatrice. i) Cotisations patronales de cette animatrice. j) Taxe sur les salaires. k) Salle prêtée gratuitement par la mairie (valorisée). l) Heures de bénévolat (valorisées). m) Subvention de la CAF. n) Participation des familles. o) Cotisations des adhérents. p) Don d'un commerçant.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (5,5 pts)

2. Classez les seize lignes du document 2 dans les comptes. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la salle prêtée par la mairie apparaît deux fois dans le budget. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 8.26 – Calculer un coût horaire chargé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le budget du projet de l'association des familles du Clos-Fleuri, la directrice vous communique les salaires et les taux de charges patronales des trois salariées qui y travailleront (données fictives ; le taux réel dépend des allègements de cotisations de chaque structure).

Document 1 – Salaires et temps affecté au projet

Salariée	Salaire brut mensuel	Taux de charges patronales	Temps de travail	Heures sur le projet
Animatrice	1 950 €	40 %	35 h par semaine	48 h
Coordinatrice	2 600 €	44 %	35 h par semaine	20 h
Agent d'entretien	1 150 €	38 %	24 h par semaine	10 h

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures mensuelles d'un temps plein et du temps partiel de 24 heures. (2 pts)

2. Calculez le coût employeur mensuel et le coût horaire chargé de chaque salariée (au centime). (4,5 pts)

3. Calculez le coût du temps de chaque salariée sur le projet et le total à inscrire au compte 64. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas inscrire le salaire brut seul. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 8.27 – Construire un budget équilibré (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

L'association des familles du Clos-Fleuri prépare six ateliers de 3 heures pour 12 familles. Vous construisez le budget prévisionnel à partir des éléments réunis par la directrice.

Document 1 – Éléments du budget (fictifs)

- Denrées : 32 € par atelier. Petit matériel : 180 €. Impression des fiches et des affiches : 95 €.
- Diététicienne libérale : 2 h 30 par atelier, honoraires de 55 € de l'heure.
- Animatrice : 48 h à 18,00 € de l'heure. Coordinatrice : 20 h à 24,69 € de l'heure.
- Salle prêtée par la mairie : 3 h par atelier, valorisée à 25 € de l'heure.
- Bénévolat : 3 bénévoles par atelier, 3 h chacun, valorisées à 12 € de l'heure (taux fixé par l'association).
- CAF : 1 500 € (acquis). Commune : 800 € (sollicités). Participation des familles : 1,50 € par famille et par atelier.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque ligne de charges et le total des charges. (4 pts)

2. Calculez les contributions en nature et la participation des familles. (2 pts)

3. Calculez l'autofinancement nécessaire pour équilibrer le budget. (2 pts)

4. Présentez le budget sous forme de tableau équilibré. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 8.28 – Analyser un budget avec des ratios (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage du projet du Clos-Fleuri veut comprendre le budget construit à l'exercice 8.27 (total : 3 747,80 €, dont 1 098 € de contributions en nature ; personnel : 1 357,80 € ; CAF : 1 500 € ; commune : 800 € ; participation des familles : 108 € ; autofinancement : 241,80 €). Vous préparez des ratios.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de la subvention de la CAF et la part des financements publics dans le budget total. (2 pts)

2. Calculez la part des charges de personnel et la part des contributions en nature. (2 pts)

3. Calculez le coût par famille et le coût par heure d'atelier. (2 pts)

4. Calculez la part de l'autofinancement dans les charges monétaires. (2 pts)

5. Calculez ce que paie une famille pour le cycle, et ce que cela représente du coût par famille. (2 pts)

6. Rédigez l'interprétation de ces ratios pour le comité (5 à 6 lignes). (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.29 – Analyser les écarts entre le prévu et le réalisé (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

Le cycle d'ateliers du Clos-Fleuri est terminé. Vous préparez le compte rendu financier pour la CAF et la commune.

Document 1 – Budget prévu et réalisé

Poste	Prévu	Réalisé
Denrées	192,00 €	231,60 €
Petit matériel	180,00 €	154,90 €
Impression	95,00 €	95,00 €
Diététicienne	825,00 €	825,00 €
Animatrice	864,00 €	972,00 €
Coordinatrice	493,80 €	493,80 €
Salle prêtée (contribution en nature)	450,00 €	375,00 €
Bénévolat (contribution en nature)	648,00 €	756,00 €

Document 2 – Notes de la directrice

« Les prix des fruits ont beaucoup augmenté au printemps. On a trouvé une batterie de casseroles en promotion. L'animatrice a fait six heures de plus, pour rappeler les familles absentes et accompagner deux mères au marché. Le dernier atelier a eu lieu dans la cuisine de l'école, prêtée sans frais et non valorisée. Trois mères sont devenues bénévoles et ont aidé à la fin du cycle. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart en euros et en pourcentage pour chaque poste, puis pour le total. (5 pts)
2. Expliquez chaque écart à l'aide du document 2. (3 pts)
3. Calculez l'écart qui touche réellement la trésorerie de l'association (hors contributions en nature) et dites comment il est couvert. (2 pts)
4. Le résultat global est-il satisfaisant ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.30 – Calculer le coût complet d'un atelier et le seuil de participants (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service prévention d'une caisse de retraite (fictive) finance des ateliers « cuisine et convivialité » pour des retraités vivant à domicile. Elle verse à l'association organisatrice un forfait de 20 € par personne présente. Chaque participant paie 3 €. La présidente de l'association vous demande à partir de combien de participants l'atelier couvre ses coûts.

Document 1 – Coûts d'un atelier (fictifs)

- Animatrice : 3 h 30 (préparation, animation, rangement) à 18,00 € de l'heure.
- Diététicienne libérale : 2 h 30 à 55 € de l'heure.
- Location de la salle : 30 € par atelier.
- Denrées : 2,40 € par participant. Fiche recette imprimée : 0,35 € par participant.
- La salle accueille 14 personnes au plus.

À vous de jouer – Questions

1. Distinguez les coûts fixes et les coûts variables, et calculez-les. (3 pts)

2. Calculez le coût par participant pour 6, 8, 10, 12 et 14 participants. Présentez un tableau. (4 pts)

3. Calculez le nombre minimal de participants pour que l'atelier couvre ses coûts. (3 pts)

4. Les ateliers réunissent en moyenne 9 personnes. Calculez la perte par atelier et proposez deux solutions. (4 pts)

5. Expliquez pourquoi il ne faut pas augmenter fortement la participation demandée aux retraités. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 8.25

1. Légendes : 1 Achats (60) ; 2 Services extérieurs (61-62) ; 3 Impôts et taxes (63) ; 4 Charges de personnel (64) ; 5 Emplois des contributions volontaires en nature (86) ; 6 Ventes, participation des usagers (70) ; 7 Subventions d'exploitation (74) ; 8 Cotisations, dons (75) ; 9 Autofinancement du porteur ; 10 Contributions volontaires en nature (87) ; 11 Total des charges = total des produits ; compte 86 = compte 87.

2. 60 : a), b). 61 : c), d). 62 : e), f), g). 63 : j). 64 : h), i). 86 et 87 : k), l). 74 : m). 70 : n). 75 : o), p).

3. La salle ne coûte rien à l'association, mais elle a une valeur. On l'inscrit en **charge** au compte 86 (on l'utilise) et en **produit** au compte 87 (on la reçoit), pour le même montant. Le budget reste équilibré, et il montre la contribution réelle de la mairie et le vrai coût du projet.

Corrigé – Exercice 8.26

1. Temps plein : 35 × 52 / 12 = **151,67 h** par mois. Temps partiel : 24 × 52 / 12 = **104 h** par mois.

2. Animatrice : 1 950 × 1,40 = **2 730,00 €** ; 2 730 / 151,67 = **18,00 €** de l'heure. Coordinatrice : 2 600 × 1,44 = **3 744,00 €** ; 3 744 / 151,67 = **24,69 €** de l'heure. Agent d'entretien : 1 150 × 1,38 = **1 587,00 €** ; 1 587 / 104 = **15,26 €** de l'heure.

3. Animatrice : 48 × 18,00 = **864,00 €** ; coordinatrice : 20 × 24,69 = **493,80 €** ; agent : 10 × 15,26 = **152,60 €**. Total au compte 64 : 864,00 + 493,80 + 152,60 = **1 510,40 €**.

4. L'employeur paie aussi les cotisations patronales : le coût réel d'une heure est bien supérieur au salaire brut. Inscrire le brut seul sous-estimerait les charges et déséquilibrerait le budget réalisé.

Corrigé – Exercice 8.27

1. Denrées : 6 × 32 = **192,00 €** ; petit matériel : **180,00 €** ; impression : **95,00 €** ; diététicienne : 6 × 2,5 × 55 = **825,00 €** ; animatrice : 48 × 18,00 = **864,00 €** ; coordinatrice : 20 × 24,69 = **493,80 €** ; salle : 6 × 3 × 25 = **450,00 €** ; bénévolat : 3 × 6 × 3 × 12 = **648,00 €**. Total des charges : **3 747,80 €**.

2. Contributions en nature : 450 + 648 = **1 098,00 €**. Participation : 12 × 6 × 1,50 = **108,00 €**.

3. Autofinancement : 3 747,80 − 1 500 − 800 − 108 − 1 098 = **241,80 €**.

4. Budget prévisionnel :

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Denrées	192,00 €	70 – Participation des familles	108,00 €
60 – Petit matériel	180,00 €	74 – CAF (acquis)	1 500,00 €
62 – Impression	95,00 €	74 – Commune (sollicité)	800,00 €
62 – Honoraires de la diététicienne	825,00 €	Autofinancement	241,80 €
64 – Animatrice	864,00 €	87 – Mise à disposition de la salle	450,00 €
64 – Coordinatrice	493,80 €	87 – Bénévolat	648,00 €
86 – Mise à disposition de la salle	450,00 €		
86 – Bénévolat	648,00 €		
Total	**3 747,80 €**	**Total**	**3 747,80 €**

Corrigé – Exercice 8.28

1. CAF : 1 500 / 3 747,80 × 100 = **40,0 %**. Financements publics (CAF et commune) : 2 300 / 3 747,80 × 100 = **61,4 %**.

2. Personnel : 1 357,80 / 3 747,80 × 100 = **36,2 %**. Contributions en nature : 1 098 / 3 747,80 × 100 = **29,3 %**.

3. Coût par famille : 3 747,80 / 12 = **312,32 €**. Coût par heure d'atelier : 3 747,80 / (6 × 3) = 3 747,80 / 18 = **208,21 €**.

4. Charges monétaires : 3 747,80 − 1 098 = 2 649,80 € ; autofinancement : 241,80 / 2 649,80 × 100 = **9,1 %**.

5. Une famille paie 6 × 1,50 = **9 €** pour le cycle, soit 9 / 312,32 × 100 = **2,9 %** du coût par famille.

6. Exemple : « Le projet est financé aux six dixièmes par des fonds publics, dont 40 % par la CAF. Près de 30 % de sa valeur vient de contributions en nature (salle, bénévolat), ce qui montre l'engagement du territoire. Le personnel représente un peu plus d'un tiers du budget, et les honoraires de la diététicienne s'y ajoutent. La participation des familles est symbolique (9 € pour le cycle, moins de 3 % du coût) : elle favorise l'engagement sans exclure. L'autofinancement reste modeste (9,1 % des charges monétaires). »

Corrigé – Exercice 8.29

1. Écarts :

Poste	Prévu	Réalisé	Écart (€)	Écart (%)
Denrées	192,00	231,60	+ 39,60	+ 20,6 %
Petit matériel	180,00	154,90	− 25,10	− 13,9 %
Impression	95,00	95,00	0,00	0,0 %
Diététicienne	825,00	825,00	0,00	0,0 %
Animatrice	864,00	972,00	+ 108,00	+ 12,5 %
Coordinatrice	493,80	493,80	0,00	0,0 %
Salle (nature)	450,00	375,00	− 75,00	− 16,7 %
Bénévolat (nature)	648,00	756,00	+ 108,00	+ 16,7 %
Total	**3 747,80**	**3 903,30**	**+ 155,50**	**+ 4,1 %**

2. Denrées : hausse du prix des fruits au printemps. Petit matériel : achat en promotion. Animatrice : 6 heures de plus (6 × 18 = 108 €) pour rappeler les familles absentes et accompagner deux mères au marché. Salle : un atelier sur six a eu lieu dans la cuisine de l'école, non valorisée (5 × 3 × 25 = 375 €). Bénévolat : 9 heures de plus (108 / 12 = 9 h), grâce aux trois mères devenues bénévoles, ce qui est un signe positif de participation.

3. Écart de trésorerie (hors comptes 86 et 87) : 39,60 − 25,10 + 108,00 = **+ 122,50 €**. Il est couvert par l'autofinancement de l'association, qui passe de 241,80 € à 241,80 + 122,50 = **364,30 €**. Les contributions en nature changent aussi de montant, mais les comptes 86 et 87 restent égaux (375 + 756 = 1 131 €).

4. Oui : l'écart global est de + 4,1 %, inférieur au repère de 5 %. Chaque écart est expliqué ; les dépenses supplémentaires de personnel ont servi la participation (rappels, accompagnement au marché). Il faudra prévoir une marge sur les denrées et du temps pour les rappels dans le prochain budget.

Corrigé – Exercice 8.30

1. Coûts fixes (ne dépendent pas du nombre de participants) : animatrice 3,5 × 18 = 63,00 € ; diététicienne 2,5 × 55 = 137,50 € ; salle 30,00 € ; total **230,50 €** par atelier. Coûts variables (par participant) : denrées 2,40 € + fiche 0,35 € = **2,75 €**.

2. Coût par participant = 230,50 / n + 2,75 :

Participants	Coût total de l'atelier	Coût par participant	Recettes (23 € × n)	Résultat de l'atelier
6	247,00 €	41,17 €	138,00 €	− 109,00 €
8	252,50 €	31,56 €	184,00 €	− 68,50 €
10	258,00 €	25,80 €	230,00 €	− 28,00 €
12	263,50 €	21,96 €	276,00 €	+ 12,50 €
14	269,00 €	19,21 €	322,00 €	+ 53,00 €

3. Recette par participant : 20 + 3 = 23 € ; chaque participant rapporte 23 − 2,75 = 20,25 € pour couvrir les coûts fixes. Seuil : 230,50 / 20,25 = **11,4**, soit **12 participants** au minimum.

4. Avec 9 participants : coût 230,50 + 9 × 2,75 = 255,25 € ; recettes 9 × 23 = 207,00 € ; perte **48,25 €** par atelier. Solutions : réduire les coûts fixes (la diététicienne intervient un atelier sur deux et l'animatrice formée assure les autres ; salle prêtée gratuitement par la commune) ; augmenter la fréquentation (inscription par les relais, covoiturage, rappels) ; demander un complément à un autre financeur (conférence des financeurs).

5. Une forte participation financière exclurait les retraités aux petites pensions, qui sont souvent les plus isolés et les plus exposés à la dénutrition. Cela irait contre l'objectif d'équité du projet (universalisme proportionné).

Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un plan de trésorerie mois par mois et repérer le besoin de trésorerie.
- Proposer des solutions à un problème de trésorerie.
- Calculer des quantités brutes à partir d'une recette, d'un nombre de portions et d'un rendement.
- Préparer la logistique d'un atelier : check-list et conducteur.
- Choisir une méthode pédagogique adaptée au type d'objectif.
- Calculer le coût et les apports d'une recette d'atelier avec la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un budget équilibré sur l'année peut poser un problème de trésorerie : les dépenses arrivent avant les recettes (une subvention est souvent versée en partie à la notification, le solde après le bilan).
- Solde de fin de mois = solde de début + encaissements − décaissements. Le besoin de trésorerie maximal est le solde le plus négatif. Les contributions en nature n'entrent pas dans la trésorerie.
- Solutions : demander une avance ou un acompte, décaler des achats, échelonner les paiements, mobiliser la trésorerie de la structure, demander le versement anticipé d'un cofinancement.
- Mise à l'échelle : coefficient = portions voulues / portions de la recette. Poids brut = poids net / rendement (partie comestible).
- Méthodes pédagogiques : expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative. La « pyramide de l'apprentissage » (« on retient 10 % de ce qu'on lit… ») ne repose sur aucune étude.

Exercice 8.31 – Le principe du plan de trésorerie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le trésorier de l'association Cuisine et Partage du Val (fictive) ne comprend pas pourquoi la banque l'appelle alors que le budget du projet est équilibré. Vous lui expliquez le plan de trésorerie.

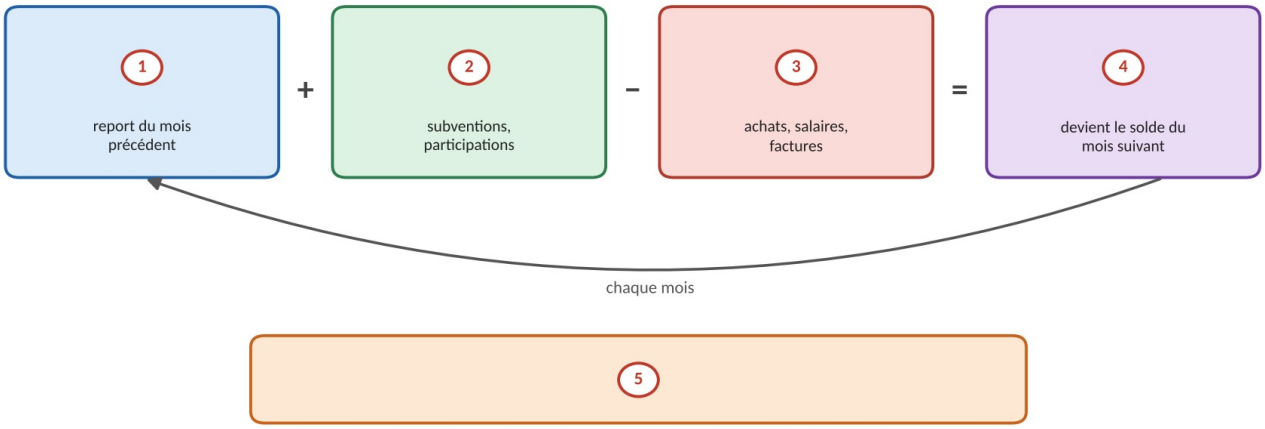


Figure 8.8 – Document 1 – Le calcul d'un plan de trésorerie (schéma à légender)

Document 2 – Les quatre premiers mois du projet

Trésorerie disponible au 1er janvier : 300 €. Janvier : aucun encaissement, 250 € de décaissements. Février : aucun encaissement, 420 € de décaissements. Mars : subvention de 1 200 € encaissée, 380 € de décaissements. Avril : aucun encaissement, 300 € de décaissements.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez le solde de fin de mois de janvier à avril. (4 pts)
3. Indiquez le mois où un problème apparaît et son montant. (1,5 pt)
4. Expliquez au trésorier, en deux phrases, pourquoi un budget équilibré n'empêche pas ce problème. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.32 – Construire un plan de trésorerie sur huit mois (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Pas à Pas (fictive) accompagne des familles d'enfants à besoins alimentaires particuliers. Son projet d'ateliers dure de janvier à août 2027. Le budget est équilibré, mais la directrice s'inquiète des versements. Vous construisez le plan de trésorerie.

Document 1 – Encaissements et décaissements prévus (hors contributions en nature)

- Trésorerie disponible au 1er janvier : 500 €.
- Commune : 1 000 € versés en mars.
- ARS : subvention de 3 000 €, versée pour moitié à la notification (mai) et pour moitié après le bilan (décembre).
- Participation des familles : 40 € par mois, de mars à août.
- Décaissements : janvier 350 € ; février 420 € ; mars 680 € ; avril 720 € ; mai 640 € ; juin 580 € ; juillet 300 € ; août 210 €.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le plan de trésorerie de janvier à août : encaissements, décaissements, calcul et solde de fin de mois. (5 pts)

2. Indiquez les mois de solde négatif et le besoin de trésorerie maximal. (2 pts)

3. Calculez le solde après le versement du solde de l'ARS en décembre, et vérifiez-le avec les totaux. (2 pts)

4. Proposez trois solutions adaptées à cette situation. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.33 – Calculer les quantités à acheter (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'hébergement pour adultes en insertion (structure fictive) organise trois ateliers où l'on prépare le même plat : un dahl de lentilles corail aux carottes, servi avec du riz. Chaque atelier sert 15 portions. La recette de base est prévue pour 4 personnes.

Document 1 – Recette pour 4 personnes (poids nets) et prix (fictifs)

Denrée	Poids net pour 4	Rendement	Prix
Lentilles corail sèches	200 g	100 %	2,90 € le kg
Carottes épluchées	300 g	85 %	1,40 € le kg
Oignons épluchés	100 g	90 %	1,80 € le kg
Lait de coco	200 g	100 %	4,50 € le kg
Riz blanc cru	240 g	100 %	1,90 € le kg
Coriandre, épices, sel	–	–	0,90 € par atelier

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coefficient de mise à l'échelle. (1 pt)
2. Calculez, pour un atelier, le poids net et le poids brut de chaque denrée. (4 pts)
3. Calculez les quantités brutes à commander pour les trois ateliers. (2 pts)
4. Calculez le coût d'un atelier, le coût par portion et le coût des trois ateliers (coût de chaque ligne arrondi au centime). (3 pts)
5. Calculez le poids de carottes épluchées obtenu si l'on oublie le rendement, et dites ce qui se passe. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.34 – Préparer la logistique d'un atelier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez le premier atelier du foyer d'hébergement de l'exercice 8.33, le jeudi de 10 h à 13 h, dans la cuisine collective du foyer (deux plaques, un four, un seul évier). Douze résidents sont inscrits, dont un allergique à l'arachide et une personne en fauteuil roulant. L'atelier se termine par le repas pris ensemble.

Document 1 – Ce qu'a prévu l'éducateur du foyer

« On commence à 10 h, tout le monde arrive en même temps. Je fais les courses le matin même. On épluche tous les légumes ensemble à l'évier. On mange à 13 h, et on range après. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez quatre risques dans l'organisation prévue par l'éducateur. (2 pts)
2. Construisez la check-list « avant, jour J, après » de l'atelier. (4 pts)
3. Construisez le conducteur de l'atelier, de 9 h 30 à 13 h 30, en indiquant pour chaque séquence l'horaire, l'activité et le rôle de l'animatrice. (4 pts)
4. Indiquez les adaptations prévues pour la personne en fauteuil roulant et pour la personne allergique. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.35 – Choisir une méthode pédagogique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue prépare des séances pour un groupe de jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par une association d'insertion (fictive). Elle a écrit un objectif par séance, et cite dans son projet une affirmation entendue en formation.

Document 1 – Cinq objectifs de séance

a) À la fin de la séance, les jeunes savent citer trois repères du PNNS sur les fruits et légumes.

b) À la fin de la séance, les jeunes savent cuire des pâtes et des œufs durs sans aide.

c) À la fin de la séance, les jeunes savent comparer le prix au kilo de deux produits en rayon.

d) À la fin de la séance, les jeunes osent goûter un légume qu'ils ne connaissent pas.

e) À la fin de la séance, les jeunes savent repérer une technique publicitaire dans une publicité pour une boisson sucrée.

Document 2 – L'affirmation citée par la collègue

« On retient 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on entend, 30 % de ce qu'on voit, et 90 % de ce qu'on fait. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque objectif : connaissance, savoir-faire ou attitude. (2,5 pts)

2. Proposez pour chaque objectif une méthode pédagogique et un outil. (5 pts)

3. Que pensez-vous de l'affirmation du document 2 ? Proposez une autre justification des méthodes actives. (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 8.36 – Coût et apports d'une recette d'atelier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min*

Mise en situation – Mise en situation

La crèche parentale Les Petits Cailloux (structure fictive) propose aux parents un atelier « déjeuner du soir vite fait » : un gratin de pâtes complètes au brocoli et au thon, puis une poire. L'atelier prépare 10 portions pour adultes. Le budget de l'atelier est de 2,50 € par portion.

Document 1 – Grammages nets par portion, pertes et prix (fictifs)

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Pâtes sèches au blé complet, crues	70 g	sans perte	2,20 € le kg
Brocoli	120 g	30 %	3,20 € le kg
Thon au naturel, égoutté	50 g	sans perte	14,00 € le kg égoutté
Lait demi-écrémé	120 g	sans perte	1,05 € le kg
Farine de blé T65	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,90 € le kg
Poire	120 g	10 %	2,60 € le kg
Épices, muscade, sel	–	–	forfait 0,60 € pour 10 portions

Document 2 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870)	353	11,8	67,6	1,8	2,2	6,1	0,016	32,1	3,2	0
Brocoli, cru (20057)	31,9	2,9	2,15	1,7	0,36	2,6	0,075	47,5	0,81	91,2
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74	6,26	0,76	traces
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078	119	0,041	1,6
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03	25,3	1,31	–
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	traces	traces	28,8	0	0,61	978	0,15	traces
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	0,072	4,3

On calcule avec les poids nets (le brocoli et les pâtes sont pesés crus) ; « traces », « < » et « – » sont comptés 0.

À vous de jouer – Questions

1. Établissez le bon de commande pour 10 portions (poids net total, poids brut, coût de chaque ligne au centime) et vérifiez le budget. (5 pts)
2. Calculez les apports d'une portion du repas complet (gratin et poire) en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C. (5 pts)
3. Calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides. (2 pts)
4. Commentez l'intérêt nutritionnel de ce repas pour un adulte (fibres, calcium, vitamine C, sel). (2 pts)
5. Proposez une version sans poisson pour une famille végétarienne, et dites ce qui change. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 8.31

1. Légendes : 1 Solde de début de mois ; 2 Encaissements ; 3 Décaissements ; 4 Solde de fin de mois ; 5 Solde négatif = besoin de trésorerie : avance, acompte, décalage des achats.

2. Janvier : 300 + 0 − 250 = **50 €**. Février : 50 + 0 − 420 = **− 370 €**. Mars : − 370 + 1 200 − 380 = **450 €**. Avril : 450 + 0 − 300 = **150 €**.

3. En **février** : le solde est de **− 370 €**. L'association ne peut pas payer ses dépenses sans découvert bancaire.

4. Le budget compare les charges et les produits sur toute la durée du projet, sans tenir compte des dates. La trésorerie suit les dates réelles des entrées et des sorties d'argent : si la subvention arrive en mars et que les dépenses commencent en janvier, il manque de l'argent entre-temps.

Corrigé – Exercice 8.32

1. Plan de trésorerie :

Mois	Encaissements	Décaissements	Calcul	Solde de fin de mois
Janvier	0	350	500 + 0 − 350	150
Février	0	420	150 − 420	− 270
Mars	1 040	680	− 270 + 1 040 − 680	90
Avril	40	720	90 + 40 − 720	− 590
Mai	1 540	640	− 590 + 1 540 − 640	310
Juin	40	580	310 + 40 − 580	− 230
Juillet	40	300	− 230 + 40 − 300	− 490
Août	40	210	− 490 + 40 − 210	− 660

Mars : 1 000 (commune) + 40 (familles) = 1 040 € ; mai : 1 500 (ARS, première moitié) + 40 = 1 540 €.

2. Soldes négatifs en février, avril, juin, juillet et août. Besoin de trésorerie maximal : **660 €**, fin août, et il dure jusqu'en décembre.

3. Décembre : − 660 + 1 500 = **840 €**. Vérification : encaissements de janvier à août = 1 040 + 40 + 1 540 + 4 × 40 = **2 740 €** ; décaissements = 350 + 420 + 680 + 720 + 640 + 580 + 300 + 210 = **3 900 €** ; 500 + 2 740 − 3 900 + 1 500 = **840 €**.

4. Exemples : demander à l'ARS un acompte plus important (par exemple 80 % à la notification) ; demander à la commune un versement en janvier plutôt qu'en mars ; décaler en septembre les achats qui peuvent attendre et échelonner les paiements des intervenants ; mobiliser la trésorerie générale de l'association ou un prêt court, après accord du bureau.

Corrigé – Exercice 8.33

1. Coefficient : 15 / 4 = **3,75**.

2. et 3. Quantités :

Denrée	Poids net pour 15	Poids brut pour 15	Brut pour 3 ateliers
Lentilles corail	200 × 3,75 = 750 g	750 g	2,25 kg
Carottes	300 × 3,75 = 1 125 g	1 125 / 0,85 = 1 323,5 g	3,97 kg
Oignons	100 × 3,75 = 375 g	375 / 0,90 = 416,7 g	1,25 kg
Lait de coco	200 × 3,75 = 750 g	750 g	2,25 kg
Riz blanc cru	240 × 3,75 = 900 g	900 g	2,70 kg

4. Coût d'un atelier : lentilles 0,750 × 2,90 = 2,18 € ; carottes 1,3235 × 1,40 = 1,85 € ; oignons 0,4167 × 1,80 = 0,75 € ; lait de coco 0,750 × 4,50 = 3,38 € ; riz 0,900 × 1,90 = 1,71 € ; forfait 0,90 €. Total : **10,77 €** par atelier ; **0,72 € par portion** ; **32,31 €** pour les trois ateliers.

5. Si l'on achète 1 125 g de carottes brutes, on obtient 1 125 × 0,85 = **956 g** épluchés, soit 169 g de moins que prévu : les portions seront plus petites ou il faudra racheter en urgence. À l'inverse, surestimer conduit au gaspillage.

Corrigé – Exercice 8.34

1. Risques : faire les courses le matin même (oubli, retard, produit manquant) ; accueillir tout le monde à 10 h sans

installation préalable ; un seul évier pour 12 personnes (attente, désordre) ; pas de recueil des allergies ni de vérification de l'étiquetage (arachide) ; pas d'adaptation pour la personne en fauteuil ; manger à 13 h sans avoir prévu le temps de cuisson du riz et du dahl.

2. Check-list :

Moment	Tâches
Avant (J − 7 à J − 1)	Liste de courses chiffrée (exercice 8.33) ; courses la veille ; vérification du matériel (balances, couteaux, planches, casseroles, plaques, four) ; recueil des allergies et lecture des étiquettes (lait de coco, épices : traces d'arachide ?) ; fiches recettes illustrées ; rappel aux inscrits la veille ; poste de travail adapté pour le fauteuil
Jour J	Installation à 9 h 30 ; lavage des mains ; affichage de la recette et des allergènes ; émargement ; trois postes de travail (légumes, dahl, riz) ; respect de la marche en avant ; repas ensemble
Après	Rangement et vaisselle en équipes ; restes refroidis rapidement et étiquetés, ou jetés ; inventaire du matériel et des denrées ; bilan à chaud ; saisie des présences et des avis

3. Conducteur (exemple) :

Horaire	Activité	Rôle de l'animatrice
9 h 30 – 10 h	Installation des postes, denrées pesées par poste	Prépare avec l'éducateur
10 h – 10 h 15	Accueil, lavage des mains, présentation de la recette avec photos	Accueille, explique
10 h 15 – 10 h 45	Épluchage et découpe en trois postes, à tour de rôle à l'évier	Montre les gestes, veille à la sécurité
10 h 45 – 11 h 30	Cuisson du dahl ; cuisson du riz ; dressage de la table	Fait goûter, ajuste l'assaisonnement
11 h 30 – 12 h	Calcul du coût par portion avec les participants ; échange	Anime l'échange
12 h – 13 h	Repas partagé	Mange avec le groupe, recueille les avis
13 h – 13 h 30	Rangement en équipes, bilan à chaud	Organise, remercie

4. Fauteuil roulant : un plan de travail à hauteur adaptée (table basse ou planche sur les genoux), une circulation dégagée, une tâche qu'il peut faire assis (découpe, assaisonnement, calcul du coût). Allergie à l'arachide : vérification de toutes les étiquettes (mention « traces »), plan de travail et ustensiles nettoyés, pas de produit à risque dans l'atelier, connaissance du protocole d'urgence et du traitement de la personne.

Corrigé – Exercice 8.35

1. a) connaissance ; b) savoir-faire ; c) savoir-faire ; d) attitude ; e) savoir-faire critique, qui touche aussi une attitude (esprit critique).

2. Exemples : a) méthode interrogative et ludique : quiz avec cartes et photos d'aliments ; b) méthode démonstrative puis active : démonstration, puis chaque jeune cuisine à son poste ; c) méthode active sur le terrain : comparaison en magasin avec une calculatrice et une fiche de relevé ; d) méthode active et coopérative : dégustation à l'aveugle sans obligation, dans un climat bienveillant, avec un jeune pair qui goûte en premier ; e) méthode interrogative et active : analyse en petits groupes de trois publicités réelles, puis débat.

3. Ces pourcentages, attribués à tort à Edgar Dale, ne reposent sur **aucune étude** : il ne faut pas les citer comme une preuve. On justifie plutôt les méthodes actives par ce qui est établi : l'engagement actif, la pratique répétée et le retour d'information favorisent l'apprentissage, surtout pour les savoir-faire.

Corrigé – Exercice 8.36

1. Bon de commande pour 10 portions :

Denrée	Poids net total	Poids brut	Coût
Pâtes complètes	700 g	700 g	0,700 × 2,20 = 1,54 €
Brocoli	1 200 g	1 200 / 0,70 = 1 714 g	1,714 × 3,20 = 5,49 €
Thon égoutté	500 g	500 g	0,500 × 14,00 = 7,00 €
Lait demi-écrémé	1 200 g	1 200 g	1,200 × 1,05 = 1,26 €
Farine	80 g	80 g	0,080 × 1,10 = 0,09 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Emmental râpé	150 g	150 g	0,150 × 9,90 = 1,49 €
Poires	1 200 g	1 200 / 0,90 = 1 333 g	1,333 × 2,60 = 3,47 €

Denrée	Poids net total	Poids brut	Coût
Épices, sel	–	–	0,60 €
Total			**21,10 €**

Coût par portion : 21,10 / 10 = **2,11 €**, inférieur au budget de 2,50 € (marge de 0,39 € par portion). Le thon représente 7,00 / 21,10 = 33,2 % du coût.

2. Apports d'une portion (gratin + poire) : énergie **609,1 kcal** ; protéines **34,39 g** ; glucides **76,26 g**, dont sucres **20,89 g** ; lipides **15,51 g** ; fibres **11,15 g** ; sel **0,66 g** ; calcium **381,9 mg** ; fer **3,86 mg** ; vitamine C **116,5 mg**. Exemple de calcul : protéines des pâtes = 70 × 11,8 / 100 = 8,26 g ; calcium de l'emmental = 15 × 978 / 100 = 146,7 mg.

3. Protéines : 34,39 × 4 / 609,1 × 100 = **22,6 %** ; lipides : 15,51 × 9 / 609,1 × 100 = **22,9 %** ; glucides : 76,26 × 4 / 609,1 × 100 = **50,1 %**. Le reste (environ 3,7 %) vient des fibres (11,15 × 2 = 22,3 kcal).

4. Le repas apporte **37 %** des 30 g de fibres conseillés par jour (11,15 / 30) grâce aux pâtes complètes, au brocoli et à la poire ; **40 %** de la référence de 950 mg de calcium (381,9 / 950), grâce au lait et à l'emmental ; plus que la référence quotidienne de 110 mg de vitamine C (brocoli cru ; une partie sera perdue à la cuisson). Le sel reste modéré (0,66 g). Les lipides sont plutôt bas : on peut garder l'huile de colza, riche en oméga 3.

5. Remplacer le thon par 50 g de pois chiches appertisés égouttés et 1 œuf, ou par du fromage de chèvre. Les protéines baissent un peu (les pois chiches en apportent moins que le thon), les fibres augmentent, le coût diminue. On vérifie avec la table Ciqual avant de valider.

Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire la boucle du pilotage et lire un tableau de bord.
- Construire une matrice des risques et proposer des mesures de prévention.
- Analyser un tableau de bord à mi-parcours et proposer des décisions.
- Construire un plan de communication par cible.
- Mesurer l'efficacité des canaux de communication.
- Réagir à un imprévu (baisse de financement, retrait d'un partenaire) en ajustant le budget.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Pilotage : suivre l'avancement (activités, délais, budget, participation), repérer les écarts et les risques, décider des ajustements, rendre compte aux partenaires et aux financeurs.
- Tableau de bord : quelques indicateurs de suivi, chacun avec une valeur prévue, une valeur réalisée et une analyse. Taux de présence = présences constatées / présences possibles × 100.
- Matrice des risques : criticité = probabilité × gravité (de 1 à 16) ; on traite d'abord les risques les plus critiques, et toujours ceux de gravité maximale.
- Plan de communication : objectifs de communication, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation. Auprès des publics éloignés, les relais humains sont souvent les canaux les plus efficaces.
- Coût par contact = coût du canal / nombre de contacts obtenus ; taux de transformation = inscrits / contacts × 100.

Exercice 8.37 – La boucle du pilotage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le jardin partagé des Prés-Verts (association fictive) conduit huit ateliers « du jardin à l'assiette ». À mi-parcours, le comité technique prépare son tableau de bord.

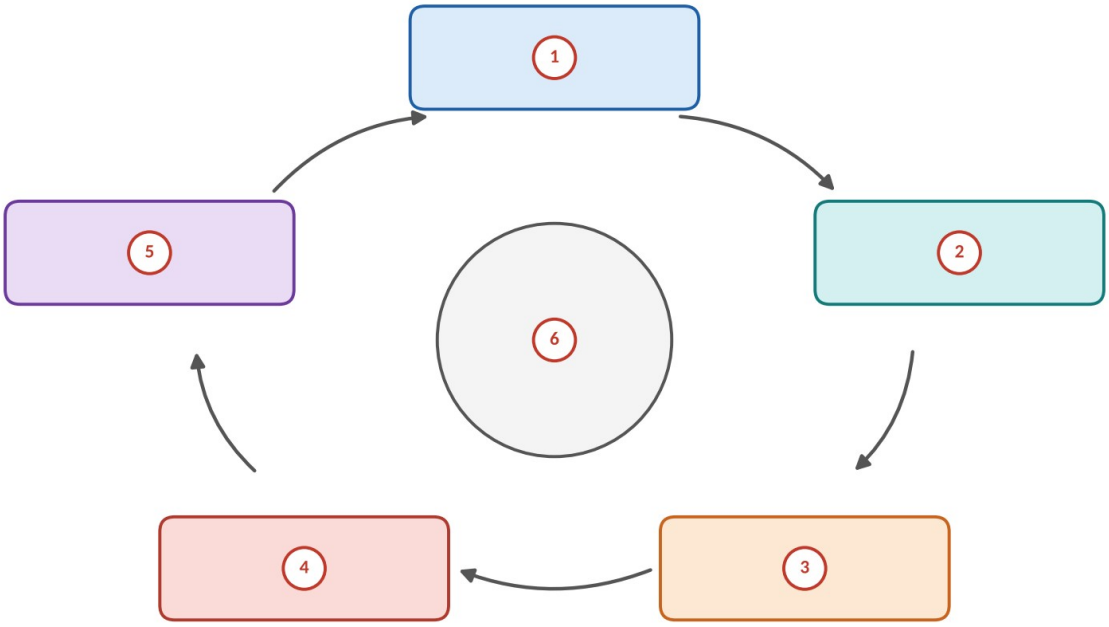


Figure 8.9 – Document 1 – La boucle du pilotage (schéma à légender)

Document 2 – Données à mi-parcours

Indicateur de suivi	Prévu à mi-parcours	Réalisé
Ateliers réalisés	4 sur 8	4
Taux de présence	75 % au moins	38 présences sur 48 possibles
Budget consommé	environ 50 % de 3 000 €	1 260 €
Fiches recettes testées et validées	6 sur 8	5

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Calculez le taux de présence, la part du budget consommée et la part des fiches validées. (3 pts)

3. Complétez la colonne « analyse » du tableau de bord pour chaque indicateur. (2 pts)

4. Proposez une décision pour l'indicateur en retard. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.38 – Construire une matrice des risques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Bocal et Compagnie (exercice 8.21) va faire circuler une cuisine mobile, installée dans un camion aménagé, dans six villages. L'équipe a listé les risques et les a notés de 1 (faible) à 4 (fort).

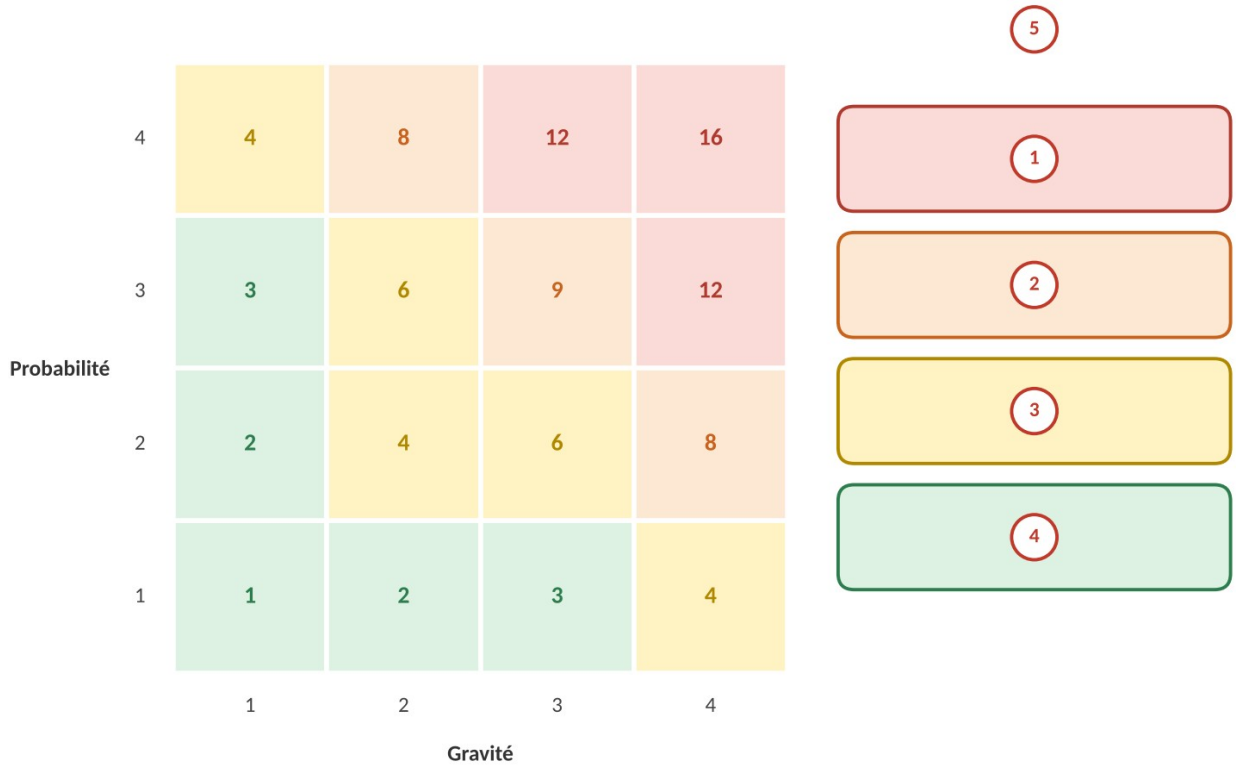


Figure 8.10 – Document 1 – La matrice des risques (schéma à légender)

Document 2 – Les risques identifiés

Risque	Probabilité	Gravité
R1 – Panne du camion un jour d'atelier	2	4
R2 – Mauvais temps qui réduit la fréquentation	3	2
R3 – Faible participation dans certains villages	3	3
R4 – Rupture de la chaîne du froid pendant une tournée	2	4
R5 – Départ d'un bénévole formé	3	2
R6 – Réaction allergique pendant une dégustation	1	4
R7 – Hausse du prix des denrées	4	2

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Calculez la criticité de chaque risque et classez-les. (3 pts)

3. Proposez une mesure de prévention ou de réduction pour chaque risque. (5 pts)

4. Expliquez pourquoi R6 doit être traité alors que sa criticité est la plus faible. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 8.39 – Analyser un tableau de bord multisite (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bailleur social Habitat du Causse (exercice 8.8) a étendu le projet « Cuisiner dans un petit logement » à trois résidences, avec huit ateliers prévus dans chacune. À mi-parcours, vous préparez le tableau de bord pour le comité de pilotage. Budget total : 4 800 €.

Document 1 – Données de suivi à mi-parcours (fictives)

Résidence	Ateliers réalisés	Places par atelier	Présences constatées
A – Les Genêts	4	12	41
B – Le Vallon	4	12	26
C – Les Aubépines	4	9	33

Budget consommé : 2 150 €. Questionnaires « avant » recueillis : 30 sur 36 inscrits. Supports en FALC validés : 3 sur 4 prévus.

Remarques de la référente : « À la résidence B, les ateliers ont lieu à 14 h, en même temps que l'aide aux devoirs ; beaucoup de mères ne peuvent pas venir. La cuisine de la résidence C est très petite, mais le groupe est soudé. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence de chaque résidence et le taux global. (4 pts)

2. Calculez le budget consommé et la part des questionnaires recueillis. (2 pts)

3. Présentez le tableau de bord avec une analyse par indicateur (objectif de présence : 75 %). (3 pts)

4. Proposez deux décisions à soumettre au comité de pilotage. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.40 – Construire un plan de communication (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réfrigérateur solidaire du Val-d'Orbe (exercice 8.7) sera installé en avril 2027. La directrice du CCAS vous demande le plan de communication. Elle insiste : « Personne ne doit avoir honte de se servir. »

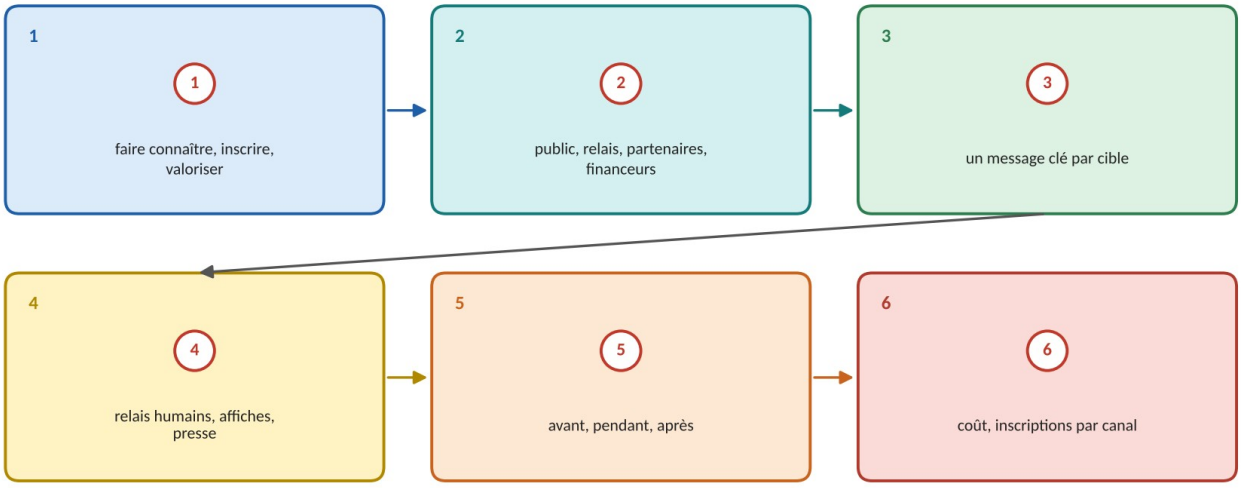


Figure 8.11 – Document 1 – Les six étapes d'un plan de communication (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Formulez trois objectifs de communication distincts des objectifs de santé du projet. (2 pts)
3. Construisez le plan de communication pour quatre cibles : habitants, donateurs (commerces), riverains, élus. Pour chaque cible, donnez l'objectif, le message, le canal et le moment. (5 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer la communication. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.41 – Mesurer l'efficacité des canaux de communication (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social du quartier de la Butte (fictif) a recruté les participants de ses ateliers « bien manger, petit budget » avec six canaux. À la fin des inscriptions, la référente vous transmet les chiffres et vous demande où mettre l'argent l'an prochain.

Document 1 – Contacts, inscriptions et coût par canal (fictifs)

Canal	Personnes qui ont pris contact	Personnes inscrites	Coût du canal
Relais (mères et voisines formées)	17	12	120 € (temps de formation)
Affiches dans le quartier	8	4	35 €
Réseaux sociaux du centre	6	2	72 € (4 h de travail)
Flyers distribués (400)	3	1	60 €
Radio locale (annonce gratuite)	2	1	0 €
Bouche-à-oreille	10	8	0 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de contacts et d'inscrits, puis la part de chaque canal dans les inscriptions. (3 pts)
2. Calculez le taux de transformation (inscrits / contacts) et le coût par inscrit de chaque canal payant. (3 pts)
3. Calculez la part des inscriptions apportées par les relais humains (relais et bouche-à-oreille) et le rendement des flyers (contacts pour 100 flyers). (2 pts)
4. Rédigez la recommandation pour l'an prochain (5 à 6 lignes). (3 pts)
5. Indiquez une limite de cette analyse. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 8.42 – Réagir à un imprévu en cours de projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Saveurs du Faubourg (fictive) conduit huit ateliers culinaires de 15 places. En février, deux mauvaises nouvelles arrivent : la commune réduit sa subvention de 30 %, et l'épicerie partenaire, qui devait donner les denrées, ferme. Vous préparez les propositions pour le comité de pilotage.

Document 1 – Budget prévisionnel initial

Charges	Montant	Produits	Montant
Charges monétaires fixes (coordination, communication, évaluation)	2 000 €	74 – ARS	2 500 €
Charges monétaires des ateliers (400 € par atelier)	3 200 €	74 – Commune	1 000 €
86 – Denrées données par l'épicerie (50 € par atelier)	400 €	74 – CAF	800 €
86 – Salle et bénévolat (forfaits annuels)	500 €	70 – Participation (1,50 € × 15 personnes × 8 ateliers)	180 €
		Autofinancement	720 €
		87 – Contributions en nature	900 €
Total	6 100 €	Total	6 100 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la nouvelle subvention de la commune et le nouveau coût monétaire des ateliers si l'association doit acheter les denrées. (2 pts)
2. Calculez le besoin de financement supplémentaire créé par ces deux nouvelles. (2 pts)
3. Le comité envisage de passer à sept ateliers. Calculez les nouvelles charges, la nouvelle participation et l'autofinancement nécessaire. Présentez le budget équilibré. (6 pts)
4. Proposez deux autres solutions et comparez-les à la réduction du nombre d'ateliers. (3 pts)
5. Indiquez qui doit être informé de ces changements et pourquoi l'ARS doit l'être. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 8.37

1. Légendes : 1 Mesurer les indicateurs de suivi ; 2 Comparer le réalisé au prévu ; 3 Analyser les causes des écarts ; 4 Décider des ajustements ; 5 Rendre compte aux partenaires ; 6 Tableau de bord.

2. Présence : 38 / 48 × 100 = **79,2 %**. Budget : 1 260 / 3 000 × 100 = **42,0 %**. Fiches : 5 / 8 × 100 = **62,5 %** (6 prévues à mi-parcours, soit 75 %).

3. Ateliers : conforme (4 sur 8). Présence : conforme (79,2 % ≥ 75 %). Budget : conforme, légèrement sous la moitié ; il reste 1 740 €. Fiches : **en retard** d'une fiche sur le prévu.

4. Exemple : fixer une séance de test de la fiche manquante avec deux jardiniers volontaires avant l'atelier 5, et confier la relecture à une personne désignée, avec une échéance notée au compte rendu.

Corrigé – Exercice 8.38

1. Légendes : 1 Prioritaire : traiter tout de suite ; 2 À traiter : mesures prévues ; 3 À surveiller ; 4 Acceptable ; 5 Criticité = P × G.

2. Criticités : R3 = 3 × 3 = **9** ; R1 = 2 × 4 = **8** ; R4 = 2 × 4 = **8** ; R7 = 4 × 2 = **8** ; R2 = 3 × 2 = **6** ; R5 = 3 × 2 = **6** ; R6 = 1 × 4 = **4**. Classement : R3, puis R1, R4 et R7, puis R2 et R5, puis R6.

3. Exemples : R3 – passer par les mairies, les écoles et des relais dans chaque village, choisir l'horaire avec les habitants, annoncer le passage une semaine avant ; R1 – entretien du camion avant la saison, solution de repli (salle communale avec réchauds), numéro de dépannage ; R4 – glacières et accumulateurs de froid, thermomètre, relevé des températures, produits sensibles achetés le jour même ; R7 – recettes de saison, achats auprès des producteurs partenaires, marge de 10 % sur la ligne denrées ; R2 – tonnelle, solution de repli en salle, report de date ; R5 – former au moins deux bénévoles par poste, conducteurs écrits et partagés ; R6 – recueil des allergies, affichage des 14 allergènes réglementaires (règlement européen INCO n° 1169/2011), variantes sans allergène, protocole d'urgence.

4. R6 a une gravité **maximale** (4) : une réaction allergique peut mettre la vie en danger. Un risque grave appelle toujours des mesures, même s'il est peu probable ; c'est aussi une obligation d'information sur les allergènes.

Corrigé – Exercice 8.39

1. Places possibles : A = 4 × 12 = 48 ; B = 4 × 12 = 48 ; C = 4 × 9 = 36. Taux de présence : A = 41 / 48 × 100 = **85,4 %** ; B = 26 / 48 × 100 = **54,2 %** ; C = 33 / 36 × 100 = **91,7 %**. Global : (41 + 26 + 33) / (48 + 48 + 36) = 100 / 132 × 100 = **75,8 %**.

2. Budget : 2 150 / 4 800 × 100 = **44,8 %** pour 50 % d'avancement ; il reste 2 650 €. Questionnaires : 30 / 36 × 100 = **83,3 %**.

3. Tableau de bord :

Indicateur	Prévu	Réalisé	Analyse
Ateliers réalisés	12 sur 24	12	Conforme
Présence globale	75 %	75,8 %	Conforme, mais masque de grands écarts
Présence résidence B	75 %	54,2 %	Écart de − 20,8 points : horaire en concurrence avec l'aide aux devoirs
Budget consommé	environ 50 %	44,8 %	Conforme
Questionnaires « avant »	36	30 (83,3 %)	Six manquants : à recueillir avant l'atelier suivant
Supports FALC	4	3	Un support en retard

4. Exemples : déplacer les ateliers de la résidence B à un autre horaire (10 h ou samedi matin), choisi avec les mères ; à la résidence C, garder le groupe mais limiter à 9 places, ou réserver une salle plus grande pour l'atelier final ; utiliser une partie du reste du budget pour une garde d'enfants pendant les ateliers de la résidence B.

Corrigé – Exercice 8.40

1. Légendes : 1 Objectifs de communication ; 2 Cibles ; 3 Messages ; 4 Canaux et supports ; 5 Calendrier ; 6 Budget et évaluation.

2. Exemples : faire connaître le réfrigérateur et ses règles à tous les habitants avant son ouverture ; obtenir l'engagement d'au moins quatre commerces donateurs ; informer les riverains pour prévenir les conflits ; valoriser l'action auprès des élus après six mois.

3. Plan de communication (exemple) :

Cible	Objectif	Message	Canal, support	Quand
Habitants	Connaître et utiliser le réfrigérateur sans gêne	« Ici, chacun donne et chacun prend. »	Affiche avec pictogrammes sur le réfrigérateur, journal municipal, relais du CCAS et des associations	Deux semaines avant l'ouverture, puis en continu
Commerces donateurs	S'engager à donner	« Moins de gaspillage, un geste visible pour votre commune. »	Rencontre en face à face, courrier de la mairie, convention simple	Un mois avant
Riverains	Accepter l'installation	« Un réfrigérateur entretenu chaque jour par des bénévoles ; un contact en cas de problème. »	Courrier dans les boîtes, rencontre sur place	Trois semaines avant
Élus	Soutenir et pérenniser	« En six mois, … kg de produits sauvés et partagés. »	Note de bilan, présentation en conseil municipal	Au bout de six mois

Le message aux habitants s'adresse à **tous** (« chacun donne et chacun prend ») : il ne désigne pas les personnes pauvres, ce qui évite la honte et la stigmatisation.

4. Exemples : nombre de commerces donateurs engagés ; nombre de personnes qui disent avoir connu le réfrigérateur par chaque canal (court questionnaire) ; nombre de plaintes de riverains.

Corrigé – Exercice 8.41

1. Contacts : 17 + 8 + 6 + 3 + 2 + 10 = **46** ; inscrits : 12 + 4 + 2 + 1 + 1 + 8 = **28**. Parts des inscriptions : relais 12 / 28 = **42,9 %** ; bouche-à-oreille 8 / 28 = **28,6 %** ; affiches 4 / 28 = **14,3 %** ; réseaux sociaux 2 / 28 = **7,1 %** ; flyers **3,6 %** ; radio **3,6 %**.
2. Taux de transformation : relais 12 / 17 = **70,6 %** ; affiches **50,0 %** ; réseaux sociaux **33,3 %** ; flyers **33,3 %** ; radio **50,0 %** ; bouche-à-oreille **80,0 %**. Coût par inscrit : relais 120 / 12 = **10,00 €** ; affiches 35 / 4 = **8,75 €** ; réseaux sociaux 72 / 2 = **36,00 €** ; flyers 60 / 1 = **60,00 €**.
3. Relais humains : (12 + 8) / 28 × 100 = **71,4 %** des inscriptions. Flyers : 3 contacts pour 400 flyers, soit **0,75 contact pour 100 flyers**.
4. Exemple : « Les relais humains apportent sept inscriptions sur dix, avec les meilleurs taux de transformation. Les flyers coûtent 60 € par inscrit et touchent très peu de personnes. L'an prochain, nous proposons de supprimer les flyers, de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, de garder les affiches, peu coûteuses, et d'investir les 60 € économisés dans la formation de deux relais supplémentaires. »
5. Limites : les effectifs sont petits (un inscrit de plus change fortement les pourcentages) ; une personne a pu être touchée par plusieurs canaux et n'en citer qu'un ; le coût des relais ne compte pas le temps qu'ils donnent.

Corrigé – Exercice 8.42

1. Commune : 1 000 × (1 − 0,30) = **700 €**. Coût monétaire d'un atelier si l'on achète les denrées : 400 + 50 = **450 €** ; pour huit ateliers : 8 × 450 = **3 600 €**.
2. Besoin supplémentaire : baisse de la commune 300 € + denrées à acheter 400 € = **700 €**. Les contributions en nature baissent de 400 € (comptes 86 et 87), sans effet sur l'équilibre.
3. Sept ateliers : charges monétaires = 2 000 + 7 × 450 = **5 150 €** ; contributions en nature : **500 €** ; total des charges : **5 650 €**. Participation : 1,50 × 15 × 7 = **157,50 €**. Produits connus : 2 500 + 700 + 800 + 157,50 + 500 = 4 657,50 € ; autofinancement nécessaire : 5 650 − 4 657,50 = **992,50 €** (contre 720 € prévus, soit 272,50 € de plus).

Charges	Montant	Produits	Montant
Charges fixes	2 000,00 €	74 – ARS	2 500,00 €
Sept ateliers (450 € chacun)	3 150,00 €	74 – Commune	700,00 €
86 – Salle et bénévolat	500,00 €	74 – CAF	800,00 €
		70 – Participation	157,50 €
		Autofinancement	992,50 €
		87 – Contributions en nature	500,00 €
Total	**5 650,00 €**	**Total**	**5 650,00 €**

4. Exemples : chercher un nouveau donateur de denrées (autre commerce, banque alimentaire, producteurs du marché), ce qui garde les huit ateliers ; demander à la CAF ou à une fondation un complément de 700 €. Ces solutions préservent l'action pour le public, mais elles sont incertaines et prennent du temps. Réduire à sept ateliers est sûr et rapide, mais

diminue l'offre : on peut le décider à titre provisoire et rétablir le huitième atelier si un financement arrive.

5. Informer le comité de pilotage (qui décide), les financeurs (ARS, CAF, commune), les participants (si le calendrier change) et les bénévoles. L'ARS doit être informée parce que la subvention a été accordée pour un projet précis (huit ateliers) : toute modification importante du contenu ou du budget doit lui être signalée, et parfois validée par un avenant. Le bilan devra expliquer l'écart.

Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Compléter un cadre logique, l'outil des financeurs.
- Préparer la pérennisation dès la conception et chiffrer le coût d'une deuxième année.
- Organiser et valoriser l'engagement des bénévoles.
- Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie.
- Défendre son plan d'action devant le jury.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve : diagnostic, objectifs, planning, budget, trésorerie, repas (Ciqual 2025), risques et éthique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Cadre logique : un tableau à quatre colonnes (logique d'intervention, indicateurs, sources de vérification, hypothèses) et quatre lignes (objectif général, objectif spécifique, résultats, activités). Il vérifie la cohérence verticale (les activités produisent les résultats qui servent l'objectif) et horizontale (chaque niveau a ses indicateurs).
- Pérennisation : former des relais, rendre les outils réutilisables, inscrire l'action dans le projet de la structure, diversifier les financements, rechercher des financements pluriannuels (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, fonds européens).
- Bénévoles : une mission claire, un accueil, une formation, un référent, une reconnaissance ; le bénévolat est valorisé aux comptes 86 et 87 avec un taux horaire justifié.
- Tableur : formules plutôt que valeurs saisies à la main ; une cellule par donnée ; vérification automatique de l'équilibre.
- À l'oral : relier chaque choix du plan d'action au diagnostic, montrer les chiffres, reconnaître les limites et dire ce que l'on ferait autrement.

Exercice 8.43 – Compléter un cadre logique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une fondation (fictive) demande à l'association Bocal et Compagnie (exercices 8.21 et 8.38) de présenter son projet de cuisine mobile sous la forme d'un cadre logique. Le coordinateur a commencé le tableau.

Document 1 – Cadre logique à compléter

Niveau	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à améliorer l'alimentation des habitants isolés de six villages	……	……	–
Objectif spécifique	Dans un an, 30 % des participants cuisinent au moins deux fois par semaine des légumes achetés aux producteurs locaux (valeur initiale : 12 %)	……	……	……
Résultats	……	6 villages desservis ; 4 producteurs partenaires	……	……
Activités	24 haltes de la cuisine mobile avec atelier et dégustation ; formation de 8 bénévoles	……	……	……

À vous de jouer – Questions

1. Complétez les cases vides du cadre logique. (6 pts)

2. Expliquez la différence entre un indicateur et une source de vérification. (2 pts)

3. Expliquez à quoi servent les hypothèses, avec un exemple. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.44 – Préparer la pérennisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La première année du projet « Cuisine au cœur du bourg » (association fictive) a été financée en grande partie par une subvention qui ne sera pas renouvelée. Le bureau veut continuer huit ateliers en deuxième année, avec 12 participants par atelier, et vous demande un budget réaliste.

Document 1 – Charges monétaires de la première année et choix pour la deuxième année (fictifs)

Poste	Année 1	Choix pour l'année 2
Diététicienne	8 ateliers × 3 h × 55 €	3 ateliers × 3 h × 55 € ; les autres sont animés par l'animatrice et deux relais formés
Coordinatrice	60 h × 24 €	20 h × 24 € (outils déjà construits)
Animatrice	64 h × 18 €	64 h × 18 €
Denrées	8 × 40 €	8 × 40 €
Petit matériel	450 €	0 € (matériel acquis)
Communication	220 €	80 € (affiches réimprimées)
Formation des relais	2 séances × 3 h × 55 €	0 €

Ressources de l'année 2 : participation de 2 € par personne et par atelier ; la commune accorde 600 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les charges monétaires des deux années et la baisse en euros et en pourcentage. (4 pts)

2. Calculez la participation, puis l'autofinancement nécessaire en année 2, et sa part dans les charges. (3 pts)

3. Relevez dans le document 1 trois choix de l'année 1 qui ont préparé la pérennisation. (3 pts)

4. Proposez deux pistes de financement pour l'année 2. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.45 – Organiser et valoriser le bénévolat (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

L'association Saveurs du Faubourg (exercice 8.42) s'appuie sur neuf bénévoles. Après deux départs l'an dernier, la présidente vous demande de mieux organiser leur engagement et de valoriser leur temps dans le budget (charges monétaires : 8 000 €). L'association a fixé à 15 € le taux horaire de valorisation (taux fictif, à justifier dans l'annexe du budget).

Document 1 – Temps des bénévoles prévu sur l'année

- 4 bénévoles aux ateliers : 8 ateliers de 3 heures chacun.
- 2 bénévoles à la logistique : 10 heures chacun.
- 3 bénévoles à la communication : 6 heures chacun.

Document 2 – Ce qu'ont dit les deux bénévoles partis

« On ne savait jamais ce qu'on devait faire en arrivant. » « Personne ne m'a dit merci, et je n'ai jamais su si les familles avaient aimé. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures de bénévolat et leur valorisation. (2 pts)

2. Calculez la part du bénévolat dans le budget total, contributions en nature comprises. (2 pts)

3. Indiquez comment le bénévolat apparaît dans le budget. (2 pts)

4. Proposez cinq mesures pour fidéliser les bénévoles, en vous appuyant sur le document 2. (4 pts)

5. Citez deux tâches qu'un bénévole ne doit pas assurer seul dans un atelier culinaire, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.46 – Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous construisez dans un tableur le suivi du budget du Clos-Fleuri (exercices 8.27 et 8.29) et un plan de trésorerie. Votre tutrice veut que le fichier se mette à jour seul quand on change une valeur.

Document 1 – Organisation de la feuille « Budget »

Ligne 1 : titres. Colonne A : postes. Colonne B : prévu. Colonne C : réalisé. Colonne D : écart en euros. Colonne E : écart en pourcentage. Lignes 2 à 9 : les huit postes de l'exercice 8.29. Ligne 10 : totaux.

Document 2 – Organisation de la feuille « Trésorerie »

Ligne 1 : titres. Colonne A : mois. Colonne B : encaissements. Colonne C : décaissements. Colonne D : solde de fin de mois. La cellule D1 contient le solde de départ (500 €). Lignes 2 à 9 : janvier à août.

À vous de jouer – Questions

1. Écrivez les formules des cellules D2, E2, B10 et D10 de la feuille « Budget ». (4 pts)
2. Écrivez la formule de la cellule D2 de la feuille « Trésorerie », puis celle de D3, recopiable vers le bas. (2 pts)
3. Proposez une formule qui affiche « équilibré » ou « déséquilibré » en comparant le total des charges (cellule H20) et le total des produits (cellule K20). (2 pts)
4. Proposez une mise en forme qui fait apparaître les soldes négatifs. (2 pts)
5. Donnez deux règles pour qu'un fichier partagé reste fiable. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.47 – Défendre son plan d'action devant le jury (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors du temps 1 de l'épreuve E5, après votre exposé de 10 minutes, le jury vous interroge pendant 20 minutes sur le plan d'action de votre projet de stage. Vous vous entraînez avec cinq questions fréquentes.

Document 1 – Cinq questions du jury

a) « Pourquoi avez-vous choisi des ateliers culinaires plutôt qu'une autre action ? »

b) « Votre budget repose à 70 % sur une seule subvention. Est-ce raisonnable ? »

c) « Votre taux de présence était de 62 %. Qu'avez-vous fait ? »

d) « Qui a décidé des horaires des ateliers ? »

e) « Si vous deviez recommencer, que changeriez-vous dans votre plan d'action ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque question, dites ce que le jury cherche à vérifier. (5 pts)

2. Rédigez une réponse de trois à quatre phrases pour chaque question, appuyée sur des faits. (7,5 pts)

3. Indiquez trois erreurs à éviter pendant l'entretien. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 8.48 – Cas complet : le « bol du bénévole » d'un festival de musique (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage auprès de l'association qui organise « Les Nuits du Lac » (festival fictif de musique, trois soirs en juillet 2027, en zone rurale). Le festival repose sur 160 bénévoles, qui travaillent souvent de 16 h à 2 h du matin. L'an dernier, plusieurs malaises ont été signalés et beaucoup de bénévoles se sont plaints de la cantine. La coordinatrice vous confie, avec une diététicienne libérale, un projet pour l'alimentation et l'hydratation des bénévoles : un « bol du bénévole » servi chaque nuit à 23 h, des fontaines à eau et une gourde pour chacun. Le projet commence en semaine 0 (fin avril 2027).

Document 1 – Questionnaire de fin d'édition 2026 (données fictives) : 112 répondants sur 160 bénévoles

Réponse	Nombre
A sauté au moins un repas pendant le festival	47
A surtout mangé des chips ou des sandwichs la nuit	58
A bu moins d'un litre et demi d'eau par jour	63
A ressenti un malaise ou une grande fatigue	19
Est satisfait de la cantine	41
Trouve les horaires de la cantine inadaptés	66

Croisement : parmi les 48 bénévoles postés après 22 h, 29 ont sauté au moins un repas ; parmi les 64 autres, 18 sont dans ce cas.

Document 2 – Règles de financement (fictives)

- Fondation Terres et Fêtes : 50 % au plus des charges monétaires du projet, dans la limite de 3 000 € ; versement de 70 % à la signature (mai), le solde après le bilan (octobre).
- Communauté de communes : 1 200 € accordés, versés en septembre.
- Le festival complète par autofinancement. Il affecte au projet une trésorerie de 900 € au 1er avril.
- Un brasseur, partenaire du festival, propose de payer les gourdes si elles portent le logo de sa bière.

Document 3 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Analyse du questionnaire 2026	2	–
B	Choix des actions avec la coordinatrice	1	A
C	Dossier pour la fondation	2	B
D	Recherche de producteurs locaux	3	B
E	Conception du bol et des fiches	3	B
F	Commande des gourdes et location des fontaines	2	C
G	Formation de l'équipe de la cantine	1	D, E
H	Communication auprès des bénévoles	2	E
I	Festival	1	F, G, H
J	Bilan	2	I

Document 4 – Éléments du budget (fictifs)

- Denrées du bol : 480 portions (160 bénévoles × 3 nuits), coût à calculer (document 5).
- Gourdes : 160 × 2,10 €. Location de 3 fontaines à eau pendant 4 jours : 45 € par fontaine et par jour.
- Diététicienne : 2 jours de préparation de 7 h et 3 soirs de présence de 4 h, à 50 € de l'heure.
- Impression des affiches et des fiches : 180 €. Coordinatrice salariée : 40 h à 22,00 € de l'heure.
- Équipe de la cantine : 12 bénévoles × 3 jours × 6 h, valorisées à 14 € de l'heure. Cuisine de la salle des fêtes prêtée par la commune : valorisée 600 €.

- Jusqu'ici, le festival achetait à un traiteur un sandwich de minuit à 2,90 € pour chaque bénévole et chaque nuit (hors projet).

Document 5 – Le « bol du bénévole » : grammages nets par portion, pertes et prix (fictifs) et extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Net par portion	Perte	Prix	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Riz complet, cru (9102)	60 g	–	2,40 € le kg	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01	11,1	0
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	80 g	–	2,60 € le kg	108	8,31	13	0,97	7	0,68	58	0,2
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	40 g	–	3,40 € le kg	105	2,66	18,3	1,68	3,1	0,59	3,51	2,1
Poivron rouge, cru (20087)	50 g	15 %	3,80 € le kg	33,6	1,06	5,98	< 0,5	3,2	< 0,013	4,8	121
Tomate sans précision, crue (20385)	60 g	5 %	2,90 € le kg	19,2	0,6	3,69	< 0,5	1,02	< 0,013	6,78	20,1
Huile de colza (17130)	6 g	–	3,20 € le kg	900	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	60 g	–	2,60 € le kg	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 2
Nectarine ou brugnon, chair et peau, sans noyau, crue (13399)	150 g	8 %	3,20 € le kg	49,5	0,74	11,3	< 0,5	0,47	< 0,013	4,88	3,24

Citron, cumin, sel : forfait de 1,60 € pour 160 portions. On calcule avec les poids nets ; « < » est compté 0.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic et objectifs (8 points)

1. Calculez le taux de participation au questionnaire et les pourcentages du document 1. (2 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de bénévoles qui ont sauté un repas. (1 pt)

3. Calculez le risque relatif de sauter un repas pour les bénévoles postés après 22 h, avec son intervalle de confiance à 95 % (formule : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$), et interprétez-le. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels SMART. (3 pts)

Partie B – Planification (5 points)

5. Calculez les dates au plus tôt et au plus tard, les marges, le chemin critique et la durée minimale du projet. (4 pts)

6. Le festival a lieu en semaine 10. Le projet est-il tenable ? Indiquez la marge disponible. (1 pt)

Partie C – Le bol du bénévole (9 points)

7. Établissez le bon de commande pour une nuit (160 portions) : poids net, poids brut, coût de chaque ligne au centime. Calculez le coût par portion et le coût des trois nuits. (3 pts)

8. Calculez les apports d'une portion (bol et nectarine) en énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel, calcium et vitamine C, et la répartition de l'énergie. (4 pts)

9. Commentez ce repas pour un bénévole qui travaille la nuit, et proposez une modification pour augmenter les protéines ; calculez-en l'effet avec un œuf dur de 50 g (Ciqual 22010 : 134 kcal, 13,5 g de protéines, 8,62 g de lipides, 41 mg de calcium pour 100 g). (2 pts)

Partie D – Budget, financement et trésorerie (12 points)

10. Calculez chaque charge du projet et présentez le budget équilibré, contributions en nature comprises. (5 pts)

11. Calculez la subvention de la fondation et l'autofinancement du festival. Comparez avec la dépense de sandwichs évitée. (3 pts)

12. Construisez le plan de trésorerie d'avril à octobre (décaissements : avril 920 € ; mai 400 € ; juin 556 € ; juillet : le reste des charges monétaires) ; indiquez le besoin maximal et une solution propre à un festival. (4 pts)

Partie E – Risques, communication et éthique (6 points)

13. Identifiez trois risques propres à cette action et proposez une mesure pour chacun. (3 pts)

14. Rédigez le message de communication adressé aux bénévoles, et indiquez deux canaux. (1,5 pt)

15. Que répondez-vous au brasseur (document 2) ? Justifiez. (1,5 pt)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 8.43

1. Cadre logique complété (exemple) :

Niveau	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à améliorer l'alimentation des habitants isolés de six villages	Évolution de la consommation de fruits et de légumes des habitants participants	Enquête au début et à la fin du projet	–
Objectif spécifique	30 % des participants cuisinent au moins deux fois par semaine des légumes des producteurs locaux (valeur initiale 12 %)	Part des participants qui déclarent cuisiner ces légumes au moins deux fois par semaine	Questionnaire avant/après	Les producteurs maintiennent des prix accessibles
Résultats	La cuisine mobile dessert six villages ; quatre producteurs vendent sur les haltes ; les habitants savent cuisiner les légumes de saison	6 villages desservis ; 4 producteurs partenaires ; part des participants capables de réaliser une recette	Planning des haltes, conventions, grille d'observation des ateliers	Les mairies prêtent un emplacement ; les habitants viennent aux haltes
Activités	24 haltes avec atelier et dégustation ; formation de 8 bénévoles	24 haltes réalisées ; 8 bénévoles formés ; nombre de participants par halte	Feuilles d'émargement, compte rendu de formation	Le camion est en état ; les bénévoles restent disponibles

2. L'**indicateur** est ce que l'on mesure (une part, un nombre) ; la **source de vérification** est le document ou l'outil qui permet de le mesurer et de le prouver (questionnaire, feuille d'émargement, convention).

3. Les hypothèses sont les conditions extérieures, hors du contrôle de l'équipe, nécessaires pour passer d'un niveau au suivant. Exemple : si les mairies refusent un emplacement, les haltes ne pourront pas avoir lieu, même si l'équipe est prête. Elles sont reliées à la matrice des risques.

Corrigé – Exercice 8.44

1. Année 1 : diététicienne 8 × 3 × 55 = 1 320 € ; coordinatrice 60 × 24 = 1 440 € ; animatrice 64 × 18 = 1 152 € ; denrées 8 × 40 = 320 € ; matériel 450 € ; communication 220 € ; formation 2 × 3 × 55 = 330 € ; total **5 232 €**. Année 2 : diététicienne 3 × 3 × 55 = 495 € ; coordinatrice 20 × 24 = 480 € ; animatrice 1 152 € ; denrées 320 € ; communication 80 € ; total **2 527 €**. Baisse : 5 232 − 2 527 = **2 705 €**, soit 2 705 / 5 232 × 100 = **51,7 %**.

2. Participation : 2 € × 12 × 8 = **192 €**. Autofinancement : 2 527 − 192 − 600 = **1 735 €**, soit 1 735 / 2 527 × 100 = **68,7 %** des charges.

3. La formation de deux relais (qui animent désormais cinq ateliers) ; l'achat de matériel durable ; la construction des outils par la coordinatrice (conducteurs, fiches, affiches réutilisables).

4. Exemples : déposer une demande à la conférence des financeurs si le public a plus de 60 ans, ou à la CAF s'il s'agit de familles ; inscrire l'action dans le contrat local de santé ou le projet alimentaire territorial ; solliciter une caisse de retraite ou une mutuelle ; demander à la commune une convention sur trois ans.

Corrigé – Exercice 8.45

1. Heures : 4 × 8 × 3 = 96 h ; 2 × 10 = 20 h ; 3 × 6 = 18 h ; total **134 heures**. Valorisation : 134 × 15 = **2 010 €**.

2. Budget total : 8 000 + 2 010 = 10 010 € ; part du bénévolat : 2 010 / 10 010 × 100 = **20,1 %**.

3. Au **compte 86** (emplois des contributions volontaires en nature, côté charges) et au **compte 87** (contributions volontaires en nature, côté produits), pour 2 010 € de chaque côté. Le taux de 15 € et le nombre d'heures sont justifiés dans l'annexe.

4. Exemples : une fiche mission pour chaque poste (ce que l'on attend, horaires, référent) ; un accueil avant le premier atelier et un point de dix minutes au début de chaque séance ; une courte formation (hygiène, accueil du public, gestes de sécurité) ; un retour sur ce que les familles ont dit et sur les résultats du projet ; une reconnaissance (remerciements publics, repas des bénévoles, attestation d'engagement) ; une place au comité de pilotage pour un représentant des bénévoles.

5. Exemples : la gestion d'une allergie ou d'un malaise (il faut connaître le protocole et appeler les secours) ; le conseil nutritionnel individuel (il relève de la diététicienne) ; la sécurité des gestes dangereux (four, friture, couteaux) avec un groupe entier.

Corrigé – Exercice 8.46

1. D2 : =C2-B2 ; E2 : =D2/B2 (format pourcentage) ou =(C2-B2)/B2*100 ; B10 : =SOMME(B2:B9) ; D10 : =C10-B10 (ou

=SOMME(D2:D9)).

2. D2 : =D1+B2-C2 ; D3 : =D2+B3-C3, à recopier vers le bas jusqu'à D9.

3. =SI(H20=K20;"équilibré";"déséquilibré") ; pour éviter les erreurs d'arrondi : =SI(ARRONDI(H20-K20;2)=0;"équilibré";"déséquilibré").

4. Une mise en forme conditionnelle : si la valeur de la cellule est inférieure à 0, police rouge et fond rose ; on peut aussi utiliser le format de nombre « 0,00 € ;[Rouge]-0,00 € ».

5. Exemples : ne jamais écrire un résultat à la main là où une formule est prévue ; garder une seule version partagée, avec la date de mise à jour ; protéger les cellules de formules ; noter les sources des données (devis, factures) ; faire vérifier les totaux par une deuxième personne.

Corrigé – Exercice 8.47

1. a) La cohérence entre l'action et le diagnostic, et la connaissance des données probantes. b) La compréhension des règles de prudence et de cofinancement. c) La capacité à piloter : repérer un écart, en chercher les causes, décider. d) La participation du public. e) La capacité d'analyse critique et de recul.

2. Exemples de réponses :

a) « Le diagnostic montrait que 71 % des personnes ne savaient pas préparer les légumes secs, alors que l'épicerie en disposait. Une information seule n'aurait pas donné ce savoir-faire. Les ateliers culinaires sont une méthode active, recommandée pour les savoir-faire, et je les ai combinés avec des dégustations à l'épicerie pour agir aussi sur l'accès. »

b) « Ce n'est pas idéal : si la subvention avait été refusée, le projet aurait été réduit de moitié. J'ai distingué les financements acquis et sollicités, et prévu une version à quatre ateliers. Pour l'an prochain, nous avons déposé une demande à la CAF pour diversifier les ressources. »

c) « J'ai calculé le taux après chaque atelier : 62 %, pour un objectif de 80 %. Les appels aux absentes ont montré que l'horaire de 14 h tombait pendant la sortie de l'école. Le comité de pilotage a déplacé les ateliers à 9 h 30, et le taux est remonté à 81 % sur les trois derniers ateliers. »

d) « Les horaires ont été choisis avec trois participantes lors d'une réunion de préparation, puis confirmés avec le groupe. Quand ils ne convenaient plus, nous les avons changés sur leur proposition. »

e) « J'associerais les participantes dès le choix des actions, et pas seulement des horaires. Je prévoirais plus de temps pour les inscriptions, que j'avais sous-estimé de près de 20 %, et je préparerais le questionnaire "après" dès le début. »

3. Exemples : réciter le dossier sans répondre à la question ; se justifier sans reconnaître une limite réelle ; donner un chiffre sans savoir le recalculer ; parler des participants de façon stigmatisante ; couper la parole au jury.

Corrigé – Exercice 8.48

Partie A

1. Participation : 112 / 160 × 100 = **70,0 %**. Pourcentages (sur 112 répondants) : repas sauté **42,0 %** ; chips ou sandwichs la nuit **51,8 %** ; moins d'un litre et demi d'eau **56,3 %** (63 / 112 = 56,25 %) ; malaise ou grande fatigue **17,0 %** ; satisfaits de la cantine **36,6 %** ; horaires inadaptés **58,9 %**.

2. p = 47 / 112 = 0,420 ; marge = 1,96 × √(0,420 × 0,580 / 112) = **0,091**, soit **± 9,1 points** ; intervalle : **32,9 % à 51,1 %**. Entre un tiers et la moitié des bénévoles ont probablement sauté un repas. Les 48 non-répondants sont peut-être différents (biais de non-réponse).

3. Postés après 22 h : 29 / 48 = 60,4 % ; autres : 18 / 64 = 28,1 % ; RR = 60,4 / 28,1 = **2,15**. Erreur type : √(1/29 − 1/48 + 1/18 − 1/64) = 0,234 ; IC à 95 % : exp(ln 2,15 ± 1,96 × 0,234) = **[1,36 ; 3,38]**. Les bénévoles postés la nuit ont environ deux fois plus de risque de sauter un repas ; l'intervalle ne contient pas 1 : la différence est statistiquement significative. Cela justifie un repas servi à 23 h.

4. Exemple. Objectif général : contribuer à préserver la santé des bénévoles du festival. OS1 : lors de l'édition 2027, réduire de 42 % à 20 % la part des bénévoles qui sautent au moins un repas (questionnaire de fin d'édition). OS2 : lors de l'édition 2027, réduire de 56 % à 30 % la part des bénévoles qui boivent moins d'un litre et demi d'eau par jour. Objectifs opérationnels : servir chaque nuit à 23 h, pendant les trois nuits, 160 bols du bénévole, soit 480 portions ; installer trois fontaines à eau et remettre une gourde à chacun des 160 bénévoles avant le premier soir.

Partie B

5. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (2)	0	2	0	2	0
B (1)	2	3	2	3	0

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
C (2)	3	5	4	6	1
D (3)	3	6	4	7	1
E (3)	3	6	3	6	0
F (2)	5	7	6	8	1
G (1)	6	7	7	8	1
H (2)	6	8	6	8	0
I (1)	max(7 ; 7 ; 8) = 8	9	8	9	0
J (2)	9	11	9	11	0

Chemin critique : **A → B → E → H → I → J** ; durée minimale : 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 = **11 semaines**.

6. Le festival (I) peut commencer au plus tôt en semaine 8 ; s'il a lieu en semaine 10, il reste **2 semaines de marge** pour l'ensemble des tâches qui le précèdent. Le projet est tenable, à condition de ne pas dépasser ces deux semaines de retard sur la conception du bol et la communication.

Partie C

7. Bon de commande pour 160 portions : riz complet 9,6 kg × 2,40 = **23,04 €** ; haricots rouges 12,8 kg × 2,60 = **33,28 €** ; maïs 6,4 kg × 3,40 = **21,76 €** ; poivrons 8,0 kg net, 8,0 / 0,85 = 9,41 kg brut × 3,80 = **35,76 €** ; tomates 9,6 kg net, 9,6 / 0,95 = 10,11 kg brut × 2,90 = **29,31 €** ; huile 0,96 kg × 3,20 = **3,07 €** ; fromage blanc 9,6 kg × 2,60 = **24,96 €** ; nectarines 24,0 kg net, 24,0 / 0,92 = 26,09 kg brut × 3,20 = **83,48 €** ; forfait **1,60 €**. Total par nuit : **256,26 €** ; par portion : 256,26 / 160 = **1,60 €** ; trois nuits : 3 × 256,26 = **768,78 €**.

8. Apports d'une portion : énergie **540,4 kcal** ; protéines **18,29 g** ; glucides **85,03 g** ; lipides **11,07 g** ; fibres **12,77 g** ; sel **0,84 g** ; calcium **146,9 mg** ; vitamine C **78,4 mg**. Exemple : énergie du riz = 60 × 350 / 100 = 210 kcal ; vitamine C du poivron = 50 × 121 / 100 = 60,5 mg. Répartition : protéines 18,29 × 4 / 540,4 = **13,5 %** ; lipides 11,07 × 9 / 540,4 = **18,4 %** ; glucides 85,03 × 4 / 540,4 = **62,9 %** ; fibres environ 4,7 %.

9. Le repas est riche en glucides complexes et en fibres (riz complet, haricots rouges), utiles pour tenir pendant un effort prolongé ; il apporte beaucoup de vitamine C et peu de sel ; il se mange froid, se prépare à l'avance et se sert vite, ce qui convient à une pause courte. Les protéines (13,5 % de l'énergie) et les lipides sont un peu bas pour un repas principal. Avec un œuf dur de 50 g : protéines 18,29 + 6,75 = **25,04 g** (16,5 % de l'énergie) ; énergie 540,4 + 67 = **607,4 kcal** ; lipides 11,07 + 4,31 = **15,38 g** ; calcium **167,4 mg**. Coût supplémentaire : le prix d'un œuf (environ 0,30 €, prix fictif), soit environ 1,90 € par portion.

Partie D

10. Charges : denrées 768,78 € ; gourdes 160 × 2,10 = 336,00 € ; fontaines 3 × 4 × 45 = 540,00 € ; diététicienne (2 × 7 + 3 × 4) × 50 = 26 × 50 = 1 300,00 € ; impression 180,00 € ; coordinatrice 40 × 22,00 = 880,00 € ; bénévolat 12 × 3 × 6 × 14 = 3 024,00 € ; cuisine prêtée 600,00 €.

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Denrées du bol	768,78 €	74 – Fondation Terres et Fêtes (sollicitée)	2 002,39 €
60 – Gourdes	336,00 €	74 – Communauté de communes (acquise)	1 200,00 €
61 – Location des fontaines	540,00 €	Autofinancement du festival	802,39 €
62 – Honoraires de la diététicienne	1 300,00 €	87 – Bénévolat	3 024,00 €
62 – Impression	180,00 €	87 – Mise à disposition de la cuisine	600,00 €
64 – Coordinatrice	880,00 €		
86 – Bénévolat	3 024,00 €		
86 – Mise à disposition de la cuisine	600,00 €		
Total	**7 628,78 €**	**Total**	**7 628,78 €**

11. Charges monétaires : 768,78 + 336 + 540 + 1 300 + 180 + 880 = **4 004,78 €**. Fondation : 50 % × 4 004,78 = **2 002,39 €**, inférieur au plafond de 3 000 €. Autofinancement : 4 004,78 − 2 002,39 − 1 200 = **802,39 €**. Sandwichs évités : 480 × 2,90 = **1 392 €** ; le festival économise donc 1 392 − 802,39 = **589,61 €** par rapport à l'an dernier, tout en offrant un repas plus complet.

12. Fondation : 70 % × 2 002,39 = 1 401,67 € en mai ; solde 600,72 € en octobre. Décaissements de juillet : 4 004,78 − 920 − 400 − 556 = 2 128,78 €.

Mois	Encaissements	Décaissements	Solde de fin de mois
Avril	0	920,00	900 − 920 = − 20,00

Mois	Encaissements	Décaissements	Solde de fin de mois
Mai	1 401,67	400,00	981,67
Juin	0	556,00	425,67
Juillet	0	2 128,78	− 1 703,11
Août	0	0	− 1 703,11
Septembre	1 200,00	0	− 503,11
Octobre	600,72	0	97,61

Besoin maximal : **1 703,11 €** en juillet et en août. Solution propre au festival : les recettes de la billetterie et de la buvette sont encaissées en juillet ; le festival peut avancer cette somme sur sa trésorerie générale. On peut aussi demander à la communauté de communes un versement en juillet. Vérification : 900 + 1 401,67 + 1 200 + 600,72 − 4 004,78 = 97,61 € ; les 900 € apportés couvrent l'autofinancement de 802,39 € et il reste 97,61 €.

Partie E

13. Exemples : chaleur et rupture de la chaîne du froid (fromage blanc, riz cuit) : préparation l'après-midi, stockage au froid, service dans les deux heures, relevé des températures, jamais de riz cuit gardé à température ambiante (*Bacillus cereus*) ; faible consommation du bol par les bénévoles postés loin de la cantine : distribution au poste par une équipe mobile ; allergies (lait, céleri éventuel dans les épices) : affichage des allergènes, version sans fromage blanc ; malaise d'un bénévole : lien avec le poste de secours, rappel de boire à chaque prise de poste.

14. Exemple : « Cette année, on prend soin de ceux qui font le festival : à 23 h, ton bol t'attend à la cantine, ou il vient à toi à ton poste. Ta gourde se remplit aux trois fontaines. » Canaux : le groupe de messagerie des bénévoles et la réunion d'accueil du premier jour ; affiches à la cantine et aux fontaines.

15. Refuser poliment : associer une marque de bière à un objet de prévention santé remis à tous les bénévoles serait contradictoire avec l'objectif, et la publicité pour les boissons alcoolisées est strictement encadrée en France par la loi Évin (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991). On peut proposer au brasseur de soutenir le projet autrement, sans logo sur les gourdes (par exemple en finançant les fontaines à eau, avec une simple mention dans le bilan), ou chercher un autre financeur.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Classer des actions dans les six stratégies ; rédiger une fiche QQOQCCP chiffrée ; choisir une action avec des critères ; relier actions et objectifs ; adapter une action à un public ; rédiger un plan d'action	8.1 à 8.6			
2	Construire une matrice pouvoir/intérêt ; organiser les instances de pilotage ; corriger une matrice RACI ; corriger une convention ; convaincre un partenaire ; rédiger un compte rendu	8.7 à 8.12			
3	Répondre à un appel à projets ; choisir le financeur ; vérifier l'éligibilité ; calculer une subvention avec un plafond et un taux ; construire un plan de financement ; relire un dossier	8.13 à 8.18			
4	Lire et calculer un réseau PERT ; construire un Gantt ; mesurer l'effet d'un retard ; estimer une charge de travail ; fixer un calendrier réel	8.19 à 8.24			
5	Classer les comptes ; calculer un coût horaire chargé ; construire un budget équilibré ; calculer des ratios ; analyser des écarts ; calculer un seuil de participants	8.25 à 8.30			
6	Construire un plan de trésorerie ; calculer des quantités brutes ; préparer la logistique et le conducteur ; choisir une méthode pédagogique ; calculer coût et apports avec la table Ciqual	8.31 à 8.36			
7	Lire un tableau de bord ; construire une matrice des risques ; analyser un suivi multisite ; construire un plan de communication ; mesurer l'efficacité des canaux ; réagir à un imprévu	8.37 à 8.42			
8	Compléter un cadre logique ; préparer la pérennisation ; organiser le bénévolat ; utiliser un tableur ; défendre un plan d'action ; traiter un cas complet	8.43 à 8.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 8

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 8

Annales E5 – Chapitre 8

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action, pilotage, appels à projets et parties prenantes

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 8

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (2); Stratégies; Partenaires; Financements; Calendrier; Budget; Pilotage

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ; décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ; identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ; connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ; planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ; construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher ; S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches ; S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation ; Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher ; Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches ; Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ;

■ décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ;

■ identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ;

■ connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ;

■ planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 8 174
Mode d'emploi du cahier d'annales 174
Ce que le jury attend sur ce chapitre 174
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 175
S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher 175
S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches 177
S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation 180
Partie II – Les corrigés détaillés 183
Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher 183
Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches 187
Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation 191
Grille d'auto-évaluation 196

Cahier d'annales E5 – chapitre 8

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les appels à projets, les budgets et les données des enquêtes sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 8 porte sur la deuxième partie de la démarche de projet : passer des objectifs à un plan d'action réaliste, financé et piloté. Le jury vérifie que le candidat sait **organiser** les actions (QQOQCCP, répartition des rôles, matrice RACI), **associer les partenaires** et les financeurs pertinents, **lire un appel à projets** et en respecter les règles (plafond, taux, calendrier de versement), **planifier** (Gantt, PERT, chemin critique, marges), **construire un budget équilibré** avec les bons comptes et les contributions volontaires en nature, **anticiper la trésorerie**, **piloter** avec un tableau de bord et une analyse des écarts, **gérer les risques** et **communiquer** avec chaque public. Il valorise les calculs posés et vérifiés, les décisions argumentées par les chiffres et le respect de l'éthique (confidentialité, indépendance vis-à-vis des financeurs) ; il pénalise les budgets déséquilibrés, les plannings sans dépendances et les indicateurs sans valeur cible.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer la demande, le public, les ressources, le financeur et ses règles ; surligner chaque donnée chiffrée et sa source (fictive ou réelle). Pendant : pour chaque calcul, écrire la formule, le calcul posé, le résultat arrondi et une phrase d'interprétation ; vérifier que le budget est équilibré, que les comptes 86 et 87 sont égaux et que la trésorerie reste positive mois par mois ; donner pour chaque indicateur une valeur cible et une échéance. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet : plan d'action, budget, calendrier) et E5.A (étude de cas en santé publique).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année aux « Jardins du Pré-Haut » (association et territoire fictifs), un atelier chantier d'insertion qui cultive 6 hectares de légumes biologiques et les vend en paniers à des adhérents. Les salariés en insertion y travaillent pendant 4 à 24 mois pour reprendre pied dans l'emploi. L'accompagnatrice socioprofessionnelle vous dit : « C'est absurde : ils cultivent des légumes toute la journée et ils n'en mangent jamais. Beaucoup ne déjeunent pas, certains n'ont pas de cuisine chez eux. » Le diagnostic a été réalisé avant votre arrivée (document 2). Votre mission : concevoir le plan d'action, le calendrier, le budget et le pilotage du projet, et préparer la réponse à un appel à projets.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- 24 salariés en insertion (contrat à durée déterminée d'insertion, 26 heures par semaine, du lundi au jeudi, de 8 h à 15 h 30, pause de 30 minutes à midi) : 17 hommes et 7 femmes, de 19 à 58 ans ; 9 vivent en foyer ou en hébergement d'urgence, 6 en logement sans cuisine équipée.
- Encadrement : 2 encadrants techniques maraîchers ; 1 encadrante technique formée à la cuisine collective (salaire brut mensuel 2 100 € ; charges patronales estimées à 40 % du brut par la direction) ; 1 accompagnatrice socioprofessionnelle (coût horaire communiqué par la direction : 22,40 €) ; une vingtaine de bénévoles adhérents.
- Locaux : une salle de pause avec deux plaques électriques, un four à micro-ondes et un réfrigérateur ; une cuisine pédagogique est disponible gratuitement dans la salle des fêtes de la commune, à 400 mètres, le mardi (valeur locative estimée par la commune : 15 € de l'heure).
- Partenaires possibles : une diététicienne libérale (45 € de l'heure, déplacements compris) ; l'épicerie sociale de la ville voisine ; le service insertion du conseil départemental ; la mission locale ; le centre communal d'action sociale ; une fondation d'entreprise créée par une enseigne de grande distribution.

Document 2 – Diagnostic réalisé auprès des salariés en insertion (données fictives, janvier 2028)

Questionnaire oral de 15 questions, passé en entretien individuel par l'accompagnatrice ; 21 répondants sur 24 salariés.

Résultat	Effectif (n = 21)
Ne prend pas de repas le midi au moins 3 jours sur 4	12
N'a pas de cuisine équipée à domicile ou ne peut pas l'utiliser	15
N'a jamais cuisiné de légumes frais	9
Mange des légumes moins d'une fois par jour	16
Dépense moins de 40 € par semaine pour se nourrir	14
Prendrait un panier de légumes s'il était à prix réduit	17
Est intéressé par un atelier de cuisine pendant le temps de travail	13

Paroles recueillies : « Le midi je fume une cigarette, ça coupe la faim. » « Des courgettes, je ne sais pas quoi en faire. » « Au foyer, on n'a qu'un micro-ondes pour trente. » « Si c'est pendant les heures payées, je viens. »

Document 3 – Extrait d'un appel à projets (version adaptée et fictive pour le sujet)

Appel à projets « Bien manger dans les parcours d'insertion » – année 2028.

- **Publics prioritaires** : personnes en situation de précarité, notamment salariés des structures d'insertion par l'activité économique.
- **Actions éligibles** : ateliers de cuisine, accès à des produits frais à prix réduit, formation des encadrants, actions associant les bénéficiaires à la conception.
- **Actions exclues** : achats d'équipement lourd (plus de 1 000 € par article), actions ponctuelles sans suivi, distribution seule sans accompagnement.
- **Financement** : 2 500 € au plus, et 60 % au plus des charges monétaires du projet (les contributions en nature ne sont pas prises en compte dans ce calcul). Cofinancement obligatoire.
- **Versement** : 60 % à la notification, prévue en avril ; le solde après réception du bilan, prévu en octobre.

- **Critères de sélection** : diagnostic chiffré (20 %), cohérence objectifs-actions (25 %), partenariats engagés (15 %), participation des bénéficiaires (15 %), évaluation (15 %), budget réaliste et cofinancé (10 %).
- **Date limite de dépôt** : fin de la 6e semaine du projet. Formulaire de demande de subvention des associations (Cerfa n° 12156) joint au dossier.

Document 4 – Tâches du projet (durées en semaines)

Tâche · Intitulé · Durée · Antériorités

A — *Intitulé :* Diagnostic complémentaire et réunion de lancement ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* –

B — *Intitulé :* Choix des actions et fiches actions ; *Durée :* 1 ; *Antériorités :* A

C — *Intitulé :* Rédaction et dépôt du dossier d'appel à projets ; *Durée :* 3 ; *Antériorités :* B

D — *Intitulé :* Convention avec la diététicienne et l'épicerie sociale ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* B

E — *Intitulé :* Achat du petit matériel et organisation de la cuisine ; *Durée :* 4 ; *Antériorités :* A

F — *Intitulé :* Communication et inscriptions des salariés ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* C, D

G — *Intitulé :* Formation de l'encadrante aux règles d'hygiène des ateliers ; *Durée :* 1 ; *Antériorités :* E, F

H — *Intitulé :* Cycle de 8 ateliers et paniers solidaires ; *Durée :* 12 ; *Antériorités :* G

I — *Intitulé :* Évaluation et bilan ; *Durée :* 3 ; *Antériorités :* H

J — *Intitulé :* Création du livret de recettes illustré ; *Durée :* 2 ; *Antériorités :* G

Document 5 – Éléments chiffrés pour le budget (devis et estimations, données fictives)

- Encadrante technique cuisine : 60 heures sur le projet ; durée légale de 35 heures par semaine.
- Accompagnatrice socioprofessionnelle : 24 heures.
- Diététicienne libérale : 8 séances de 3 heures.
- Denrées des ateliers : 8 ateliers × 12 portions × 2,10 € par portion.
- Petit matériel de cuisine : 420 € ; boîtes de conservation : 24 × 6,50 €.
- Paniers solidaires : 24 salariés × 10 semaines ; le salarié paie 1 € par panier et la structure prend à sa charge 1,50 € par panier.
- Impression du livret : 30 exemplaires × 4,80 € ; assurance de l'activité : 90 € ; déplacements pour une visite de marché : 60 €.
- Contributions en nature : cuisine de la salle des fêtes, 24 heures ; légumes du jardin utilisés en atelier, 96 portions valorisées à 0,60 € ; bénévolat, 20 heures valorisées à 12 €.
- Financements : appel à projets du document 3 (montant à déterminer) ; conseil départemental, 800 € (acquis, versés en février) ; fondation d'entreprise, 600 € (sollicités, versement prévu en mai) ; le reste en fonds propres de l'association.
- Trésorerie disponible pour le projet au 1er janvier : 400 €. Décaissements prévus (hors contributions en nature) : janvier 180 € ; février 650 € ; mars 1 050 € ; avril 820 € ; mai 760 € ; juin, le reste des charges monétaires.

Document 6 – Résultats d'un essai mené l'an dernier (données fictives)

L'an dernier, 10 salariés volontaires ont reçu pendant 8 semaines un panier hebdomadaire accompagné d'une fiche recette ; 11 salariés n'en ont pas reçu. À la fin, 7 des 10 salariés avec panier et 3 des 11 salariés sans panier déclaraient manger des légumes au moins une fois par jour. Les salariés avec panier étaient volontaires ; ceux sans panier ne l'avaient pas demandé.

Document 7 – Risques repérés par l'équipe

Risque	Probabilité (1 à 4)	Gravité (1 à 4)
R1 – Abandon de salariés en cours de cycle (sortie du chantier, absence)	3	3
R2 – Retard de notification de la subvention	3	3
R3 – Intoxication alimentaire en atelier	1	4
R4 – Mauvaise récolte (moins de légumes disponibles)	2	2
R5 – Absence de l'encadrante formée	2	3

Document 8 – Repères utiles (données réelles)

- Formulaire Cerfa n° 12156 : demande de subvention des associations ; le budget prévisionnel suit le plan comptable associatif (charges 60 à 64 et 86 ; produits 70, 74, 75 et 87), équilibré, avec des contributions volontaires en nature identiques aux comptes 86 et 87.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : réduire les inégalités sociales de santé en nutrition et faire des milieux de vie des espaces favorables à la santé.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.
- Matrice RACI : R réalise, A approuve et rend compte (une seule personne A par tâche), C est consulté, I est informé.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 2. Formulez le problème central, l'objectif général et trois objectifs spécifiques SMART. Choisissez quatre actions qui combinent au moins trois stratégies différentes, et décrivez l'une d'elles avec la méthode QQOQCCP. (2 pts)

2. Placez les parties prenantes dans la matrice pouvoir-intérêt et établissez la matrice RACI de six tâches du projet. (1,5 pt)

3. Calculez les dates au plus tôt, au plus tard et les marges des tâches du document 4 ; déterminez la durée minimale du projet et le chemin critique. Vérifiez que la date limite de dépôt du document 3 peut être respectée et commentez la tâche J. (2 pts)

4. Établissez le budget prévisionnel équilibré (comptes du plan comptable associatif) ; calculez le montant de la subvention demandée en respectant les règles du document 3 ; calculez trois ratios et commentez. (2 pts)

5. Établissez le plan de trésorerie de janvier à juin ; repérez le besoin de trésorerie et proposez deux solutions. Calculez la criticité des risques du document 7, classez-les et proposez une mesure pour les trois premiers. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif du document 6 et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez, puis expliquez pourquoi ce résultat ne prouve pas l'efficacité du panier. (1,5 pt)

7. Proposez un protocole d'évaluation du nouveau projet (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments de mesure, comparaison) qui corrige les limites de l'essai. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur les appels à projets et les financements de la prévention en nutrition pour les publics en insertion : sources, outils, fréquence, partage dans l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Élaborez le plan de communication du projet (cibles, objectifs, messages, canaux, calendrier). Analysez la proposition de financement par la fondation d'une enseigne de distribution : intérêts, risques et conditions à poser. (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 12 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour quatre d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, mise à l'échelle et rendement, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'antenne départementale d'une association de personnes atteintes de la maladie de Parkinson (association fictive « Parkinson Ensemble 37 ») organise chaque mois une rencontre pour ses adhérents et leurs proches aidants. À la suite d'une enquête (document 5), le bureau vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui permette aux participants de **continuer à cuisiner malgré les tremblements et la lenteur des gestes**, de **préparer des repas faciles à mâcher et à avaler**, riches en fibres et en eau, et de **partager un moment convivial** entre malades et aidants. Le président prévient : « Ici, on ne parle pas de la maladie toute la journée. On veut des recettes, et du plaisir. »

Document 1 – Le public et les contraintes

- 10 participants : 6 personnes atteintes de la maladie de Parkinson (58 à 79 ans) et 4 proches aidants ; on prévoit 12 portions (participants, la bénévole qui co-anime et vous).
- Monsieur R., 72 ans, a perdu 5 kg en un an ; il se fatigue vite pendant les repas.
- Madame L., 66 ans, tousse parfois en buvant et en mangeant des aliments secs ; son orthophoniste lui a conseillé des textures tendres et humides.
- Monsieur G., 61 ans, prend un traitement par lévodopa et a des périodes de blocage dans la journée ; son neurologue lui a demandé de prendre ses comprimés à distance des repas riches en protéines.
- Madame V., 70 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Monsieur N., aidant de son épouse, ne mange pas de poisson.
- Plusieurs participants ont des tremblements des mains ; deux se déplacent avec une canne.
- Salle d'activité de la maison des associations : 1 plaque à induction de deux feux, 1 four, 1 réfrigérateur, 3 tables de travail à hauteur assise, un évier ; pas de

robot ni de mixeur plongeant (vous pouvez en apporter un).

- Budget denrées : au plus 3,80 € par portion.
- Durée de l'atelier avec les participants : 2 h, de 14 h à 16 h, dégustation comprise, avec une pause ; le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Entrée : velouté de potiron.

Plat : parmentier de cabillaud aux poireaux, gratiné à l'emmental ; pain complet.

Dessert : compote pommes-pruneaux sans sucre ajouté, fromage blanc, cannelle.

Le candidat réalise le velouté, le parmentier et la compote. Il présente les adaptations pour Monsieur R., Madame L., Monsieur G., Madame V. et Monsieur N., et une organisation qui permet de préparer le parmentier à l'avance et de le congeler en portions individuelles.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée · Grammage net par portion · Perte · Prix

Potiron — *Grammage net par portion :* 150 g ; *Perte :* 30 % ; *Prix :* 1,90 € le kg

Pommes de terre (velouté 40 g et parmentier 150 g) — *Grammage net par portion :* 190 g ; *Perte :* 15 % ; *Prix :* 1,40 € le kg

Oignons — *Grammage net par portion :* 15 g ; *Perte :* 10 % ; *Prix :* 1,80 € le kg

Huile de colza (velouté 3 g et poireaux 3 g) — *Grammage net par portion :* 6 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le kg

Filets de cabillaud surgelés — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 13,90 € le kg

Poireaux — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte :* 25 % ; *Prix :* 2,60 € le kg

Lait demi-écrémé — *Grammage net par portion :* 50 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 1,05 € le litre (1 L = 1 kg)

Beurre doux — *Grammage net par portion :* 5 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 9,80 € le kg

Emmental râpé — *Grammage net par portion :* 10 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 9,90 € le kg

Pain complet — *Grammage net par portion :* 40 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 4,60 € le kg

Pommes — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte :* 20 % ; *Prix :* 2,40 € le kg

Pruneaux dénoyautés — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 9,50 € le kg

Fromage blanc 3 % de matière grasse — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 2,60 € le kg

Cannelle, muscade, sel, poivre — *Grammage net par portion :* – ; *Perte :* – ; *Prix :* forfait 0,90 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Fer (mg) · Vitamine C (mg)

Potiron, cru (20044) — *Énergie (kcal) :* 20,1 ; *Protéines (g) :* 1,05 ; *Glucides (g) :* 3,5 ; *dont sucres (g) :* 1,93 ; *Lipides (g) :* 0,1 ; *Fibres (g) :* 0,5 ; *Sel (g) :* 0,0025 ; *Calcium (mg) :* 20,5 ; *Fer (mg) :* 0,85 ; *Vitamine C (mg) :* 10,7

Pomme de terre, sans peau, crue (4008) — *Énergie (kcal) :* 80 ; *Protéines (g) :* 2,02 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *dont sucres (g) :* 0,78 ; *Lipides (g) :* 0,09 ; *Fibres (g) :* 2,2 ; *Sel (g) :* < 0,0011 ; *Calcium (mg) :* 14,3 ; *Fer (mg) :* 0,78 ; *Vitamine C (mg) :* 19,7

Oignon, cru (20034) — *Énergie (kcal) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 25 ; *Fer (mg) :* 0,00019 ; *Vitamine C (mg) :* 3,9

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028 ; *Calcium (mg) :* < 2,57 ; *Fer (mg) :* 0,023 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Cabillaud, cru (26043) — *Énergie (kcal) :* 77,4 ; *Protéines (g) :* 18,1 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 0,57 ; *Fibres (g) :* < 0,2 ; *Sel (g) :* 0,23 ; *Calcium (mg) :* 4,43 ; *Fer (mg) :* 0,49 ; *Vitamine C (mg) :* 1

Poireau, cru (20039) — *Énergie (kcal) :* 30,4 ; *Protéines (g) :* 1,5 ; *Glucides (g) :* 4,55 ; *dont sucres (g) :* 3,9 ; *Lipides (g) :* 0,3 ; *Fibres (g) :* 1,8 ; *Sel (g) :* 0,05 ; *Calcium (mg) :* 59 ; *Fer (mg) :* 2,1 ; *Vitamine C (mg) :* 12

Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042) — *Énergie (kcal) :* 46,4 ; *Protéines (g) :* 3,19 ; *Glucides (g) :* 4,9 ; *dont sucres (g) :* 4,81 ; *Lipides (g) :* 1,54 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,078 ; *Calcium (mg) :* 119 ; *Fer (mg) :* 0,041 ; *Vitamine C (mg) :* 1,6

Beurre à 80% MG minimum, doux (16400) — *Énergie (kcal) :* 753 ; *Protéines (g) :* 0,64 ; *Glucides (g) :* 0,71 ; *dont sucres (g) :* 0,71 ; *Lipides (g) :* 83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,035 ; *Calcium (mg) :* 19,8 ; *Fer (mg) :* < 0,5 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Emmental ou emmenthal, râpé (12118) — *Énergie (kcal) :* 368 ; *Protéines (g) :* 27,6 ; *Glucides (g) :* 0,58 ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 28,2 ; *Fibres (g) :* 0,042 ; *Sel (g) :* 0,68 ; *Calcium (mg) :* 977 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110) — *Énergie (kcal) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *dont sucres (g) :* 2,41 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17 ; *Calcium (mg) :* 83,2 ; *Fer (mg) :* 2 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Énergie (kcal) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,6 ; *dont sucres (g) :* 10,6 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 0,0037 ; *Calcium (mg) :* 5,34 ; *Fer (mg) :* 0,099 ; *Vitamine C (mg) :* 4,6

Pruneau, sans noyau, sec (13042) — *Énergie (kcal) :* 229 ; *Protéines (g) :* 1,63 ; *Glucides (g) :* 55,4 ; *dont sucres (g) :* 38,1 ; *Lipides (g) :* 0,4 ; *Fibres (g) :* 5,1 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 50 ; *Fer (mg) :* 0,38 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646) — *Énergie (kcal) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *dont sucres (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 131 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Cannelle, poudre (11025) — *Énergie (kcal) :* 243 ; *Protéines (g) :* 3,99 ; *Glucides (g) :* 27,5 ; *dont sucres (g) :* 2,17 ; *Lipides (g) :* 1,24 ; *Fibres (g) :* 53,1 ; *Sel (g) :* 0,025 ; *Calcium (mg) :* 1000 ; *Fer (mg) :* 8,32 ; *Vitamine C (mg) :* 3,8

Lentille corail, sèche (20535) — *Énergie (kcal) :* 328 ; *Protéines (g) :* 27,7 ; *Glucides (g) :* 44,9 ; *dont sucres (g) :* 1,29 ; *Lipides (g) :* 0,8 ; *Fibres (g) :* 15,4 ; *Sel (g) :* < 0,13 ; *Calcium (mg) :* 29 ; *Fer (mg) :* 6,3 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté et la muscade ne sont pas comptés. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Enquête réalisée par l'association auprès de ses adhérents (données fictives, février 2028)

Questionnaire de 12 questions envoyé par courrier et par courriel aux 42 foyers adhérents, avec aide au remplissage par téléphone ; 31 réponses.

- 14 foyers citent la constipation comme une gêne fréquente ;
- 11 disent que la personne malade a du mal à éplucher, couper ou ouvrir les emballages ;
- 9 signalent une perte de poids depuis un an ;
- 8 signalent une toux ou des fausses routes pendant les repas ;
- 17 disent que les repas sont désormais préparés par l'aidant seul ;
- 20 souhaitent des recettes faciles, adaptées et qui se congèlent ;
- 12 aidants disent manquer de temps pour cuisiner.

Document 6 – Trois situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Au bout de 40 minutes, Monsieur G. entre dans une période de blocage et ne peut plus se lever de sa chaise. Une aidante vous demande s'il faut « supprimer la viande » pour que le traitement de son mari marche mieux, parce qu'elle l'a lu sur un forum. Le laboratoire qui commercialise un des traitements propose de financer les prochains ateliers et de fournir des tabliers à son logo.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; boire de l'eau à volonté.
- Anses (références nutritionnelles, 2016 et 2021) : apport satisfaisant en fibres de 30 g par jour pour l'adulte ; calcium 950 mg par jour pour l'adulte de 25 ans et plus ; vitamine C 110 mg par jour.
- Les protéines alimentaires peuvent gêner l'absorption de la lévodopa ; l'horaire des prises et une éventuelle répartition des protéines dans la journée relèvent du neurologue, et ne justifient pas de supprimer les protéines.
- Les troubles de la déglutition exposent aux fausses routes ; l'adaptation des textures est décidée avec l'orthophoniste ou le médecin ; le cadre international IDDSI décrit des niveaux de textures (par exemple, niveau 6 « tendre et en petits morceaux », niveau 5 « haché et humide »).
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : information sur 14 allergènes, dont le gluten, le lait et le poisson, y compris pour les denrées non préemballées.
- Bonnes pratiques d'hygiène : cuisson à cœur du poisson ; refroidissement rapide des préparations avant congélation ; étiquetage (nom, date) ; décongélation au réfrigérateur.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Exploitez le document 5 (taux de réponse et pourcentages) et dégagez trois besoins prioritaires. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le respect du budget et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de l'entrée, du plat et du dessert (ingrédients, matériel adapté aux tremblements, étapes, points critiques). Présentez les adaptations pour Monsieur R., Madame L., Monsieur G., Madame V. et Monsieur N., et l'organisation de la préparation à l'avance avec congélation. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du repas complet en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie. Commentez au regard des repères, en particulier pour les fibres et pour Monsieur R. ; calculez l'effet d'un enrichissement de sa part (10 g d'emmental et 30 g de fromage blanc en plus dans la purée). (2 pts)

5. Rédigez la check-list logistique (avant, jour J, après) et le planning de préparation de l'atelier, en tenant compte de la fatigue et de la lenteur des gestes des participants. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), avec une pause et des tâches adaptées à chacun (assis, sans couteau pointu). (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes malade-aidant, fiche recette imagée en gros caractères, ustensiles adaptés, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation simple. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (poisson, refroidissement et congélation, étiquetage), la sécurité (brûlures, couteaux, chutes), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez les trois préparations ; dressez une assiette adaptée à Madame L. et une assiette standard ; conditionnez deux portions de parmentier pour la congélation. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, sentiment de capacité, intention de refaire, participation des malades aux gestes) et analysez les trois situations du document 6, avec la réponse que vous donnez à chaque personne. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points pour chaque temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (pilotage et bilan d'étape d'un projet), E5.A et E5.B (atelier culinaire, bon de commande, calcul nutritionnel).

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Saint-Aubin-sur-Lhers (ville et service fictifs) emploie 64 agents au service de la propreté urbaine. Ils prennent leur poste à 5 h, font une pause de 20 minutes à 9 h et terminent à 12 h. Après plusieurs malaises en fin de matinée, la direction des ressources humaines, le service de prévention et de santé au travail et les représentants du personnel ont lancé en novembre 2027 un projet de huit mois, « Bien démarrer sa tournée ». Vous arrivez en stage à la fin du mois de février 2028, au milieu du projet. La coordinatrice vous confie le bilan d'étape pour le comité de pilotage du 6 mars, puis l'animation de l'atelier de collation du mois de mars.

Temps 1 – Le bilan d'étape et l'ajustement du projet

Document 1 – Le diagnostic de septembre 2027 (données fictives)

Questionnaire anonyme distribué au vestiaire et rempli pendant la pause ; 50 réponses sur 64 agents.

- 31 agents ne mangent rien avant leur prise de poste ;
- 38 achètent leur collation au distributeur automatique du centre technique (viennoiseries, barres chocolatées, sodas) ;
- 22 boivent au moins un soda ou une boisson énergisante par matinée ;
- 27 se disent « très fatigués » en fin de tournée ;
- 19 trouvent le four à micro-ondes du vestiaire sale ou toujours occupé ;
- 29 sont intéressés par un atelier pendant le temps de travail.

Document 2 – Le plan d'action prévu (novembre 2027 à juin 2028)

- **Objectif spécifique 1** : en juin 2028, au moins 50 % des agents participants prennent un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux avant ou pendant la tournée (valeur initiale : 27,8 % des participants).
- **Objectif spécifique 2** : en juin 2028, la part des agents qui boivent un soda ou une boisson énergisante chaque matinée passe de 44 % à 25 % au plus.
- **Actions** : 6 ateliers de collation de 1 h 30 sur le temps de travail (un par mois, 12 places chacun, soit 72 places) ; installation d'une fontaine à eau réfrigérée et distribution d'une gourde à chaque agent ; négociation avec le gestionnaire du distributeur pour introduire des produits plus favorables ; affiches et livret de recettes ; formation de deux agents relais.
- **Objectif opérationnel de participation** : taux de présence d'au moins 80 % des places offertes sur l'ensemble des ateliers.

Document 3 – Le tableau de bord à la fin de février 2028 (4 mois sur 8)

- Ateliers réalisés : 3 sur 6 ; présences : 10, 8 et 7 agents.
- Fontaine à eau installée en décembre ; 64 gourdes distribuées ; relevé du compteur de la fontaine : 1 450 litres en janvier.
- Distributeur : le gestionnaire « étudie la demande » depuis décembre ; aucun changement de l'offre.
- Agents relais : 1 sur 2 formé ; le second est en arrêt.
- Raisons d'absence données par les agents (21 réponses, plusieurs possibles) : atelier placé un lundi de forte charge (12), pas prévenu à temps (9), « pas pour moi » (5), horaire de fin d'atelier qui empiète sur la tournée (7).

Document 4 – Le budget : prévu sur huit mois et réalisé à la fin de février (en euros)

Poste	Prévu (8 mois)	Réalisé (fin février)
Denrées (6 ateliers × 12 portions × 1,70 €)	122,40	64,20
Location de la fontaine à eau (8 mois × 60 €)	480,00	240,00
Gourdes (64 × 4,50 €)	288,00	288,00
Diététicienne (6 ateliers × 3 h × 45 €)	810,00	405,00
Coordination (40 h × 24 €)	960,00	612,00
Impression des affiches et du livret	180,00	210,00

Document 5 – Un premier résultat (données fictives, fin février 2028)

Parmi les 18 agents qui ont participé à au moins un atelier, 5 prenaient un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux en septembre ; ils sont 11 fin février. Parmi les 32 autres agents qui avaient répondu en septembre, 9 le font fin février.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; limiter les boissons sucrées ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Les horaires de travail atypiques (nuit, très tôt le matin) désorganisent les rythmes des repas ; l'Anses a publié en 2016 une évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit.
- Dans la fonction publique territoriale, les questions de santé et de sécurité au travail sont examinées par la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.

Travail à faire – Temps 1

Partie A – Le projet d'intervention – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 1. Rappelez le problème central et vérifiez la cohérence des objectifs du document 2 avec le diagnostic. (1,5 pt)

2. Calculez les indicateurs du tableau de bord (taux de présence à mi-parcours, nombre de présences nécessaires sur les trois derniers ateliers pour atteindre l'objectif de 80 %, consommation d'eau par agent et par jour ouvré en janvier, sur 21 jours ouvrés). Analysez les écarts et proposez trois ajustements argumentés du plan d'action. (2,5 pts)

3. Calculez, pour chaque poste du budget, le taux de consommation, puis l'écart entre le réalisé et la moitié du prévu. Analysez les dépassements et proposez une solution pour terminer le projet dans l'enveloppe prévue. (2 pts)

4. Établissez la matrice RACI de cinq tâches de la seconde moitié du projet (ateliers, négociation du distributeur, formation du second relais, communication, évaluation). (1,5 pt)

5. Rédigez l'ordre du jour du comité de pilotage du 6 mars et le relevé de décisions attendu. (1,5 pt)

Partie B – Recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez, fin février, la proportion d'agents qui prennent un petit-déjeuner ou une collation préparée chez eux chez les participants et chez les autres agents, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Calculez aussi l'évolution chez les participants depuis septembre. Interprétez avec prudence (deux biais au moins). (3 pts)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

7. Organisez une veille sur l'alimentation et les horaires de travail atypiques (sources, outils, fréquence, diffusion aux partenaires du projet). (2 pts)

Partie D – Communication et posture – C3.5 et C3.6 (3 points)

8. Proposez une stratégie pour améliorer l'information des agents sur les ateliers (canaux, relais, messages) et rédigez le message d'invitation à l'atelier de mars. Expliquez comment garantir que la participation reste volontaire et que les résultats restent anonymes vis-à-vis de l'encadrement. (1,5 pt)

9. Rédigez la trame minutée de votre exposé et cinq questions probables du jury avec les éléments de réponse. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale (3 points)

Temps 2 – L'atelier « collation de tournée »

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'atelier de mars a lieu au réfectoire du centre technique, de 9 h 30 à 11 h, juste après la pause, avec 10 agents (8 hommes et 2 femmes, de 24 à 61 ans) ; on prévoit 12 portions (agents, l'agent relais et vous). L'objectif est que chaque agent sache préparer **la veille au soir, en moins de 10 minutes**, une collation complète, transportable dans une boîte, qui tienne au corps jusqu'à midi sans passer par le distributeur.

Document 7 – Le public et les contraintes

- Monsieur F., 48 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Madame H., 33 ans, est intolérante au lactose (elle supporte les fromages affinés).
- Monsieur O., 24 ans, ne mange pas de porc et dit « avoir toujours faim ».
- Monsieur T., 56 ans, n'a pas de réfrigérateur au vestiaire de son secteur et part avec sa boîte à 4 h 30.
- Matériel : 2 plaques électriques, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 2 grandes tables, un évier ; pas de four.
- Budget denrées : au plus 1,70 € par portion.

Document 8 – Menu imposé

Porridge froid préparé la veille (flocons d'avoine, lait demi-écrémé, pomme râpée, raisins secs, cannelle) ; tartine de pain complet à l'emmental ; œuf dur ; clémentine.

Le candidat réalise le porridge et les œufs durs, prépare les tartines, et présente une boîte de collation montée. Il présente les adaptations pour Monsieur F., Madame H., Monsieur O. et Monsieur T.

Document 9 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Flocons d'avoine	50 g	sans perte	2,20 € le kg
Lait demi-écrémé UHT	150 g	sans perte	0,99 € le litre (1 L = 1 kg)
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Raisins secs	15 g	sans perte	6,80 € le kg
Pain complet	50 g	sans perte	4,60 € le kg

Emmental en bloc — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 10,50 € le kg

Œufs (calibre moyen, 50 g net) — *Grammage net par portion :* 1 œuf ; *Perte :* sans perte ; *Prix :* 0,28 € l'œuf

Clémentines — *Grammage net par portion :* 70 g ; *Perte :* 25 % ; *Prix :* 2,90 € le kg

Cannelle, sel — *Grammage net par portion :* – ; *Perte :* – ; *Prix :* forfait 0,40 € pour l'atelier

Document 10 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Fer (mg) · Vitamine C (mg)

Flocons d'avoine (32140) — *Énergie (kcal) :* 369 ; *Protéines (g) :* 10,6 ; *Glucides (g) :* 57,7 ; *dont sucres (g) :* 1,04 ; *Lipides (g) :* 7,82 ; *Fibres (g) :* 11,2 ; *Sel (g) :* 0,011 ; *Calcium (mg) :* 52 ; *Fer (mg) :* 3,8 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Lait demi-écrémé, UHT (19041) — *Énergie (kcal) :* 47,7 ; *Protéines (g) :* 3,48 ; *Glucides (g) :* 5 ; *dont sucres (g) :* 4,96 ; *Lipides (g) :* 1,56 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 121 ; *Fer (mg) :* < 0,084 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Énergie (kcal) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,6 ; *dont sucres (g) :* 10,6 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 0,0037 ; *Calcium (mg) :* 5,34 ; *Fer (mg) :* 0,099 ; *Vitamine C (mg) :* 4,6

Raisin sec (13046) — *Énergie (kcal) :* 322 ; *Protéines (g) :* 3 ; *Glucides (g) :* 73,2 ; *dont sucres (g) :* 70,3 ; *Lipides (g) :* 0,9 ; *Fibres (g) :* 4,2 ; *Sel (g) :* 0,013 ; *Calcium (mg) :* 54 ; *Fer (mg) :* 1,7 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Cannelle, poudre (11025) — *Énergie (kcal) :* 243 ; *Protéines (g) :* 3,99 ; *Glucides (g) :* 27,5 ; *dont sucres (g) :* 2,17 ; *Lipides (g) :* 1,24 ; *Fibres (g) :* 53,1 ; *Sel (g) :* 0,025 ; *Calcium (mg) :* 1000 ; *Fer (mg) :* 8,32 ; *Vitamine C (mg) :* 3,8

Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110) — *Énergie (kcal) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *dont sucres (g) :* 2,41 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17 ; *Calcium (mg) :* 83,2 ; *Fer (mg) :* 2 ; *Vitamine C (mg) :* < 2

Emmental ou emmenthal (12115) — *Énergie (kcal) :* 373 ; *Protéines (g) :* 27,9 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 28,8 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,61 ; *Calcium (mg) :* 978 ; *Fer (mg) :* 0,15 ; *Vitamine C (mg) :* traces

Oeuf cru (22000) — *Énergie (kcal) :* 140 ; *Protéines (g) :* 12,8 ; *Glucides (g) :* 0,06 ; *dont sucres (g) :* 0,06 ; *Lipides (g) :* 9,83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,31 ; *Calcium (mg) :* 76,8 ; *Fer (mg) :* 1,75 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024) — *Énergie (kcal) :* 45,5 ; *Protéines (g) :* 0,81 ; *Glucides (g) :* 9,17 ; *dont sucres (g) :* 8,6 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 23 ; *Fer (mg) :* 0,09 ; *Vitamine C (mg) :* 49,2

On calcule avec les poids nets crus (l'œuf dur est compté avec les valeurs de l'œuf cru, 50 g). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 11 – Deux situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Le chef d'équipe passe la tête par la porte et demande la liste des agents « qui ne mangent rien le matin », pour « les avoir à l'œil ». Un agent arrive avec une canette de boisson énergisante et dit : « Ça, c'est mon petit-déjeuner, et je tiens très bien. »

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (11 points)

10. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (1,5 pt)

11. Établissez le bon de commande pour 12 portions et calculez le coût par portion. (2 pts)

12. Rédigez la fiche technique de la collation (étapes, temps de préparation la veille, conservation et transport) et les adaptations pour Monsieur F., Madame H., Monsieur O. et Monsieur T. (3 pts)

13. Calculez l'apport de la collation en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; comparez la collation à l'achat type au distributeur (une viennoiserie de 60 g à 410 kcal pour 100 g et un soda de 33 cl à 10,6 g de sucres pour 100 mL, données fictives) en énergie et en sucres. (2,5 pts)

14. Présentez la check-list logistique de l'atelier. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

15. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et agents). (2 pts)

16. Présentez les méthodes d'animation (démonstration, défi « 10 minutes chrono », comparaison avec le distributeur) et les outils. (1,5 pt)

17. Présentez les règles d'hygiène (œufs, chaîne du froid de la boîte, nettoyage du micro-ondes), la gestion des allergènes et deux éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

18. Réalisez la collation et montez une boîte complète ; présentez une boîte adaptée à Monsieur T. (3 pts)

19. Proposez l'évaluation de l'atelier et analysez les deux situations du document 11. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « On cultive des légumes qu'on ne mange pas » : concevoir et piloter un projet alimentation dans un chantier d'insertion maraîcher

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à passer du diagnostic à un plan d'action réaliste : des actions qui combinent plusieurs stratégies (éducation, accès aux produits, environnement de travail, participation), décrites précisément, avec des partenaires engagés, un calendrier calculé, un budget équilibré qui respecte les règles du financeur et une trésorerie anticipée. Il valorise la prise en compte des contraintes du public (temps de travail payé, absence de cuisine, petit budget) et la prudence dans l'interprétation de l'essai. Il pénalise un budget déséquilibré, des honoraires classés en charges de personnel, une subvention qui dépasse le plafond, un chemin critique faux et une conclusion « le panier est efficace » tirée d'un essai sur volontaires.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Diagnostic, objectifs et actions (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du document 2

- Taux de réponse : 21 / 24 × 100 = **87,5 %**.
- Pas de repas le midi au moins 3 jours sur 4 : 12 / 21 = **57,1 %** ; pas de cuisine utilisable : 15 / 21 = **71,4 %** ; jamais cuisiné de légumes frais : 9 / 21 = **42,9 %**.
- Légumes moins d'une fois par jour : 16 / 21 = **76,2 %** ; moins de 40 € par semaine pour se nourrir : 14 / 21 = **66,7 %**.
- Intéressés par un panier à prix réduit : 17 / 21 = **81,0 %** ; par un atelier pendant le temps de travail : 13 / 21 = **61,9 %**.

Le taux de réponse est élevé, car le questionnaire a été passé oralement par une personne connue des salariés ; en contrepartie, le risque de **désirabilité sociale** existe. Avec 21 répondants, on donne aussi les effectifs.

Problème central : les salariés en insertion des Jardins du Pré-Haut ont une alimentation irrégulière et pauvre en légumes (repas de midi sauté par 12 salariés sur 21, légumes moins d'une fois par jour pour 16 sur 21), alors qu'ils produisent eux-mêmes des légumes.

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des salariés en parcours d'insertion du chantier.

Objectifs spécifiques (échéance : fin du cycle, en juin 2028, mesure par le même questionnaire oral) :

- OS1 : au moins 60 % des salariés participants prennent un repas le midi au moins 3 jours sur 4 (contre 42,9 % qui le font au départ, soit 9 sur 21).
- OS2 : au moins 50 % des salariés participants mangent des légumes au moins une fois par jour (contre 23,8 %, soit 5 sur 21).
- OS3 : au moins 75 % des participants savent préparer seuls, avec deux plaques ou un micro-ondes, trois recettes à base de légumes du jardin (mise en situation lors du dernier atelier).

Quatre actions et leurs stratégies

Action · Stratégie · Objectif servi
Cycle de 8 ateliers de cuisine de 1 h 30 sur le temps de travail, avec des recettes réalisables avec deux plaques ou un micro-ondes — *Stratégie :* Éducation pour la santé (compétences) ; *Objectif servi :* OS2, OS3
Panier solidaire hebdomadaire de légumes du jardin à 1 €, avec une fiche recette — *Stratégie :* Accès aux produits, environnement ; *Objectif servi :* OS2
Aménagement de la salle de pause (boîtes, réfrigérateur partagé, repas collectif du mardi) et allongement de la pause de midi à 45 minutes le mardi — *Stratégie :* Action sur l'environnement de travail, lien social ; *Objectif servi :* OS1
Comité de salariés qui choisit les recettes et teste le livret — *Stratégie :* Participation, pouvoir d'agir ; *Objectif servi :* OS1 à OS3

Exemple – L'atelier de cuisine décrit avec la méthode QQOQCCP

Quoi ? Atelier « Un repas complet avec les légumes du jardin et deux plaques ». **Qui ?** 12 salariés volontaires par atelier ; animation par la diététicienne libérale et l'encadrante technique cuisine ; l'accompagnatrice socioprofessionnelle fait le lien avec les parcours. **Où ?** Cuisine de la salle des fêtes, à 400 m, accessible à pied. **Quand ?** Le mardi de 11 h à 12 h 30, huit fois sur 12 semaines, sur le temps de travail (condition de participation exprimée par les salariés). **Comment ?** Démonstration courte, réalisation en binômes, repas pris ensemble, fiche recette imagée, portion à emporter en boîte. **Combien ?** 12 portions à 2,10 € ; 3 heures de diététicienne et de l'encadrante par atelier (préparation comprise). **Pourquoi ?** OS2 et OS3, et indirectement OS1 par l'habitude d'un repas à midi.

Question 2 – Parties prenantes et RACI (1,5 pt)

Position · Parties prenantes · Attitude à adopter
Pouvoir fort, intérêt fort — *Parties prenantes :* Direction de l'association ; financeur de l'appel à projets ; service insertion du département (financeur des postes) ; *Attitude à adopter :* Gérer étroitement : membres du comité de pilotage
Pouvoir fort, intérêt faible — *Parties prenantes :* Mairie (prêt de la cuisine) ; fondation d'entreprise ; *Attitude à adopter :* Satisfaire : informer, consulter sur ce qui les concerne
Pouvoir faible, intérêt fort — *Parties prenantes :* Salariés en insertion ; encadrants ; bénévoles ; diététicienne ; épicerie sociale ; *Attitude à adopter :* Associer : comité de salariés, réunions d'équipe
Pouvoir faible, intérêt faible — *Parties prenantes :* Mission locale ; centre communal d'action sociale ; adhérents des paniers ; *Attitude à adopter :* Surveiller et informer : ils peuvent devenir des relais

Tâche · Stagiaire · Encadrante cuisine · Accompagnatrice · Diététicienne · Direction · Comité de salariés

Dossier d'appel à projets — *Stagiaire :* R ; *Encadrante cuisine :* C ; *Accompagnatrice :* C ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* I

Conventions de partenariat — *Stagiaire :* R ; *Encadrante cuisine :* I ; *Accompagnatrice :* C ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* –

Organisation de la cuisine — *Stagiaire :* C ; *Encadrante cuisine :* R ; *Accompagnatrice :* I ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Animation des ateliers — *Stagiaire :* C ; *Encadrante cuisine :* R ; *Accompagnatrice :* I ; *Diététicienne :* R ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Paniers solidaires — *Stagiaire :* I ; *Encadrante cuisine :* C ; *Accompagnatrice :* R ; *Diététicienne :* – ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Évaluation et bilan — *Stagiaire :* R ; *Encadrante cuisine :* C ; *Accompagnatrice :* C ; *Diététicienne :* C ; *Direction :* A ; *Comité de salariés :* C

Une seule personne est **A** par tâche (la direction), car c'est elle qui engage l'association auprès des financeurs.

Question 3 – Calendrier : réseau PERT et chemin critique (2 pts)

Calcul posé – Dates au plus tôt, au plus tard et marges (en semaines)

Au plus tôt : A 0 → 2 ; B 2 → 3 ; C 3 → 6 ; D 3 → 5 ; E 2 → 6 ; F : début max(6 ; 5) = 6, fin 8 ; G : début max(fin E = 6 ; fin F = 8) = 8, fin 9 ; H 9 → 21 ; I 21 → 24 ; J 9 → 11. **Durée minimale : 24 semaines.**

Au plus tard (de droite à gauche) : I 21 → 24 ; J 22 → 24 ; H 9 → 21 ; G : fin = min(début H ; début J) = min(9 ; 22) = 9, début 8 ; F 6 → 8 ; E 4 → 8 ; D 4 → 6 ; C 3 → 6 ; B : fin = min(début C ; début D) = min(3 ; 4) = 3, début 2 ; A : fin = min(début B ; début E) = min(2 ; 4) = 2, début 0.

Marges : A, B, C, F, G, H, I : **0** ; D : 4 − 3 = **1** ; E : 4 − 2 = **2** ; J : 22 − 9 = **13** semaines.

Chemin critique : **A → B → C → F → G → H → I** (2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 12 + 3 = 24 semaines).

Le dossier (tâche C) se termine au plus tôt à la fin de la semaine 6, ce qui correspond exactement à la date limite du document 3 : la tâche est **critique et sans marge**. Il faut donc commencer la rédaction dès la semaine 3, préparer en parallèle les lettres d'engagement des partenaires (tâche D) et viser un dépôt quelques jours avant la date limite. La tâche J (livret) dispose de 13 semaines de marge : on peut la confier au comité de salariés pendant le cycle, en y intégrant les recettes testées en atelier, sans risque pour le calendrier.

Question 4 – Budget prévisionnel et ratios (2 pts)

Calcul posé – Coûts de personnel

- Encadrante : coût employeur mensuel 2 100 × 1,40 = **2 940 €** ; heures mensuelles 35 × 52 / 12 = **151,67 h** ; coût horaire 2 940 / 151,67 = **19,38 €** ; 60 h × 19,38 = **1 162,80 €**.
- Accompagnatrice : 24 h × 22,40 = **537,60 €**.
- Diététicienne libérale : 8 × 3 h × 45 = **1 080,00 €** ; ce sont des **honoraires** (compte 62), pas des charges de personnel, car elle n'est pas salariée de l'association.

Charges	Montant (€)	Produits	Montant (€)
60 – Achats	**1 137,60**	**74 – Subventions**	**3 900,00**
Denrées (8 × 12 × 2,10)	201,60	Appel à projets « Bien manger dans les parcours d'insertion » (sollicité)	2 500,00
Petit matériel	420,00	Conseil départemental (acquis)	800,00
Boîtes de conservation (24 × 6,50)	156,00	Fondation d'entreprise (sollicité)	600,00
Paniers solidaires, part de la structure (240 × 1,50)	360,00	**Fonds propres de l'association**	**312,00**
61-62 – Services extérieurs et autres services	**1 374,00**		
Honoraires de la diététicienne	1 080,00		
Impression du livret (30 × 4,80)	144,00		
Assurance	90,00		
Déplacements	60,00		
64 – Charges de personnel	**1 700,40**		
Encadrante technique cuisine (60 h)	1 162,80		
Accompagnatrice socioprofessionnelle (24 h)	537,60		
Total des charges monétaires	**4 212,00**	**Total des produits monétaires**	**4 212,00**
86 – Contributions volontaires en nature	**657,60**	**87 – Contributions volontaires en nature**	**657,60**
Cuisine de la salle des fêtes (24 h × 15)	360,00	Mise à disposition par la commune	360,00
Légumes du jardin (96 × 0,60)	57,60	Dons en nature de l'association	57,60
Bénévolat (20 h × 12)	240,00	Bénévolat	240,00
Total	**4 869,60**	**Total**	**4 869,60**

Calcul posé – Montant de la subvention demandée

- Plafond de 60 % des charges monétaires : 0,60 × 4 212,00 = **2 527,20 €**.
- Plafond absolu : **2 500 €**. On retient le plus petit : **2 500 €**, soit 2 500 / 4 212,00 × 100 = **59,4 %** des charges monétaires (règle respectée).
- Fonds propres : 4 212,00 − 2 500 − 800 − 600 = **312,00 €**.

Ratio · Calcul · Résultat

Part de l'appel à projets dans le budget total — *Calcul :* 2 500 / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 51,3 %

Part des financements publics — *Calcul :* (2 500 + 800) / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 67,8 %

Part des coûts humains (64 et honoraires) — *Calcul :* (1 700,40 + 1 080) / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 57,1 %

Part des contributions en nature — *Calcul :* 657,60 / 4 869,60 × 100 ; *Résultat :* 13,5 %

Coût total par salarié — *Calcul :* 4 869,60 / 24 ; *Résultat :* 202,90 €

Commentaire : le projet repose surtout sur du temps humain (57,1 %), ce qui est normal pour un projet éducatif. Il est cofinancé, mais il dépend fortement de l'appel à projets (51,3 %) et d'un financement de fondation encore sollicité : il faut prévoir une version réduite si l'un des deux est refusé (par exemple 6 ateliers au lieu de 8). Le coût par salarié (202,90 €) reste modéré pour huit ateliers, des paniers pendant dix semaines et un livret. Le salarié paie 1 € par panier : cette somme entre dans les ventes habituelles de paniers de l'association et n'est pas un produit du projet ; seule la part prise en charge par la structure (1,50 €) est une charge du projet.

Question 5 – Trésorerie et risques (1,5 pt)

Mois · Encaissements · Décaissements · Calcul · Solde fin de mois

Janvier — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 180 ; *Calcul :* 400 + 0 − 180 ; *Solde fin de mois :* 220

Février — *Encaissements :* 800 ; *Décaissements :* 650 ; *Calcul :* 220 + 800 − 650 ; *Solde fin de mois :* 370

Mars — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 1 050 ; *Calcul :* 370 − 1 050 ; *Solde fin de mois :* − 680

Avril — *Encaissements :* 1 500 ; *Décaissements :* 820 ; *Calcul :* − 680 + 1 500 − 820 ; *Solde fin de mois :* 0

Mai — *Encaissements :* 600 ; *Décaissements :* 760 ; *Calcul :* 0 + 600 − 760 ; *Solde fin de mois :* − 160

Juin — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 752 ; *Calcul :* − 160 − 752 ; *Solde fin de mois :* − 912

Calcul posé – Vérifications

- Avance de l'appel à projets : 60 % × 2 500 = **1 500 €** en avril ; solde **1 000 €** en octobre.
- Décaissements de juin : 4 212 − (180 + 650 + 1 050 + 820 + 760) = 4 212 − 3 460 = **752 €**.
- Après le versement du solde en octobre : − 912 + 1 000 = **88 €**, soit 400 − 312 : on retrouve bien les fonds propres consommés.

Le budget est équilibré, mais la trésorerie est **négative en mars** (− 680 €), puis **de mai à octobre**, avec un besoin maximal de **912 €** fin juin. Solutions : demander au département de verser sa part dès janvier ; décaler l'achat du petit matériel après la notification d'avril ; demander à la fondation un versement à la signature ; mobiliser la trésorerie générale de l'association, avec l'accord du trésorier, en attendant le solde.

Risque · P × G · Rang · Mesure

R1 – Abandons en cours de cycle — *P × G :* 3 × 3 = **9** ; *Rang :* 1 (ex æquo) ; *Mesure :* Ateliers sur le temps de travail ; liste d'attente ; portion à emporter ; recettes choisies par le comité de salariés

R2 – Retard de notification — *P × G :* 3 × 3 = **9** ; *Rang :* 1 (ex æquo) ; *Mesure :* Plan de trésorerie, avance du département, achats échelonnés

R5 – Absence de l'encadrante — *P × G :* 2 × 3 = **6** ; *Rang :* 3 ; *Mesure :* Fiches techniques partagées ; la diététicienne peut animer seule ; second encadrant sensibilisé

R3 – Intoxication alimentaire — *P × G :* 1 × 4 = **4** ; *Rang :* 4 ; *Mesure :* Formation à l'hygiène (tâche G), plan de nettoyage, chaîne du froid ; un risque de gravité 4 appelle toujours des mesures

R4 – Mauvaise récolte — *P × G :* 2 × 2 = **4** ; *Rang :* 4 ; *Mesure :* Complément par l'épicerie sociale ; recettes de saison adaptables

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – L'essai de l'an dernier (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif et intervalle de confiance

- Avec panier : 7 / 10 = **70,0 %** ; sans panier : 3 / 11 = **27,3 %**.
- RR = 0,700 / 0,273 = **2,57**.
- Erreur type de ln RR : $\sqrt{(1/7 - 1/10 + 1/3 - 1/11)} = \sqrt{(0{,}1429 - 0{,}1000 + 0{,}3333 - 0{,}0909)} = \sqrt{0{,}2853} =$ **0,534**.
- ln RR = ln 2,57 = **0,943** ; bornes : exp(0,943 − 1,96 × 0,534) = exp(− 0,104) = **0,90** ; exp(0,943 + 1,047) = exp(1,990) = **7,31**.
- IC 95 % : **[0,90 ; 7,31]**.

Les salariés qui ont reçu le panier sont 2,57 fois plus nombreux, en proportion, à déclarer manger des légumes chaque jour. Mais l'intervalle de confiance **contient 1** : avec 21 personnes, la différence n'est **pas statistiquement significative** et peut être due au hasard. Surtout, l'essai ne prouve pas l'efficacité du panier : les salariés avec panier étaient **volontaires** (ils étaient probablement déjà plus intéressés par les légumes : biais de sélection) ; il n'y a pas de mesure avant ; la consommation est **déclarée** à une personne de la structure (désirabilité sociale) ; les effectifs sont très petits. On parle d'un résultat **encourageant**, qui justifie un nouvel essai mieux construit.

Question 7 – Protocole d'évaluation (1,5 pt)

- **Indicateurs de processus** : nombre d'ateliers réalisés (8 prévus) ; taux de présence (présences / (ateliers × inscrits)), avec une cible de 75 % ; nombre de paniers distribués ; nombre de recettes testées par le comité de salariés.
- **Indicateurs de résultat** : les trois objectifs spécifiques (repas de midi, légumes chaque jour, capacité à préparer trois recettes).
- **Outils et moments** : le même questionnaire oral au début (semaine 9) et à la fin (semaine 21), passé par une personne extérieure à l'encadrement pour limiter la désirabilité sociale ; rappel des légumes mangés la veille (plus précis qu'une fréquence générale) ; grille d'observation lors du dernier atelier.
- **Comparaison** : mesure **avant-après chez les mêmes personnes** ; si les places manquent, tirage au sort des participants des premiers ateliers parmi les volontaires, les autres commençant au cycle suivant (groupe de comparaison sans priver personne).

- **Analyse** : pourcentages avec effectifs, évolution en points, prudence sur la généralisation ; entretiens courts avec cinq salariés pour comprendre les freins.

Partie C – Veille

Question 8 – Veille sur les financements (2 pts)

Élément · Organisation proposée
Sources — *Organisation proposée :* Sites de l'agence régionale de santé (appels à projets de prévention), de la préfecture et des services déconcentrés de l'État (alimentation, cohésion sociale), du conseil départemental (insertion), de la caisse d'allocations familiales ; réseau régional des structures d'insertion par l'activité économique ; instance régionale d'éducation et de promotion de la santé ; portails de fondations (avec vérification des conflits d'intérêts)
Outils — *Organisation proposée :* Alertes par courriel et abonnement aux lettres d'information ; flux d'actualités ; tableau partagé des appels à projets (financeur, thème, montant, date limite, pièces, statut)
Fréquence — *Organisation proposée :* Lecture des alertes chaque semaine ; mise à jour du tableau tous les quinze jours ; point en réunion d'équipe chaque mois ; calendrier annuel des appels récurrents en janvier
Partage — *Organisation proposée :* Tableau dans l'espace partagé de l'association ; rappel des dates limites un mois avant ; fiche de synthèse d'une page par appel retenu
Qualité — *Organisation proposée :* Toujours dater et sourcer ; vérifier l'éligibilité avant de rédiger ; garder les dossiers déposés comme modèles

Partie D – Communication et posture

Question 9 – Plan de communication et fondation (1,5 pt)

Cible · Objectif · Message · Canal · Quand
Salariés en insertion — *Objectif :* S'inscrire et rester dans le cycle ; *Message :* « Cuisiner les légumes qu'on cultive, pendant les heures payées » ; *Canal :* Annonce orale en réunion d'équipe, affiche imagée dans la salle de pause, encadrants relais ; *Quand :* 3 semaines avant le cycle, puis chaque lundi
Encadrants et bénévoles — *Objectif :* Soutenir la participation ; *Message :* « Le projet a besoin de vous pour motiver et organiser » ; *Canal :* Réunion d'équipe, fiche de présentation ; *Quand :* Au lancement
Financeurs et département — *Objectif :* Informer, rendre compte ; *Message :* « Un projet qui relie insertion et alimentation » ; *Canal :* Point d'étape écrit, invitation au repas final ; *Quand :* Mi-parcours et bilan
Adhérents des paniers, commune — *Objectif :* Valoriser ; *Message :* « Les jardiniers cuisinent leurs légumes » ; *Canal :* Lettre aux adhérents, bulletin municipal ; *Quand :* Fin du cycle

La fondation d'une enseigne de distribution : l'intérêt est un cofinancement (600 €) qui sécurise le budget. Les risques sont un **conflit d'intérêts** et une utilisation commerciale du projet (image de l'enseigne, promotion de produits auprès d'un public précaire), contraire à l'indépendance attendue d'une action de santé (chapitre 6). Conditions à poser dans une convention : aucune présence de produits ou de marques dans les ateliers et le livret ; aucune collecte de données sur les salariés ; mention du soutien sur un support institutionnel seulement, validée par l'association ; liberté totale du contenu pédagogique ; possibilité de refuser si ces conditions ne sont pas acceptées.

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de 10 minutes : contexte et demande (1 min) ; diagnostic et chiffres clés (2 min) ; objectifs et actions (2 min) ; calendrier et chemin critique (1 min 30) ; budget, financement et trésorerie (2 min) ; évaluation et limites (1 min) ; conclusion et perspectives (30 s).

Questions probables : Pourquoi les ateliers sont-ils sur le temps de travail ? Pourquoi la diététicienne est-elle au compte 62 ? Que faites-vous si la fondation refuse ? Comment avez-vous calculé le chemin critique ? Que se passe-t-il si le dossier est déposé une semaine en retard ? Comment évitez-vous la stigmatisation des salariés ? Le panier à 1 € n'exclut-il pas les plus pauvres ? Quelle est la limite principale de l'essai de l'an dernier ? Comment mesurez-vous la consommation de légumes ? Comment pérenniser après la subvention ? Quel est le rôle du comité de salariés ? Qu'avez-vous fait vous-même ?

Éléments de réponse pour quatre questions :

- **Temps de travail** : c'est la condition exprimée par les salariés (« si c'est pendant les heures payées, je viens ») ; l'insertion inclut l'acquisition de compétences de vie quotidienne ; cela réduit le risque d'abandon (R1).
- **Fondation qui refuse** : le budget prévoit 312 € de fonds propres ; on réduit à 6 ateliers ou l'on sollicite la caisse d'allocations familiales ou le centre communal d'action sociale ; le chemin critique ne change pas.
- **Dossier en retard** : le dossier est sur le chemin critique et sa date limite coïncide avec la fin au plus tôt de la tâche ; un retard ferait perdre le financement, d'où le démarrage anticipé et le dépôt avant l'échéance.
- **Pérennisation** : le livret, les recettes intégrées aux paniers, deux salariés relais pour les repas du mardi, l'inscription de l'atelier dans le programme d'accompagnement socioprofessionnel et une demande de financement pluriannuel.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Calculer les pourcentages sur les 24 salariés au lieu des 21 répondants ; oublier une dépendance dans le PERT et se tromper de chemin critique ; donner une marge à une tâche critique ; classer les honoraires de la diététicienne en charges de personnel (compte 64) au lieu du compte 62 ; oublier les charges patronales dans le coût horaire ; inscrire les contributions volontaires en nature d'un seul côté du budget ; demander plus que le plafond de 2 500 € ou plus de 60 % des charges monétaires ; oublier que le solde de la subvention n'arrive qu'en octobre et laisser la trésorerie négative ; conclure à un effet certain de l'essai alors que l'intervalle de confiance du risque relatif contient 1.

Corrigé S2 – « Mes mains tremblent, mais je veux encore cuisiner » : un atelier culinaire pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches

que le jury attend

Le jury évalue un atelier réellement adapté au public : des tâches possibles avec des tremblements et une lenteur des gestes (travail assis, ustensiles à gros manche, planches antidérapantes, pas de couteau pointu), des textures adaptées aux troubles de la déglutition, des repas riches en fibres et en eau, un rythme qui tient compte de la fatigue. Il vérifie les calculs (bon de commande avec rendement, coût, apports) et la logistique (check-list, préparation à l'avance, congélation en sécurité). Il valorise le respect des limites de rôle : on ne modifie ni un traitement ni un régime prescrit, on oriente vers le neurologue ou l'orthophoniste. Il pénalise un atelier où les aidants font tout, des conseils médicaux donnés à la place des soignants et l'acceptation sans condition d'un financement par un laboratoire.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Calcul posé – Exploitation du document 5

- Taux de réponse : 31 / 42 × 100 = **73,8 %**.
- Constipation : 14 / 31 = **45,2 %** ; difficultés pour éplucher, couper, ouvrir : 11 / 31 = **35,5 %** ; perte de poids : 9 / 31 = **29,0 %** ; toux ou fausses routes : 8 / 31 = **25,8 %**.
- Repas préparés par l'aidant seul : 17 / 31 = **54,8 %** ; souhait de recettes faciles qui se congèlent : 20 / 31 = **64,5 %** ; aidants qui manquent de temps : 12 / 31 = **38,7 %**.

Trois besoins prioritaires : **garder une place active dans la cuisine** malgré les difficultés motrices (plus de la moitié des repas sont désormais préparés par l'aidant seul) ; **prévenir la constipation et la perte de poids** par des repas riches en fibres, en eau et suffisamment énergétiques ; **gagner du temps** grâce à des recettes simples, faciles à mâcher et à avaler, préparées à l'avance et congelées.

Objectif général : contribuer à préserver l'autonomie, l'état nutritionnel et le plaisir de manger des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs proches.

Objectifs opérationnels (vérifiés à la fin de la séance) :

- chaque personne malade réalise au moins deux gestes de la recette (laver, mélanger, émietter, monter le parmentier, servir), observés par l'animateur ;
- au moins 8 participants sur 10 citent deux moyens d'augmenter les fibres et l'eau d'un repas (tour de table) ;
- chaque foyer repart avec une portion congelable étiquetée et la fiche recette en gros caractères.

Question 2 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Potiron	12 × 150 = 1 800 g	1 800 / 0,70 = 2 571 g	2,6 kg	2,571 × 1,90 = 4,89
Pommes de terre	12 × 190 = 2 280 g	2 280 / 0,85 = 2 682 g	2,7 kg	2,682 × 1,40 = 3,76
Oignons	180 g	180 / 0,90 = 200 g	200 g	0,200 × 1,80 = 0,36
Huile de colza	72 g	72 g	1 bouteille (entamée)	0,072 × 3,20 = 0,23
Cabillaud surgelé	1 200 g	1 200 g	1,2 kg	1,200 × 13,90 = 16,68
Poireaux	960 g	960 / 0,75 = 1 280 g	1,3 kg	1,280 × 2,60 = 3,33
Lait demi-écrémé	600 g	600 g	1 L (entamé)	0,600 × 1,05 = 0,63
Beurre doux	60 g	60 g	1 plaquette de 125 g	0,060 × 9,80 = 0,59
Emmental râpé	120 g	120 g	1 sachet de 150 g	0,120 × 9,90 = 1,19
Pain complet	480 g	480 g	1 pain de 500 g	0,480 × 4,60 = 2,21
Pommes	1 200 g	1 200 / 0,80 = 1 500 g	1,5 kg	1,500 × 2,40 = 3,60
Pruneaux dénoyautés	240 g	240 g	1 sachet de 250 g	0,240 × 9,50 = 2,28
Fromage blanc 3 %	1 200 g	1 200 g	1,2 kg	1,200 × 2,60 = 3,12
Épices, sel, poivre	–	–	–	forfait 0,90
Total				**43,77**

Calcul posé – Coût par portion

43,77 / 12 = **3,65 €** par portion, sous le plafond de 3,80 € (marge de 0,15 € par portion, soit 1,80 € pour l'atelier). Le cabillaud est le poste le plus coûteux : 16,68 / 43,77 × 100 = **38,1 %** du coût. Si le budget se resserre, on peut le remplacer par un poisson blanc moins cher (lieu noir, colin) ou réduire le grammage à 90 g en ajoutant un œuf dans la purée.

On calcule le coût sur la quantité **réellement utilisée** (exemple : 60 g de beurre) ; les produits entamés (huile, lait, beurre) restent à l'association pour les ateliers suivants, ce qui est noté dans l'inventaire.

Question 3 – Fiches techniques, adaptations et préparation à l'avance (3 pts)

Matériel adapté : planches à découper antidérapantes (ou torchon humide dessous), épluche-légumes à gros manche, couteaux à bout rond pour les participants (le candidat taille le potiron cru, dur et dangereux), presse-purée ou mixeur plongeant apporté par le candidat, bols lestés ou posés sur un tapis antidérapant, verres à anse, tablier pour chacun, tables à hauteur assise.

Préparation · Étapes · Points critiques

Velouté de potiron — *Étapes :* 1. Le candidat ouvre et taille le potiron en gros cubes ; les participants épluchent les pommes de terre et l'oignon assis. 2. Faire suer l'oignon dans 36 g d'huile, ajouter potiron et pommes de terre en cubes, couvrir d'eau à hauteur. 3. Cuire 25 minutes à couvert, mixer finement, rectifier la consistance avec de l'eau de cuisson, assaisonner (muscade). ; *Points critiques :* Sécurité de la découpe du potiron ; mixage loin du bord de la table ; servir chaud mais pas brûlant

Parmentier de cabillaud aux poireaux — *Étapes :* 1. Décongeler le cabillaud au réfrigérateur la veille (ou le cuire directement surgelé à la vapeur douce). 2. Laver les poireaux fendus en quatre (participants), les émincer finement (candidat), les étuver 15 minutes dans 36 g d'huile avec un peu d'eau. 3. Cuire les pommes de terre à l'eau 20 minutes, les écraser avec le lait chaud et le beurre. 4. Pocher le cabillaud 8 minutes dans de l'eau frémissante, l'égoutter, l'émietter à la fourchette en retirant les arêtes (participants). 5. Monter dans un plat : poireaux, poisson, purée, emmental. 6. Gratiner 15 minutes à 200 °C. ; *Points critiques :* Cuisson à cœur du poisson ; recherche des arêtes ; refroidissement rapide de la part à congeler

Compote pommes-pruneaux — *Étapes :* 1. Laver, éplucher et couper les pommes (participants avec épluche-légumes et couteau à bout rond). 2. Cuire 15 minutes à couvert avec les pruneaux, un fond d'eau et la cannelle, sans sucre. 3. Écraser ou mixer selon la texture souhaitée. 4. Servir tiède avec 100 g de fromage blanc. ; *Points critiques :* Pas de sucre ajouté ; texture lisse pour Madame L.

Adaptations

Personne · Adaptation · Justification

Monsieur R. (perte de 5 kg) — *Adaptation :* Enrichir sa part : + 10 g d'emmental et + 30 g de fromage blanc dans la purée ; proposer une collation l'après-midi (fromage blanc et compote) ; petites portions plus fréquentes s'il se fatigue ; *Justification :* Perte de poids et fatigue au repas ; besoin d'énergie et de protéines

Madame L. (toux, textures tendres et humides) — *Adaptation :* Purée lisse et bien nappée ; poisson très finement émietté et mélangé à la purée ; pas de pain (miettes sèches) ou pain de mie sans croûte trempé dans le velouté ; compote mixée lisse ; consistance du velouté et des boissons à vérifier avec son orthophoniste ; manger assise bien droite, petites bouchées, sans parler en mangeant ; *Justification :* Les aliments secs, les miettes et les mélanges de textures favorisent les fausses routes ; le niveau de texture est fixé par le soignant, pas par l'animateur

Monsieur G. (lévodopa, blocages) — *Adaptation :* On ne modifie pas son repas : on lui rappelle de suivre l'horaire de prise fixé par son neurologue ; on prévoit pour lui des tâches assises qu'il peut interrompre ; s'il le souhaite, on lui remet une fiche à montrer à son neurologue sur la répartition des protéines ; *Justification :* La répartition des protéines relève d'une prescription ; supprimer les protéines exposerait à la dénutrition

Madame V. (diabète de type 2) — *Adaptation :* Repas sans sucre ajouté ; dessert pris à la fin du repas ; pain complet ; part de compote de 120 g environ (pommes et pruneaux) ; *Justification :* Les sucres du repas viennent des fruits et du lait ; les fibres et la prise au cours du repas limitent l'élévation de la glycémie

Monsieur N. (pas de poisson) — *Adaptation :* Version aux lentilles corail : 50 g de lentilles sèches cuites 12 minutes avec les poireaux, à la place du cabillaud ; *Justification :* Apport protéique et fibres conservés (calcul en question 4)

Préparation à l'avance et congélation : monter deux parmentiers individuels dans des barquettes en aluminium avant gratinage ; les refroidir rapidement (bac d'eau froide avec glaçons, puis réfrigérateur) ; filmer, étiqueter (nom du plat, date de fabrication, allergènes : poisson, lait) ; congeler à − 18 °C ; consommer dans le mois ; décongeler au réfrigérateur la veille, puis réchauffer à cœur au four ou au micro-ondes, couvert. Le velouté et la compote se congèlent aussi en portions dans des boîtes de 250 mL.

Question 4 – Apports nutritionnels d'une portion (2 pts)

Calcul posé – Apports par préparation (valeurs Ciqual 2025, poids nets crus)

- Velouté (potiron 150 g, pomme de terre 40 g, oignon 15 g, huile 3 g) : énergie 150 × 20,1 / 100 + 40 × 80 / 100 + 15 × 39 / 100 + 3 × 900 / 100 = 30,15 + 32,00 + 5,85 + 27,00 = **95,0 kcal** ; protéines **2,55 g** ; fibres **1,88 g** ; vitamine C **24,52 mg**.
- Parmentier et pain (pomme de terre 150 g, cabillaud 100 g, poireau 80 g, lait 50 g, beurre 5 g, emmental 10 g, huile 3 g, pain complet 40 g) : **439,97 kcal** ; protéines **30,18 g** ; glucides **46,96 g** ; lipides **12,37 g** ; fibres **7,66 g** ; sel **0,85 g** ; calcium **264,55 mg**.
- Dessert (pomme 100 g, pruneaux 20 g, fromage blanc 100 g, cannelle 0,3 g) : **176,23 kcal** ; protéines **7,87 g** ; glucides **26,62 g** dont sucres **22,09 g** ; calcium **149,34 mg**.

Nutriment · Velouté · Parmentier et pain · Dessert · Repas

Énergie (kcal) — *Velouté :* 95,00 ; *Parmentier et pain :* 439,97 ; *Dessert :* 176,23 ; *Repas :* **711,2**

Protéines (g) — *Velouté :* 2,55 ; *Parmentier et pain :* 30,18 ; *Dessert :* 7,87 ; *Repas :* **40,60**

Glucides (g) — *Velouté :* 12,67 ; *Parmentier et pain :* 46,96 ; *Dessert :* 26,62 ; *Repas :* **86,25**

dont sucres (g) — *Velouté :* 3,93 ; *Parmentier et pain :* 7,69 ; *Dessert :* 22,09 ; *Repas :* **33,71**

Lipides (g) — *Velouté :* 3,28 ; *Parmentier et pain :* 12,37 ; *Dessert :* 3,56 ; *Repas :* **19,21**

Fibres (g) — *Velouté :* 1,88 ; *Parmentier et pain :* 7,66 ; *Dessert :* 2,60 ; *Repas :* **12,15**

Sel (g) — *Velouté :* 0,02 ; *Parmentier et pain :* 0,85 ; *Dessert :* 0,09 ; *Repas :* **0,96**

Calcium (mg) — *Velouté :* 40,22 ; *Parmentier et pain :* 264,55 ; *Dessert :* 149,34 ; *Repas :* **454,1**

Fer (mg) — *Velouté :* 1,59 ; *Parmentier et pain :* 4,16 ; *Dessert :* 0,20 ; *Repas :* **5,95**

Vitamine C (mg) — *Velouté :* 24,52 ; *Parmentier et pain :* 40,95 ; *Dessert :* 4,61 ; *Repas :* **70,1**

Calcul posé – Répartition de l'énergie et comparaison aux repères

- Protéines : 40,60 × 4 / 711,2 × 100 = **22,8 %** ; lipides : 19,21 × 9 / 711,2 × 100 = **24,3 %** ; glucides : 86,25 × 4 / 711,2 × 100 = **48,5 %** (le reste vient des fibres, comptées à 2 kcal par gramme dans les valeurs Ciqual).
- Sucres ajoutés : **0 g** (les 33,71 g de sucres viennent des fruits, des légumes et du lait).
- Fibres : 12,15 / 30 × 100 = **40,5 %** de l'apport satisfaisant de la journée ; calcium : 454,1 / 950 × 100 = **47,8 %** ; vitamine C : 70,1 / 110 × 100 = **63,7 %**.

Commentaire : le repas est complet (légumes, féculents, poisson, produit laitier, fruit), pauvre en sel (0,96 g) et sans sucre ajouté. Il apporte 40 % des fibres de la journée en un seul repas, grâce aux légumes, au pain complet et aux pruneaux, et beaucoup d'eau (velouté, compote, légumes) : c'est utile contre la constipation, à condition de boire aussi

tout au long de la journée. Les protéines (40,6 g) sont élevées pour un repas ; pour Monsieur G., c'est le neurologue qui dit si leur répartition doit être modifiée.

Calcul posé – Enrichissement de la part de Monsieur R. et version de Monsieur N.

- Monsieur R. : + 10 g d'emmental (36,8 kcal ; 2,76 g de protéines ; 97,7 mg de calcium) et + 30 g de fromage blanc (22,71 kcal ; 2,18 g ; 39,3 mg), soit **+ 59,5 kcal**, **+ 4,94 g** de protéines, **+ 137,0 mg** de calcium. Repas enrichi : **770,7 kcal**, **45,54 g** de protéines, **591,1 mg** de calcium, pour un volume presque inchangé, ce qui convient à une personne qui se fatigue en mangeant.
- Monsieur N. : on retire le cabillaud (77,4 kcal ; 18,10 g de protéines) et l'on ajoute 50 g de lentilles corail sèches (164,0 kcal ; 13,85 g de protéines ; 7,70 g de fibres ; 3,15 mg de fer). Repas : **797,8 kcal**, **36,35 g** de protéines, **19,85 g** de fibres, **8,61 mg** de fer. Les protéines restent suffisantes et les fibres augmentent nettement.

Question 5 – Check-list logistique et planning (2 pts)

Moment · Tâches

J − 10 — *Tâches :* Confirmer la salle (plaque, four, réfrigérateur, tables assises) ; recueillir les allergies, régimes et consignes de texture à l'inscription ; prévenir l'aidant de Madame L. pour obtenir la consigne écrite de l'orthophoniste

J − 3 — *Tâches :* Courses (bon de commande) ; cabillaud gardé au congélateur ; impression des fiches recettes en police 16, illustrées ; barquettes, film, étiquettes, sacs isothermes

J − 1 — *Tâches :* Mettre le cabillaud à décongeler au réfrigérateur ; préparer le matériel adapté (planches antidérapantes, épluche-légumes à gros manche, mixeur) ; rappel téléphonique aux participants

Jour J, avant — *Tâches :* Arrivée 1 h avant : installation des postes assis, circulation dégagée pour les cannes, affichage des allergènes, eau et verres à anse sur chaque table, fiche d'émargement

Jour J, pendant — *Tâches :* Pause de 10 minutes au milieu ; une tâche de remplacement assise prévue pour chacun ; surveillance des plaques et du four par le candidat seul

Après — *Tâches :* Nettoyage et désinfection, inventaire des produits entamés, congélation des portions, bilan à chaud, saisie des évaluations, compte rendu au bureau

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire · Candidat · Participants

0 h 00 – 0 h 40 — *Candidat :* Conception finale, mise en place des postes, pesée, découpe du potiron, mise à cuire des pommes de terre du parmentier ; *Participants :* –

0 h 40 – 0 h 50 (14 h 00 – 14 h 10) — *Candidat :* Accueil, présentation des objectifs, règles (chacun va à son rythme, on peut s'arrêter), tour de table « un plat que j'aime cuisiner » ; *Participants :* Arrivée, installation, tablier, lavage des mains

0 h 50 – 1 h 20 — *Candidat :* Démonstration du velouté, répartition des tâches en binômes malade-aidant ; *Participants :* Épluchage des pommes de terre et des pommes, lavage des poireaux, assis

1 h 20 – 1 h 40 — *Candidat :* Étuvée des poireaux, pochage du poisson, cuisson de la compote ; *Participants :* Émiettage du poisson, écrasement de la purée, assaisonnement

1 h 40 – 1 h 50 — *Candidat :* Pause, boisson ; *Participants :* Pause

1 h 50 – 2 h 10 — *Candidat :* Montage des parmentiers, gratinage, conditionnement des portions à congeler, mixage du velouté et de la compote ; *Participants :* Montage des parts individuelles, étiquetage

2 h 10 – 2 h 40 (15 h 30 – 16 h 00) — *Candidat :* Dégustation, échange sur les fibres, l'eau et la préparation à l'avance, grille de dégustation, questionnaire de fin ; *Participants :* Dégustation, avis, questions, départ avec les portions et la fiche

2 h 40 – 3 h 00 — *Candidat :* Remise en état, rangement, inventaire, bilan ; *Participants :* –

Si un participant se fatigue, il passe à une tâche de goût ou d'étiquetage ; l'aidant n'est pas chargé de « faire à sa place ».

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Démonstration** courte de chaque geste, puis pratique en binômes malade-aidant : le malade réalise les gestes possibles, l'aidant aide sans se substituer.
- **Faire dire** : « Comment faites-vous chez vous pour éplucher ? » ; partage d'astuces entre participants (s'asseoir, caler le bol, tenir l'avant-bras sur la table).
- **Fiche recette** en gros caractères, avec photos des étapes et pictogrammes « se congèle », « texture tendre ».
- **Échange** sur les fibres et l'eau à partir des aliments sur la table (pruneaux, pain complet, poireaux), sans exposé.
- **Grille de dégustation** à trois visages (j'aime, moyen, je n'aime pas) pour le goût, la texture (facile à mâcher et à avaler) et l'envie de refaire, remplie à l'oral pour ceux qui écrivent difficilement.

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** (5 M) : lavage des mains à l'arrivée et après avoir touché le poisson cru ; tablier ; planches distinctes pour le poisson et les fruits ; décongélation au réfrigérateur ; cuisson à cœur du poisson ; refroidissement rapide des portions à congeler, étiquetage (nom, date, allergènes) ; denrées périssables au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation ; transport des portions en sac isotherme.
- **Sécurité** : le candidat seul utilise le four, les plaques et le mixeur ; couteaux à bout rond pour les participants ; sol sec et circulation libre pour les cannes ; boissons tièdes et pas trop pleines ; trousse de secours ; numéro d'urgence affiché.
- **Allergènes** du repas : poisson, lait (beurre, lait, emmental, fromage blanc), gluten (pain) ; affichage à l'entrée ; vérification des allergies à l'inscription.
- **Éco-gestes** : cuisson à couvert ; épluchures au compost ; quantités calculées au plus juste avec les rendements ; restes conditionnés et donnés aux participants le jour même.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe l'organisation du poste, l'hygiène, le respect des quantités, la texture (purée lisse, poisson sans arête, compote lisse pour Madame L.), l'assaisonnement, le dressage dans une assiette creuse facile à saisir et le conditionnement étiqueté des portions congelées.

Question 10 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : questionnaire oral de fin (satisfaction de 1 à 4 ; « je me sens capable de refaire ce plat chez moi » de 1 à 4 ; intention de le refaire dans le mois) ; observation par l'animateur du nombre de gestes réalisés par chaque malade ; appel téléphonique trois semaines plus tard (plat refait, portion congelée utilisée).

Situation · Réponse

Blocage de Monsieur G. — *Réponse :* Rester calme, ne pas le tirer ni le forcer à se lever ; le laisser assis confortablement, lui proposer de l'eau ; demander à son aidant ce qu'il fait d'habitude (horaire du traitement) ; poursuivre l'atelier en lui laissant une tâche assise s'il le souhaite ; en cas de chute ou de malaise, appeler les secours

« Supprimer la viande » — *Réponse :* Expliquer avec bienveillance qu'il ne faut pas supprimer les protéines, car le risque de dénutrition est réel ; dire que l'horaire des comprimés et une éventuelle répartition des protéines dans la journée se décident avec le neurologue ; l'inviter à poser la question à la prochaine consultation, avec la fiche remise

Financement par un laboratoire — *Réponse :* Remercier et transmettre la proposition au bureau ; signaler le conflit d'intérêts (lien avec la prescription des traitements) ; refuser les tabliers à logo et toute présence de marque dans l'atelier ; si l'association accepte un don, il doit être encadré par une convention qui garantit son indépendance et rendu public ; diversifier les financements (conférence des financeurs, caisse de retraite, mutuelle)

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 42 adhérents au lieu des 31 répondants ; oublier le rendement des légumes et du poisson dans le bon de commande ; dépasser le budget de 3,80 € par portion ; modifier soi-même le repas de Monsieur G. (lévodopa) ou supprimer ses protéines, alors que l'horaire des prises relève de son neurologue ; proposer des gestes fins (émincer, décortiquer) sans ustensile adapté ; supprimer la viande pour tout le groupe sur la demande d'une seule personne ; accepter le financement d'un laboratoire sans règles d'indépendance ; faire à la place des participants au lieu de les aider à faire seuls.

Corrigé S3 – « On commence à 5 heures, on mange à 9 heures, et encore » : piloter à mi-parcours un projet pour les agents de propreté d'une ville et animer un atelier de collation

que le jury attend

Au temps 1, le jury évalue la capacité à **piloter** : calculer les indicateurs du tableau de bord, comparer le réalisé au prévu, expliquer les écarts et proposer des ajustements concrets, en gardant le projet dans son enveloppe. Il valorise l'analyse des causes d'absence (jour, horaire, information) plutôt qu'un reproche aux agents, la protection de l'anonymat vis-à-vis de l'encadrement et la prudence dans l'interprétation d'un premier résultat. Au temps 2, il évalue une collation réaliste (préparée la veille en moins de 10 minutes, transportable, sûre sans réfrigérateur), des calculs justes et une animation qui respecte les choix des agents.

Temps 1 – Le bilan d'étape et l'ajustement du projet

Question 1 – Diagnostic et cohérence des objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Exploitation du document 1

- Taux de réponse : 50 / 64 × 100 = **78,1 %**.
- Rien avant la prise de poste : 31 / 50 = **62,0 %** ; collation au distributeur : 38 / 50 = **76,0 %** ; soda ou boisson énergisante chaque matinée : 22 / 50 = **44,0 %**.
- Très fatigués en fin de tournée : 27 / 50 = **54,0 %** ; micro-ondes sale ou occupé : 19 / 50 = **38,0 %** ; intéressés par un atelier : 29 / 50 = **58,0 %**.

Problème central : **un rythme alimentaire désorganisé par la prise de poste à 5 h**, avec une matinée de travail physique sans repas pour la majorité des agents et une collation achetée au distributeur, riche en sucres, associée à une fatigue importante en fin de tournée.

Les objectifs sont cohérents avec le diagnostic : l'OS1 répond au défaut de petit-déjeuner et à la dépendance au distributeur ; l'OS2 reprend la valeur initiale du diagnostic (44 %). Deux remarques : la valeur initiale de l'OS1 (27,8 %) porte sur les **participants**, alors que l'OS2 porte sur **tous les agents** : il faut le préciser et mesurer les deux de la même façon ; la cause « micro-ondes sale ou occupé » (38,0 %) n'a pas d'action correspondante dans le plan.

Question 2 – Tableau de bord et ajustements (2,5 pts)

Calcul posé – Indicateurs à mi-parcours

- Taux de présence : (10 + 8 + 7) / (3 × 12) = 25 / 36 × 100 = **69,4 %** (cible : 80 %).
- Présences nécessaires sur l'ensemble du cycle : 0,80 × 72 = 57,6, soit **58** ; il en faut encore 58 − 25 = **33** sur les 36 places restantes, soit 33 / 36 × 100 = **91,7 %** de présence sur les trois derniers ateliers.
- Eau consommée en janvier : 1 450 / (64 × 21) = 1 450 / 1 344 = **1,08 L** par agent et par jour ouvré.

Indicateur · Prévu · Réalisé · Analyse

Ateliers — *Prévu :* 3 sur 6 ; *Réalisé :* 3 sur 6 ; *Analyse :* Conforme

Présence — *Prévu :* ≥ 80 % ; *Réalisé :* 69,4 % ; *Analyse :* En retard ; la cible de 80 % sur le cycle exigerait 91,7 % de présence d'ici juin, ce qui est peu réaliste sans changement

Fontaine et gourdes — *Prévu :* Installées ; *Réalisé :* Installées, 1,08 L par agent et par jour ; *Analyse :* Bonne appropriation, à suivre en été

Distributeur — *Prévu :* Offre modifiée ; *Réalisé :* Aucun changement ; *Analyse :* Blocage ; la négociation doit remonter à la direction

Agents relais — *Prévu :* 2 formés ; *Réalisé :* 1 formé ; *Analyse :* Retard lié à un arrêt

Les raisons d'absence (21 réponses) montrent un problème d'**organisation**, pas de motivation : le lundi de forte charge (12 réponses sur 21, 57,1 %), l'information tardive (9, 42,9 %) et l'horaire qui empiète sur la tournée (7, 33,3 %) l'emportent nettement sur le désintérêt (5, 23,8 %).

Trois ajustements :

1. **Déplacer les ateliers** au jour le plus calme de la semaine, en accord avec les chefs d'équipe, et les terminer à 11 h, avec un temps de trajet compté dans le temps de travail.
2. **Informer plus tôt et autrement** : inscription au planning hebdomadaire deux semaines avant, message oral aux prises de poste par l'agent relais, rappel la veille.
3. **Ajuster la cible ou l'offre** : soit ajouter un 7e atelier (12 places de plus), soit présenter au comité de pilotage une cible révisée et justifiée ; ajouter une action sur le micro-ondes (nettoyage planifié, deuxième appareil) qui répond à une cause du diagnostic.

Question 3 – Suivi du budget (2 pts)

Poste · Prévu (8 mois) · Moitié du prévu · Réalisé · Consommation · Écart à la moitié

Denrées — *Prévu (8 mois) :* 122,40 ; *Moitié du prévu :* 61,20 ; *Réalisé :* 64,20 ; *Consommation :* 52,5 % ; *Écart à la moitié :* + 3,00

Location de la fontaine — *Prévu (8 mois) :* 480,00 ; *Moitié du prévu :* 240,00 ; *Réalisé :* 240,00 ; *Consommation :* 50,0 % ; *Écart à la moitié :* 0,00

Gourdes — *Prévu (8 mois) :* 288,00 ; *Moitié du prévu :* 144,00 ; *Réalisé :* 288,00 ; *Consommation :* 100,0 % ; *Écart à la moitié :* + 144,00

Diététicienne — *Prévu (8 mois) :* 810,00 ; *Moitié du prévu :* 405,00 ; *Réalisé :* 405,00 ; *Consommation :* 50,0 % ; *Écart à la moitié :* 0,00

Coordination — *Prévu (8 mois) :* 960,00 ; *Moitié du prévu :* 480,00 ; *Réalisé :* 612,00 ; *Consommation :* 63,7 % ; *Écart à la moitié :* + 132,00

Impression — *Prévu (8 mois) :* 180,00 ; *Moitié du prévu :* 90,00 ; *Réalisé :* 210,00 ; *Consommation :* 116,7 % ; *Écart à la moitié :* + 120,00

Total — *Prévu (8 mois) :* **2 840,40** ; *Moitié du prévu :* **1 420,20** ; *Réalisé :* **1 819,20** ; *Consommation :* **64,0 %** ; *Écart à la moitié :* **+ 399,00**

Calcul posé – Exemples de calculs

- Consommation de la coordination : 612,00 / 960,00 × 100 = **63,7 %** ; heures réalisées : 612 / 24 = **25,5 h** contre 20 h attendues à mi-parcours, soit (25,5 − 20) /

20 × 100 = **+ 27,5 %**.

- Impression : 210,00 / 180,00 × 100 = **116,7 %** : le poste est déjà dépassé de 30,00 €.
- Reste disponible : 2 840,40 − 1 819,20 = **1 021,20 €**.

Analyse : l'écart total (+ 399 €) n'est pas inquiétant en soi, car les gourdes (+ 144 €) sont un achat unique prévu au début. Les vrais dépassements sont l'**impression** (+ 30 € sur le total du poste, déjà consommé) et la **coordination** (5,5 h de plus que prévu, liées au lancement et aux relances du distributeur).

Solution pour finir dans l'enveloppe : les dépenses incompressibles de la seconde moitié sont les denrées (61,20 €), la fontaine (240 €) et la diététicienne (405 €), soit 706,20 €. Il reste 1 021,20 − 706,20 = **315,00 €** pour la coordination, soit 315 / 24 = **13,1 heures** au lieu de 14,5. On confie donc à l'agent relais une partie des rappels, on fait imprimer le livret par le service de reprographie de la ville (sans coût pour le projet) et l'on fixe un plafond d'heures de coordination validé par le comité de pilotage.

Question 4 – Matrice RACI de la seconde moitié (1,5 pt)

Tâche	Stagiaire	Coordinatrice	Diététicienne	Service de prévention et de santé au travail	DRH	Agents relais
Ateliers 4 à 6	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* R	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* I	*Agents relais :* C
Négociation avec le gestionnaire du distributeur	*Stagiaire :* C	*Coordinatrice :* R	*Diététicienne :* C	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* A	*Agents relais :* I
Formation du second agent relais	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* C	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* I	*Agents relais :* I
Communication auprès des agents	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* I	*Service de prévention et de santé au travail :* I	*DRH :* I	*Agents relais :* R
Évaluation finale	*Stagiaire :* R	*Coordinatrice :* A	*Diététicienne :* C	*Service de prévention et de santé au travail :* C	*DRH :* I	*Agents relais :* C

Question 5 – Ordre du jour et relevé de décisions (1,5 pt)

Ordre du jour du comité de pilotage du 6 mars 2028 (1 h 30) : 1. Rappel des objectifs et du calendrier (5 min). 2. Tableau de bord : ateliers, présence, fontaine, distributeur, relais (20 min). 3. Premiers résultats et leurs limites (10 min). 4. Budget : réalisé, dépassements, reste à engager (15 min). 5. Propositions d'ajustement et décisions (30 min). 6. Communication et calendrier des trois derniers ateliers (5 min). 7. Questions diverses et date du comité de juin (5 min).

Relevé de décisions attendu : nouveau jour et nouvel horaire des ateliers, validés avec les chefs d'équipe ; cible de présence maintenue avec un 7e atelier, ou révisée ; plafond de 13 heures de coordination jusqu'en juin ; impression du livret par la reprographie ; lettre de la DRH au gestionnaire du distributeur avec une date de réponse ; plan de nettoyage du micro-ondes ; date de formation du second relais. Chaque décision a un responsable et une échéance.

Temps 1 – Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Premier résultat (3 pts)

Calcul posé – Comparaison des participants et des autres agents

- Participants : 11 / 18 = **61,1 %** ; autres agents : 9 / 32 = **28,1 %**.
- RR = 0,611 / 0,281 = **2,17**.
- Erreur type de ln RR : √(1/11 − 1/18 + 1/9 − 1/32) = √(0,0909 − 0,0556 + 0,1111 − 0,0313) = √0,1152 = **0,339**.
- ln 2,17 = **0,776** ; bornes : exp(0,776 − 0,665) = exp(0,111) = **1,12** ; exp(0,776 + 0,665) = exp(1,441) = **4,23**. IC 95 % : **[1,12 ; 4,23]**.
- Évolution chez les participants : de 5 / 18 = **27,8 %** à 11 / 18 = **61,1 %**, soit **+ 33,3 points**.

L'intervalle de confiance ne contient pas 1 : la différence entre participants et autres agents est **statistiquement significative**. La progression chez les participants est nette et dépasse déjà la cible de l'OS1 (50 %). L'interprétation reste prudente : les participants sont **volontaires** et étaient peut-être déjà plus motivés (biais de sélection, même si leur valeur de départ, 27,8 %, n'était pas plus élevée que celle des autres) ; les réponses sont **déclarées** à des personnes du projet (désirabilité sociale) ; les effectifs sont petits ; la fontaine et les gourdes ont touché tous les agents, ce qui brouille la comparaison ; on ne sait pas si le changement durera. On parle d'un **résultat encourageant à confirmer** en juin, avec la même question et une passation anonyme.

Temps 1 – Partie C – Veille

Question 7 – Veille sur l'alimentation et les horaires atypiques (2 pts)

- **Sources** : Anses (avis et rapports, dont l'évaluation de 2016 sur le travail de nuit), Santé publique France, Institut national de recherche et de sécurité (dossiers sur les horaires atypiques), Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, Haute Autorité de santé, revues de santé au travail ; textes de la fonction publique territoriale sur la santé au travail.
- **Outils** : alertes par courriel, abonnement aux lettres d'information, bases bibliographiques avec mots-clés (« shift work », « early morning work », « meal timing »), tableau de veille partagé.
- **Fréquence** : alertes lues chaque semaine ; synthèse mensuelle d'une page.
- **Diffusion** : synthèse transmise à la coordinatrice et au service de prévention et de santé au travail ; point en comité de pilotage ; information des représentants du personnel ; chaque document daté et sourcé.

Temps 1 – Partie D – Communication et posture

Question 8 – Information des agents, volontariat et anonymat (1,5 pt)

- **Canaux et relais** : annonce orale à la prise de poste par l'agent relais et les chefs d'équipe ; affiche imagée au vestiaire et près de la fontaine ; inscription au planning ; message court sur le téléphone professionnel la veille.
- **Message d'invitation** : « Mardi 14 mars, de 9 h 30 à 11 h, au réfectoire : on prépare ensemble une collation qui tient jusqu'à midi, prête la veille en 10 minutes. Sur le

temps de travail. Inscription auprès de votre agent relais. Les agents des ateliers précédents en parlent mieux que nous ! »

- **Volontariat et anonymat** : l'atelier reste facultatif et ne figure dans aucune évaluation individuelle ; la liste des présents sert seulement au calcul de la présence et n'est pas transmise à l'encadrement ; les questionnaires sont anonymes et analysés par la diététicienne ou la stagiaire ; les résultats sont présentés de façon agrégée, jamais par équipe de moins de cinq agents ; ces règles sont écrites et présentées en comité de pilotage, en lien avec la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.

Question 9 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame : contexte et diagnostic (2 min) ; plan d'action initial (1 min 30) ; tableau de bord et écarts (2 min) ; budget (1 min 30) ; premier résultat et limites (1 min 30) ; ajustements décidés (1 min) ; conclusion (30 s).

- *Pourquoi la présence est-elle faible ?* Organisation (jour, horaire, information) plutôt que désintérêt, d'après 21 réponses ; ajustements proposés.
- *La cible de 80 % est-elle encore atteignable ?* Seulement avec 91,7 % de présence ou un atelier de plus ; sinon, cible révisée et justifiée devant le comité.
- *Le résultat de février prouve-t-il l'efficacité ?* Non : différence significative, mais volontaires, déclaratif, petit effectif.
- *Pourquoi le budget dépasse-t-il de 399 € ?* Surtout l'achat unique des gourdes ; vrais dépassements : impression et coordination, compensés par un plafond d'heures et la reprographie.
- *Comment protégez-vous les agents ?* Volontariat, anonymat, résultats agrégés, aucune liste transmise à l'encadrement.

Temps 2 – L'atelier « collation de tournée »

Question 10 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : contribuer à améliorer le rythme alimentaire et la vigilance des agents de propreté pendant leur tournée. **Objectifs opérationnels** (fin de séance) : chaque agent prépare seul un porridge froid en moins de 10 minutes (chronométré) ; chaque agent monte une boîte de collation complète comprenant un féculent, un produit laitier ou un œuf, et un fruit ; au moins 8 agents sur 10 citent deux règles pour transporter une boîte en sécurité sans réfrigérateur.

Question 11 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net total	Brut total	Commande	Coût (€)
Flocons d'avoine	600 g	600 g	1 paquet de 1 kg	0,600 × 2,20 = 1,32
Lait demi-écrémé UHT	1 800 g	1 800 g	2 L	1,800 × 0,99 = 1,78
Pommes	960 g	960 / 0,80 = 1 200 g	1,2 kg	1,200 × 2,40 = 2,88
Raisins secs	180 g	180 g	1 sachet de 250 g	0,180 × 6,80 = 1,22
Pain complet	600 g	600 g	2 pains de 300 g	0,600 × 4,60 = 2,76
Emmental en bloc	240 g	240 g	250 g	0,240 × 10,50 = 2,52
Œufs	12	12	2 boîtes de 6	12 × 0,28 = 3,36
Clémentines	840 g	840 / 0,75 = 1 120 g	1,2 kg	1,120 × 2,90 = 3,25
Cannelle, sel	–	–	–	0,40
Total				**19,49**

Coût par portion : 19,49 / 12 = **1,62 €**, sous le plafond de 1,70 € (marge de 0,08 €).

Question 12 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape (la veille au soir)	Temps
Dans une boîte hermétique de 500 mL : 50 g de flocons, 150 g de lait, une pincée de cannelle ; mélanger	2 min
Râper 80 g de pomme avec la peau, l'ajouter avec 15 g de raisins secs ; fermer, réfrigérer	3 min
Préparer la tartine (50 g de pain, 20 g d'emmental en lamelles) dans un papier ou une boîte	2 min
Œuf dur cuit à l'avance (10 minutes dans l'eau bouillante, refroidi, gardé dans sa coquille au réfrigérateur, 2 à 3 jours au plus) ; clémentine	1 min
Le matin : boîte dans un sac isotherme avec un pain de glace ; collation consommée à la pause de 9 h	–

Points critiques : la boîte au lait reste au froid (sac isotherme et pain de glace) ; œuf dur gardé entier ; lavage des mains avant de manger, avec le point d'eau du vestiaire ou une lingette.

Personne · Adaptation

Monsieur F. (diabète de type 2) — *Adaptation :* Garder le porridge (féculent riche en fibres) ; supprimer les raisins secs ou les réduire à 5 g, la pomme suffit à donner du goût ; tartine et œuf conservés ; collation prise à heure régulière

Madame H. (intolérance au lactose) — *Adaptation :* Porridge au lait sans lactose ou à une boisson au soja enrichie en calcium ; emmental conservé (fromage affiné, presque sans lactose)

Monsieur O. (pas de porc, faim) — *Adaptation :* Le menu ne contient pas de porc ; portion augmentée : deux œufs, 75 g de pain, 70 g de flocons

Monsieur T. (pas de réfrigérateur, départ à 4 h 30) — *Adaptation :* Sac isotherme avec une bouteille d'eau congelée, qui sert aussi de boisson ; porridge préparé à l'eau ou avec une compote sans sucre ajouté au lieu du lait, ou remplacé par un sachet de flocons et un fruit ; tartine à l'emmental (fromage à pâte dure, qui supporte mieux quelques heures hors du froid) ; œuf dur dans sa coquille ; consommation à 9 h au plus tard

Question 13 – Apports nutritionnels et comparaison au distributeur (2,5 pts)

Nutriment · Porridge · Tartine, œuf, clémentine · Collation

Énergie (kcal) — *Porridge :* 348,28 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 293,45 ; *Collation :* **641,7**

Protéines (g) — *Porridge :* 11,18 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 16,88 ; *Collation :* **28,06**

Glucides (g) — *Porridge :* 56,69 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 27,05 ; *Collation :* **83,74**

dont sucres (g) — *Porridge :* 26,99 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 7,25 ; *Collation :* **34,25**

Lipides (g) — *Porridge :* 6,59 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 11,52 ; *Collation :* **18,11**

Fibres (g) — *Porridge :* 7,51 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 4,84 ; *Collation :* **12,35**

Sel (g) — *Porridge :* 0,14 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 0,86 ; *Collation :* **1,00**

Calcium (mg) — *Porridge :* 222,87 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 291,70 ; *Collation :* **514,6**

Fer (mg) — *Porridge :* 2,26 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 1,97 ; *Collation :* **4,23**

Vitamine C (mg) — *Porridge :* 3,69 ; *Tartine, œuf, clémentine :* 34,44 ; *Collation :* **38,1**

Calcul posé – Exemples de calculs et répartition de l'énergie

- Porridge, énergie : 50 × 369 / 100 + 150 × 47,7 / 100 + 80 × 54 / 100 + 15 × 322 / 100 + 0,3 × 243 / 100 = 184,50 + 71,55 + 43,20 + 48,30 + 0,73 = **348,28 kcal**.
- Tartine, œuf, clémentine : 50 × 234 / 100 + 20 × 373 / 100 + 50 × 140 / 100 + 70 × 45,5 / 100 = 117,00 + 74,60 + 70,00 + 31,85 = **293,45 kcal**.
- Protéines : 28,06 × 4 / 641,7 × 100 = **17,5 %** ; lipides : 18,11 × 9 / 641,7 × 100 = **25,4 %** ; glucides : 83,74 × 4 / 641,7 × 100 = **52,2 %**.
- Achat au distributeur : viennoiserie 60 × 410 / 100 = **246 kcal** ; soda 330 × 10,6 / 100 = **35,0 g** de sucres, soit 35,0 × 4 = **140 kcal** ; total **386 kcal**.

Commentaire : la collation apporte environ 640 kcal, soit 641,7 / 386 = **1,66 fois** l'énergie de l'achat au distributeur, mais avec 28 g de protéines, 12 g de fibres et un demi-apport de calcium : elle « tient au corps » jusqu'à midi, ce que demandent les agents. Ses 34 g de sucres viennent des fruits, des fruits secs et du lait (aucun sucre ajouté), alors que le soda seul apporte 35 g de sucres ajoutés, soit plus que la limite de l'OMS pour une journée (moins de 10 % de l'énergie, environ 50 g pour 2 000 kcal). Pour des agents qui ne mangent rien avant 5 h et font un travail physique, une collation de cette taille à 9 h est adaptée ; elle remplace le petit-déjeuner et ne s'y ajoute pas.

Question 14 – Check-list logistique (2 pts)

Moment · Tâches

J − 7 — *Tâches :* Réservation du réfectoire ; liste des inscrits, allergies et régimes ; commande des boîtes hermétiques et des sacs isothermes de démonstration

J − 2 — *Tâches :* Courses selon le bon de commande ; impression de la fiche « 10 minutes chrono » illustrée ; chronomètre ; étiquettes

J − 1 — *Tâches :* Cuisson des 12 œufs durs, refroidissement, réfrigération ; préparation d'un porridge témoin de la veille pour la dégustation ; rappel aux agents par le relais

Jour J — *Tâches :* Installation 45 minutes avant ; postes avec planche, râpe, balance, boîtes ; affichage des allergènes ; nettoyage préalable du micro-ondes

Après — *Tâches :* Nettoyage, inventaire, restes distribués aux agents, questionnaires, compte rendu à la coordinatrice

Question 15 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire · Candidat · Agents

0 h 00 – 0 h 45 — *Candidat :* Mise en place des postes, pesées, contrôle des œufs durs et du porridge témoin ; *Agents :* –

0 h 45 – 0 h 55 (9 h 30) — *Candidat :* Accueil, objectifs, tour de table « ce que je mange pendant ma tournée » ; *Agents :* Installation, lavage des mains

0 h 55 – 1 h 10 — *Candidat :* Comparaison collation et distributeur avec les emballages et les calculs (sucres en morceaux) ; *Agents :* Échange, questions

1 h 10 – 1 h 35 — *Candidat :* Démonstration, puis défi « 10 minutes chrono » ; *Agents :* Chaque agent prépare son porridge, sa tartine et sa boîte

1 h 35 – 2 h 15 (11 h 00) — *Candidat :* Dégustation du porridge témoin, boîte adaptée à Monsieur T., questionnaire de fin ; *Agents :* Dégustation, avis, départ avec la boîte et la fiche

2 h 15 – 3 h 00 — *Candidat :* Remise en état, inventaire, bilan ; *Agents :* –

Question 16 – Méthodes et outils (1,5 pt)

Démonstration courte puis pratique individuelle ; défi chronométré, qui montre que la préparation tient en moins de 10 minutes ; comparaison concrète avec les produits du distributeur (sucres représentés en morceaux, prix comparés : 1,62 € pour la collation complète) ; échanges entre agents (« qu'est-ce qui marcherait dans ta tournée ? ») ; fiche recette illustrée au format carte, à garder dans le vestiaire ; trois variantes (compote, banane, fromage blanc).

Question 17 – Hygiène, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : œufs durs cuits la veille, refroidis rapidement, gardés au réfrigérateur dans leur coquille ; porridge au lait conservé au froid jusqu'à la consommation (sac isotherme et pain de glace) ; boîtes lavées chaque jour ; nettoyage quotidien du micro-ondes affiché au vestiaire ; lavage des mains avant la collation.
- **Allergènes** : gluten (avoine, pain), lait (lait, emmental), œuf ; affichage et variantes (boisson au soja enrichie, pain sans gluten si besoin).
- **Éco-gestes** : boîtes et gourdes réutilisables au lieu des emballages du distributeur ; épluchures et trognons au compost du centre technique.

Question 18 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe la rapidité et la propreté de la préparation, le respect des grammages, la cuisson des œufs, la présentation d'une boîte complète et étiquetée, et la boîte adaptée à Monsieur T. (sans lait, sac isotherme et bouteille congelée).

Question 19 – Évaluation et situations (1 pt)

Évaluation : questionnaire anonyme de fin (satisfaction ; « je peux le refaire » ; intention de préparer une collation la semaine suivante) ; temps de préparation mesuré pendant le défi ; question posée trois semaines plus tard à l'atelier suivant (collations préparées dans la semaine).

Situation · Réponse

Le chef d'équipe demande la liste — *Réponse :* Refuser poliment : les réponses sont anonymes et l'atelier est volontaire ; proposer de lui transmettre les résultats agrégés présentés en comité de pilotage ; en informer la coordinatrice

« La boisson énergisante, c'est mon petit-déjeuner » — *Réponse :* Ne pas juger ; l'inviter à goûter et à comparer : énergie, sucres et caféine, tenue jusqu'à midi ; l'inviter à essayer une collation une semaine et à observer sa fatigue en fin de tournée ; le choix lui appartient

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 64 agents au lieu des 50 répondants ; calculer le taux de réalisation du budget sans le comparer à l'avancement du projet ; confondre un écart favorable et un écart défavorable ; conclure à l'efficacité de l'atelier sans tenir compte des agents qui n'y sont pas venus ; oublier l'heure très matinale de la collation et proposer un plat long à préparer ; dépasser le budget de 1,70 € par portion ; transmettre au chef d'équipe la liste des participants ; juger un agent qui boit une boisson énergisante au lieu de l'inviter à comparer.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Construire un plan d'action avec le QQOQCCP et répartir les rôles avec une matrice RACI	S1, S3			
C3.1	Construire un PERT, trouver le chemin critique et calculer les marges	S1			
C3.1	Calculer un coût horaire chargé et construire un budget équilibré avec les bons comptes, y compris les comptes 86 et 87	S1, S3			
C3.1	Appliquer les règles d'un appel à projets (plafond, taux, calendrier de versement) et construire un plan de trésorerie	S1			
C3.1	Piloter avec un tableau de bord : taux de présence, taux de réalisation du budget, écarts, décision	S3			
C3.1	Construire une matrice des risques et proposer des mesures de prévention	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget par portion	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 et la répartition de l'énergie ; adapter une recette à un besoin individuel	S2, S3			
C3.2	Adapter les gestes et le matériel à des personnes qui tremblent ou qui travaillent très tôt	S2, S3			
C3.2	Organiser le déroulé d'un atelier minute par minute et respecter l'hygiène	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance pour évaluer un essai	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille datée sur les financements et sur la santé au travail	S1, S3			
C3.5	Construire un plan de communication adapté à chaque public et une trame d'exposé de 10 minutes	S1, S3			
C3.6	Respecter la confidentialité et garder son indépendance face à un financeur privé	S2, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.
