Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 8

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 8

Article de synthèse · Review article

Chapitre 8 – Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action, pilotage, appels à projets et parties prenantes

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 8

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (2); Stratégies; Partenaires; Financements; Calendrier; Budget; Pilotage

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ; décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ; identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ; connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ; planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ; construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé.

Contenu. 8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 8.3.1 Choisir les stratégies et les actions ; 8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat ; 8.3.3 Les financements et les appels à projets ; 8.3.4 Planifier le projet ; 8.3.5 Construire et suivre le budget ; 8.3.6 Piloter le projet ; 8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet ; 8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ Combiner les stratégies : éducation + environnement + lien social + participation + plaidoyer + formation de relais.

■ Choisir une action : cohérence, efficacité (données probantes), adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique.

■ QQOQCCP : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi ; fiche projet (F4).

■ Parties prenantes : matrice pouvoir/intérêt (gérer étroitement, satisfaire, associer, surveiller) ; RACI (réalise, approuve, consulté, informé) ; convention ; COPIL (décide) / comité technique (organise) / comité d'usage

■ Financeurs : ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP), collectivités, CAF, conférence des financeurs (loi du 28 décembre 2015), assurance maladie, mutuelles, fondations ; appel à projets : lire le cahier des charges, éligibilité, c

Sommaire

8.1 Compétences mobilisées 4

8.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

8.3 Cours 5

8.3.1 Choisir les stratégies et les actions 5

8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat 8

8.3.3 Les financements et les appels à projets 12

8.3.4 Planifier le projet 16

8.3.5 Construire et suivre le budget 20

8.3.6 Piloter le projet 25

8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet 29

8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques 32

8.3.9 Organiser la logistique des ateliers 36

8.3.10 Anticiper la trésorerie du projet 39

8.3.11 Rédiger un dossier de demande de financement : exemple commenté 41

8.3.12 La convention de partenariat : un modèle commenté 41

8.3.13 Estimer la charge de travail et tenir une feuille de temps 44

8.3.14 Utiliser les outils numériques du projet 44

8.3.15 Fil rouge : le plan d'action d'Inès 47

8.4 Approfondissements 48

8.4.1 Le cadre logique, outil des financeurs 48

8.4.2 Le travail en réseau et la coordination territoriale 49

8.4.3 La pérennisation dès la conception 50

8.4.4 Les contrats pluriannuels et les fonds européens 50

8.4.5 La gestion des bénévoles 51

8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 52

8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 52

Ce que le jury attend sur la conception et le pilotage 54

8.7 L'essentiel à retenir 55

8.8 Entraînement 55

8.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 55

8.8.2 Exercices 56

8.8.3 Questions de réflexion 58

8.8.4 Étude de cas 59

8.8.5 Mises en situation express 59

8.8.6 Exercices complémentaires 60

8.9 Glossaire 61

8.10 Renvois bibliographiques par notion 62

8.12 Bibliographie numérotée 62

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ;
- décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ;
- identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ;
- connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ;
- planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ;
- construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé ;
- piloter un projet : tableau de bord, gestion des risques, analyse des écarts, ajustements, comptes rendus.

8.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Cœur de la compétence : concevoir un plan d'action et des moyens réalistes, mobiliser partenaires et financements, piloter ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes ; projet mis en œuvre ; ajustements envisagés

C3.2 — *Ce que le chapitre apporte :* Programmer et organiser les ateliers dans le plan d'action (calendrier, budget des denrées, logistique) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Programme d'ateliers adapté ; organisation cohérente

C3.5 — *Ce que le chapitre apporte :* Présenter le projet aux partenaires et financeurs, animer une réunion, travailler en équipe ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Expression écrite et orale maîtrisée ; techniques d'animation et posture adaptées

C3.6 — *Ce que le chapitre apporte :* Partager les documents du projet (tableau de bord, budget) de façon sécurisée ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Environnement numérique géré et sécurisé ; bonnes pratiques de messagerie

8.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Stratégies d'intervention — *Objectifs pour l'apprenant :* Choisir et justifier des actions ; *Limites et attendus :* Données probantes ; combinaison de stratégies

Plan d'action — *Objectifs pour l'apprenant :* Formaliser une action (QQOQCCP, fiche projet) ; *Limites et attendus :* Fiche F4

Parties prenantes, partenariat — *Objectifs pour l'apprenant :* Identifier, analyser, mobiliser ; *Limites et attendus :* Matrice pouvoir/intérêt ; convention ; COPIL

Financements, appels à projets — *Objectifs pour l'apprenant :* Repérer les financeurs ; lire un cahier des charges ; rédiger une réponse ; *Limites et attendus :* FIR, CAF, collectivités ; formulaire Cerfa n° 12156

Planification — *Objectifs pour l'apprenant :* Construire un Gantt ; identifier le chemin critique ; *Limites et attendus :* Fiche F5

Budget — *Objectifs pour l'apprenant :* Construire un budget équilibré ; calculer coûts et ratios ; *Limites et attendus :* Plan comptable associatif simplifié ; fiche F6 ; tableur

Pilotage — *Objectifs pour l'apprenant :* Suivre, anticiper les risques, ajuster ; *Limites et attendus :* Tableau de bord ; matrice des risques

8.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », indicateurs « Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes » et « Projet mis en œuvre ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 pour les notions et les outils de la démarche de projet, p. 108 pour les étapes et l'apport des autres blocs). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 8.2.2.

Texte · Critère ou notion · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Étapes : conception du projet et plan d'action ; conduite et pilotage du projet ; *Où dans ce cours :* 8.3.1 ; 8.3.4 à 8.3.6 ; 8.3.15 (fil rouge)

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Appel à projets ; parties prenantes ; *Où dans ce cours :* 8.3.2 et 8.3.3 ; 8.3.11 (dossier commenté) ; 8.3.12 (convention)

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Cahier des charges ; fiche projet ; conducteur de séance ; *Où dans ce cours :* 8.3.3 ; 8.3.1 (fiche projet) ; encadré « Repères » du CNED en 8.3.2 ; chapitre 10

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Plan de communication ; *Où dans ce cours :* 8.3.7

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Diagramme de Gantt, feuille de temps, tableaux de bord ; *Où dans ce cours :* 8.3.4 ; 8.3.13 ; 8.3.6

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Logiciels de gestion de projet, mind-mapping, tableur, formulaire en ligne ; *Où dans ce cours :* 8.3.14

Guide 2025, p. 63 — *Critère ou notion :* Budgets (autres enseignements) ; *Où dans ce cours :* 8.3.5 ; 8.3.10 (trésorerie)

Référentiel, C3.1 — *Critère ou notion :* « Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes » ; « Projet mis en œuvre » ; *Où dans ce cours :* 8.3.1 à 8.3.6 ; 8.3.9 (logistique)

8.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) présente les étapes du projet et ses parties prenantes (séquence 2) et les acteurs des politiques de santé (séquence 3). Il ne détaille pas la planification ni le

budget, qui viennent du guide de 2025. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours
Essentiels S2 §2 (p. 10 et 11) — *Contenu CNED :* Parties prenantes : équipe, partenaires, usagers ; étapes du diagnostic à l'évaluation (doc. 3) ; *Où dans ce cours :* 8.3.2 (parties prenantes, encadré « Repères » du CNED) ; 8.3.1
Essentiels S2 §2 (p. 12) — *Contenu CNED :* Communication et valorisation tout au long du projet ; cadre à respecter ; *Où dans ce cours :* 8.3.7 (plan de communication) ; 8.3.12 (convention) ; chapitre 6
Essentiels S3 §1.1 (p. 13) — *Contenu CNED :* Quatre types d'acteurs : consultatifs, décideurs, opérateurs, financeurs ; *Où dans ce cours :* 8.3.2 (encadré « Repères » du CNED) ; 8.3.3 (financeurs)
Essentiels S3 §1.2 (p. 14) — *Contenu CNED :* Priorité sanitaire, programme, planification ; *Où dans ce cours :* 8.3.1 (choisir des actions cohérentes avec les politiques) ; chapitre 7

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Instances** (p. 14 et 15) : le fascicule écrit « CRAS », « Haut Comité de santé publique » et « CNSP ». Il faut lire **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), **Haut Conseil** de la santé publique (depuis 2004) et **CNS** (Conférence nationale de santé).
- **Politiques de référence** : un projet de 2026 s'appuie sur le **PNNS 5** et le **PNA 4** (2026-2030, lancés le 8 avril 2026) et sur la SNANC 2025-2030, et non sur le PNNS 4 (2019-2023) ; les annales du chapitre ont été corrigées.
- **Financements vérifiés en octobre 2026** : le formulaire de demande de subvention reste le Cerfa n° 12156*06 (compte rendu : Cerfa n° 15059) ; le programme « Mieux manger pour tous » a publié ses appels à projets 2026 ; le FSE+ couvre la période 2021-2027.

8.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Appels à projets** : les ARS (fonds d'intervention régional), les DRAAF (programme national pour l'alimentation, PNA 4 2026-2030) et les services de l'État chargés de la cohésion sociale (« Mieux manger pour tous ») publient leurs appels à projets chaque année, avec des priorités et des calendriers propres : consultez leurs sites en début d'année.
- **Demandes de subvention** : le formulaire Cerfa n° 12156*06 et le service en ligne « Le Compte Asso » sont les outils de référence pour les associations (version en vigueur en octobre 2026 ; compte rendu financier : Cerfa n° 15059).
- **Interventions probantes** : le répertoire de Santé publique France des interventions efficaces ou prometteuses est enrichi régulièrement : consultez-le avant de choisir une action.
- **Outils numériques** : avant d'utiliser un logiciel de gestion de projet ou un formulaire en ligne pour des données personnelles, vérifiez les recommandations de la CNIL et la politique de votre structure (voir la partie « Utiliser les outils numériques du projet » de ce cours).

8.3.1 Choisir les stratégies et les actions

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S3 §1.2 (p. 14)

Combiner plusieurs stratégies

Les objectifs spécifiques (chapitre 7) indiquent **ce qui doit changer** ; les stratégies indiquent **par quels leviers**. Les interventions les plus efficaces en nutrition **combinent** plusieurs leviers (Charte d'Ottawa, chapitre 1) : une action purement informative change peu les comportements, surtout chez les publics défavorisés.

Stratégie · Exemples en nutrition · Facteurs visés (PRECEDE)
Éducation pour la santé — *Exemples en nutrition :* Ateliers culinaires, dégustations, groupes de parole, éducation sensorielle ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Prédisposants (connaissances, attitudes) et facilitants (compétences)
Action sur l'environnement — *Exemples en nutrition :* Eau en carafe, fruits à la récréation, menus améliorés, partenariat avec l'épicerie solidaire, jardin partagé ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Facilitants (accessibilité, prix, offre)
Renforcement du lien social et de l'entourage — *Exemples en nutrition :* Mamans relais, repas partagés, implication des familles ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* De renforcement
Participation et développement du pouvoir d'agir — *Exemples en nutrition :* Comité d'usagers, choix des recettes par les familles, habitants enquêteurs ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Tous ; empowerment
Plaidoyer — *Exemples en nutrition :* Note au CLS sur l'offre alimentaire du quartier, demande de navette vers le marché ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Environnement, politiques
Formation des relais — *Exemples en nutrition :* Formation des animateurs périscolaires, des aides à domicile ; *Facteurs visés (PRECEDE) :* Facilitants ; démultiplication

Méthode pas à pas – Choisir une action : 6 questions

1. Cohérence : l'action répond-elle à un objectif spécifique (et à une cause de l'arbre) ?

2. Efficacité : existe-t-il des preuves ou des retours d'expérience (portail des interventions probantes de Santé publique France, littérature, évaluations d'actions similaires) ?

3. Adaptation au public : littératie, langue, culture, horaires, budget, mobilité (chapitres 4 et 5) ?

4. Faisabilité : compétences, locaux, matériel, temps, budget ?

5. Acceptabilité et participation : les personnes ont-elles été consultées ?

6. Éthique : non-stigmatisation, équité, indépendance (chapitre 6) ?

Décrire une action : la méthode QQOQCCP

Question · Ce qu'on précise · Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls

Quoi ? — *Ce qu'on précise :* Nature de l'action, contenu ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Atelier culinaire « Repas complet petit budget »

Qui ? — *Ce qu'on précise :* Public ; animateurs ; partenaires ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* 12 familles ; Inès et la diététicienne ; l'épicerie fournit les légumes secs

Où ? — *Ce qu'on précise :* Lieu, accessibilité ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Cuisine pédagogique du centre social, rez-de-chaussée

Quand ? — *Ce qu'on précise :* Date, horaire, durée, fréquence ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Mardi 28 mars 2028, 9 h – 12 h

Comment ? — *Ce qu'on précise :* Méthodes, outils, déroulé ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Photo-expression, réalisation en 3 groupes, dégustation, calcul du coût (conducteur F7)

Combien ? — *Ce qu'on précise :* Moyens humains, matériels, coût ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* 2 animatrices ; 16,55 € de denrées ; 6 h de préparation

Pourquoi ? — *Ce qu'on précise :* Objectif visé ; *Exemple : atelier n° 3 du projet des Tilleuls :* Objectif spécifique 1 (légumes secs) et 2 (connaissances petit budget)

Définition – Fiche projet

Document de synthèse (1 à 2 pages) qui présente le projet à un partenaire, à un financeur ou à un jury : intitulé, porteur, contexte et constats, public, objectifs, actions, partenaires, calendrier, évaluation, budget (fiche **F4**). Elle sert de base à la réponse aux appels à projets.

De l'arbre à problèmes au plan d'action : la chaîne logique

Un plan d'action solide ne commence pas par une liste d'idées d'ateliers. Il commence par les **causes** retenues dans l'arbre à problèmes (chapitre 7). Chaque cause sur laquelle le projet veut agir devient un **objectif spécifique** ; chaque objectif spécifique appelle une ou plusieurs **stratégies** ; chaque stratégie se traduit en **actions** concrètes, et chaque action reçoit un **indicateur** de suivi. Cette chaîne garantit que rien n'est fait « pour faire » et que rien d'important n'est oublié.

Cause retenue (arbre à problèmes) · Objectif spécifique · Stratégie · Action · Indicateur de suivi

Les parents ne savent pas cuisiner les légumes secs — *Objectif spécifique :* Augmenter la part des familles qui cuisinent des légumes secs chaque semaine ; *Stratégie :* Éducation pour la santé ; *Action :* Quatre ateliers « légumes secs en 30 minutes » ; *Indicateur de suivi :* Nombre d'ateliers réalisés ; taux de présence

Le seul commerce proche vend peu de produits frais, à prix élevé — *Objectif spécifique :* Améliorer l'accès aux fruits et aux légumes frais ; *Stratégie :* Action sur l'environnement ; *Action :* Marché de producteurs mensuel sur la place ; panier à prix solidaire ; *Indicateur de suivi :* Nombre de marchés ; nombre de paniers vendus

Les parents se sentent seuls face aux refus des enfants — *Objectif spécifique :* Renforcer le soutien entre parents ; *Stratégie :* Lien social ; *Action :* Groupe de parole mensuel avec la PMI ; *Indicateur de suivi :* Nombre de séances ; nombre de parents présents

Les familles ne sont jamais consultées sur les actions du quartier — *Objectif spécifique :* Associer les familles aux choix du projet ; *Stratégie :* Participation ; *Action :* Comité de quatre parents au comité de pilotage ; *Indicateur de suivi :* Nombre de réunions avec les parents ; décisions prises sur leur proposition

Le tableau se lit dans les deux sens. De gauche à droite, il répond à la question **« comment ? »** : comment agir sur cette cause ? De droite à gauche, il répond à la question **« pourquoi ? »** : pourquoi faire cette action ? Si une action ne peut pas être reliée à une cause, elle est « orpheline » : on la supprime ou on la rattache à un objectif. Si une cause importante n'a aucune action, le projet a un angle mort.

Méthode pas à pas – Construire la chaîne logique en cinq étapes

1. Reprendre l'arbre à problèmes validé et entourer les causes sur lesquelles le projet peut agir (critères de faisabilité et de priorité, chapitre 7).

2. Transformer chaque cause en objectif spécifique SMART : la cause négative devient un changement positif mesurable.

3. Choisir une ou deux stratégies par objectif, en veillant à combiner, sur l'ensemble du projet, des stratégies individuelles (éducation) et collectives (environnement, lien social, plaidoyer).

4. Décrire chaque action avec la méthode QQOQCCP (8.3.1) et vérifier sa faisabilité.

5. Associer un indicateur de suivi à chaque action ; les indicateurs de résultat, liés aux objectifs, sont préparés pour l'évaluation (chapitre 9).

Attention – Une action peut servir plusieurs objectifs

Un atelier culinaire peut à la fois donner un savoir-faire (objectif 1) et créer du lien entre parents (objectif 3). C'est un avantage, à condition de le prévoir : on choisit alors des méthodes qui servent les deux objectifs (travail en binômes, repas pris ensemble) et on suit les deux indicateurs. À l'inverse, un projet dont toutes les actions sont des ateliers n'agit que sur les facteurs individuels, même s'il en organise beaucoup.

Exemple – Une chaîne logique incomplète, repérée en comité technique

Dans un projet sur l'alimentation de personnes âgées vivant seules (CCAS fictif), l'arbre retenait trois causes : la difficulté à faire les courses sans voiture, la perte d'envie de cuisiner pour soi seul, et la méconnaissance des besoins en protéines après 70 ans. Le plan proposait cinq conférences et une distribution de livrets. Le comité technique a constaté que la première cause n'avait aucune action, et que la deuxième était traitée par une information alors qu'elle relève du lien social. Le plan a été complété par une navette solidaire vers le marché (environnement) et par des repas partagés mensuels (lien social) ; deux conférences sur cinq ont été remplacées par

des ateliers.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.1

Dans une école de production (structure fictive qui forme des jeunes de 15 à 18 ans en atelier), l'arbre à problèmes retient trois causes du saut du petit-déjeuner : les horaires de transport très matinaux, l'absence de produits du petit-déjeuner dans les placards en fin de mois, et l'idée qu'un petit-déjeuner « prend trop de temps ». Pour chaque cause, proposez un objectif spécifique, une stratégie, une action et un indicateur de suivi.

Corrigé

Exemple de réponse. Horaires matinaux : augmenter la part de jeunes qui prennent un petit-déjeuner avant de partir ; stratégie d'action sur l'environnement ; un « petit-déjeuner d'atelier » servi à l'arrivée, de 7 h 45 à 8 h, dans la salle de pause ; indicateur : nombre de portions prises chaque semaine. Placards vides en fin de mois : améliorer l'accès aux produits de base ; environnement et partenariat ; convention avec l'épicerie sociale pour un panier petit-déjeuner à prix réduit ; indicateur : nombre de paniers retirés. « Trop de temps » : faire évoluer cette représentation ; éducation pour la santé ; défi « petit-déjeuner en 5 minutes » avec dégustation ; indicateur : nombre de participants au défi.

S'appuyer sur des interventions qui ont fait leurs preuves

Avant d'inventer une action, le professionnel cherche si des interventions comparables ont déjà été **évaluées**. C'est le deuxième critère de choix d'une action (efficacité). Santé publique France met en ligne un **répertoire des interventions efficaces ou prometteuses** en prévention et promotion de la santé : chaque fiche décrit l'intervention, son public, ses résultats et le niveau de preuve. Les revues de la littérature, les évaluations publiées par les instances régionales de promotion de la santé et les retours d'expérience des réseaux locaux complètent cette recherche.

Définition – Intervention probante, intervention prometteuse

Une intervention **probante** a montré son efficacité dans des évaluations de bonne qualité, si possible répétées. Une intervention **prometteuse** a donné des résultats encourageants, mais avec un niveau de preuve plus faible (évaluation unique, petit échantillon, absence de groupe de comparaison). Les deux peuvent inspirer un projet, à condition de dire clairement sur quoi l'on s'appuie.

Transférer une action : garder les fonctions clés, adapter la forme

Une intervention efficace dans un contexte ne l'est pas forcément dans un autre : le public, les ressources et l'environnement changent. Pour transférer une action, on distingue ce qui la fait marcher et ce qui peut changer. Les chercheurs parlent de **fonctions clés** (ce que l'action doit produire, par exemple « donner un savoir-faire pratique » ou « créer un soutien entre pairs ») et de **forme** (la manière concrète de le faire : durée, lieu, support, animateur). Hawe et ses collègues ont proposé cette distinction en 2004 (*British Medical Journal*) : on peut adapter la forme, à condition de préserver les fonctions clés.

Élément de l'action d'origine · Fonction clé (à garder) · Forme (adaptable)

Six ateliers culinaires de 3 heures en centre social — *Fonction clé (à garder) :* Pratique répétée d'un geste culinaire, avec dégustation ; *Forme (adaptable) :* Quatre ateliers de 2 heures dans la cuisine d'une résidence

Recettes choisies par les participantes — *Fonction clé (à garder) :* Participation au choix du contenu ; *Forme (adaptable) :* Recettes proposées par un comité de résidents

Animation par une diététicienne et une mère relais — *Fonction clé (à garder) :* Présence d'un pair qui partage l'expérience du public ; *Forme (adaptable) :* Co-animation par un résident volontaire

Livret de recettes remis à la fin — *Fonction clé (à garder) :* Support pour refaire à la maison ; *Forme (adaptable) :* Fiches avec photos et pictogrammes, ou vidéos courtes

Pour analyser la **transférabilité**, une équipe française a construit la grille ASTAIRE (Cambon et ses collègues, *BMC Public Health*, 2013). Elle invite à comparer le contexte d'origine et le nouveau contexte sur quatre familles de critères : la **population** (caractéristiques, besoins, attentes), l'**environnement** (ressources, partenaires, politiques), la **mise en œuvre** (compétences des intervenants, moyens) et le **soutien au transfert** (accompagnement, formation). Plus les écarts sont grands, plus l'adaptation doit être réfléchie et évaluée.

Astuce – Citer ses sources dans le dossier

Dans le dossier de projet et devant le jury, une phrase suffit souvent : « Cette action s'inspire de l'intervention X, décrite dans le répertoire de Santé publique France (consulté le…), dont nous avons gardé la pratique répétée et la participation, et adapté la durée et le lieu. » Elle montre que le choix est réfléchi et que l'on connaît ses limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.2

Une association veut reprendre, dans des villages ruraux, une action évaluée en ville : un « marché mobile » de fruits et de légumes à prix réduit, accompagné de dégustations, installé une fois par semaine au pied des immeubles. Identifiez deux fonctions clés de cette action, puis proposez deux adaptations de forme pour le milieu rural.

Corrigé

Fonctions clés : rendre les fruits et légumes **accessibles** (proximité et prix réduit) ; donner envie de les **goûter et de les cuisiner** (dégustation, idées de recettes). Adaptations de forme : une tournée qui s'arrête sur la

place de chaque village à jour fixe, au moment de la sortie de l'école ou du marché existant ; une commande possible par téléphone pour les personnes qui ne se déplacent pas, avec un portage par des bénévoles ; des recettes adaptées aux produits de saison des producteurs locaux.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.1 – Les stratégies et les actions

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six stratégies d'intervention présentées dans le cours.
2. Quelles sont les sept questions de la méthode QQOQCCP ?
3. Qu'est-ce qu'une action « orpheline », et que faut-il en faire ?
4. Citez quatre des six questions qui aident à choisir une action.
5. Que signifie « garder les fonctions clés » quand on transfère une action ?
6. Pourquoi une action purement informative est-elle insuffisante, surtout auprès des publics défavorisés ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.1

1. Éducation pour la santé ; action sur l'environnement ; lien social et entourage ; participation et pouvoir d'agir ; plaidoyer ; formation des relais.
2. Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
3. Une action qui ne répond à aucun objectif spécifique ; on la supprime ou on la rattache explicitement à un objectif.
4. Cohérence, efficacité, adaptation au public, faisabilité, acceptabilité et participation, éthique (quatre suffisent).
5. Préserver ce qui fait l'efficacité de l'action (par exemple la pratique répétée), tout en adaptant sa forme (durée, lieu, support) au nouveau contexte.
6. L'information ne lève ni les freins d'accès (prix, offre, transport), ni le manque de savoir-faire, ni l'absence de soutien ; les personnes qui ont le plus de ressources en profitent davantage, ce qui peut creuser les inégalités.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.2.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le tableau des stratégies et la chaîne logique.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.1 et je refais les exercices d'application.

8.3.2 Les parties prenantes et le partenariat

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S3 §1.1 (p. 13)

Définition – Partie prenante et partenaire

Une **partie prenante** est toute personne ou organisation **concernée** par le projet ou **susceptible de l'influencer** : public, professionnels, structures, élus, financeurs, commerçants. Un **partenaire** est une partie prenante qui **s'engage** dans le projet en apportant des ressources (temps, locaux, produits, financement, orientation du public) selon des modalités définies.

Cartographier et analyser les parties prenantes

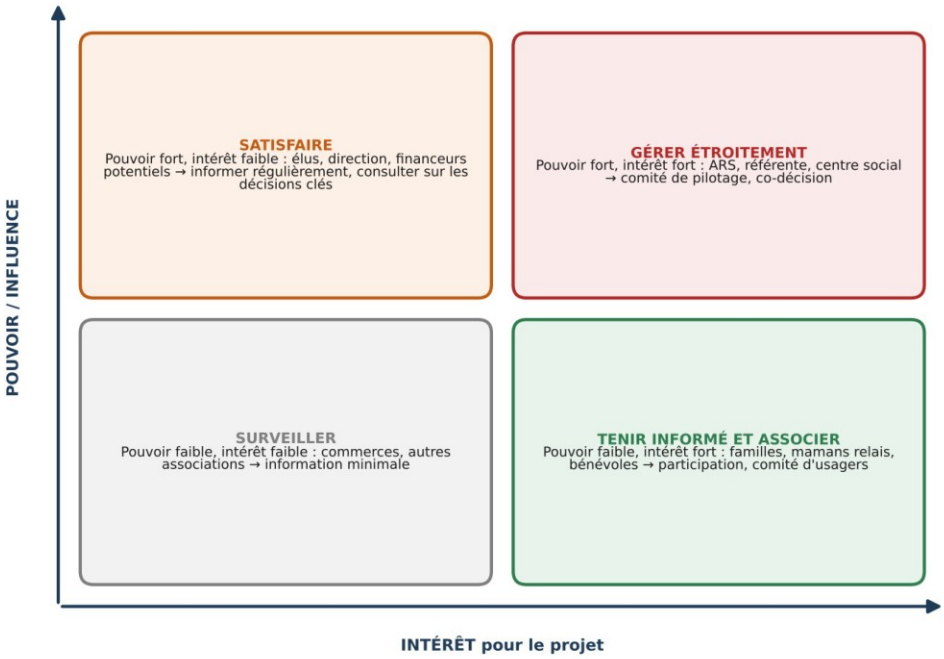


Figure 8.1 – La matrice pouvoir/intérêt des parties prenantes

Comprendre le schéma – Figure 8.1

1. Chaque partie prenante est placée selon son **pouvoir** (capacité à décider, financer, bloquer) et son **intérêt** pour le projet (d'après la grille de Mendelow).

2. Pouvoir fort, intérêt fort (ARS financeur, direction et référente du centre social) : à **gérer étroitement** ; ils siègent au comité de pilotage et participent aux décisions.

3. Pouvoir fort, intérêt faible (élus, direction de la CAF) : à **satisfaire** ; on les informe des avancées et on les consulte sur les décisions qui les concernent (communication institutionnelle, invitation au temps fort).

4. Pouvoir faible, intérêt fort (familles, mamans relais, bénévoles) : à **associer** et tenir informés ; ce sont les premiers concernés, leur participation est une exigence (chapitre 6).

5. Pouvoir faible, intérêt faible (commerces voisins) : à **surveiller**, avec une information minimale ; leur position peut évoluer (un commerce peut devenir partenaire).

6. La matrice est **dynamique** : on la met à jour au cours du projet.

Répartir les rôles : la matrice RACI

Tâche · Inès (étudiante) · Diététicienne · Référente familles · Épicerie · COPIL

Diagnostic — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* C ; *COPIL :* I

Dossier d'appel à projets — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* I ; *COPIL :* I

Conception des ateliers — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* I ; *COPIL :* –

Animation ateliers 1 à 3 — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* R ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* – ; *COPIL :* –

Animation ateliers 4 à 6 — *Inès (étudiante) :* C ; *Diététicienne :* R ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* – ; *COPIL :* –

Orientation des familles — *Inès (étudiante) :* I ; *Diététicienne :* I ; *Référente familles :* R ; *Épicerie :* R ; *COPIL :* –

Évaluation — *Inès (étudiante) :* R ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* A ; *Épicerie :* I ; *COPIL :* I

Validation des étapes — *Inès (étudiante) :* C ; *Diététicienne :* C ; *Référente familles :* R ; *Épicerie :* C ; *COPIL :* A

R = réalise ; A = approuve, rend compte (une seule personne A par tâche) ; C = consulté ; I = informé.

Formaliser le partenariat

Outil · Contenu

Convention de partenariat — *Contenu :* Objet ; engagements de chaque partie (ressources, moyens, temps) ; durée ; communication (logos, mentions) ; confidentialité et RGPD ; évaluation ; conditions de résiliation ; signatures

Comité de pilotage (COPIL) — *Contenu :* Instance de décision : porteur, partenaires principaux, financeurs, représentants des usagers ; 2 à 3 réunions (lancement, mi-parcours, bilan)

Comité technique / équipe projet — *Contenu :* Instance d'organisation et de mise en œuvre ; réunions fréquentes ; suivi du

Comité d'usagers — *Contenu :* Participation des personnes concernées (choix des thèmes, avis sur les supports)

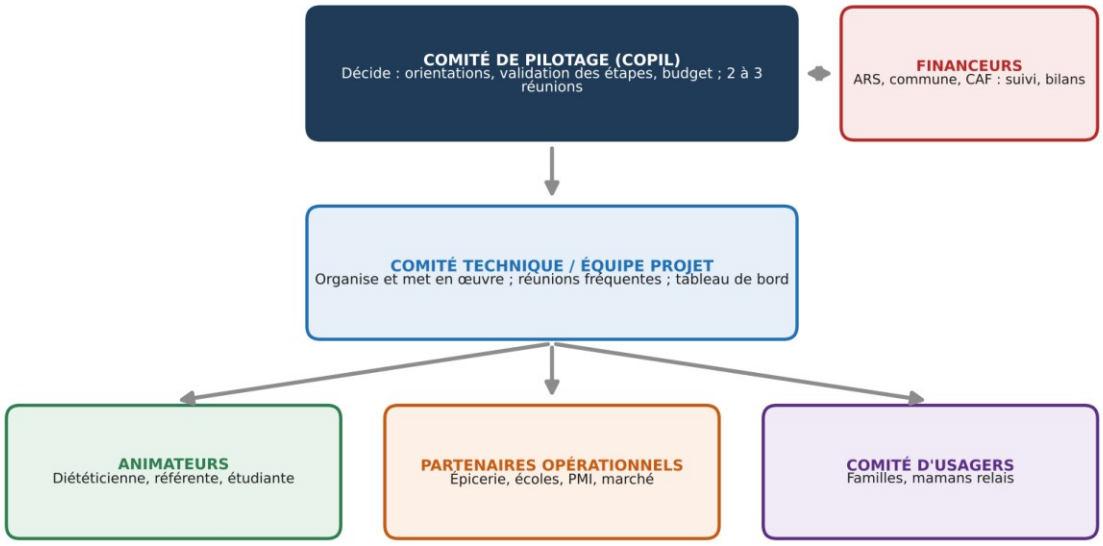


Figure 8.2 – L'organisation du pilotage d'un projet

Attention – Un partenariat se construit

Un partenaire ne s'implique que s'il y trouve un **intérêt** pour sa propre mission (l'épicerie veut que les légumes secs soient utilisés ; l'école veut associer les parents). Présenter le projet en montrant ce qu'il **apporte** au partenaire, rester disponible, respecter ses contraintes, l'associer aux décisions et lui **restituer** les résultats sont les clés d'un partenariat durable.

Analyser chaque partie prenante en profondeur

La matrice pouvoir/intérêt donne une vue d'ensemble. Pour les parties prenantes les plus importantes, on va plus loin avec une **fiche d'analyse** : que veut cette personne ou cette structure ? Que peut-elle apporter ? Que craint-elle ? Comment l'associer ? Ce travail évite deux erreurs fréquentes : supposer que tout le monde partage les objectifs du projet, et oublier une partie prenante capable de le bloquer.

Question · Ce que l'on cherche · Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner

Quelle est sa mission ? — *Ce que l'on cherche :* Ce qui guide ses décisions ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Réussite des élèves, sécurité, relations avec les familles

Quel intérêt peut-il trouver au projet ? — *Ce que l'on cherche :* Le point de rencontre avec ses propres objectifs ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Moins de malaises et de baisses d'attention en fin de matinée

Que peut-il apporter ? — *Ce que l'on cherche :* Les ressources concrètes ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Une salle, un créneau dans l'emploi du temps, l'accord pour informer les parents

Que craint-il ? — *Ce que l'on cherche :* Les freins, souvent non dits ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Surcharge des équipes, responsabilité en cas d'allergie, réaction des parents

Quel est son pouvoir sur le projet ? — *Ce que l'on cherche :* Sa capacité à décider ou à bloquer ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Il peut refuser l'accès à l'établissement

Comment l'associer ? — *Ce que l'on cherche :* La modalité adaptée ; *Exemple : le principal d'un collège sollicité pour un projet sur le petit-déjeuner :* Le rencontrer avant tout dépôt de dossier ; l'inviter au comité de pilotage ; lui proposer un protocole allergies écrit

Méthode pas à pas – Préparer la rencontre avec un futur partenaire

1. Se renseigner sur la structure : missions, public, projets en cours, personnes à rencontrer.

2. Préparer un message court : le constat (deux ou trois chiffres), l'objectif du projet, ce que l'on attend du partenaire, et surtout ce que le projet peut lui apporter.

3. Écouter ses contraintes et ses craintes avant de proposer des solutions.

4. Proposer un engagement précis et limité (une salle deux matins par mois, une orientation de familles) plutôt qu'une participation vague.

5. Laisser une trace : un courriel de remerciement qui reprend ce qui a été convenu, puis, si l'engagement se confirme, une lettre d'engagement ou une convention.

Attention – Les parties prenantes « cachées »

Certaines parties prenantes ne figurent sur aucun organigramme, mais elles comptent : l'agent d'entretien qui ferme la salle à 17 h, la gardienne d'immeuble qui connaît toutes les familles, la secrétaire qui gère les réservations, le conjoint qui décide des courses. Les oublier peut faire échouer une action bien conçue. Pendant le diagnostic, on demande systématiquement : « Qui d'autre pourrait aider ou gêner ce projet ? »

Exemple – Une crainte levée, un partenaire gagné

Une diététicienne voulait organiser des dégustations de fruits dans le hall d'une maison de santé. Le médecin coordinateur hésitait. En l'écoutant, elle a compris qu'il craignait la gêne pour les patients en salle d'attente et le

risque d'hygiène. Elle a proposé un créneau le mercredi après-midi, quand il n'y a pas de consultation, avec des fruits préparés devant le public sur un plan de travail désinfecté. Le médecin a accepté et a proposé lui-même d'orienter ses patients diabétiques vers l'atelier suivant.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.3

Un service de santé au travail veut installer des fontaines à eau et un distributeur de fruits dans une blanchisserie industrielle (fictive). Remplissez la fiche d'analyse (mission, intérêt, apport, crainte, pouvoir, modalité) pour deux parties prenantes : le directeur de l'entrepôt et les représentants du personnel.

Corrigé

Directeur : mission, productivité et sécurité ; intérêt, moins d'accidents et d'absences liés à la fatigue et à la déshydratation ; apport, financement et emplacement des équipements ; crainte, coût et temps de pause supplémentaire ; pouvoir fort (il décide) ; modalité, le rencontrer avec des chiffres (relevé des malaises, coût d'une fontaine) et l'inviter au comité de pilotage. Représentants du personnel : mission, défendre la santé et les conditions de travail des salariés ; intérêt fort ; apport, relais auprès des équipes et connaissance des postes ; crainte, que l'action serve à surveiller les pauses ou culpabilise les salariés ; pouvoir moyen (ils peuvent soutenir ou dénoncer le projet) ; modalité, les associer dès le diagnostic et à la rédaction des messages.

Faire vivre le partenariat dans la durée

Signer une convention ne suffit pas. Un partenariat se **construit**, s'**entretient** et se **termine** proprement. Trois outils l'organisent, du plus léger au plus formel.

Outil · Quand l'utiliser · Contenu

Courriel de confirmation — *Quand l'utiliser :* Après une première rencontre, pour un engagement ponctuel ; *Contenu :* Ce qui a été convenu, les dates, le contact

Lettre d'engagement (ou lettre de soutien) — *Quand l'utiliser :* Pour un dossier de financement : elle prouve au financeur que le partenaire s'engage ; *Contenu :* Nom et signature du responsable, nature de l'engagement (orientation, locaux, temps, produits), durée

Convention de partenariat — *Quand l'utiliser :* Pour un engagement durable ou qui comporte des moyens importants, des données ou de l'argent ; *Contenu :* Objet, engagements, durée, communication, données, suivi, résiliation, signatures (8.3.12)

Prévenir et gérer les désaccords

Les partenaires n'ont pas les mêmes contraintes ni le même calendrier. Des tensions apparaissent souvent sur quatre sujets : le **partage du travail** (« c'est toujours nous qui faisons tout »), la **visibilité** (« notre logo n'apparaît pas »), le **calendrier** (« vous nous prévenez trop tard ») et les **résultats** (« on ne sait jamais ce que deviennent les familles qu'on vous envoie »). On les prévient en écrivant les engagements de chacun, en partageant le calendrier dès le début, en validant ensemble les supports et en restituant régulièrement les résultats, sous une forme agrégée et anonyme.

Méthode pas à pas – Traiter un désaccord entre partenaires

1. Séparer les faits des interprétations : qu'est-ce qui s'est passé exactement ?

2. Écouter chaque point de vue sans chercher un coupable, de préférence en réunion et non par courriel.

3. Revenir à l'objectif commun et aux engagements écrits.

4. Chercher une solution qui respecte les contraintes de chacun, puis la noter dans le compte rendu (qui fait quoi, pour quand).

5. Si le désaccord persiste, le porter au comité de pilotage, qui arbitre.

Lien diététique – Le diététicien, partenaire et non prestataire

Quand une structure sollicite un diététicien pour « faire un atelier », le risque est de devenir un simple prestataire, sans lien avec le reste du projet. Le diététicien gagne à demander où se situe l'atelier dans le projet, quels objectifs il sert, qui sont les participants et comment les résultats seront suivis. Il devient alors un partenaire qui contribue à la cohérence de l'ensemble. La participation des personnes concernées aux instances, et ses exigences éthiques, sont traitées au chapitre 6.

Exemple – Une fin de partenariat bien gérée

Une épicerie solidaire qui orientait des familles vers des ateliers a dû réduire son activité faute de bénévoles. Plutôt que de laisser le partenariat s'éteindre sans explication, la coordinatrice du projet a proposé une dernière réunion : bilan des orientations (23 familles en deux ans), remerciements écrits, mention du partenariat dans le rapport annuel et accord pour reprendre contact si l'épicerie retrouvait des bénévoles. Un an plus tard, l'épicerie a repris les orientations.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.4

Une PMI oriente depuis six mois des familles vers les ateliers d'un centre social. L'infirmière puéricultrice se plaint : « On ne sait jamais si les familles sont venues, ni ce qu'elles en ont pensé. » Proposez trois mesures pour répondre à cette plainte, en respectant la confidentialité.

Corrigé

Exemples : transmettre chaque trimestre un bilan agrégé (nombre de familles orientées par la PMI, nombre venues, taux de présence, satisfaction globale), sans nom ; proposer aux familles, avec leur accord écrit, que le centre

social informe la PMI de leur participation ; inviter l'infirmière à un atelier ou au comité de pilotage et présenter les résultats lors d'une réunion commune ; prévoir ce retour dans la convention (article « suivi et évaluation »).

Repères – Les acteurs d'une politique de santé et le conducteur de séance (CNED)

- **Quatre types d'acteurs** (CNED, Essentiels, séquence 3) : les acteurs **consultatifs** donnent un avis (HCSP, CNS, CRSA, Conseil national de l'alimentation) ; les acteurs **décideurs** prennent les décisions (État, ministères, Parlement, ARS) ; les acteurs **opérateurs** mettent en œuvre (Santé publique France, collectivités, associations, professionnels de santé) ; les acteurs **financeurs** paient (Assurance maladie, État, collectivités, mutuelles). Dans la matrice pouvoir/intérêt, un même partenaire peut jouer plusieurs rôles : une ARS décide, finance par le FIR et siège au comité de pilotage.
- **Parties prenantes** (CNED, séquence 2) : l'équipe du projet, les partenaires (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier) et les usagers, futurs bénéficiaires du projet.
- **Conducteur de séance** (guide 2025, p. 63) : c'est le plan minuté d'une séance d'atelier (étapes, durées, activités, méthodes, rôles, matériel, évaluation). Le plan d'action dit **quels** ateliers ont lieu et **quand** ; le conducteur dit **comment** se déroule chacun. Il est traité en détail au chapitre 10.
- **Communication et valorisation** : elles accompagnent toute la vie du projet ; le plan de communication (8.3.7) les prévoit dès la conception.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.2 – Les parties prenantes et le partenariat

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre une partie prenante et un partenaire ?
2. Dans la matrice pouvoir/intérêt, que fait-on des parties prenantes à pouvoir fort et à intérêt faible ?
3. Dans une matrice RACI, combien de personnes peuvent être « A » pour une même tâche ?
4. Quel est le rôle du comité de pilotage ? Celui du comité technique ?
5. À quoi sert une lettre d'engagement dans un dossier de financement ?
6. Citez trois sujets fréquents de désaccord entre partenaires.

Corrigé – Point d'étape 8.3.2

1. Une partie prenante est concernée par le projet ou peut l'influencer ; un partenaire s'engage et apporte des ressources selon des modalités définies.
2. On les satisfait : on les informe des avancées et on les consulte sur les décisions qui les concernent.
3. Une seule.
4. Le comité de pilotage décide et arbitre ; le comité technique organise, suit le tableau de bord et prépare les décisions.
5. Elle prouve au financeur que le partenaire s'engage réellement (nature, durée, signature du responsable).
6. Le partage du travail, la visibilité, le calendrier, le retour sur les résultats (trois suffisent).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.3.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la matrice pouvoir/intérêt et la matrice RACI.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.2 et je refais les exercices d'application.

8.3.3 Les financements et les appels à projets

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S3 §1.1 (p. 13)

Qui finance la prévention en nutrition ?

Financeur · Ce qu'il finance · Modalités

ARS – fonds d'intervention régional (FIR) — *Ce qu'il finance :* Actions de prévention et de promotion de la santé conformes au PRS (nutrition, publics prioritaires, QPV) ; le FIR est prévu par l'article L. 1435-8 du CSP ; *Modalités :* Appels à projets annuels, subventions, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM)

Collectivités (commune, intercommunalité, département, région) — *Ce qu'il finance :* Actions inscrites dans le CLS, le contrat de ville, le PAT ; restauration collective ; protection maternelle et infantile (département) ; *Modalités :* Subventions, appels à projets, mise à disposition de locaux

Caisse d'allocations familiales (CAF) — *Ce qu'il finance :* Animation collective familles des centres sociaux, soutien à la parentalité (REAAP) ; *Modalités :* Prestations de service, appels à projets

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015) — *Ce qu'il finance :* Actions de prévention pour les 60 ans et plus (nutrition, activité physique, lien social) ; *Modalités :* Appels à projets départementaux

Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite — *Ce qu'il finance :* Prévention, ateliers collectifs, programmes « bien vieillir » ; *Modalités :* Appels à projets, partenariats

Fondations et mécénat — *Ce qu'il finance :* Projets innovants, précarité alimentaire, enfance ; *Modalités :* Appels à projets ; attention aux conflits d'intérêts (chapitre 6)

État (politique de la ville, alimentation) — *Ce qu'il finance :* Actions en QPV (contrat de ville) ; programmes de lutte contre la précarité alimentaire ; *Modalités :* Appels à projets nationaux ou déconcentrés

Définition – Appel à projets

Procédure par laquelle un financeur définit, dans un **cahier des charges**, des **priorités**, des **publics**, des **critères d'éligibilité et de sélection**, un **calendrier** et un **montant** disponible, et invite les porteurs à déposer

un dossier. Les dossiers sont évalués par un comité selon une grille ; les projets retenus reçoivent une subvention et s'engagent à rendre un **bilan** (compte rendu financier et d'activité).

Méthode pas à pas – Répondre à un appel à projets en 7 étapes

1. Lire le cahier des charges en entier et surligner : priorités, publics, territoires, actions éligibles et **exclues**, montant maximal, cofinancement exigé, date limite, pièces à joindre, critères de sélection.

2. Vérifier l'éligibilité du porteur (association déclarée, numéro SIRET, compte bancaire) et du projet.

3. Faire correspondre le projet aux priorités : reprendre le **vocabulaire** du financeur (PRS, publics prioritaires, réduction des inégalités).

4. Rédiger : contexte et diagnostic chiffré, objectifs SMART, actions détaillées, partenaires (lettres d'engagement), calendrier, évaluation (indicateurs), budget équilibré avec cofinancements.

5. Remplir le formulaire (souvent le Cerfa n° 12156 de demande de subvention des associations, ou la plateforme en ligne du financeur, par exemple Le Compte Asso).

6. Faire relire (référente, partenaire) et vérifier la cohérence entre objectifs, actions, indicateurs et budget.

7. Déposer avant la date limite et garder une preuve du dépôt ; préparer le bilan dès le début (indicateurs à suivre).

Ce qui fait gagner des points · Ce qui fait perdre un dossier

Diagnostic local chiffré et sourcé — *Ce qui fait perdre un dossier :* Contexte général sans données locales

Objectifs SMART reliés aux constats — *Ce qui fait perdre un dossier :* Objectifs flous (« sensibiliser »)

Public prioritaire du financeur, participation des personnes — *Ce qui fait perdre un dossier :* Public non précisé

Partenariats concrets (lettres d'engagement) — *Ce qui fait perdre un dossier :* Partenaires cités sans engagement

Évaluation prévue avec indicateurs — *Ce qui fait perdre un dossier :* Évaluation absente ou vague

Budget détaillé, équilibré, cofinancé — *Ce qui fait perdre un dossier :* Budget incohérent, financeur unique à 100 %

Pérennisation envisagée — *Ce qui fait perdre un dossier :* Projet « one shot »

Analyser un cahier des charges avec une grille

Un cahier des charges se lit avec un crayon. Les dossiers rejetés le sont souvent pour une raison simple : un public hors cible, une action exclue, une durée trop longue, une pièce manquante ou un dépôt en retard. La grille suivante aide à ne rien oublier. On la remplit avant de rédiger, puis on la relit avant de déposer.

Rubrique · Question à se poser · Où trouver la réponse

Porteurs éligibles — *Question à se poser :* Notre structure peut-elle déposer (statut, ancienneté, territoire) ? ; *Où trouver la réponse :* Article « bénéficiaires » ou « éligibilité »

Publics prioritaires — *Question à se poser :* Notre public correspond-il exactement ? Faut-il le préciser ou le recentrer ? ; *Où trouver la réponse :* Article « publics »

Actions éligibles et exclues — *Question à se poser :* Nos actions sont-elles financées ? Certaines sont-elles exclues (investissement, consultations individuelles, distribution seule) ? ; *Où trouver la réponse :* Articles « actions » et « exclusions »

Durée et calendrier — *Question à se poser :* Le projet tient-il dans la période ? Quand commence-t-il au plus tôt ? ; *Où trouver la réponse :* Article « calendrier »

Montant — *Question à se poser :* Quel taux, quel plafond, quelle assiette (base de calcul) ? Un cofinancement est-il exigé ? ; *Où trouver la réponse :* Article « financement »

Dépenses éligibles — *Question à se poser :* Les contributions en nature, le matériel, les frais de structure sont-ils pris en compte ? ; *Où trouver la réponse :* Annexe financière

Critères de sélection — *Question à se poser :* Sur quoi le comité note-t-il ? Avec quel poids ? ; *Où trouver la réponse :* Article « sélection » ou grille jointe

Pièces et modalités — *Question à se poser :* Quel formulaire, quelle plateforme, quelles pièces jointes, quelle date et quelle heure limite ? ; *Où trouver la réponse :* Article « dépôt »

Engagements — *Question à se poser :* Quel bilan, à quelle date, avec quels indicateurs ? ; *Où trouver la réponse :* Article « suivi »

Calculer le montant à demander

Le montant d'une subvention dépend de trois éléments : l'**assiette** (les dépenses que le financeur accepte de prendre en compte), le **taux** maximal et le **plafond**. La subvention possible est le plus petit des deux montants : taux × assiette, ou plafond.

Exemple – Calcul détaillé : montant d'une subvention et cofinancement

Un appel à projets (fictif) finance 70 % au plus des dépenses éligibles, dans la limite de 5 000 €. Il exclut les contributions en nature et l'achat de matériel de plus de 300 €. Le projet compte 6 800 € de charges monétaires, dont un réfrigérateur de 400 €, et 900 € de contributions en nature.

- Dépenses éligibles : 6 800 − 400 = **6 400 €** (les contributions en nature ne sont pas dans les charges monétaires ; le réfrigérateur est exclu).
- Taux appliqué : 70 % × 6 400 = **4 480 €**, inférieur au plafond de 5 000 € : subvention maximale **4 480 €**.
- Cofinancement nécessaire pour les charges monétaires : 6 800 − 4 480 = **2 320 €**, soit 2 320 / 6 800 × 100 = **34,1 %**. Il viendra d'autres financeurs, de la participation des personnes et de l'autofinancement. Le réfrigérateur doit être financé par d'autres ressources.

Attention – Demander le maximum n'est pas toujours la meilleure stratégie

Un dossier qui demande exactement le plafond, sans

cofinancement solide, inquiète le comité : il montre une forte dépendance à un seul financeur. Un montant justifié ligne par ligne, avec des cofinancements acquis, est plus convaincant. Il faut aussi vérifier que la structure pourra avancer les dépenses avant le versement (8.3.10).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.5

Avec les règles de l'exemple (70 % des dépenses éligibles, plafond de 5 000 €, matériel de plus de 300 € exclu), calculez la subvention maximale d'un projet de 9 200 € de charges monétaires, dont un four de 600 €. Calculez ensuite le cofinancement nécessaire en euros et en pourcentage des charges monétaires.

Corrigé

Dépenses éligibles : 9 200 − 600 = **8 600 €** ; 70 % × 8 600 = 6 020 €, supérieur au plafond : subvention maximale **5 000 €**. Cofinancement : 9 200 − 5 000 = **4 200 €**, soit 4 200 / 9 200 × 100 = **45,7 %** des charges monétaires. Le plafond limite ici la subvention : le porteur doit trouver près de la moitié du financement ailleurs.

Le formulaire de demande et les pièces à joindre

Les associations qui demandent une subvention à l'État, à une collectivité ou à un organisme public utilisent le plus souvent le **formulaire Cerfa n° 12156** (« Demande de subvention(s) »), sur papier ou en ligne. Le service en ligne **Le Compte Asso** permet de remplir ce formulaire et de déposer les pièces une seule fois pour plusieurs financeurs. Certains financeurs (ARS, fondations, caisses) utilisent leur propre plateforme : le cahier des charges le précise.

Partie du dossier · Ce qu'on y met · Conseil

Identification de l'association — *Ce qu'on y met :* Nom, numéro RNA (répertoire national des associations), numéro SIRET, adresse, représentant légal, personne chargée du dossier ; *Conseil :* Vérifier que les numéros sont à jour avant la date limite : leur obtention peut prendre plusieurs semaines

Moyens humains — *Ce qu'on y met :* Nombre de salariés, de bénévoles, de personnes mises à disposition ; *Conseil :* Cohérence avec le budget du projet

Budget de l'association — *Ce qu'on y met :* Budget prévisionnel de l'année ; *Conseil :* Il montre la solidité financière du porteur

Description du projet — *Ce qu'on y met :* Contexte, objectifs, public, actions, partenaires, calendrier, moyens, évaluation ; *Conseil :* Reprendre la chaîne logique et le vocabulaire du financeur

Budget du projet — *Ce qu'on y met :* Charges et produits par compte, contributions en nature ; *Conseil :* Équilibré ; financements acquis et sollicités distingués

Attestations — *Ce qu'on y met :* Déclaration sur l'honneur du représentant, montant demandé, engagement à respecter le contrat d'engagement républicain ; *Conseil :* Signée par le représentant légal ou par une personne qu'il a déléguée

Pièces jointes — *Ce qu'on y met :* Statuts, liste des dirigeants, relevé d'identité bancaire, derniers comptes approuvés, rapport d'activité ; *Conseil :* Préparer un dossier de pièces à jour, réutilisable

Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, une association qui demande une subvention publique s'engage, en signant le **contrat d'engagement républicain**, à respecter notamment la liberté de conscience, l'égalité, la dignité de la personne et l'ordre public. Cet engagement figure dans le formulaire.

Rédiger la description du projet : ce qui convainc

Rubrique · Ce qui convainc le comité · Ce qui l'inquiète

Contexte — *Ce qui convainc le comité :* Trois ou quatre chiffres locaux, datés et sourcés ; les besoins exprimés par le public ; *Ce qui l'inquiète :* Des généralités nationales, des adjectifs (« alarmant »)

Objectifs — *Ce qui convainc le comité :* Un objectif général, des objectifs spécifiques SMART reliés aux constats ; *Ce qui l'inquiète :* « Sensibiliser », « informer », sans valeur cible

Actions — *Ce qui convainc le comité :* Des actions décrites (QQOQCCP), qui combinent plusieurs stratégies ; *Ce qui l'inquiète :* Une liste d'ateliers sans lien avec les objectifs

Public et participation — *Ce qui convainc le comité :* Un nombre de personnes, un mode de recrutement, une participation au choix des actions ; *Ce qui l'inquiète :* « Tout public », ou un public qui ne correspond pas aux priorités

Partenaires — *Ce qui convainc le comité :* Des engagements précis, avec lettres jointes ; *Ce qui l'inquiète :* Une liste de noms sans engagement

Évaluation — *Ce qui convainc le comité :* Des indicateurs de processus et de résultat, une méthode de recueil ; *Ce qui l'inquiète :* Une évaluation limitée à la satisfaction

Budget — *Ce qui convainc le comité :* Des lignes justifiées (quantité × coût unitaire), un cofinancement ; *Ce qui l'inquiète :* Une ligne « divers » importante, un financeur unique

Astuce – Le résumé en cinq lignes

Beaucoup de plateformes demandent un résumé du projet en quelques lignes. C'est souvent le seul texte que tous les membres du comité lisent en entier. Écrivez-le en dernier, et répondez dans l'ordre à cinq questions : quel problème, pour qui, quelles actions, avec qui, quels résultats attendus.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.6

Réécrivez ce résumé pour le rendre convaincant : « Notre association souhaite sensibiliser les habitants à l'importance d'une bonne alimentation, car la malbouffe est un fléau. Nous organiserons des ateliers. »

Données disponibles : quartier de 3 400 habitants ; 44 % des 120 familles interrogées en 2026 disent manquer d'idées de repas à petit prix ; projet de huit ateliers pour 12 familles, avec l'épicerie sociale et la PMI ; objectif : que la moitié des familles cuisinent au moins deux nouveaux plats à base de légumes chaque mois.

Corrigé

Exemple : « Dans le quartier des Peupliers (3 400 habitants), 44 % des 120 familles interrogées en 2026 disent manquer d'idées de repas à petit prix. Avec l'épicerie sociale et la PMI, notre association propose à 12

familles huit ateliers culinaires construits avec elles, à partir des produits disponibles à l'épicerie. Nous visons qu'à la fin du cycle, au moins la moitié des familles cuisinent chaque mois au moins deux nouveaux plats à base de légumes. Les présences et les pratiques seront mesurées avant et après le cycle. » Les mots « malbouffe » et « fléau » sont supprimés : ils jugent les personnes sans rien prouver.

Après la décision : convention, versements et compte rendu

Obtenir une subvention crée des **obligations**. Le porteur doit utiliser l'argent pour le projet décrit, dans la période prévue, et en rendre compte. Les connaître dès la conception évite de mauvaises surprises au moment du bilan.

Étape · Ce qui se passe · Ce que fait le porteur

Notification — *Ce qui se passe :* Le financeur informe de sa décision et du montant accordé, parfois inférieur à la demande ; *Ce que fait le porteur :* Si le montant est réduit, il ajuste le projet ou cherche un complément, et il le signale

Convention ou arrêté attributif — *Ce qui se passe :* Document qui fixe l'objet, le montant, le calendrier des versements et les obligations. Pour l'État et les collectivités, une convention est obligatoire au-delà de 23 000 € par an (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 10, et décret n° 2001-495 du 6 juin 2001) ; *Ce que fait le porteur :* Il la lit, la signe et note les dates de bilan

Versements — *Ce qui se passe :* Souvent un acompte à la signature, le solde après le bilan ; *Ce que fait le porteur :* Il met à jour le plan de trésorerie (8.3.10)

Mise en œuvre — *Ce qui se passe :* Le projet se déroule ; *Ce que fait le porteur :* Il conserve les justificatifs (factures, feuilles de temps, émargements) et signale toute modification importante

Compte rendu — *Ce qui se passe :* Un compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059 pour les subventions publiques) et un bilan d'activité ; *Ce que fait le porteur :* Il compare le prévu et le réalisé, explique les écarts et présente les résultats des indicateurs

Le compte rendu financier doit être transmis dans les **six mois** qui suivent la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée (article 10 de la loi du 12 avril 2000). Une subvention qui n'a pas été utilisée conformément à son objet peut devoir être **remboursée**. Les justificatifs sont conservés : le financeur peut les demander lors d'un contrôle.

Attention – Modifier un projet subventionné

Changer de public, réduire fortement le nombre d'actions, prolonger la durée ou utiliser une ligne de budget pour une autre dépense importante : ces modifications doivent être signalées au financeur **avant** d'être appliquées, par un courrier motivé. Selon leur importance, elles peuvent donner lieu à un avenant à la convention. Un financeur informé à temps accepte souvent un ajustement ; un financeur qui le découvre au bilan peut demander un remboursement.

Exemple – Un compte rendu financier commenté (extrait)

« La subvention de 2 400 € de la communauté de communes (projet fictif) a financé 85 % des denrées et la totalité des honoraires de la diététicienne. Le poste denrées présente un dépassement de 11,2 % (prix des fruits au printemps), compensé par une économie sur l'impression. Le total réalisé (5 960 €) est supérieur de 1,9 % au budget prévu. Sept ateliers sur huit ont eu lieu ; le huitième a été remplacé, avec l'accord écrit du financeur du 14 mai, par une visite du marché. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.7

Une association a reçu 3 000 € d'une collectivité pour six ateliers destinés à des personnes âgées. En cours de projet, la salle devient indisponible et l'association pense remplacer deux ateliers par une sortie au marché. Indiquez ce qu'elle doit faire, dans quel ordre, et ce qu'elle devra présenter dans son compte rendu.

Corrigé

1. Évaluer la modification : la sortie au marché sert-elle les mêmes objectifs ? Quel est son coût ? 2. Écrire au financeur **avant** la modification : constat (salle indisponible), proposition, effet sur le budget, demande d'accord. 3. Attendre sa réponse écrite (éventuellement un avenant), puis informer les participants et les partenaires. 4. Dans le compte rendu : quatre ateliers et la sortie réalisés, l'accord du financeur et sa date, les dépenses comparées au budget prévu avec l'explication des écarts, les résultats des indicateurs.

Les courriers qui accompagnent un projet

Au cours d'un projet, le chef de projet rédige plusieurs courriers : une **demande de lettre de soutien** à un partenaire, une **lettre de soutien** à faire signer, une **demande d'acompte** au financeur, un **courrier d'information** en cas de modification du projet. Ces écrits suivent les règles du courrier professionnel : expéditeur, destinataire, date, objet, formule d'appel, corps du texte en paragraphes courts, formule de politesse, signature de la personne habilitée.

Définition – Lettre de soutien

Courrier par lequel un partenaire (collectivité, association, professionnel) atteste qu'il connaît le projet, qu'il en partage les objectifs et, le plus souvent, qu'il s'engage à y contribuer d'une manière précise. Elle est jointe au dossier de financement. Une lettre de soutien utile est **précise** : elle dit ce que le partenaire apporte (orientation de familles, prêt de salle, temps de professionnel).

Exemple – Une demande d'acompte au financeur (structure et montants fictifs)

« Objet : demande de versement d'un acompte – projet

"Cuisiner ensemble à la Grange".

Madame la Directrice,

Par décision du 12 septembre 2027, vous avez attribué à notre association une subvention de 1 500 € pour le projet cité en objet, qui se déroule d'octobre 2027 à mai 2028. Les achats de matériel de cuisine, d'un montant de 650 €, doivent être réalisés en octobre, avant le premier atelier. Notre plan de trésorerie, joint à ce courrier, montre un solde négatif de 520 € fin octobre si la subvention est versée en totalité à la fin du projet.

Nous sollicitons donc le versement d'un acompte de 50 %, soit 750 €, dès la signature de la convention. Le solde serait versé après la remise du compte rendu financier.

Nous restons à votre disposition pour tout complément et vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de nos salutations distinguées.

La présidente de l'association »

Méthode – Informer un financeur d'une modification du projet

1. **Prévenir avant** de modifier, et non après, dès que l'écart est connu (8.3.6).
2. **Décrire** l'écart avec précision : ce qui était prévu, ce qui change, pourquoi.
3. **Montrer** que les objectifs restent atteignables, ou proposer de nouveaux objectifs réalistes.
4. **Chiffrer** l'effet sur le budget, en restant dans les règles de la convention (une modification importante peut nécessiter un avenant).
5. **Demander** l'accord écrit du financeur et le conserver avec la convention.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.8

Vous avez besoin d'une lettre de soutien de la PMI pour un projet d'ateliers « premiers repas » destinés aux parents de bébés de 4 à 12 mois. Rédigez les trois engagements précis que vous proposez à la PMI d'inscrire dans la lettre.

Corrigé

Exemples d'engagements précis : 1. Les puéricultrices de la PMI présentent les ateliers aux parents lors des consultations et remettent le flyer, pendant toute la durée du projet. 2. La PMI met à disposition sa salle d'activités un mercredi matin par mois, d'octobre à mars. 3. Une puéricultrice participe à deux ateliers sur six pour répondre aux questions sur le développement de l'enfant, et participe au comité de pilotage. Chaque engagement dit qui fait quoi, quand et combien, ce qui le rend vérifiable.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.3 – Les financements et les appels à projets

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre financeurs possibles d'un projet de prévention en nutrition.
2. Quel financeur s'adresse spécifiquement aux actions de prévention pour les personnes de 60 ans et plus ?
3. Une subvention est plafonnée à 3 000 € et à 60 % de 4 000 € de dépenses éligibles. Quel montant peut-on demander au plus ?
4. Quel formulaire utilise-t-on le plus souvent pour une demande de subvention associative ? Et pour le compte rendu financier ?
5. Dans quel délai le compte rendu financier d'une subvention publique doit-il être transmis ?
6. Que faire si l'on doit modifier un projet subventionné ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.3

1. ARS (fonds d'intervention régional), collectivités, CAF, conférence des financeurs, Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite, fondations, État (quatre suffisent).
2. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015).
3. 60 % × 4 000 = 2 400 €, inférieur au plafond : **2 400 €**.
4. Le Cerfa n° 12156 pour la demande ; le Cerfa n° 15059 pour le compte rendu financier.
5. Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée.
6. Le signaler au financeur avant de l'appliquer, par un courrier motivé, et attendre son accord (éventuellement un avenant).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.4.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la grille d'analyse du cahier des charges et le calcul de la subvention.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.3 et je refais les exercices d'application.

8.3.4 Planifier le projet

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le diagramme de Gantt

Définition – Diagramme de Gantt

Représentation graphique du calendrier d'un projet (Henry Gantt, vers 1910) : les **tâches** sont en lignes, le **temps** en colonnes ; chaque tâche est une barre dont la position et la longueur indiquent sa date de début et sa durée. On y ajoute les **jalons** (dates clés : dépôt du dossier, premier atelier, comité de pilotage) et les **dépendances** entre tâches (fiche **F5** ; tableur de stage, feuille Gantt).

Le réseau PERT et le chemin critique

Le réseau **PERT** (*Program Evaluation and Review Technique*, 1958) représente les tâches et leurs **antériorités** (« la tâche C ne peut commencer que lorsque B est terminée »). Il permet de calculer la **durée minimale** du projet et d'identifier le **chemin critique** : la suite de tâches sans marge, dont tout retard retarde le projet entier.

Tâche · Intitulé · Durée · Antériorités

A — *Intitulé :* Diagnostic ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* –

B — *Intitulé :* Objectifs et choix des actions ; *Durée :* 1 sem. ; *Antériorités :* A

C — *Intitulé :* Rédaction et dépôt du dossier d'appel à projets ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* B

D — *Intitulé :* Recherche et conventions de partenariat ; *Durée :* 3 sem. ; *Antériorités :* A

E — *Intitulé :* Communication et inscriptions ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* C, D

F — *Intitulé :* Préparation des ateliers (conducteurs, fiches, achats) ; *Durée :* 3 sem. ; *Antériorités :* C

G — *Intitulé :* Ateliers (6 séances + visite du marché) ; *Durée :* 10 sem. ; *Antériorités :* E, F

H — *Intitulé :* Évaluation et bilan ; *Durée :* 2 sem. ; *Antériorités :* G

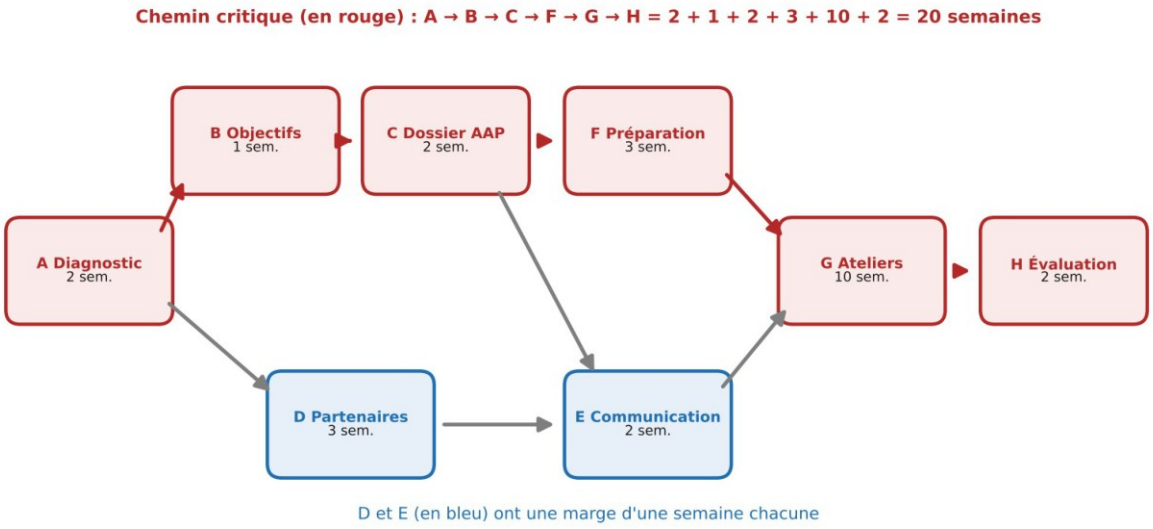


Figure 8.3 – Réseau PERT et chemin critique

Exemple – Calcul détaillé des dates au plus tôt, au plus tard et des marges

Dates au plus tôt (on avance de gauche à droite ; une tâche commence quand **toutes** ses antériorités sont finies, donc au **maximum** de leurs fins) :

- A : début 0, fin 0 + 2 = **2**. B : début 2, fin 3. D : début 2, fin 2 + 3 = **5**. C : début 3, fin 5.
- E : début = max(fin C ; fin D) = max(5 ; 5) = 5, fin **7**. F : début 5, fin **8**.
- G : début = max(fin E ; fin F) = max(7 ; 8) = 8, fin 8 + 10 = **18**. H : début 18, fin **20**.

Durée minimale du projet : 20 semaines. Dates au plus tard (on recule de droite à gauche ; fin au plus tard = **minimum** des débuts au plus tard des tâches suivantes) :

- H : fin 20, début 18. G : fin 18, début 8. F : fin 8, début 5. E : fin 8, début 6.
- C : fin = min(début F ; début E) = min(5 ; 6) = 5, début 3. D : fin = début E = 6, début 3. B : fin 3, début 2. A : fin = min(début B ; début D) = min(2 ; 3) = 2, début 0.

Marges (date au plus tard − date au plus tôt) : A, B, C, F, G, H : **0** → chemin critique **A → B → C → F → G → H** (2 + 1 + 2 + 3 + 10 + 2 = 20 semaines). D : 3 − 2 = **1 semaine** ; E : 6 − 5 = **1 semaine**. **Conséquence pratique** : un retard d'une semaine dans la recherche de partenaires (D) est absorbé ; un retard d'une semaine dans le dépôt du dossier (C) décale tout le projet. On surveille donc en priorité les tâches critiques.

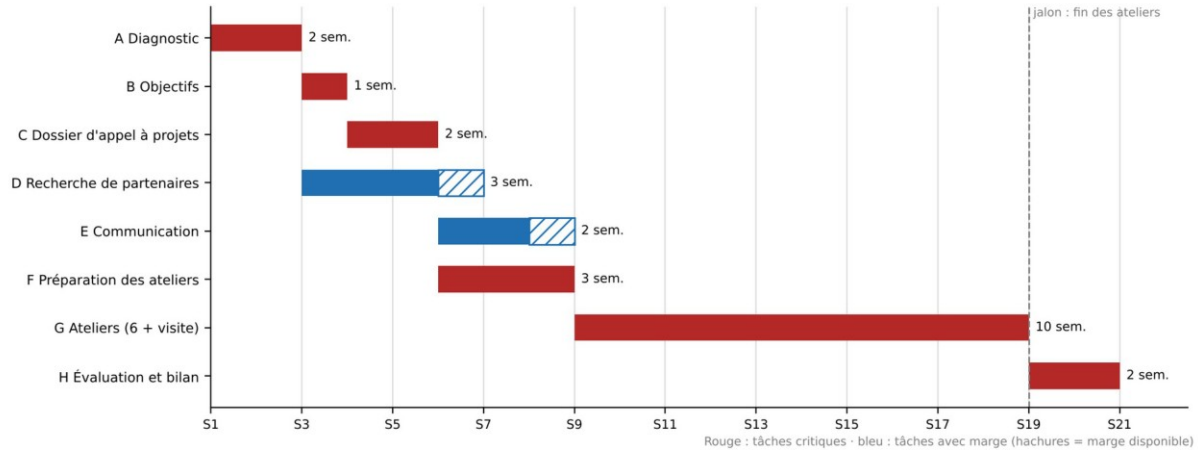


Figure 8.4 – Le diagramme de Gantt correspondant

Comprendre le schéma – Figure 8.4

1. Les tâches **critiques** (en rouge) s'enchaînent sans interruption de la semaine 1 à la semaine 20.
2. Les tâches **D** et **E** (en bleu) disposent d'une **marge** d'une semaine (hachures) : elles peuvent glisser sans retarder le projet.
3. Le **jalon** « fin des ateliers » (fin de la semaine 18) déclenche l'évaluation finale.
4. Dans la réalité, on ajoute les **contraintes de calendrier** : vacances scolaires (pas d'atelier parents-enfants), Ramadan (chapitre 4), dates du stage, date limite de l'appel à projets, disponibilité de la cuisine.

Astuce – Prévoir des marges

Ajoutez une **marge de sécurité** de 10 à 20 % sur les tâches dépendant d'autres personnes (signature de convention, réponse d'un financeur, impression) et fixez le dépôt d'un dossier **quelques jours avant** la date limite. Les délais de versement d'une subvention peuvent dépasser plusieurs mois : vérifiez la **trésorerie** de la structure.

Construire un diagramme de Gantt pas à pas

Le diagramme de Gantt est l'outil de planification le plus utilisé dans les structures, parce qu'il se lit d'un coup d'œil. On peut le construire sur papier quadrillé, dans un tableur (une colonne par semaine, des cellules colorées) ou dans un logiciel de gestion de projet (8.3.14).

Méthode pas à pas – Construire un Gantt en six étapes

1. Lister les tâches à partir du plan d'action, avec un verbe (« réserver la salle », « rédiger les fiches »).

2. Estimer la durée de chaque tâche, en semaines pour un projet de plusieurs mois, en jours pour un événement.

3. Noter les antériorités : quelles tâches doivent être finies avant de commencer celle-ci ?

4. Placer les tâches sur l'échelle de temps, en commençant par celles qui n'ont pas d'antériorité, puis en respectant les dépendances.

5. Ajouter les contraintes de calendrier : vacances, fêtes religieuses, fermeture des locaux, période de stage, date limite d'un appel à projets, disponibilité des partenaires.

6. Placer les jalons (losanges) : décisions du comité de pilotage, dépôt du dossier, premier atelier, fin des ateliers, bilan.

Le rétroplanning : partir de la date imposée

Quand une date est imposée (date limite d'un dossier, date d'un forum, date de l'épreuve), on construit le planning **à rebours** : on part de cette date et on remonte le temps, tâche par tâche, en ajoutant une marge de sécurité. C'est le **rétroplanning**.

Exemple – Rétroplanning d'un stand au forum santé d'une commune (samedi 9 octobre 2027)

Échéance · Tâche · Responsable

Lundi 6 septembre — *Tâche :* Valider le thème du stand et le message principal avec la tutrice ; *Responsable :* Étudiante

Lundi 13 septembre — *Tâche :* Réserver le matériel (tables, grilles d'exposition, balance) auprès de la mairie ; *Responsable :* Tutrice

Vendredi 17 septembre — *Tâche :* Concevoir le jeu « quel est le prix au kilo ? » et le tester avec deux collègues ; *Responsable :* Étudiante

Lundi 20 septembre — *Tâche :* Envoyer les fichiers des affiches à l'imprimeur (délai : 10 jours) ; *Responsable :* Étudiante

Vendredi 1er octobre — *Tâche :* Récupérer les affiches ; préparer la liste de courses de la dégustation ; *Responsable :* Étudiante

Mercredi 6 octobre — *Tâche :* Vérifier les inscriptions des bénévoles, imprimer les fiches recettes ; *Responsable :* Tutrice et étudiante

Vendredi 8 octobre — *Tâche :* Courses ; préparation des boîtes de dégustation, stockage au froid ; *Responsable :* Étudiante et bénévole

Samedi 9 octobre — *Tâche :* Forum santé ; *Responsable :* Équipe

Le rétroplanning montre que le **délai d'impression** (10 jours) commande toute la préparation : si les fichiers partent le 20 septembre, le jeu doit être prêt avant. C'est l'équivalent, en planification à rebours, du chemin critique.

Attention – Un planning se partage et se met à jour

Un Gantt construit au début du projet et jamais relu ne sert à rien. On le met à jour à chaque réunion du comité technique : tâches terminées, retards, nouvelles contraintes. On l'envoie aux partenaires qui ont des tâches à réaliser. Le décalage entre le planning prévu et le planning réel est un indicateur de pilotage (8.3.6).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.9

Une association organise une « semaine des légumes secs » dans un restaurant administratif, du lundi 7 au vendredi 11 juin 2027. Elle doit : valider les menus avec le chef (5 jours ouvrés avant la commande) ; commander les denrées (10 jours ouvrés avant la semaine) ; faire imprimer les affiches (7 jours ouvrés de délai) ; afficher une semaine avant. Construisez le rétroplanning en dates, sans compter les week-ends ni le lundi 17 mai 2027 (lundi de Pentecôte, jour non travaillé dans ce restaurant).

Corrigé

Affichage : au plus tard le **lundi 31 mai**. Commande : 10 jours ouvrés avant le lundi 7 juin, soit le **lundi 24 mai** (on compte en arrière : 4, 3, 2, 1 juin, 31 mai, 28, 27, 26, 25, 24 mai). Validation des menus : 5 jours ouvrés avant le 24 mai, en sautant le lundi 17 mai (on compte 21, 20, 19, 18 et 14 mai), soit le **vendredi 14 mai**. Impression : les affiches doivent être prêtes le 31 mai ; 7 jours ouvrés avant : 28, 27, 26, 25, 24, 21 et 20 mai, envoi des fichiers le **jeudi 20 mai**. On prévoit une marge : valider les menus dès le 12 mai et envoyer les fichiers le 18 mai.

Un deuxième réseau PERT : quand une tâche consomme sa marge

Le calcul des dates (8.3.4) ne sert pas seulement à trouver la durée du projet. Il permet surtout de savoir **où porter son attention** quand un incident survient. L'exemple suivant montre qu'une tâche non critique peut devenir critique si elle consomme toute sa marge.

Tâche · Intitulé · Durée (semaines) · Antériorités

A — *Intitulé :* Accord du lycée professionnel et des familles ; *Durée (semaines) :* 2 ; *Antériorités :* –

B — *Intitulé :* Conception des séances avec les enseignants ; *Durée (semaines) :* 3 ; *Antériorités :* A

C — *Intitulé :* Choix de l'emplacement du jardin ; *Durée (semaines) :* 1 ; *Antériorités :* A

D — *Intitulé :* Fabrication des bacs par la section menuiserie ; *Durée (semaines) :* 4 ; *Antériorités :* B

E — *Intitulé :* Rédaction des fiches de culture ; *Durée (semaines) :* 2 ; *Antériorités :* B, C

F — *Intitulé :* Achat des plants et du terreau ; *Durée (semaines) :* 3 ; *Antériorités :* C

G — *Intitulé :* Plantations et première dégustation ; *Durée (semaines) :* 2 ; *Antériorités :* D, E, F

Exemple – Calcul détaillé : dates, marges et effet d'un retard

Calcul aller. A : 0 → 2. B : 2 → 5. C : 2 → 3. D : 5 → 9. E : début = max(5 ; 3) = 5 → 7. F : 3 → 6. G : début = max(9 ; 7 ; 6) = 9 → **11**. Durée minimale : **11 semaines**.

Calcul retour. G : 9 → 11. D : fin au plus tard 9, début 5. E : fin 9, début 7. F : fin 9, début 6. B : fin = min(début D ; début E) = min(5 ; 7) = 5, début 2. C : fin = min(début E ; début F) = min(7 ; 6) = 6, début 5. A : fin = min(2 ; 5) = 2, début 0.

Marges. A, B, D, G : 0 → chemin critique **A → B → D → G** (2 + 3 + 4 + 2 = 11). C : 5 − 2 = **3 semaines** ; E : 7 − 5 = **2 semaines** ; F : 6 − 3 = **3 semaines**.

Incident. Le fournisseur de plants annonce un délai de 6 semaines au lieu de 3 (F = 6). F commence à 3 et finit à 9 : la fin du projet reste à **11 semaines**, car F avait 3 semaines de marge. Mais F et C deviennent **critiques** : il existe maintenant deux chemins critiques (A → B → D → G et A → C → F → G). Le moindre retard supplémentaire sur le choix de l'emplacement ou sur la livraison retarderait les plantations. L'équipe décide de choisir l'emplacement dès la semaine 2 et de relancer le fournisseur chaque semaine.

Attention – Marge totale et marge partagée

Les marges de tâches qui se suivent ne s'additionnent pas. Dans l'exemple, C et F ont chacune 3 semaines de marge, mais elles sont sur le même chemin : si C prend 3 semaines de retard, F n'a plus aucune marge. On parle de marge **totale** pour la marge calculée tâche par tâche ; elle est partagée par toutes les tâches d'un même chemin.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.10

Reprenez le réseau de l'exemple, avec les durées d'origine. La conception des séances (B) prend 4 semaines au lieu de 3. Calculez la nouvelle durée du projet et indiquez si le chemin critique change.

Corrigé

B est critique : B finit à 2 + 4 = 6 ; D : 6 → 10 ; E : début max(6 ; 3) = 6 → 8 ; G : début max(10 ; 8 ; 6) = 10 → **12 semaines**. Le projet prend une semaine de retard. Le chemin critique reste **A → B → D → G** (2 + 4 + 4 + 2 = 12). Pour rattraper la semaine, on peut demander à la section menuiserie de commencer les bacs dès que les plans sont prêts, sans attendre la fin de la conception des séances.

Estimer une durée incertaine : l'estimation à trois points

Certaines durées sont très incertaines : la réponse d'une mairie, le recrutement de participants, la livraison d'un matériel. Plutôt que de donner un seul chiffre, la méthode PERT d'origine (1958) propose trois estimations : une durée **optimiste** (O, tout se passe bien), une durée **la plus**

probable (M) et une durée **pessimiste** (P, tout se passe mal). On en tire une durée attendue et une mesure de l'incertitude.

Définition – Durée attendue et écart-type d'une tâche

Durée attendue = (O + 4 × M + P) / 6. Écart-type ≈ (P − O) / 6. Plus l'écart entre la durée optimiste et la durée pessimiste est grand, plus la tâche est incertaine, et plus il faut la surveiller ou la commencer tôt.

Exemple – Calcul détaillé : trois tâches incertaines d'un projet de jardin partagé

Tâche · O · M · P · Durée attendue · Écart-type

Obtenir l'accord écrit de la mairie — *O :* 1 ; *M :* 3 ; *P :* 8 ; *Durée attendue :* (1 + 12 + 8) / 6 = **3,5** sem. ; *Écart-type :* (8 − 1) / 6 = **1,17** sem.

Aménager les parcelles — *O :* 2 ; *M :* 3 ; *P :* 4 ; *Durée attendue :* (2 + 12 + 4) / 6 = **3,0** sem. ; *Écart-type :* (4 − 2) / 6 = **0,33** sem.

Recruter 12 familles jardinières — *O :* 1 ; *M :* 2 ; *P :* 5 ; *Durée attendue :* (1 + 8 + 5) / 6 = **2,33** sem. ; *Écart-type :* (5 − 1) / 6 = **0,67** sem.

Si les trois tâches se suivent, la durée attendue est 3,5 + 3,0 + 2,33 = **8,83 semaines**. L'accord de la mairie est la tâche la plus incertaine (écart-type de 1,17 semaine) : c'est elle qu'il faut lancer le plus tôt possible et relancer. Pour fixer une date d'ouverture prudente, on ajoute une marge : environ deux écarts-types sur l'ensemble du chemin (calcul simplifié : $\sqrt{(1{,}17^2 + 0{,}33^2 + 0{,}67^2)} \approx 1{,}38$ semaine), soit 8,83 + 2 × 1,38 ≈ **11,6 semaines**, arrondies à 12 semaines. C'est un ordre de grandeur, pas une certitude.

Astuce – Demander les trois durées aux bonnes personnes

Les durées optimiste, probable et pessimiste se demandent à ceux qui connaissent le terrain : la secrétaire de mairie pour un accord, l'imprimeur pour une impression, l'animatrice pour un recrutement. Leur expérience vaut mieux qu'une estimation au hasard, et la question les implique dans le projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.11

L'impression d'un livret de recettes demande 1 semaine au mieux, 2 semaines le plus souvent et 5 semaines au pire (relectures, corrections). Calculez la durée attendue et l'écart-type, puis dites combien de semaines vous prévoyez dans le planning, et pourquoi.

Corrigé

Durée attendue : (1 + 4 × 2 + 5) / 6 = 14 / 6 = **2,33 semaines**. Écart-type : (5 − 1) / 6 = **0,67 semaine**. On peut prévoir 2,33 + 2 × 0,67 ≈ **3,7 semaines**, soit environ 4 semaines, car le livret doit être prêt pour une date fixe (dernier atelier) et le risque de retard vient surtout des relectures, que l'on peut anticiper en les programmant tôt.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.4 – La planification

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un jalon dans un diagramme de Gantt ?
2. Dans le calcul aller du PERT, prend-on le maximum ou le minimum des fins des tâches précédentes ? Pourquoi ?
3. Comment calcule-t-on la marge d'une tâche ?
4. Qu'est-ce que le chemin critique ?
5. Une tâche a 2 semaines de marge et prend 3 semaines de retard. De combien le projet est-il retardé ?
6. Donnez la formule de la durée attendue dans l'estimation à trois points.

Corrigé – Point d'étape 8.3.4

1. Une date clé (décision, dépôt, début ou fin d'une phase), représentée par un losange.
2. Le maximum : une tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches qui la précèdent sont finies.
3. Marge = début au plus tard − début au plus tôt.
4. La suite des tâches dont la marge est nulle ; sa durée est la durée minimale du projet.
5. D'une semaine (3 − 2), si aucune autre tâche ne change.
6. (O + 4 × M + P) / 6.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.5.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je refais le calcul détaillé du réseau PERT.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.4 et je refais les exercices d'application.

8.3.5 Construire et suivre le budget

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

La structure d'un budget prévisionnel

Le budget prévisionnel d'un projet associatif suit le **plan comptable associatif** simplifié (formulaire Cerfa n° 12156) : il est présenté en **charges** (dépenses) et **produits** (ressources), et il doit être **équilibré** (total des charges = total des produits).

Compte · Charges · Exemples

60 — *Charges :* Achats ; *Exemples :* Denrées, petit matériel, fournitures pédagogiques

61-62 — *Charges :* Services extérieurs et autres services ; *Exemples :* Location, assurance, impression, déplacements, honoraires d'intervenants extérieurs

63 — *Charges :* Impôts et taxes ; *Exemples :* Taxes sur salaires (rare pour un petit projet)

64 — *Charges :* Charges de personnel ; *Exemples :* Salaires et charges des salariés affectés au projet (au prorata du temps)

86 — *Charges :* Emplois des contributions volontaires en nature ; *Exemples :* Bénévolat, mise à disposition de locaux, dons de produits (valorisés)

Compte — *Charges :* Produits ; *Exemples :* Exemples

70 — *Charges :* Ventes, prestations ; *Exemples :* Participation des usagers

74 — *Charges :* Subventions d'exploitation ; *Exemples :* ARS (FIR), commune, département, CAF, fondations

75 — *Charges :* Autres produits de gestion courante ; *Exemples :* Cotisations, dons

87 — *Charges :* Contributions volontaires en nature ; *Exemples :* Contrepartie exacte du compte 86

Attention – Les règles d'or du budget

1. Équilibre : charges = produits ; l'autofinancement du porteur comble l'écart.

2. Comptes 86 = 87 : les contributions en nature apparaissent des deux côtés, pour le même montant.

3. Cofinancement : un financeur ne finance presque jamais 100 % ; montrer la diversité des ressources.

4. Cohérence : chaque ligne correspond à une action décrite (pas de « divers » important).

5. Justification : quantité × coût unitaire, avec des prix réalistes (devis, relevés de prix).

6. Prudence : distinguer les financements **acquis** et **sollicités**.

Exemple – Calcul détaillé : coût horaire d'une salariée affectée au projet

Une référente familles est rémunérée **2 000 € bruts par mois** ; les charges patronales représentent environ **42 %** du brut (ordre de grandeur à vérifier auprès de la structure ; il varie selon les allègements de cotisations).

- Coût employeur mensuel : 2 000 × 1,42 = **2 840 €**.
- Heures mensuelles (35 h par semaine) : 35 × 52 / 12 = **151,67 h**.
- Coût horaire : 2 840 / 151,67 = **18,73 €**.
- Temps affecté au projet : 30 h → 30 × 18,73 = **561,90 €** à inscrire au compte 64.

Dans le budget des Tilleuls (chapitre 1), la ligne « coordinatrice » a été valorisée à 24 € de l'heure, taux communiqué par la structure (il intègre une quote-part de frais de structure) : on utilise **toujours** le taux fourni par l'employeur et on le précise.

Le budget du projet des Tilleuls : ratios d'analyse

Rappel (fiche F6, chapitre 1) : charges totales **3 510 €**, dont personnel 1 520 + 720 = 2 240 € ; subvention ARS **1 500** € ; commune 600 € ; CAF 400 € ; participation des familles 144 € ; contributions en nature 450 € ; autofinancement 416 €.

Ratio · Calcul · Résultat

Part de la subvention ARS — *Calcul :* 1 500 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 42,7 %

Part des financements publics — *Calcul :* (1 500 + 600 + 400) / 3 510 × 100 = 2 500 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 71,2 %

Part du personnel — *Calcul :* 2 240 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 63,8 %

Coût par famille — *Calcul :* 3 510 / 12 ; *Résultat :* 292,50 €

Coût par heure d'atelier — *Calcul :* 3 510 / (6 × 3 h) = 3 510 / 18 ; *Résultat :* 195,00 €

Part des contributions en nature — *Calcul :* 450 / 3 510 × 100 ; *Résultat :* 12,8 %

Participation des familles par rapport au coût par famille — *Calcul :* 12 / 292,50 × 100 (12 € = 2 € × 6 ateliers) ; *Résultat :* 4,1 %

Interprétation : le projet est majoritairement financé par des fonds publics et repose surtout sur du **temps humain**, ce qui est habituel en éducation pour la santé ; la participation symbolique des familles (2 € par atelier)

favorise l'engagement sans exclure ; le coût par famille (292,50 €) se justifie par l'intensité de l'accompagnement (6 ateliers de 3 heures, livret, visite).

Suivre le budget réalisé

Exemple – Calcul détaillé : écarts entre budget prévisionnel et réalisé

Poste · Prévu · Réalisé · Écart (€) · Écart (%)

Denrées — *Prévu :* 210,00 ; *Réalisé :* 236,40 ; *Écart (€) :* + 26,40 ; *Écart (%) :* + 12,6 %

Petit matériel — *Prévu :* 180,00 ; *Réalisé :* 172,50 ; *Écart (€) :* − 7,50 ; *Écart (%) :* − 4,2 %

Supports pédagogiques — *Prévu :* 150,00 ; *Réalisé :* 150,00 ; *Écart (€) :* 0,00 ; *Écart (%) :* 0,0 %

Impression, communication — *Prévu :* 220,00 ; *Réalisé :* 198,00 ; *Écart (€) :* − 22,00 ; *Écart (%) :* − 10,0 %

Déplacements — *Prévu :* 60,00 ; *Réalisé :* 48,00 ; *Écart (€) :* − 12,00 ; *Écart (%) :* − 20,0 %

Diététicienne — *Prévu :* 1 520,00 ; *Réalisé :* 1 520,00 ; *Écart (€) :* 0,00 ; *Écart (%) :* 0,0 %

Coordinatrice (32 h × 24 €) — *Prévu :* 720,00 ; *Réalisé :* 768,00 ; *Écart (€) :* + 48,00 ; *Écart (%) :* + 6,7 %

Locaux (valorisation) — *Prévu :* 210,00 ; *Réalisé :* 210,00 ; *Écart (€) :* 0,00 ; *Écart (%) :* 0,0 %

Bénévolat (24 h × 12 €) — *Prévu :* 240,00 ; *Réalisé :* 288,00 ; *Écart (€) :* + 48,00 ; *Écart (%) :* + 20,0 %

Total — *Prévu :* 3 510,00 ; *Réalisé :* 3 590,90 ; *Écart (€) :* + 80,90 ; *Écart (%) :* + 2,3 %

Formules : écart (€) = réalisé − prévu ; écart (%) = écart / prévu × 100. Exemple : denrées : 236,40 − 210,00 = 26,40 € ; 26,40 / 210,00 × 100 = **12,6 %**. **Total réalisé** : 236,40 + 172,50 + 150 + 198 + 48 + 1 520 + 768 + 210 + 288 = **3 590,90 €** ; écart : 3 590,90 − 3 510 = **80,90 €**, soit 80,90 / 3 510 × 100 = **2,3 %**. **Analyse** : le dépassement des denrées s'explique par la hausse des prix des fruits (+ 12,6 %) ; il est compensé en partie par les économies d'impression (impression au centre social) et de déplacements (covoiturage) ; le bénévolat supplémentaire (+ 4 h de mamans relais) est une bonne nouvelle (participation) et ne coûte rien en trésorerie (il est valorisé aux comptes 86 et 87 : les produits en nature passent aussi à 210 + 288 = 498 €). L'écart réel de trésorerie est donc : 26,40 − 7,50 − 22 − 12 + 48 = **+ 32,90 €**, couvert par l'autofinancement. Un écart global inférieur à 5 % est généralement jugé satisfaisant ; les écarts importants sur un poste sont **expliqués** dans le compte rendu financier.

Valoriser les contributions volontaires en nature

Un projet de prévention mobilise souvent des ressources qui ne coûtent rien à la structure : du temps de bénévoles, une salle prêtée, des denrées données, du matériel mis à disposition. Ces **contributions volontaires en nature** ont pourtant une valeur. Les inscrire au budget montre le vrai coût du projet, l'engagement du territoire et, souvent, la capacité du porteur à mobiliser des partenaires. Le plan comptable des associations (règlement ANC n° 2018-06) prévoit de les présenter dans les comptes 86 (emplois) et 87 (contributions), ou de les décrire dans l'annexe des comptes.

Contribution · Méthode de valorisation · Justificatif

Bénévolat — *Méthode de valorisation :* Nombre d'heures × taux horaire choisi par la structure et justifié (souvent le coût d'un salarié qui ferait la même tâche) ; *Justificatif :* Feuille de présence ou de temps des bénévoles

Mise à disposition d'une salle — *Méthode de valorisation :* Nombre d'heures ou de demi-journées × tarif de location pratiqué par le propriétaire ; *Justificatif :* Attestation du propriétaire, grille tarifaire

Don de denrées ou de matériel — *Méthode de valorisation :* Valeur de marché (prix d'achat équivalent) ; *Justificatif :* Attestation du donateur, bon de livraison

Personnel mis à disposition par un partenaire — *Méthode de valorisation :* Heures × coût horaire communiqué par l'employeur ; *Justificatif :* Attestation de l'employeur

Exemple – Calcul détaillé : les contributions en nature d'un projet de repas partagés

Trois bénévoles donnent chacun 40 heures sur l'année ; l'association a fixé un taux de 14 € de l'heure (taux fictif, expliqué dans l'annexe). La mairie prête une salle pour 12 demi-journées, qu'elle loue habituellement 25 € la demi-journée. Un primeur donne des légumes d'une valeur de 150 €.

- Bénévolat : 3 × 40 × 14 = **1 680 €**.
- Salle : 12 × 25 = **300 €**.
- Denrées données : **150 €**.
- Total : 1 680 + 300 + 150 = **2 130 €**, inscrits au compte 86 (charges) et au compte 87 (produits).

Le budget reste équilibré : les contributions en nature apparaissent pour le même montant des deux côtés. Elles n'entrent pas dans le plan de trésorerie, puisqu'aucun argent ne circule.

Attention – Ne pas gonfler les valorisations

Une valorisation exagérée (un taux horaire très élevé pour du bénévolat, une salle comptée au prix d'un hôtel) fait perdre sa crédibilité au dossier. Le taux doit être justifié, cohérent d'une année sur l'autre, et appuyé sur des pièces. Certains financeurs excluent les contributions en nature du calcul de leur subvention ou du cofinancement : il faut le vérifier dans le cahier des charges (8.3.3).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.12

Une association organise 8 ateliers. Deux bénévoles sont présents à chaque atelier pendant 3 heures (taux retenu : 13 € de l'heure). Un supermarché donne des fruits pour une valeur de 20 € par atelier. Le centre social prête sa cuisine, qu'il loue 30 € l'atelier. Calculez le montant des contributions en nature et indiquez comment elles apparaissent dans le budget.

Corrigé

Bénévolat : 2 × 8 × 3 × 13 = **624 €** ; fruits : 8 × 20 = **160 €** ; cuisine : 8 × 30 = **240 €** ; total : 624 + 160 + 240 = **1 024 €**. Ce montant apparaît au **compte 86** (emplois des

contributions volontaires en nature, côté charges) et au **compte 87** (contributions volontaires en nature, côté produits), avec le détail des trois lignes. Il ne figure pas dans le plan de trésorerie.

Construire un budget prévisionnel pas à pas

Un budget se construit à partir du plan d'action, ligne par ligne, et jamais en partant du montant que l'on espère obtenir. Chaque ligne s'écrit sous la forme **quantité × coût unitaire**, avec la source du coût (devis, tarif, relevé de prix, taux communiqué par l'employeur).

Méthode pas à pas – Construire le budget en sept étapes

1. Lister les moyens nécessaires à chaque action (fiches QQOQCCP, rubrique « combien ? »).

2. Chiffrer chaque moyen : quantité × coût unitaire, avec sa source.

3. Classer les charges dans les comptes (60, 61, 62, 63, 64) et ajouter les contributions en nature (86).

4. Additionner les charges monétaires, les contributions en nature et le total.

5. Inscrire les produits connus : subventions acquises et sollicitées, participation, mécénat, contributions en nature (87, même montant que le compte 86).

6. Calculer l'autofinancement qui équilibre le budget, et vérifier qu'il est supportable pour la structure.

7. Vérifier : total des charges = total des produits ; 86 = 87 ; règles des financeurs (plafond, taux, cofinancement) ; cohérence avec le plan d'action.

Exemple – Calcul détaillé : le budget du projet « Cuisine en pied d'immeuble » d'une régie de quartier (fictif)

Le projet comprend 10 ateliers de 3 heures pour 10 habitants, animés par une animatrice salariée et une diététicienne libérale.

- 60 – Denrées : 10 ateliers × 28 € = **280,00 €** (relevé de prix de deux magasins).
- 60 – Petit matériel : **240,00 €** (devis).
- 61 – Assurance complémentaire de l'activité : **60,00 €**.
- 62 – Impression des fiches et des affiches : **120,00 €** (devis de l'imprimeur).
- 62 – Honoraires de la diététicienne : 10 × 2,5 h × 50 € = **1 250,00 €**.
- 62 – Déplacements : 216 km × 0,40 € (taux fixé par la régie) = **86,40 €**.
- 64 – Animatrice : 70 h × 19,20 € (coût horaire chargé communiqué par la régie) = **1 344,00 €**.
- 86 – Bénévolat : 2 bénévoles × 10 ateliers × 3 h × 13 € = **780,00 €** ; 86 – Salle prêtée : 10 × 3 h × 20 € = **600,00 €**.

Charges monétaires : 280 + 240 + 60 + 120 + 1 250 + 86,40 + 1 344 = **3 380,40 €** ; contributions en nature : 780 + 600 = **1 380,00 €** ; total : **4 760,40 €**.

Produits	Montant	Statut
74 – Commune	1 500,00 €	Acquis
74 – Département	1 000,00 €	Sollicité
75 – Mécénat du bailleur social	600,00 €	Acquis
70 – Participation des habitants (1 € × 10 × 10)	100,00 €	Prévu
Autofinancement de la régie	180,40 €	Acquis
87 – Contributions volontaires en nature	1 380,00 €	Prévu
Total	**4 760,40 €**	

Autofinancement : 3 380,40 − (1 500 + 1 000 + 600 + 100) = **180,40 €**, soit 5,3 % des charges monétaires. Les financements publics représentent 2 500 / 4 760,40 × 100 = **52,5 %** du budget total. Si le département refuse, il manquera 1 000 € : la régie a prévu une version à six ateliers.

Astuce – Prévoir une version réduite

Quand un financement important est seulement sollicité, préparez dès le départ une version réduite du projet (moins d'ateliers, moins d'heures de diététicienne) et calculez son budget. Si la réponse est négative ou partielle, vous savez immédiatement ce que vous pouvez maintenir, et vous le présentez au comité de pilotage.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.13

Dans l'exemple, le département n'accorde que 600 € au lieu de 1 000 €. La régie décide de supprimer deux ateliers. Chaque atelier supprimé économise 28 € de denrées, 125 € d'honoraires et 7 heures d'animatrice ; la participation diminue de 10 € par atelier. Les autres charges ne changent pas. Calculez les nouvelles charges monétaires et le nouvel autofinancement.

Corrigé

Économie par atelier : 28 + 125 + 7 × 19,20 = 28 + 125 + 134,40 = **287,40 €** ; pour deux ateliers : **574,80 €**. Nouvelles charges monétaires : 3 380,40 − 574,80 = **2 805,60 €**. Produits monétaires hors autofinancement : 1 500 + 600 + 600 + (100 − 20) = **2 780,00 €**. Autofinancement : 2 805,60 − 2 780,00 = **25,60 €**. (Les contributions en nature baissent aussi si les bénévoles et la salle ne sont plus mobilisés pour ces deux ateliers ; les comptes 86 et 87 restent égaux.)

Coûts fixes, coûts variables et nombre minimal de participants

Certaines charges ne dépendent pas du nombre de participants : l'animatrice est payée pour l'atelier, que le groupe compte 5 ou 12 personnes. Ce sont des **coûts fixes**. D'autres augmentent avec chaque participant : les denrées,

les fiches remises, parfois le transport. Ce sont des **coûts variables**. Distinguer les deux permet de calculer le **coût par participant** et le **nombre minimal de participants** pour qu'une action financée « à la personne » couvre ses coûts.

Définition – Coût par participant et seuil

Coût par participant = coûts fixes / nombre de participants + coût variable par participant. Quand chaque participant rapporte une recette R (forfait d'un financeur, participation), le **seuil** est le nombre de participants à partir duquel les recettes couvrent les coûts : seuil = coûts fixes / (R − coût variable par participant), arrondi à l'unité supérieure.

Exemple – Calcul détaillé : un atelier « cuisine et mémoire » financé à la personne

Coûts fixes d'un atelier : diététicienne 2 h × 55 € = 110,00 € ; animatrice 3 h × 19,20 € = 57,60 € ; salle 25,00 € ; total **192,60 €**. Coûts variables : denrées 1,90 € et fiche 0,30 €, soit **2,20 €** par participant. Une caisse de retraite (fictive) verse 16 € par participant présent, et chaque participant paie 2 € : recette **18 €** par participant.

Participants · Coût par participant · Résultat de l'atelier

5 — *Coût par participant :* 192,60 / 5 + 2,20 = 40,72 € ; *Résultat de l'atelier :* 5 × 18 − (192,60 + 5 × 2,20) = − 113,60 €

8 — *Coût par participant :* 192,60 / 8 + 2,20 = 26,28 € ; *Résultat de l'atelier :* − 66,20 €

10 — *Coût par participant :* 21,46 € ; *Résultat de l'atelier :* − 34,60 €

12 — *Coût par participant :* 18,25 € ; *Résultat de l'atelier :* − 3,00 €

15 — *Coût par participant :* 15,04 € ; *Résultat de l'atelier :* + 44,40 €

Seuil : 192,60 / (18 − 2,20) = 192,60 / 15,80 = **12,2**, soit **13 participants**. Avec une salle de 12 places, l'atelier ne peut pas couvrir ses coûts : il faut réduire les coûts fixes (salle prêtée gratuitement : seuil = 167,60 / 15,80 = 10,6, soit 11 participants) ou obtenir un autre financement.

Attention – Le seuil n'est pas un objectif pédagogique

Un atelier de 15 personnes couvre mieux ses coûts qu'un atelier de 8, mais il n'est pas forcément meilleur : chacun cuisine moins, l'animatrice accompagne moins. Le calcul du seuil éclaire une décision ; il ne la remplace pas. On cherche un équilibre entre la qualité de l'atelier, l'équité d'accès et la viabilité financière.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.14

Un atelier coûte 150 € de coûts fixes et 3 € de denrées par participant. Un financeur verse 15 € par participant. Calculez le coût par participant pour 8 et pour 12 participants, puis le seuil.

Corrigé

8 participants : 150 / 8 + 3 = 18,75 + 3 = **21,75 €**. 12 participants : 150 / 12 + 3 = 12,50 + 3 = **15,50 €**. Seuil : 150 / (15 − 3) = 150 / 12 = **12,5**, soit **13 participants**. Avec 12 participants, il manque 12 × 15 − (150 + 12 × 3) = 180 − 186 = **6 €** par atelier.

Acheter : comparer des devis avec une grille pondérée

Les achats importants du projet (matériel de cuisine, impression, transport) se font sur **devis**. La plupart des structures fixent une règle interne : au-delà d'un certain montant, on demande au moins **trois devis** et l'on garde une trace du choix. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur : on compare les devis avec une **grille pondérée**, comme pour hiérarchiser des priorités (chapitre 7).

Méthode – Comparer des devis en cinq étapes

1. Rédiger un **besoin précis** et le même pour tous les fournisseurs (quantités, caractéristiques, délai, livraison).
2. Choisir les **critères** (prix, délai, qualité, service après-vente, proximité, engagement social ou environnemental) et leur **poids**, avant de lire les devis.
3. **Noter** chaque devis sur 10 pour chaque critère.
4. Calculer la **note pondérée** : somme des notes multipliées par les poids.
5. **Conserver** la grille et les devis : ils justifient la dépense auprès du financeur et de la direction.

Exemple – Calcul détaillé : le choix d'un fournisseur de matériel de cuisine (données fictives)

Besoin : 4 plaques à induction mobiles, 4 lots de casseroles compatibles, 2 balances, livraison avant le 15 septembre. Poids des critères : prix 40 %, délai 20 %, qualité 30 %, service après-vente 10 %.

Critère (poids) · Fournisseur 1 · Fournisseur 2 · Fournisseur 3

Prix (0,4) — *Fournisseur 1 :* 8 ; *Fournisseur 2 :* 10 ; *Fournisseur 3 :* 6

Délai (0,2) — *Fournisseur 1 :* 6 ; *Fournisseur 2 :* 8 ; *Fournisseur 3 :* 9

Qualité (0,3) — *Fournisseur 1 :* 7 ; *Fournisseur 2 :* 5 ; *Fournisseur 3 :* 9

Service après-vente (0,1) — *Fournisseur 1 :* 9 ; *Fournisseur 2 :* 5 ; *Fournisseur 3 :* 8

Note pondérée — *Fournisseur 1 :* 7,4 ; *Fournisseur 2 :* 7,6 ; *Fournisseur 3 :* 7,7

- Fournisseur 1 : 0,4 × 8 + 0,2 × 6 + 0,3 × 7 + 0,1 × 9 = 3,2 + 1,2 + 2,1 + 0,9 = **7,4**.
- Fournisseur 2 : 0,4 × 10 + 0,2 × 8 + 0,3 × 5 + 0,1 × 5 = 4,0 + 1,6 + 1,5 + 0,5 = **7,6**.
- Fournisseur 3 : 0,4 × 6 + 0,2 × 9 + 0,3 × 9 + 0,1 × 8 = 2,4 + 1,8 + 2,7 + 0,8 = **7,7**.

Décision : le fournisseur 3, le plus cher, obtient la meilleure note grâce à sa qualité et à son délai. L'écart avec le fournisseur 2 est faible (0,1 point) : on vérifie que

le budget permet ce choix, et l'on peut demander au fournisseur 3 s'il accepte une remise. Si le budget est trop juste, le fournisseur 2 reste un choix défendable.

Attention – Fixer les poids avant d'ouvrir les devis

Si l'on choisit les poids après avoir lu les devis, on risque, même sans le vouloir, de les ajuster pour favoriser un fournisseur. La grille doit être décidée à l'avance, si possible avec une autre personne (tutrice, trésorier de l'association).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.15

Reprenez la grille ci-dessus en changeant les poids : prix 60 %, délai 10 %, qualité 20 %, service 10 %. Recalculez les notes pondérées et indiquez le fournisseur retenu. Que montre cet exercice ?

Corrigé

Fournisseur 1 : 0,6 × 8 + 0,1 × 6 + 0,2 × 7 + 0,1 × 9 = 4,8 + 0,6 + 1,4 + 0,9 = 7,7. Fournisseur 2 : 0,6 × 10 + 0,1 × 8 + 0,2 × 5 + 0,1 × 5 = 6,0 + 0,8 + 1,0 + 0,5 = 8,3. Fournisseur 3 : 0,6 × 6 + 0,1 × 9 + 0,2 × 9 + 0,1 × 8 = 3,6 + 0,9 + 1,8 + 0,8 = 7,1. Le fournisseur 2 est retenu. L'exercice montre que le résultat dépend fortement des poids : c'est pourquoi on les fixe avant de lire les devis et on les justifie (par exemple, un budget très contraint justifie un poids élevé pour le prix).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.5 – Le budget

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel compte inscrit-on les honoraires d'une diététicienne libérale ? Le salaire d'une animatrice ?
2. Pourquoi les comptes 86 et 87 doivent-ils être égaux ?
3. Calculez le coût horaire d'une salariée dont le coût employeur mensuel est de 2 730 € pour 151,67 heures.
4. Un poste prévu à 250 € est réalisé à 280 €. Calculez l'écart en euros et en pourcentage.
5. Comment valorise-t-on une salle prêtée gratuitement ?
6. Qu'est-ce qu'un coût fixe ? Donnez un exemple dans un atelier culinaire.

Corrigé – Point d'étape 8.3.5

1. Honoraires : compte 62 ; salaire et charges : compte 64.
2. Ce sont les deux faces d'une même contribution : on l'utilise (86, charge) et on la reçoit (87, produit) ; leur égalité garde le budget équilibré.
3. 2 730 / 151,67 = **18,00 €** de l'heure.
4. 280 − 250 = **+ 30 €** ; 30 / 250 × 100 = **+ 12,0 %**.
5. Nombre d'heures ou de demi-journées × tarif de location pratiqué par le propriétaire, avec une attestation.
6. Une charge qui ne dépend pas du nombre de participants, par exemple le temps de l'animatrice ou la location de la salle.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.6.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je refais le budget pas à pas de la régie de quartier.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.5 et je refais les exercices d'application.

8.3.6 Piloter le projet

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Définition – Pilotage

Ensemble des activités qui permettent de **suivre** l'avancement du projet (activités, délais, budget, participation), de **repérer** les écarts et les risques, de **décider** des ajustements et d'en **rendre compte** aux partenaires et financeurs.

Le tableau de bord de suivi

Indicateur de suivi · Prévu à mi-parcours · Réalisé à mi-parcours · Analyse

Ateliers réalisés — *Prévu à mi-parcours :* 3 / 6 ; *Réalisé à mi-parcours :* 3 / 6 ; *Analyse :* Conforme

Taux de présence — *Prévu à mi-parcours :* ≥ 80 % ; *Réalisé à mi-parcours :* 31 / 36 = 86,1 % ; *Analyse :* Conforme

Familles inscrites — *Prévu à mi-parcours :* 12 ; *Réalisé à mi-parcours :* 12 (dont 1 remplacement) ; *Analyse :* Liste d'attente utilisée

Budget consommé — *Prévu à mi-parcours :* ≈ 50 % ; *Réalisé à mi-parcours :* 1 650 / 3 510 = 47,0 % ; *Analyse :* Conforme

Questionnaires « avant » recueillis — *Prévu à mi-parcours :* 12 ; *Réalisé à mi-parcours :* 12 ; *Analyse :* Conforme

Supports validés — *Prévu à mi-parcours :* 6 fiches recettes ; *Réalisé à mi-parcours :* 4 ; *Analyse :* Retard : 2 fiches en relecture FALC

Calcul du taux de présence : 3 ateliers × 12 familles = 36 présences possibles ; 31 présences constatées (11 + 10 + **10.** ; 31 / 36 × 100 = **86,1 %** (objectif ≥ 80 % atteint).

Gérer les risques

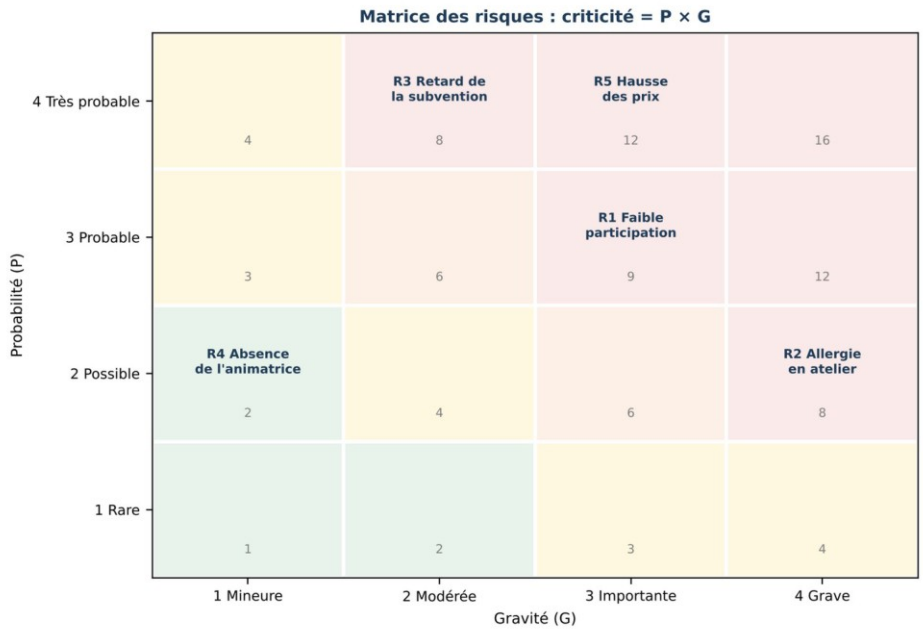


Figure 8.5 – La matrice des risques du projet des Tilleuls

Risque · P · G · P × G · Mesure de prévention ou de réduction

R1 – Faible participation — *P :* 3 ; *G :* 3 ; *P × G :* 9 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Inscription en face à face, rappel la veille (SMS, message vocal), horaires adaptés, garde d'enfants, liste d'attente

R2 – Réaction allergique en atelier — *P :* 2 ; *G :* 4 ; *P × G :* 8 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Recueil des allergies à l'inscription, étiquetage des 14 allergènes, variantes, trousse et protocole d'urgence

R3 – Retard de versement de la subvention — *P :* 4 ; *G :* 2 ; *P × G :* 8 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Vérifier la trésorerie, avance de la structure, achats échelonnés

R4 – Absence de l'animatrice — *P :* 2 ; *G :* 1 ; *P × G :* 2 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Conducteurs rédigés et partagés, binôme de remplacement

R5 – Hausse des prix des denrées — *P :* 4 ; *G :* 3 ; *P × G :* 12 ; *Mesure de prévention ou de réduction :* Recettes de saison, achats groupés, partenariat avec l'épicerie, marge de 10 % sur la ligne denrées

Lecture : la criticité (P × G, de 1 à 16) classe les risques : R5 (12), puis R1 (9), puis R2 et R3 (8). Un risque de gravité 4 (R2) appelle toujours des mesures, même si sa probabilité est faible.

Animer une réunion et en rendre compte

Méthode pas à pas – Réunion de pilotage efficace

Avant : ordre du jour envoyé une semaine avant, documents joints (tableau de bord, budget). **Pendant** : rappel des objectifs, point d'avancement (ce qui est fait, écarts, risques), décisions à prendre, répartition des tâches (qui fait quoi pour quand), date de la prochaine réunion ; respect du temps. **Après** : **compte rendu** sous 48 heures : présents et excusés, points abordés, **décisions** prises, **relevé des actions** (tâche, responsable, échéance).

Choisir et définir les indicateurs de suivi

Le tableau de bord ne contient pas tous les chiffres possibles : il en retient **quelques-uns**, choisis parce qu'ils permettent de décider. On distingue les indicateurs de **suivi** (ou de processus), qui disent si le projet se déroule comme prévu (activités réalisées, présence, budget, délais), et les indicateurs de **résultat**, qui disent si les objectifs sont atteints. Les premiers servent au pilotage en cours de route ; les seconds servent surtout à l'évaluation (chapitre 9). Un bon tableau de bord compte cinq à huit indicateurs.

Domaine · Indicateur de suivi · Formule · Fréquence

Activité — *Indicateur de suivi :* Taux de réalisation des ateliers ; *Formule :* Ateliers réalisés / ateliers prévus à cette date × 100 ; *Fréquence :* Chaque mois

Participation — *Indicateur de suivi :* Taux de présence ; *Formule :* Présences constatées / présences possibles × 100 ; *Fréquence :* Après chaque atelier

Participation — *Indicateur de suivi :* Taux de fidélisation ; *Formule :* Participants présents à au moins 4 ateliers sur 6 / inscrits × 100 ; *Fréquence :* À mi-parcours et à la fin

Budget — *Indicateur de suivi :* Taux de consommation du budget ; *Formule :* Dépenses réalisées / budget prévu × 100 ; *Fréquence :* Chaque mois

Délais — *Indicateur de suivi :* Nombre de tâches en retard ; *Formule :* Tâches non terminées à leur échéance ; *Fréquence :* À chaque comité technique

Partenariat — *Indicateur de suivi :* Orientations par les partenaires ; *Formule :* Nombre de personnes orientées par chaque partenaire ; *Fréquence :* Chaque mois

Définition – Fiche indicateur

Document court qui définit un indicateur pour que tout le monde le calcule de la même façon : **nom**, **définition**, **formule** (numérateur et dénominateur), **source** des données, **fréquence** de mesure, **responsable**, **valeur cible** et **seuil d'alerte** (valeur à partir de laquelle on

réagit).

Exemple – Fiche indicateur « taux de présence »

Nom : taux de présence aux ateliers. **Définition** : part des places réservées effectivement occupées. **Formule** : nombre de présences constatées sur les feuilles d'émargement / (nombre d'inscrits × nombre d'ateliers réalisés) × 100. **Source** : feuilles d'émargement. **Fréquence** : après chaque atelier, cumul mensuel. **Responsable** : l'animatrice. **Valeur cible** : 80 % au moins. **Seuil d'alerte** : moins de 70 % sur deux ateliers consécutifs, ce qui déclenche des appels aux personnes absentes et un point au comité technique.

Attention – Un taux sans effectif ne dit rien

Un taux de présence de 50 % peut correspondre à 3 personnes sur 6 ou à 30 personnes sur 60. Dans le tableau de bord, on donne toujours le **nombre** et le **pourcentage**. Pour les petits groupes, une seule absence change fortement le taux : on regarde la tendance sur plusieurs ateliers plutôt qu'une valeur isolée.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.16

Rédigez la fiche indicateur du « taux de consommation du budget » d'un projet de 4 000 €, suivi chaque mois par la coordinatrice. Proposez une valeur cible à mi-parcours et un seuil d'alerte.

Corrigé

Nom : taux de consommation du budget. Définition : part du budget prévisionnel déjà dépensée. Formule : dépenses réalisées (factures et salaires imputés au projet) / 4 000 € × 100. Source : tableau de suivi budgétaire tenu dans le tableur, rapproché des factures. Fréquence : chaque mois. Responsable : la coordinatrice. Valeur cible : proche de l'avancement du projet (environ 50 % à mi-parcours). Seuil d'alerte : un écart de plus de 15 points avec l'avancement (moins de 35 % ou plus de 65 % à mi-parcours), qui conduit à analyser les postes concernés.

Analyser un écart et décider

Un écart entre le prévu et le réalisé n'est pas une faute : c'est une **information**. Le pilotage consiste à le repérer tôt, à en comprendre la cause et à décider d'un ajustement, puis à vérifier que l'ajustement a eu l'effet attendu.

Méthode pas à pas – De l'écart à la décision

1. Constater : quel indicateur, quel écart, depuis quand ? On donne les chiffres.

2. Chercher les causes : on interroge les personnes concernées (participants, animateurs, partenaires) et on vérifie les faits. On peut se demander plusieurs fois « pourquoi ? » pour remonter à la cause profonde.

3. Lister les options : continuer sans changer, ajuster (horaire, lieu, méthode, budget), renforcer (rappels, relais), ou modifier le projet (après accord du financeur).

4. Décider en comité technique ou en comité de pilotage, selon l'importance, et noter la décision (qui fait quoi, pour quand).

5. Vérifier l'effet au point suivant du tableau de bord.

Exemple – Calcul détaillé : une présence qui baisse

Un cycle de six ateliers accueille 12 inscrits. Présences aux quatre premiers ateliers : 11, 10, 8 et 6.

- Taux par atelier : 11 / 12 = **91,7 %** ; 10 / 12 = **83,3 %** ; 8 / 12 = **66,7 %** ; 6 / 12 = **50,0 %**.
- Taux cumulé : (11 + 10 + 8 + 6) / (4 × 12) = 35 / 48 = **72,9 %**, sous la cible de 80 %.
- Évolution entre le premier et le quatrième atelier : (6 – 11) / 11 × 100 = **– 45,5 %**.

Causes recherchées : l'animatrice appelle les six absents. Quatre expliquent que les ateliers 3 et 4 ont eu lieu pendant les vacances scolaires, avec les enfants à la maison ; deux ont repris un travail. **Options** : proposer un accueil des enfants pendant les vacances, ou décaler les deux derniers ateliers hors vacances ; envoyer les fiches recettes aux personnes qui travaillent. **Décision** du comité technique : les ateliers 5 et 6 sont placés hors vacances, avec un rappel par message vocal la veille ; les fiches sont envoyées aux deux personnes en emploi. **Vérification** : 10 et 11 présents aux ateliers 5 et 6 (taux cumulé final : 56 / 72 = 77,8 %).

Astuce – Écrire « on a appris » plutôt que « on a échoué »

Dans le compte rendu et devant le jury, un écart bien analysé est un point fort. La phrase « la présence a baissé pendant les vacances scolaires ; nous avons déplacé les ateliers et elle est remontée » montre une démarche de pilotage. Le jury attend cette capacité d'ajustement plus qu'un projet sans incident.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.17

Un groupe de 10 inscrits a eu les présences suivantes sur cinq ateliers : 9, 9, 7, 8, 6. Calculez le taux de présence de chaque atelier et le taux cumulé, puis proposez deux questions à poser aux personnes absentes au cinquième atelier.

Corrigé

Taux : 90,0 % ; 90,0 % ; 70,0 % ; 80,0 % ; 60,0 %. Taux cumulé : (9 + 9 + 7 + 8 + 6) / (5 × 10) = 39 / 50 = **78,0 %**. Questions : « Qu'est-ce qui vous a empêché de venir cette fois ? » ; « Qu'est-ce qui vous aiderait à venir au prochain atelier (horaire, lieu, garde d'enfants, rappel) ? ». On pose ces questions avec bienveillance, sans reproche, et on note

les réponses de façon anonyme pour le comité technique.

Le registre des risques et le plan de repli

La matrice des risques (8.3.6) classe les risques par criticité. Le **registre des risques** va plus loin : pour chaque risque, il nomme un responsable, un **signal d'alerte** qui montre que le risque est en train de se produire, des mesures de **prévention** (pour qu'il n'arrive pas) et un **plan de repli** (ce que l'on fait s'il arrive quand même). On le relit à chaque comité technique.

Risque · Criticité (P × G) · Signal d'alerte · Prévention · Plan de repli · Responsable

Canicule le jour d'un atelier de cuisine — *Criticité (P × G) :* 3 × 3 = 9 ; *Signal d'alerte :* Alerte de Météo-France à J − 2 ; *Prévention :* Atelier le matin ; recette sans four ; eau fraîche disponible ; *Plan de repli :* Remplacer la cuisson par une recette crue ; décaler l'atelier ; *Responsable :* Animatrice

Absence de la diététicienne — *Criticité (P × G) :* 2 × 3 = 6 ; *Signal d'alerte :* Message la veille ou le matin ; *Prévention :* Conducteur écrit et partagé ; binôme formé ; *Plan de repli :* L'animatrice assure un atelier « recettes déjà testées » ; *Responsable :* Coordinatrice

Intoxication alimentaire — *Criticité (P × G) :* 1 × 4 = 4 ; *Signal d'alerte :* Symptômes signalés après l'atelier ; *Prévention :* Bonnes pratiques d'hygiène, températures, traçabilité des produits ; *Plan de repli :* Conserver les restes et les étiquettes ; prévenir le médecin et la direction ; une toxi-infection alimentaire collective (au moins deux cas groupés liés au même repas) est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS ; *Responsable :* Coordinatrice

Retrait d'un partenaire qui oriente le public — *Criticité (P × G) :* 2 × 3 = 6 ; *Signal d'alerte :* Baisse des orientations sur deux mois ; *Prévention :* Plusieurs partenaires orienteurs ; restitution régulière des résultats ; *Plan de repli :* Activer d'autres relais (mairie, associations) ; *Responsable :* Coordinatrice

Définition – Plan de continuité

Ensemble des solutions prévues à l'avance pour qu'une action essentielle continue malgré un incident : un lieu de repli, une personne de remplacement, une recette sans cuisson, une version à distance. Il évite d'improviser dans l'urgence et rassure les partenaires et les financeurs.

Attention – Les risques pour les personnes passent avant les risques pour le projet

Un projet peut accepter un retard ou une baisse de participation. Il ne peut pas accepter un risque pour la santé ou la sécurité des participants : allergie, brûlure, coupure, intoxication, chute. Ces risques sont traités en priorité, même quand leur probabilité est faible, avec des règles écrites et connues de toute l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.18

Un projet prévoit trois sorties au marché avec un groupe de personnes âgées, en minibus prêté par la mairie. Identifiez deux risques, puis remplissez pour chacun le signal d'alerte, la prévention et le plan de repli.

Corrigé

Exemples. Minibus indisponible : signal, la mairie n'a pas confirmé la réservation à J − 7 ; prévention, réserver les trois dates dès le début et confirmer à J − 7 ; repli, covoiturage avec des bénévoles assurés, ou sortie remplacée par la venue d'un producteur. Chute d'une personne au marché : signal, sol mouillé, foule, fatigue d'un participant ; prévention, groupe de six au plus par accompagnateur, horaire calme, bancs repérés, chaussures adaptées conseillées ; repli, trousse de premiers secours, numéros d'urgence, fiche de contact de chaque participant.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.6 – Le pilotage

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre un indicateur de suivi et un indicateur de résultat ?
2. Que contient une fiche indicateur ? Citez cinq éléments.
3. Calculez le taux de présence cumulé de trois ateliers de 12 places avec 10, 9 et 8 présents.
4. Citez les cinq étapes qui mènent d'un écart à une décision.
5. Qu'est-ce qu'un plan de repli ?
6. Pourquoi traite-t-on un risque d'allergie même s'il est peu probable ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.6

1. L'indicateur de suivi dit si le projet se déroule comme prévu (activités, présence, budget, délais) ; l'indicateur de résultat dit si les objectifs sont atteints.
2. Nom, définition, formule, source, fréquence, responsable, valeur cible, seuil d'alerte (cinq suffisent).
3. (10 + 9 + 8) / (3 × 12) = 27 / 36 = **75,0 %**.
4. Constater, chercher les causes, lister les options, décider, vérifier l'effet.
5. La solution prévue à l'avance si un risque se réalise, pour que l'action continue.
6. Parce que sa gravité est maximale : il met en danger la santé d'une personne.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.7.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la fiche indicateur et la méthode de l'écart à la décision.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.6 et je refais les exercices d'application.

8.3.7 Élaborer le plan de communication du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 12)

Le référentiel cite explicitement le **plan de communication** parmi les indicateurs de la compétence C3.1. Il organise la manière dont on fait connaître le projet, on mobilise le public et les partenaires, et on valorise les résultats (fiche **F10** ; les techniques de communication sont approfondies aux chapitres 14 et 15).

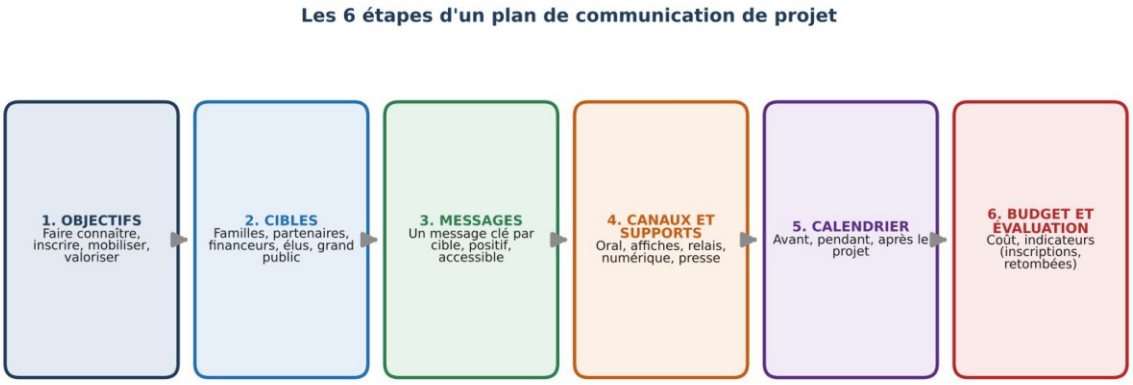


Figure 8.8 – Les étapes d'un plan de communication

Comprendre le schéma – Figure 8.8

1. Objectifs de communication : faire connaître le projet, susciter les inscriptions, mobiliser les partenaires, informer les financeurs, valoriser les résultats ; ils se distinguent des objectifs de santé du projet.

2. Cibles : public bénéficiaire (familles), relais (enseignants, travailleurs sociaux, mamans relais), partenaires, financeurs, élus, grand public.

3. Messages : un message clé par cible (« Venez cuisiner à petit prix avec vos enfants » pour les familles ; « Un projet qui réduit les inégalités d'accès à une alimentation favorable » pour les financeurs), clair et non stigmatisant (chapitres 5 et 6).

4. Canaux et supports : bouche-à-oreille et relais (souvent les plus efficaces auprès des publics éloignés), affiches et flyers imagés, messages vocaux, réseaux sociaux de la structure, presse locale, réunions.

5. Calendrier : avant (lancement, inscriptions), pendant (rappels, informations aux partenaires), après (restitution, valorisation, chapitre 9).

6. Budget et évaluation : coût des supports, temps humain ; indicateurs (nombre d'inscriptions par canal, fréquentation, retombées presse).

Cible · Objectif · Message · Canal, support · Quand

Familles du quartier — *Objectif :* S'inscrire aux ateliers ; *Message :* « Cuisinons ensemble des repas bons et pas chers » ; *Canal, support :* Mamans relais, affiches imagées, message vocal, inscription à l'accueil ; *Quand :* 3 semaines avant

Enseignants, PMI, épicerie — *Objectif :* Orienter les familles ; *Message :* « Un cycle gratuit d'ateliers pour vos familles » ; *Canal, support :* Réunion, courriel, flyer ; *Quand :* 4 semaines avant

Financeurs (ARS, commune, CAF) — *Objectif :* Informer, rendre compte ; *Message :* « Le projet avance : 6 ateliers, 12 familles » ; *Canal, support :* Point d'étape, bilan ; *Quand :* Mi-parcours, fin

Élus, grand public — *Objectif :* Faire connaître, valoriser ; *Message :* « Le quartier cuisine ! » ; *Canal, support :* Journal municipal, temps fort, réseaux de la structure ; *Quand :* Fin du cycle

Exemple – Calcul détaillé : efficacité des canaux de recrutement

Pour un cycle d'ateliers, 31 familles ont pris contact. Origine : mamans relais 14 ; affiche au centre social 6 ; orientation par l'épicerie solidaire 7 ; publication sur la page de la structure 2 ; flyer distribué à la sortie de l'école (300 flyers) 2.

- Vérification : 14 + 6 + 7 + 2 + 2 = **31** (vérifié).
- Parts : mamans relais 14 / 31 = **45,2 %** ; épicerie 7 / 31 = **22,6 %** ; affiche 6 / 31 = **19,4 %** ; page de la structure 2 / 31 = **6,5 %** ; flyers 2 / 31 = **6,5 %**.
- Rendement des flyers : 2 contacts pour 300 flyers = 2 / 300 × 100 = **0,67 %** ; coût d'impression 45 € : 45 / 2 = **22,50 € par contact**.

Conclusion : auprès de ce public, les **relais humains** (mamans relais, épicerie) apportent deux tiers des contacts (21 / 31 = 67,7 %) ; les flyers sont peu efficaces : on réoriente le budget vers la formation des relais.

Rédiger un message clair et non stigmatisant

Le meilleur canal ne sert à rien si le message n'est pas compris ou s'il blesse. Un message de projet doit être **court**, **concret**, **positif** et **adapté** à la cible. Il dit ce que la personne va trouver, pas ce qui ne va pas chez elle. Les techniques de communication et l'écriture en facile à lire et à comprendre (FALC) sont développées aux chapitres 14 et 15 ; on retient ici ce qui concerne le projet.

Message à éviter · Pourquoi · Message reformulé

« Atelier pour les familles en difficulté » — *Pourquoi :* Il désigne et stigmatise ; les personnes concernées ne viendront pas ; *Message reformulé :* « Atelier cuisine du mardi : des repas bons et pas chers, à faire en famille »

« Venez apprendre à bien manger » — *Pourquoi :* Il suppose que les personnes mangent mal ; *Message reformulé :* « Venez découvrir des recettes rapides et partager vos astuces »

« Lutte contre l'obésité infantile » — *Pourquoi :* Il étiquette les enfants et inquiète les parents ; *Message reformulé :* « Bouger et goûter : un mercredi par mois pour les 6-10 ans et leurs parents »

« Conférence sur les recommandations du PNNS » — *Pourquoi :* Il est abstrait et peu attirant ; *Message reformulé :* « Les légumes secs, ça se cuisine comment ? Dégustation offerte »

Méthode pas à pas – Vérifier un message avant de le diffuser

1. Une seule idée principale, dite dans la première phrase ou le titre.

2. Les informations pratiques visibles : quoi, quand, où, combien (gratuit ?), comment s'inscrire, avec qui.

3. Des mots simples, des phrases courtes, des chiffres écrits en chiffres, une image qui montre l'activité (et non un aliment « interdit » barré).

4. Aucun mot qui juge les personnes ou leurs habitudes.

5. Un test auprès de deux ou trois personnes du public : ont-elles compris ? Ont-elles envie de venir ?

Exemple – Une affiche reformulée avec les habitantes

Une première affiche annonçait : « Programme nutrition : prévention du surpoids et des maladies cardiovasculaires ». Testée auprès de quatre habitantes, elle a été jugée « triste » et « pour les malades ». Avec elles, l'équipe a choisi un titre (« Cuisine du monde, petit budget »), une photo d'un atelier précédent (avec l'accord écrit des personnes photographiées) et trois informations en gros caractères : « Le mardi, 9 h 30 – 12 h », « Gratuit », « Inscription à l'accueil ou au 06… ». Les inscriptions ont été complètes en dix jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.19

Reformulez ce message destiné à des retraités vivant seuls : « Le CCAS organise un programme de prévention de la dénutrition chez les personnes âgées isolées. » Donnez un titre, une phrase d'accroche et les trois informations pratiques à faire figurer.

Corrigé

Exemple. Titre : « Les jeudis gourmands ». Accroche : « Un repas cuisiné ensemble, une fois par mois, pour le plaisir de partager et de découvrir des recettes simples. » Informations pratiques : « Un jeudi par mois, de 10 h à 14 h, à la salle des fêtes » ; « Participation : 3 € le repas » ; « Inscription au CCAS ou par téléphone ; transport possible sur demande ». Les mots « dénutrition », « personnes âgées » et « isolées » ne figurent pas : ils décrivent l'objectif de santé, pas l'activité, et risquent de faire fuir les personnes visées.

Communiquer avec les financeurs, les partenaires et les médias

Le plan de communication ne s'adresse pas seulement au public. Les financeurs et les partenaires attendent d'être **informés** et **cités** ; les élus et la presse peuvent **valoriser** le projet et faciliter sa pérennisation.

Destinataire · Ce qu'il attend · Bonnes pratiques

Financeurs — *Ce qu'il attend :* Que leur soutien soit visible et que le projet avance comme prévu ; *Bonnes pratiques :* Apposer leur logo ou la mention prévue par la convention ; envoyer un point d'étape à mi-parcours ; les inviter au temps fort ; respecter leur charte graphique

Partenaires — *Ce qu'il attend :* Que leur rôle soit reconnu ; *Bonnes pratiques :* Les citer sur les supports, valider avec eux les documents qui les concernent, leur transmettre les résultats agrégés

Élus — *Ce qu'il attend :* Des résultats concrets pour leur territoire ; *Bonnes pratiques :* Une note courte, deux ou trois chiffres, une photo du temps fort, une proposition pour la suite

Presse locale — *Ce qu'il attend :* Une histoire, des personnes, une date ; *Bonnes pratiques :* Un communiqué court, envoyé une semaine avant l'événement, avec un contact disponible

Définition – Communiqué de presse

Texte court (une page au plus) envoyé aux journalistes pour annoncer un événement ou un résultat. Il répond dès le premier paragraphe aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi ; il contient une citation d'un responsable, les informations pratiques et un contact. Le titre est informatif et concret.

Attention – Image des personnes et données

Une photo d'atelier publiée dans la presse ou sur un réseau social nécessite l'**accord écrit** des personnes reconnaissables (et des titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), pour un usage précis. On ne publie jamais une information qui permet d'identifier la situation de santé ou sociale d'une personne. On peut photographier les mains, les plats, ou le groupe de dos (chapitre 6).

Exemple – Un communiqué de presse (extrait, projet fictif)

« **Les habitants du quartier des Peupliers ouvrent leur cuisine le 18 juin.** Samedi 18 juin, de 11 h à 14 h, sur la place du marché, douze familles qui ont suivi les ateliers "Cuisine du monde, petit budget" proposent une dégustation gratuite de leurs recettes. Le projet, porté par le centre social avec l'épicerie sociale et la PMI, a été soutenu par la commune et la caisse d'allocations familiales. "Nous avons appris à cuisiner les lentilles, et maintenant nous apprenons aux autres", explique une

participante. Contact : coordinatrice du projet, centre social, 06… »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.20

Un projet financé par l'ARS et la commune se termine par un repas partagé. Indiquez trois actions de communication à prévoir envers les financeurs, et une précaution à prendre si un journaliste vient photographier le repas.

Corrigé

Exemples : inviter les représentants de l'ARS et de la commune au repas, avec un carton d'invitation envoyé trois semaines avant ; faire figurer leurs logos ou la mention de soutien sur l'affiche et sur le livret de recettes, selon les conventions ; leur adresser une note de bilan avec les principaux chiffres dans le mois qui suit. Précaution : recueillir l'accord écrit des personnes avant toute photo où elles sont reconnaissables, prévoir un espace sans photo pour ceux qui refusent, et relire les légendes pour qu'aucune information personnelle n'apparaisse.

Planifier et évaluer les actions de communication

Le plan de communication a besoin d'un **calendrier** et d'un **suivi**, comme le reste du projet. On construit le calendrier à rebours à partir de la date de l'action (8.3.4), puis on mesure, pour chaque canal, combien de personnes il a permis de toucher ou d'inscrire.

Échéance · Action de communication · Responsable

J − 6 semaines — *Action de communication :* Rencontre des relais (centre social, PMI, association de quartier) ; remise du message clé ; *Responsable :* Chef de projet

J − 4 semaines — *Action de communication :* Article dans le bulletin municipal (délai de bouclage à vérifier) ; affiches dans les commerces ; *Responsable :* Commune, bénévoles

J − 3 semaines — *Action de communication :* Publication sur les réseaux de la structure ; ouverture des inscriptions ; *Responsable :* Chargée de communication

J − 1 semaine — *Action de communication :* Communiqué de presse ; point sur les inscriptions et relance si besoin ; *Responsable :* Chef de projet

J − 1 jour — *Action de communication :* Rappel individuel des inscrits (message ou appel) ; *Responsable :* Animatrice

J + 1 semaine — *Action de communication :* Remerciements aux partenaires ; photos (avec accord) et chiffres clés ; *Responsable :* Chef de projet

Exemple – Calcul détaillé : quel canal a le mieux fonctionné ? (données fictives)

À l'inscription, on a demandé à chaque participant comment il avait connu l'atelier. Résultats pour 27 inscrits :

Canal · Dépense · Inscrits · Part des inscrits · Coût par inscrit

Affiches — *Dépense :* 60 € ; *Inscrits :* 4 ; *Part des inscrits :* 14,8 % ; *Coût par inscrit :* 15,00 €

Bulletin municipal — *Dépense :* 0 € ; *Inscrits :* 6 ; *Part des inscrits :* 22,2 % ; *Coût par inscrit :* 0 €

Relais formés (2 séances × 2 h × 45 €) — *Dépense :* 180 € ; *Inscrits :* 14 ; *Part des inscrits :* 51,9 % ; *Coût par inscrit :* 12,86 €

Réseau social (publication sponsorisée) — *Dépense :* 40 € ; *Inscrits :* 3 ; *Part des inscrits :* 11,1 % ; *Coût par inscrit :* 13,33 €

Total — *Dépense :* 280 € ; *Inscrits :* 27 ; *Part des inscrits :* 100 % ; *Coût par inscrit :* 10,37 €

- Parts : 4 / 27 = 14,8 % ; 6 / 27 = 22,2 % ; 14 / 27 = 51,9 % ; 3 / 27 = 11,1 %.
- Coûts par inscrit : 60 / 4 = **15,00 €** ; 180 / 14 = **12,86 €** ; 40 / 3 = **13,33 €** ; coût moyen 280 / 27 = **10,37 €**.

Interprétation : les relais apportent plus de la moitié des inscrits, pour un coût par inscrit inférieur à celui des affiches. Le bulletin municipal ne coûte rien et apporte 6 inscrits : on le garde. Pour le cycle suivant, on peut réduire les affiches et renforcer les relais. Attention : la formation des relais a aussi un effet durable (ils pourront relayer d'autres actions), que ce calcul ne mesure pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.21

Pour un second cycle, la structure dispose de 200 € pour la communication. Elle envisage de supprimer les affiches et la publication sponsorisée, et de consacrer tout le budget aux relais. Calculez le nombre d'inscrits attendu si le coût par inscrit des relais reste de 12,86 €, ajoutez les inscrits du bulletin municipal (6), puis discutez la limite de ce raisonnement.

Corrigé

Inscrits attendus par les relais : 200 / 12,86 = 15,55, soit environ 15 inscrits (on arrondit à l'entier inférieur pour rester prudent). Avec le bulletin municipal : 15 + 6 = 21 inscrits environ. Limite : le coût par inscrit n'est pas forcément constant ; les relais ont peut-être déjà mobilisé les personnes les plus faciles à toucher, et le nombre de relais disponibles est limité. Supprimer les affiches et les réseaux sociaux prive aussi le projet de publics que les relais ne connaissent pas. Il vaut mieux garder un petit budget pour un canal de diffusion large et suivre de nouveau l'origine des inscriptions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.7 – Le plan de communication

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six éléments d'un plan de communication.
2. Pourquoi un objectif de communication est-il différent d'un objectif de santé ? Donnez un exemple.
3. Reformulez sans stigmatiser : « Atelier pour les personnes en surpoids ».

4. Quel canal est souvent le plus efficace auprès des publics éloignés des institutions ?
5. Que doit contenir le premier paragraphe d'un communiqué de presse ?
6. Que faut-il obtenir avant de publier la photo d'un participant ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.7

1. Objectifs de communication, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation.
2. L'objectif de communication porte sur la connaissance du projet ou la mobilisation (par exemple « remplir les 12 places en trois semaines ») ; l'objectif de santé porte sur un changement chez le public (par exemple « augmenter la consommation de légumes »).
3. Par exemple : « Bouger et cuisiner léger : un atelier convivial le jeudi soir ».
4. Les relais humains : pairs, relais formés, professionnels de confiance, bouche-à-oreille.
5. Qui, quoi, où, quand, pourquoi.
6. L'accord écrit de la personne (et des titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), pour un usage précis.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.8.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le tableau des messages à éviter.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.7 et je refais les exercices d'application.

8.3.8 Choisir les méthodes et les outils pédagogiques

Module · Référentiel et guide : voir 8.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le plan d'action précise **comment** les objectifs éducatifs seront atteints. Le choix de la méthode dépend du **type d'objectif** (savoir, savoir-faire, savoir-être), du **public** et des **moyens**.

Méthode · Principe · Usage en nutrition

Expositive (transmissive) — *Principe :* L'intervenant présente, explique ; *Usage en nutrition :* Courte présentation des repères ; efficace pour des connaissances simples, insuffisante seule

Interrogative — *Principe :* L'intervenant fait découvrir par des questions ; *Usage en nutrition :* Quiz, « selon vous, pourquoi… ? » ; fait émerger les représentations

Démonstrative — *Principe :* L'intervenant montre, l'apprenant reproduit ; *Usage en nutrition :* Technique culinaire (cuisson des légumes secs), lecture d'étiquette

Active, expérientielle — *Principe :* L'apprenant agit, expérimente, puis analyse ; *Usage en nutrition :* Atelier culinaire, dégustation, jeu de rôle, défi, enquête de terrain

Coopérative — *Principe :* Travail en petits groupes, entraide ; *Usage en nutrition :* Cuisine en équipes, création collective d'un livret

Attention – Le mythe de la « pyramide de l'apprentissage »

On lit souvent que l'on retiendrait « 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on entend… 90 % de ce qu'on fait ». Ces pourcentages, attribués à tort à Edgar Dale, ne reposent sur aucune étude. Il est en revanche bien établi que l'**engagement actif**, la **pratique répétée** et le **retour d'information** favorisent l'apprentissage : c'est ce qui justifie les ateliers pratiques.

Type d'objectif · Méthodes et outils adaptés

Connaissances (citer les repères) — *Méthodes et outils adaptés :* Exposé court illustré, quiz, jeux de cartes, photolangage

Savoir-faire (cuisiner, lire une étiquette) — *Méthodes et outils adaptés :* Démonstration puis pratique, atelier culinaire, mise en situation en magasin

Attitudes (oser goûter, critiquer une publicité) — *Méthodes et outils adaptés :* Dégustation sans pression, débat, analyse de publicités, témoignages de pairs

Comportements (consommer des légumes secs 2 fois par semaine) — *Méthodes et outils adaptés :* Combinaison : pratique, défis à la maison, rappel, soutien du groupe, accès aux produits (environnement)

Formuler des objectifs pédagogiques

Une séance éducative se prépare à partir d'**objectifs pédagogiques**. Ils sont plus précis que les objectifs opérationnels du projet : ils décrivent ce que le participant saura **faire** à la fin de la séance. Un objectif pédagogique commence par un **verbe d'action observable** (citer, choisir, préparer, comparer), et non par un verbe vague (connaître, comprendre, prendre conscience).

Définition – Objectif pédagogique

Énoncé de ce que l'apprenant sera capable de faire à l'issue d'une séquence, formulé avec un verbe d'action observable, dans des conditions précisées, avec un critère de réussite. Exemple : « À la fin de l'atelier, chaque participant choisit, parmi cinq céréales du petit-déjeuner, celle qui contient le moins de sucres, en lisant le tableau nutritionnel pour 100 g. »

La **taxonomie de Bloom** (Bloom, 1956), révisée par Anderson et Krathwohl (2001), classe les objectifs cognitifs du plus simple au plus complexe. Elle aide à choisir le bon verbe et à vérifier que la séance ne se limite pas à la mémorisation.

Niveau (version révisée, 2001) · Ce que fait le participant · Verbes utiles · Exemple en nutrition

Se souvenir — *Ce que fait le participant :* Il retrouve une information ; *Verbes utiles :* Citer, nommer, lister ; *Exemple en nutrition :* Citer trois légumes secs

Comprendre — *Ce que fait le participant :* Il explique avec ses mots ; *Verbes utiles :* Expliquer, reformuler, classer ; *Exemple en nutrition :* Expliquer pourquoi les légumes secs rassasient

Appliquer — *Ce que fait le participant :* Il utilise une règle dans une situation ; *Verbes utiles :* Calculer, préparer, utiliser ; *Exemple en nutrition :* Préparer une portion de lentilles pour un adulte

Analyser — *Ce que fait le participant :* Il décompose, compare ; *Verbes utiles :* Comparer, distinguer, repérer ; *Exemple en nutrition :* Comparer deux étiquettes de plats préparés

Évaluer — *Ce que fait le participant :* Il juge selon des critères ; *Verbes utiles :* Justifier, choisir, critiquer ; *Exemple en nutrition :* Choisir le menu le plus équilibré et justifier son choix

Créer — *Ce que fait le participant :* Il produit quelque chose de nouveau ; *Verbes utiles :* Concevoir, composer, inventer ; *Exemple en nutrition :* Composer les menus d'une semaine avec un budget donné

Méthode – Rédiger un objectif pédagogique en quatre éléments

1. **Qui ?** Le participant (et non l'animateur : « présenter les repères » est une activité de l'animateur, pas un objectif).
2. **Quoi ?** Un verbe d'action observable et son complément.
3. **Dans quelles conditions ?** Avec quel support, quel matériel, quelle aide.
4. **Avec quel critère de réussite ?** Un seuil vérifiable (« sans erreur », « au moins trois sur cinq », « en moins de 10 minutes »).

Formulation à éviter · Pourquoi · Formulation correcte

« Sensibiliser les parents au sucre » — *Pourquoi :* Verbe vague, centré sur l'animateur ; *Formulation correcte :* « Chaque parent estime, avec des morceaux de sucre, la quantité de sucres contenue dans trois boissons courantes, avec au plus une erreur »

« Que les jeunes comprennent l'équilibre alimentaire » — *Pourquoi :* Non observable ; *Formulation correcte :* « Chaque jeune compose un plateau repas comportant les composantes du repère, à partir d'un choix d'images »

« Faire un atelier cuisine » — *Pourquoi :* C'est une activité, pas un objectif ; *Formulation correcte :* « Les participants préparent en binôme une soupe de légumes de saison en suivant une fiche recette illustrée »

Construire le conducteur de séance

Le **conducteur** (ou déroulé) est le document qui organise la séance minute par minute. Il permet à un autre animateur de reprendre la séance, il sert de support au bilan et il est souvent demandé dans un dossier de financement.

Exemple – Conducteur d'un atelier de 90 minutes « Goûters malins » (public : parents d'enfants de 6 à 10 ans, projet fictif)

Objectif pédagogique principal : « À la fin de l'atelier, chaque parent compose trois goûters associant un produit céréalier, un fruit et un produit laitier ou une boisson sans sucre ajouté, pour un coût inférieur à 0,80 € par enfant. »

Temps · Durée · Activité · Méthode · Matériel · Rôle de l'animateur

0 – 10 min — *Durée :* 10 ; *Activité :* Accueil, présentation, règles du groupe ; *Méthode :* Tour de table ; *Matériel :* Badges, feuille d'émargement ; *Rôle de l'animateur :* Accueillir, rappeler la confidentialité

10 – 25 min — *Durée :* 15 ; *Activité :* « Le goûter de mon enfant » : chacun décrit un goûter habituel ; *Méthode :* Photolangage ; *Matériel :* Photos de goûters ; *Rôle de l'animateur :* Faire émerger les représentations, ne pas juger

25 – 40 min — *Durée :* 15 ; *Activité :* Repères : rôle du goûter, composition, sucres cachés ; *Méthode :* Exposé court interactif ; *Matériel :* Affiche, emballages vides ; *Rôle de l'animateur :* Reformuler les apports du groupe

40 – 70 min — *Durée :* 30 ; *Activité :* Préparation de trois goûters en équipes ; *Méthode :* Atelier pratique coopératif ; *Matériel :* Denrées, ustensiles, fiches recettes ; *Rôle de l'animateur :* Circuler, aider, vérifier l'hygiène

70 – 80 min — *Durée :* 10 ; *Activité :* Dégustation et calcul du coût par enfant ; *Méthode :* Calcul guidé ; *Matériel :* Tickets de caisse, calculatrice ; *Rôle de l'animateur :* Valoriser chaque équipe

80 – 90 min — *Durée :* 10 ; *Activité :* Bilan : « ce que je vais essayer cette semaine », questionnaire ; *Méthode :* Écrit court et oral ; *Matériel :* Questionnaire, livret ; *Rôle de l'animateur :* Recueillir les données d'évaluation

Astuce – Équilibrer la séance

Une règle pratique consiste à limiter l'exposé à **15 minutes d'affilée** et à alterner les temps où l'animateur parle et ceux où les participants agissent. Le temps de bilan final n'est jamais supprimé : c'est lui qui fournit les données de l'évaluation de processus et de résultats (chapitre 9).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.22

Réécrivez ces trois énoncés sous la forme d'objectifs pédagogiques, puis indiquez le niveau de la taxonomie révisée de Bloom correspondant.

a) « Informer les seniors sur les protéines. »

b) « Apprendre aux étudiants à faire leurs courses. »

c) « Que les participants connaissent les féculents. »

Corrigé

a) « À la fin de la séance, chaque participant cite au moins trois aliments sources de protéines qu'il peut consommer au dîner, dont un d'origine végétale. » (Se souvenir.) On peut viser plus haut : « … compose un dîner apportant une source de protéines à partir d'une liste d'aliments » (Créer ou Appliquer).

b) « À partir d'un budget de 25 € et d'une liste de prix, chaque étudiant établit une liste de courses pour quatre repas, comprenant des légumes et un féculent à chaque repas. » (Créer.)

c) « Chaque participant classe dix aliments en "féculents" et "autres", avec au plus une erreur. » (Comprendre.)

Dans les trois cas, le verbe vague (informer, apprendre, connaître) est remplacé par une action observable, et un critère de réussite est ajouté.

Choisir et analyser un outil pédagogique

Un **outil pédagogique** (jeu, exposition, mallette, vidéo, photolangage, application) est un support qui aide l'animateur à atteindre un objectif. Avant de l'utiliser, on

vérifie qu'il est **fiable**, **adapté au public** et **cohérent avec l'objectif**. Un outil séduisant mais dépassé ou culpabilisant peut produire l'effet inverse de celui recherché.

En France, l'INPES a publié en 2005 un référentiel de critères de qualité des outils d'intervention en éducation pour la santé (Lemonnier et al., *Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité*, INPES, 2005). Il organise l'analyse autour de quatre axes : le **contenu**, la **pédagogie**, le **support** et la **conception** de l'outil. Les centres de ressources documentaires du réseau Promotion Santé (anciennes Ireps) prêtent des outils et accompagnent leur choix.

Axe · Questions à se poser · Exemple de point faible

Contenu — *Questions à se poser :* Les informations sont-elles exactes, à jour, sourcées ? Sont-elles cohérentes avec les recommandations actuelles (PNNS, Santé publique France) ? ; *Exemple de point faible :* Un jeu qui présente encore la « pyramide alimentaire » des années 1990

Pédagogie — *Questions à se poser :* L'outil fait-il participer ? Laisse-t-il de la place aux représentations ? Évite-t-il la culpabilisation et la peur ? ; *Exemple de point faible :* Des cartes « bons » et « mauvais » aliments, qui moralisent

Support — *Questions à se poser :* Est-il lisible, solide, transportable, accessible (langue, illustrations, handicap) ? ; *Exemple de point faible :* Des textes longs pour un public peu lecteur

Conception — *Questions à se poser :* Qui l'a conçu, avec quel financement, a-t-il été testé auprès du public ? Y a-t-il un intérêt commercial ? ; *Exemple de point faible :* Un outil fourni gratuitement par une marque qui met ses produits en avant

Attention – Les outils offerts par l'industrie

Un outil financé par une entreprise agroalimentaire n'est pas forcément faux, mais il présente un **risque de conflit d'intérêts** : messages orientés, logos, produits mis en scène. En éducation pour la santé, on privilégie les outils d'organismes publics ou associatifs indépendants et on vérifie systématiquement la présence de marques. Ce point est attendu à l'épreuve E5.

Méthode – Analyser un outil en six questions

1. Quel est l'**objectif** de l'outil, et correspond-il à mon objectif pédagogique ?
2. À quel **public** est-il destiné (âge, niveau de lecture, culture) ?
3. Le **contenu** est-il exact et daté ? Qui l'a conçu, et y a-t-il un intérêt commercial ?
4. Quelle **démarche** propose-t-il : transmettre, faire découvrir, faire débattre, faire pratiquer ?
5. Quelles **conditions** d'utilisation : durée, nombre de participants, matériel, formation de l'animateur ?
6. Quelles **adaptations** sont nécessaires, et comment évaluer son effet ?

Exemple – Analyse d'un outil fictif : le jeu « Le marché de Léo »

Jeu de plateau pour enfants de 8 à 11 ans : chaque équipe dispose d'un budget fictif et doit « acheter » un repas équilibré. Conçu en 2019 par une association de consommateurs, testé dans quatre écoles. Contenu : repères alimentaires de Santé publique France publiés en 2019, sans marques. Points forts : démarche active, travail en équipe, lien avec le budget. Points faibles : prix des cartes datés de 2019, à actualiser ; une carte présente les jus de fruits comme pouvant remplacer tous les fruits de la journée, alors que les repères actuels demandent de limiter les jus de fruits à un petit verre par jour au plus. Conclusion : outil retenu, après correction des prix et retrait de la carte sur les jus.

Contexte · Outil souvent adapté · Précaution

Public peu lecteur ou allophone — *Outil souvent adapté :* Photolangage, aliments réels, pictogrammes ; *Précaution :* Vérifier que les images correspondent aux habitudes culturelles du groupe

Adolescents — *Outil souvent adapté :* Défi, quiz sur smartphone, analyse de publicités, jeu de rôle ; *Précaution :* Éviter le ton moralisateur, laisser débattre

Personnes âgées — *Outil souvent adapté :* Atelier cuisine, dégustation, souvenirs alimentaires ; *Précaution :* Adapter les gestes (préhension), la lisibilité et la durée

Groupe nombreux en événement — *Outil souvent adapté :* Stand interactif, roue des questions, exposition ; *Précaution :* Prévoir un relais humain pour répondre aux questions

À vous de jouer – Exercice d'application 8.23

Une enseigne de boissons propose gratuitement à un collège un kit pédagogique intitulé « Bien s'hydrater », avec affiches et quiz. Les affiches portent le logo de la marque, et le quiz présente une boisson aromatisée de la marque comme « idéale pour le sport ». Analysez ce kit selon les quatre axes du référentiel de 2005, puis donnez votre décision argumentée.

Corrigé

Contenu : le message « boisson aromatisée idéale pour le sport » est contraire au repère (l'eau est la seule boisson indispensable ; les boissons sucrées sont à limiter). Pédagogie : le quiz peut être participatif, mais il oriente les réponses vers un produit. Support : probablement attractif. Conception : outil conçu par une entreprise, avec un intérêt commercial évident (logo, produit cité). Décision : on refuse le kit ; on le remplace par un outil indépendant (centre de ressources du réseau Promotion Santé, Santé publique France) ou on construit un quiz sur l'eau et les boissons sucrées avec les élèves. On informe la direction de la raison du refus.

Animer un groupe : posture et situations délicates

La meilleure séance sur le papier peut échouer si l'animation ne permet pas à chacun de participer. En éducation pour la santé, l'animateur n'est pas un « expert qui sait » face à des participants « qui ne savent pas » : il **facilite** les échanges,

part de ce que vivent les participants et les aide à trouver leurs propres solutions.

Technique d'animation · Comment faire · Effet recherché

Questions ouvertes — *Comment faire :* « Comment faites-vous pour… ? », « Qu'est-ce qui vous aide ? » plutôt que « Est-ce que vous mangez des légumes ? » ; *Effet recherché :* Faire parler, recueillir des expériences

Reformulation — *Comment faire :* « Si je comprends bien, le soir, vous manquez de temps pour cuisiner » ; *Effet recherché :* Montrer que l'on a écouté, vérifier sa compréhension

Valorisation — *Comment faire :* Souligner une idée, un effort, une réussite ; *Effet recherché :* Renforcer la confiance en soi et l'envie de continuer

Faire circuler la parole — *Comment faire :* Tour de table, travail en binôme, « qui n'a pas encore donné son avis ? » ; *Effet recherché :* Éviter que quelques personnes monopolisent l'échange

Synthèse — *Comment faire :* Résumer les idées du groupe à la fin de chaque temps ; *Effet recherché :* Fixer les acquis, faire le lien avec la suite

Définition – Écoute active

Attitude qui consiste à écouter sans interrompre ni juger, à montrer son attention (regard, hochements de tête), à reformuler et à poser des questions ouvertes pour aider la personne à préciser sa pensée. Elle est issue des travaux de Carl Rogers sur l'approche centrée sur la personne et elle est à la base de l'entretien motivationnel.

Situation délicate · Réponse possible de l'animateur

Un participant monopolise la parole — *Réponse possible de l'animateur :* Le remercier, résumer son idée, puis s'adresser aux autres : « Merci, c'est une piste. Qu'en pensent les autres ? » ; si besoin, proposer un tour de parole

Un participant conteste les repères (« les nutritionnistes changent d'avis tout le temps ») — *Réponse possible de l'animateur :* Accueillir l'objection sans se braquer, expliquer simplement d'où viennent les repères et pourquoi ils évoluent, revenir à l'expérience concrète du groupe

Une personne raconte une situation personnelle difficile — *Réponse possible de l'animateur :* L'écouter brièvement, la remercier de sa confiance, proposer d'en parler après la séance, l'orienter si besoin vers un professionnel adapté

Un participant se moque d'un autre (poids, habitudes) — *Réponse possible de l'animateur :* Rappeler calmement les règles du groupe fixées au début (respect, non-jugement, confidentialité)

Le groupe ne participe pas — *Réponse possible de l'animateur :* Changer de méthode : travail en binôme, activité pratique, question plus concrète, photolangage

Attention – Rester dans son rôle

Dans un atelier collectif, on ne donne pas de conseil diététique individuel sur une pathologie : on oriente vers une consultation. On évite aussi de juger les aliments (« bons » ou « mauvais ») et les personnes. Une remarque culpabilisante peut suffire à faire partir un participant, souvent celui qui avait le plus besoin de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.24

Pendant un atelier pour des parents, une mère déclare : « De toute façon, mes enfants ne mangent que des pâtes, j'ai tout essayé. » Proposez une réponse de l'animateur qui utilise l'écoute active, puis une façon d'impliquer le groupe.

Corrigé

Réponse : « Vous avez déjà beaucoup essayé, et c'est décourageant quand les enfants refusent. Qu'est-ce que vous avez tenté jusqu'ici ? » La reformulation montre que l'on a compris la difficulté, sans juger, et la question ouverte invite à préciser. Implication du groupe : « Est-ce que d'autres parents ont vécu la même chose ? Qu'est-ce qui a marché chez vous ? » Le groupe partage ses astuces (ajouter des légumes dans la sauce des pâtes, faire participer les enfants à la cuisine, proposer plusieurs fois sans forcer). L'animateur complète en rappelant que l'acceptation d'un aliment nouveau demande souvent plusieurs présentations.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.8 – Les méthodes et les outils pédagogiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi « sensibiliser les participants » n'est-il pas un objectif pédagogique ?
2. Citez les quatre éléments d'un objectif pédagogique bien rédigé.
3. Classez du plus simple au plus complexe : évaluer, se souvenir, appliquer.
4. Quelle méthode convient le mieux pour apprendre à cuisiner des légumes secs ?
5. Citez les quatre axes d'analyse d'un outil pédagogique.
6. Quel risque présente un outil offert par une entreprise agroalimentaire ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.8

1. Le verbe est vague et non observable, et il décrit l'action de l'animateur, pas ce que le participant saura faire.
2. Qui (le participant), quoi (un verbe d'action observable), dans quelles conditions, avec quel critère de réussite.
3. Se souvenir, appliquer, évaluer.
4. Une méthode démonstrative suivie d'une pratique (atelier culinaire, méthode active).
5. Le contenu, la pédagogie, le support et la conception.
6. Un conflit d'intérêts : messages orientés vers ses produits, présence de marques.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.9.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la méthode de rédaction d'un objectif et le tableau des axes.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.8 et je refais les exercices d'application.

8.3.9 Organiser la logistique des ateliers

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Prévoir les quantités : mise à l'échelle et rendement

Pour un atelier culinaire, on calcule les quantités à acheter à partir des recettes de base (fiche F8) en tenant compte du **nombre de portions** et du **rendement** des produits (part comestible après épluchage, parage, cuisson).

Exemple – Calcul détaillé : liste de courses pour un cycle de 3 ateliers

Recette de base pour 4 personnes ; chaque atelier sert **12 portions** (coefficient 12 / 4 = **3**) ; rendements usuels (ordres de grandeur) : carottes 85 % de partie comestible après épluchage ; pommes de terre 80 % ; oignons 90 % ; pommes 85 %.

- **Carottes** (300 g épluchés pour 4 personnes dans la recette) : 300 × 3 = 900 g épluchés par atelier ; poids brut = 900 / 0,85 = **1 059 g**, soit environ **1,1 kg** ; pour 3 ateliers utilisant la recette : 1,059 × 3 = **3,18 kg**, arrondis à **3,2 kg**.
- **Pommes de terre** (600 g épluchés) : 600 × 3 / 0,80 = 1 800 / 0,80 = **2 250 g** brut par atelier.
- **Lentilles corail** (160 g secs) : 160 × 3 = **480 g** (pas de perte).
- **Coût** des carottes : 3,2 kg × 1,40 €/kg = **4,48 €**.

Pourquoi c'est important : oublier le rendement conduit à manquer d'ingrédients (900 g achetés ne donnent que 765 g épluchés : 900 × 0,85) ; surestimer conduit au gaspillage.

La check-list logistique

Avant l'atelier (J − 7 à J − 1) · Commandes et courses (liste chiffrée), vérification du matériel (balance, ustensiles, four), réservation de la salle, confirmation des inscriptions (rappel la veille), impression des fiches, fiche d'allergies, trousse de secours

Jour J — *Commandes et courses (liste chiffrée), vérification du matériel (balance, ustensiles, four), réservation de la salle, confirmation des inscriptions (rappel la veille), impression des fiches, fiche d'allergies, trousse de secours :* Installation 30 minutes avant, mise en place par poste, affichage des recettes et des allergènes, émargement

Après — *Commandes et courses (liste chiffrée), vérification du matériel (balance, ustensiles, four), réservation de la salle, confirmation des inscriptions (rappel la veille), impression des fiches, fiche d'allergies, trousse de secours :* Rangement, nettoyage, inventaire du matériel et des restes de denrées, bilan à chaud, saisie des données d'évaluation, compte rendu

Maîtriser l'hygiène pendant un atelier culinaire

Un atelier culinaire manipule des denrées périssables, souvent dans une salle qui n'est pas une cuisine professionnelle. Le diététicien est responsable de la **sécurité sanitaire** de ce qu'il fait préparer et goûter. Les règles générales d'hygiène des denrées sont fixées par le **règlement (CE) n° 852/2004** du 29 avril 2004 ; les températures et les règles de la remise directe au consommateur sont précisées en France par l'**arrêté du 21 décembre 2009** relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail.

Un atelier où les participants préparent et consomment ensemble leur propre repas n'a pas toujours le même statut qu'un restaurant. Les bonnes pratiques d'hygiène s'appliquent néanmoins dans tous les cas, et elles deviennent indispensables dès que des denrées sont servies à un public extérieur (dégustation lors d'un forum, buffet de fin de projet). En cas de doute, on se renseigne auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations (DDPP ou DDETSPP).

Point de maîtrise · Règle à appliquer · Pourquoi

Lavage des mains — *Règle à appliquer :* À l'arrivée, après être allé aux toilettes, après avoir touché des œufs crus, de la viande ou des déchets ; savon, essuie-mains à usage unique ; *Pourquoi :* Les mains sont le premier vecteur de contamination

Tenue — *Règle à appliquer :* Cheveux attachés ou charlotte, tablier propre, bijoux retirés, plaie protégée par un pansement et un gant ; *Pourquoi :* Éviter les contaminations physiques et microbiennes

Chaîne du froid — *Règle à appliquer :* Transport en sac isotherme ; denrées très périssables stockées entre 0 et + 4 °C ; temps hors du froid le plus court possible ; *Pourquoi :* Limiter la multiplication des bactéries

Marche en avant — *Règle à appliquer :* Séparer les zones et les ustensiles « sale » (épluchage, viande crue) et « propre » (produits prêts à consommer) ; *Pourquoi :* Éviter les contaminations croisées

Cuisson — *Règle à appliquer :* Cuire à cœur les viandes hachées et les volailles ; ne pas servir d'œufs crus ou peu cuits aux publics fragiles ; *Pourquoi :* Détruire les bactéries pathogènes

Maintien au chaud — *Règle à appliquer :* Au moins + 63 °C jusqu'au service ; *Pourquoi :* Empêcher la multiplication bactérienne

Refroidissement — *Règle à appliquer :* Passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures, puis stocker entre 0 et + 3 °C (arrêté du 21 décembre 2009) ; *Pourquoi :* Traverser vite la zone de températures dangereuse

Restes — *Règle à appliquer :* Ne pas redonner les restes servis ; jeter ce qui est resté à température ambiante ; *Pourquoi :* Éviter les toxi-infections

Définition – Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Apparition d'au moins deux cas groupés de symptômes similaires, en général digestifs, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. La TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** auprès de l'agence régionale de santé (ARS). Le registre des risques du projet (8.3.6) prévoit la conduite à tenir.

Attention – Les publics fragiles

Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont plus vulnérables à certaines bactéries (*Listeria*, salmonelles). Pour ces publics, on évite dans les ateliers les produits à risque : œufs crus (mousse au chocolat, mayonnaise maison), lait cru, fromages au lait cru pour les femmes

enceintes, poissons crus, graines germées crues.

Informer sur les allergènes

Le **règlement (UE) n° 1169/2011** (règlement INCO) liste en annexe II **14 substances ou produits** provoquant des allergies ou des intolérances, qui doivent être signalés au consommateur. Pour les denrées non préemballées, comme un buffet ou une dégustation, le **décret n° 2015-447 du 17 avril 2015** impose que l'information soit donnée **par écrit** ou rendue accessible au consommateur.

Les 14 allergènes à déclarer (annexe II du règlement 1169/2011)	
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut)	Crustacés
Œufs	Poissons
Arachides	Soja
Lait (y compris le lactose)	Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, de pécan, du Brésil, pistaches, noix de Macadamia)
Céleri	Moutarde
Graines de sésame	Anhydride sulfureux et sulfites (au-delà de 10 mg par kg ou par litre)
Lupin	Mollusques

Méthode – Gérer les allergies dans un atelier

1. Demander les allergies et les régimes particuliers **à l'inscription**, par écrit, et les reporter sur une fiche confidentielle.
2. Choisir des recettes compatibles avec le groupe, ou prévoir une variante préparée à part, avec des ustensiles propres.
3. Lire **toutes** les étiquettes des produits achetés : les allergènes sont mis en évidence dans la liste des ingrédients.
4. Afficher le jour même, pour chaque recette, la liste des allergènes présents.
5. Connaître la conduite à tenir en cas de réaction (appel du 15 ou du 112) et savoir si la personne dispose d'un stylo d'adrénaline.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.25

Pour un buffet de fin de projet ouvert aux familles, vous prévoyez : un houmous (pois chiches, crème de sésame, citron, huile d'olive), des bâtonnets de carottes, un pain aux noix et un taboulé (semoule de blé, persil, tomates). Établissez l'affichage des allergènes, puis indiquez deux précautions d'hygiène pour le service.

Corrigé

Houmous : sésame (crème de sésame). Bâtonnets de carottes : aucun des 14 allergènes. Pain aux noix : gluten (blé) et fruits à coque (noix) ; vérifier l'étiquette du pain pour d'éventuels œufs, lait ou sésame. Taboulé : gluten (semoule de blé). L'affichage est écrit, placé à côté de chaque plat. Précautions : garder le houmous et le taboulé au froid jusqu'au service et ne pas les laisser plus de deux heures à température ambiante ; prévoir une cuillère par plat pour éviter qu'un allergène passe d'un plat à l'autre ; jeter les restes du buffet.

Commander, réceptionner et stocker les denrées

La logistique d'un atelier repose sur trois documents simples : le **bon de commande** (ou la liste de courses chiffrée), la **fiche de réception** et la **fiche de stock**. Ils évitent les oublis et le gaspillage, et ils servent de justificatifs pour le budget réalisé (8.3.5).

Exemple – Calcul détaillé : bon de commande d'un velouté pour 30 portions (prix fictifs)

Recette de base pour 10 portions : 1,2 kg de potimarron épépiné, 150 g d'oignons épluchés, 0,5 L de lait demi-écrémé, épices et bouillon. Coefficient : 30 / 10 = **3**. Rendements retenus (ordres de grandeur) : potimarron 75 % après épépinage, oignons 90 %.

- **Potimarron** : 1,2 × 3 = 3,6 kg épépiné ; poids brut = 3,6 / 0,75 = **4,8 kg** ; coût 4,8 × 2,20 = **10,56 €**.
- **Oignons** : 0,150 × 3 = 0,450 kg épluché ; poids brut = 0,450 / 0,90 = **0,5 kg** ; coût 0,5 × 1,80 = **0,90 €**.
- **Lait** : 0,5 × 3 = 1,5 L, mais il est vendu en bouteilles de 1 L : on achète **2 L**, soit 2 × 1,05 = **2,10 €**.
- **Épices et bouillon** (forfait) : **0,60 €**.
- **Total** : 10,56 + 0,90 + 2,10 + 0,60 = **14,16 €**, soit 14,16 / 30 = **0,47 €** par portion (0,472 arrondi).

Ce qu'il faut retenir : le conditionnement de vente oblige parfois à acheter plus que le besoin ; le demi-litre de lait restant est prévu pour une autre recette ou rendu à la structure.

Étape · Ce que l'on vérifie · Document

Commande — *Ce que l'on vérifie :* Quantités calculées avec le coefficient et le rendement ; budget disponible ; délai de livraison ; *Document :* Bon de commande, devis

Réception — *Ce que l'on vérifie :* Température des produits frais (au toucher ou avec un thermomètre), état des emballages, dates, conformité à la commande ; *Document :* Fiche de réception, bon de livraison

Stockage — *Ce que l'on vérifie :* Froid entre 0 et + 4 °C pour les produits frais ; produits secs à l'abri de l'humidité, au-dessus du sol ; produits d'entretien séparés des aliments ; *Document :* Fiche de stock, relevé de température du réfrigérateur

Utilisation — *Ce que l'on vérifie :* Rotation des stocks : premier entré, premier sorti ; contrôle des dates avant usage ; *Document :* Fiche de stock mise à jour

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (DLC), mentionnée « à consommer jusqu'au », concerne les denrées très

périssables : au-delà, le produit peut présenter un danger et ne doit pas être utilisé. La **date de durabilité minimale** (DDM), mentionnée « à consommer de préférence avant », concerne les produits stables (pâtes, conserves, biscuits) : au-delà, le produit peut perdre en qualité, mais il ne présente pas de danger s'il a été bien conservé et si l'emballage est intact.

Astuce – Réduire le gaspillage dans un projet

Les produits secs à DDM dépassée de peu, donnés par une épicerie solidaire, peuvent être utilisés en atelier s'ils sont en bon état. Les restes de légumes crus peuvent servir à un bouillon préparé le jour même. Les quantités réellement consommées sont notées à chaque atelier : elles servent à ajuster les commandes suivantes et constituent un indicateur du projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.26

Une recette de salade de lentilles pour 6 personnes demande 240 g de lentilles vertes sèches, 300 g de carottes épluchées (rendement 85 %) et 90 g d'oignons rouges épluchés (rendement 90 %). Calculez les quantités à acheter pour un atelier de 18 personnes, sachant que les lentilles sont vendues en sachets de 500 g. Indiquez ensuite où et comment stocker chaque produit avant l'atelier.

Corrigé

Coefficient : 18 / 6 = 3. Lentilles : 240 × 3 = 720 g, soit 2 sachets de 500 g (1 000 g achetés, 280 g de reste à stocker). Carottes : 300 × 3 = 900 g épluchées, soit 900 / 0,85 = 1 058,8 g, environ 1,06 kg brut. Oignons rouges : 90 × 3 = 270 g épluchés, soit 270 / 0,90 = 300 g brut. Stockage : les lentilles dans un placard sec, au-dessus du sol, sachet refermé ; les carottes au réfrigérateur ou dans un local frais ; les oignons dans un endroit sec, frais et aéré, à l'abri de la lumière.

Rendre les ateliers accessibles à tous

Un atelier conçu pour « tout le monde » peut exclure sans le vouloir : salle à l'étage sans ascenseur, fiches recettes écrites en petits caractères, recette incompatible avec les habitudes alimentaires d'une partie du groupe, horaire incompatible avec le travail. La logistique fait partie de la lutte contre les inégalités sociales de santé (chapitre 7).

Obstacle · Adaptation possible

Mobilité réduite — *Adaptation possible :* Salle de plain-pied ou accessible par ascenseur, plan de travail à hauteur adaptée, transport solidaire, chaises pendant les temps longs

Troubles de la vue — *Adaptation possible :* Fiches en gros caractères, contrastes forts, description orale des gestes, ustensiles faciles à repérer

Difficultés de lecture ou de compréhension — *Adaptation possible :* Recettes illustrées étape par étape, pictogrammes, documents en « facile à lire et à comprendre » (FALC)

Langue — *Adaptation possible :* Interprète ou participant relais, supports visuels, aliments réels plutôt que des mots

Habitudes alimentaires culturelles ou religieuses — *Adaptation possible :* Recettes sans porc ou sans alcool, version végétarienne, recettes proposées par les participants

Contraintes horaires — *Adaptation possible :* Créneaux variés (soir, samedi), garde d'enfants pendant l'atelier

Coût — *Adaptation possible :* Gratuité ou participation symbolique, produits accessibles dans les commerces proches

Définition – Facile à lire et à comprendre (FALC)

Méthode de rédaction qui rend l'information accessible aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et utile aussi aux personnes qui lisent difficilement : phrases courtes, un message par phrase, mots simples, illustrations, mise en page aérée. Les règles européennes du FALC ont été établies par l'association Inclusion Europe ; un document FALC est relu par des personnes concernées.

Exemple – Une recette réécrite pour être accessible

Version initiale : « Faire revenir l'oignon émincé dans l'huile, ajouter les lentilles préalablement rincées et mouiller à hauteur. » Version accessible, avec une photo par étape : « 1. Coupez l'oignon en petits morceaux. 2. Mettez 1 cuillère d'huile dans la casserole. 3. Faites cuire l'oignon 5 minutes. 4. Lavez les lentilles dans une passoire. 5. Mettez les lentilles dans la casserole. 6. Ajoutez de l'eau : l'eau doit couvrir les lentilles. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.27

Un atelier est prévu dans la salle du premier étage d'une mairie (sans ascenseur), le mardi à 14 h, avec une recette de rôti de porc au cidre et des fiches recettes en texte continu. Le public : des familles d'un quartier où vivent beaucoup de personnes qui travaillent en horaires décalés, dont certaines sont arrivées récemment en France. Relevez quatre obstacles et proposez une adaptation pour chacun.

Corrigé

1. Salle à l'étage sans ascenseur : choisir une salle de plain-pied (centre social, cuisine d'une école). 2. Horaire unique en semaine : proposer un créneau le samedi matin ou en fin de journée, et une garde d'enfants. 3. Recette au porc et à l'alcool : choisir une recette compatible avec tous (par exemple un plat de légumes secs) ou proposer une variante, et associer les familles au choix. 4. Fiches en texte continu : recettes illustrées étape par étape, pictogrammes, mots simples, éventuellement traduites ou expliquées par un participant relais.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.9 – La logistique et l'hygiène des ateliers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pour 24 portions d'une recette prévue pour 8, avec 400 g de carottes épluchées et un rendement de 80 %, quel poids brut faut-il acheter ?
2. Quelle température minimale faut-il respecter pour le maintien au chaud ?
3. En combien de temps un plat doit-il passer de + 63 °C à moins de + 10 °C ?
4. Combien d'allergènes doivent être signalés selon le règlement INCO ? Citez-en quatre.
5. Quelle est la différence entre une DLC et une DDM ?
6. Que signifie « premier entré, premier sorti » ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.9

1. Coefficient 24 / 8 = 3 ; 400 × 3 = 1 200 g épluchés ; 1 200 / 0,80 = 1 500 g, soit 1,5 kg brut.
2. Au moins + 63 °C.
3. En moins de 2 heures.
4. Quatorze ; par exemple gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque, sésame, soja, moutarde, céleri, poissons, crustacés, mollusques, lupin, sulfites.
5. Après la DLC, le produit peut être dangereux et ne doit pas être consommé ; après la DDM, il peut perdre en qualité mais reste sans danger s'il a été bien conservé.
6. On utilise d'abord les produits arrivés les premiers (rotation des stocks), pour éviter de dépasser les dates.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.10.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le tableau des points de maîtrise et la liste des allergènes.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.9 et je refais les exercices d'application.

8.3.10 Anticiper la trésorerie du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Un budget peut être **équilibré** sur l'année et pourtant poser un problème de **trésorerie** : les dépenses arrivent avant les recettes (les subventions sont souvent versées plusieurs mois après la notification). Le **plan de trésorerie** prévoit, mois par mois, les encaissements, les décaissements et le solde.

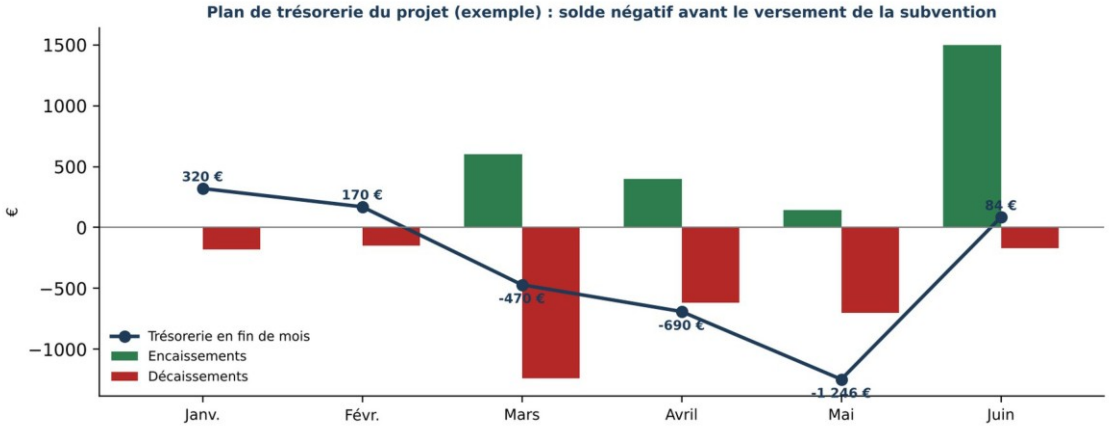


Figure 8.9 – Un plan de trésorerie mois par mois

Exemple – Calcul détaillé : le plan de trésorerie du projet des Tilleuls (hors contributions en nature)

Trésorerie disponible au départ (réserve affectée par le centre social) : **500 €**. Dépenses monétaires prévues : 3 060 € (3 510 € – 450 € de contributions en nature) ; recettes : commune 600 € (mars), CAF 400 € (avril), familles 144 € (mai), ARS 1 500 € (juin).

Mois · Encaissements · Décaissements · Calcul · Solde fin de mois

Janvier — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 180 ; *Calcul :* 500 + 0 − 180 ; *Solde fin de mois :* 320

Février — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 150 ; *Calcul :* 320 − 150 ; *Solde fin de mois :* 170

Mars — *Encaissements :* 600 ; *Décaissements :* 1 240 ; *Calcul :* 170 + 600 − 1 240 ; *Solde fin de mois :* − 470

Avril — *Encaissements :* 400 ; *Décaissements :* 620 ; *Calcul :* − 470 + 400 − 620 ; *Solde fin de mois :* − 690

Mai — *Encaissements :* 144 ; *Décaissements :* 700 ; *Calcul :* − 690 + 144 − 700 ; *Solde fin de mois :* − 1 246

Juin — *Encaissements :* 1 500 ; *Décaissements :* 170 ; *Calcul :* − 1 246 + 1 500 − 170 ; *Solde fin de mois :* 84

- Vérification : décaissements 180 + 150 + 1 240 + 620 + 700 + 170 = **3 060 €** ; encaissements 600 + 400 + 144 + 1 500 = **2 644 €** ; 500 + 2 644 − 3 060 = **84 €** (la différence 3 060 − 2 644 = **416 €** est l'autofinancement).
- **Besoin de trésorerie maximal** : **1 246 €** fin mai.

Solutions : demander une **avance** sur subvention (certains financeurs versent un acompte à la notification), décaler des achats, mobiliser la trésorerie générale de la structure, solliciter le versement anticipé de la part communale. Ce risque (R3, 8.3.6) doit être anticipé avec la direction dès la conception.

Comparer les solutions à un besoin de trésorerie

Quand le plan de trésorerie fait apparaître un solde négatif, le chef de projet ne se contente pas de le constater : il **chiffre plusieurs solutions**, les compare et propose la plus réaliste à la direction. Chaque solution a un coût ou une contrainte.

Solution · Effet sur la trésorerie · Contrainte

Demander une avance (acompte) au financeur — *Effet sur la trésorerie :* Encaissement plus tôt ; *Contrainte :* Dépend des règles du financeur ; à prévoir dans la convention

Décaler des achats non urgents — *Effet sur la trésorerie :* Décaissement plus tard ; *Contrainte :* Ne doit pas retarder une tâche du chemin critique (8.3.4)

Échelonner un paiement avec un fournisseur — *Effet sur la trésorerie :* Décaissement étalé ; *Contrainte :* Accord du fournisseur

Mobiliser la trésorerie générale de la structure — *Effet sur la trésorerie :* Couvre le creux ; *Contrainte :* Possible seulement si la structure a des réserves ; accord de la direction ou du bureau

Emprunter (prêt de trésorerie, découvert autorisé) — *Effet sur la trésorerie :* Couvre le creux ; *Contrainte :* Coût des intérêts, garanties ; rarement adapté à un petit projet associatif

Exemple – Calcul détaillé : le plan de trésorerie d'un projet « Bien manger pour mieux jouer » (club de football amateur, données fictives)

Le club porte un projet d'ateliers pour ses licenciés de 11 à 14 ans, de septembre à février. Trésorerie de départ : **300 €**. Recettes : participation des familles 240 € (octobre), commune 800 € (novembre), mécénat d'un commerce local 360 € (décembre), conseil départemental 1 600 € (février, après le bilan intermédiaire).

Mois · Encaissements · Décaissements · Calcul · Solde fin de mois

Septembre — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 250 ; *Calcul :* 300 + 0 − 250 ; *Solde fin de mois :* 50

Octobre — *Encaissements :* 240 ; *Décaissements :* 900 ; *Calcul :* 50 + 240 − 900 ; *Solde fin de mois :* − 610

Novembre — *Encaissements :* 800 ; *Décaissements :* 650 ; *Calcul :* − 610 + 800 − 650 ; *Solde fin de mois :* − 460

Décembre — *Encaissements :* 360 ; *Décaissements :* 400 ; *Calcul :* − 460 + 360 − 400 ; *Solde fin de mois :* − 500

Janvier — *Encaissements :* 0 ; *Décaissements :* 700 ; *Calcul :* − 500 + 0 − 700 ; *Solde fin de mois :* − 1 200

Février — *Encaissements :* 1 600 ; *Décaissements :* 300 ; *Calcul :* − 1 200 + 1 600 − 300 ; *Solde fin de mois :* 100

- Vérification : décaissements 250 + 900 + 650 + 400 + 700 + 300 = **3 200 €** ; encaissements 240 + 800 + 360 + 1 600 = **3 000 €** ; 300 + 3 000 − 3 200 = **100 €**.
- **Besoin de trésorerie maximal** : **1 200 €** fin janvier. Le solde est négatif pendant quatre mois.

Solution A : avance de 50 % du conseil départemental en octobre (800 € en octobre, 800 € en février). Soldes : 50 ; 190 ; 340 ; 300 ; **– 400** ; 100. Le besoin maximal tombe à **400 €**, en janvier seulement.

Solution B : décaler l'achat du matériel pédagogique (400 €) d'octobre à février, sans changer les recettes. Soldes : 50 ; – 210 ; – 60 ; – 100 ; **– 800** ; 100. Le besoin maximal tombe à **800 €**, mais le solde reste négatif quatre mois, et le matériel arrive tard.

Solutions A et B combinées. Soldes : 50 ; 590 ; 740 ; 700 ; **0** ; 100. Le solde n'est jamais négatif.

Conclusion argumentée : la solution A est la plus efficace, mais elle dépend de l'accord du conseil départemental. Le chef de projet la demande dès le dépôt du dossier. Si elle est refusée, il combine la solution B (pour une partie seulement du matériel, afin de ne pas pénaliser les premiers ateliers) avec une mobilisation de la trésorerie du club, à faire valider par le bureau.

Attention – Budget et trésorerie ne se confondent pas

Le budget répond à la question « le projet est-il financé ? » ; le plan de trésorerie répond à la question « aura-t-on l'argent au moment de payer ? ». Les contributions en nature (8.3.5) figurent au budget mais jamais dans le plan de trésorerie, puisqu'elles ne donnent lieu à aucun mouvement d'argent.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.28

Reprenez le plan de trésorerie du club de football. Le commerce local propose de verser son mécénat de 360 € en octobre au lieu de décembre. Recalculez les soldes mensuels sans avance du conseil départemental, puis indiquez le nouveau besoin maximal.

Corrigé

Encaissements : octobre 240 + 360 = 600 ; décembre 0. Soldes : septembre 300 − 250 = 50 ; octobre 50 + 600 − 900 = − 250 ; novembre − 250 + 800 − 650 = − 100 ; décembre − 100 + 0 − 400 = − 500 ; janvier − 500 − 700 = − 1 200 ; février − 1 200 + 1 600 − 300 = 100. Le besoin maximal reste de **1 200 €** en janvier : avancer le mécénat améliore octobre et novembre, mais pas le creux de janvier, qui vient du versement tardif du conseil départemental. La seule solution efficace pour janvier est d'avancer une recette importante ou de décaler une dépense de janvier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.10 – La trésorerie du projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un budget équilibré peut-il poser un problème de trésorerie ?
2. Comment calcule-t-on le solde de fin de mois ?
3. Trésorerie de départ 200 €, encaissements du mois 500 €, décaissements 900 € : quel est le solde ?
4. Les contributions en nature figurent-elles dans le plan de trésorerie ? Pourquoi ?
5. Citez trois solutions à un besoin de trésorerie.
6. Quelle précaution prendre avant de décaler un achat ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.10

1. Parce que les dépenses arrivent souvent avant les recettes, les subventions étant versées plusieurs mois après la notification.
2. Solde du mois précédent + encaissements du mois − décaissements du mois.
3. 200 + 500 − 900 = − 200 €.
4. Non, car elles ne donnent lieu à aucun mouvement d'argent.
5. Par exemple : demander une avance au financeur, décaler des achats non urgents, échelonner un paiement, mobiliser la trésorerie de la structure.
6. Vérifier que l'achat ne concerne pas une tâche du chemin critique, pour ne pas retarder le projet.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.11.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je refais le calcul du plan de trésorerie du club de football.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 8.3.10 et je refais les exercices d'application.

8.3.11 Rédiger un dossier de demande de financement : exemple commenté

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Exemple – Extraits commentés de la réponse du centre social à l'appel à projets de l'ARS

Contexte et constats (½ page) : « Le quartier des Tilleuls (4 200 habitants, quartier prioritaire) présente un taux de pauvreté de 41 % (15 % à Valmont) et 14 % d'enfants de grande section en surpoids (9 % dans le département). L'enquête menée auprès de 48 parents en juin 2027 montre que 71 % jugent qu'une alimentation équilibrée coûte cher et que 58 % ne savent pas cuisiner les légumes secs ; 54 % souhaitent des ateliers. L'environnement alimentaire est dominé par la restauration rapide (indice d'environnement favorable de 28,6 / 100). » → *Commentaire : données locales chiffrées, sourcées et datées, besoins exprimés et normatifs.* **Inscription dans les politiques** : « Le projet répond à l'axe 2 du PNNS 5, à la priorité du PRS sur la nutrition des enfants en quartier prioritaire et à la fiche-action 3 du contrat local de santé. » → *Reprise du vocabulaire du financeur.* **Objectifs** : objectif général et 4 objectifs spécifiques SMART (fiche F3). → *Indicateurs et valeurs initiales mentionnés.* **Actions et méthodes** : « 6 ateliers culinaires participatifs (méthodes actives et démonstratives), une visite accompagnée du marché, un livret de 12 recettes testées, un partenariat avec l'épicerie solidaire (convention) pour l'accès aux produits. » → *Combinaison éducation et environnement.* **Public et participation** : « 12 familles orientées par l'épicerie, les écoles et la PMI ; recettes du monde choisies par les familles ; deux mamans relais associées au comité de pilotage. » → *Participation et universalisme proportionné.* **Évaluation** : « Processus (ateliers réalisés, taux de présence ≥ 80 %) ; résultats (questionnaire avant/après : légumes secs, connaissances ; satisfaction). » → *Indicateurs alignés sur les objectifs.* **Budget** : « Coût total 3 510 €, dont 450 € de contributions en nature ; subvention sollicitée 1 500 € (42,7 %) ; cofinancements de la commune (600 €), de la CAF (400 €), participation des familles (144 €) et autofinancement (416 €). » → *Budget équilibré, cofinancé.* **Pérennisation** : « Formation de deux mamans relais et de la référente, conducteurs réutilisables, intégration au projet social. » → *Argument souvent décisif.*

Attention – Un dossier de financement n'est pas un dossier d'examen

Le dossier de financement est rédigé **avant** l'action, pour convaincre ; le dossier de l'épreuve E5 rend compte de **votre** démarche et de **votre** analyse, y compris des difficultés et des ajustements. Les mêmes données peuvent servir aux deux, mais la rédaction, personnelle, et l'analyse critique sont propres au dossier d'examen.

8.3.12 La convention de partenariat : un modèle commenté

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 12)

Exemple – Convention entre le centre social des Tilleuls et l'épicerie solidaire « Le Panier partagé » (extraits

commentés) Article 1 – Objet : « La présente convention définit les modalités de collaboration entre les parties pour la mise en œuvre du projet "Bien manger, petit budget, grand plaisir" (mars-mai 2028). » → *Un objet précis, limité dans le temps.* **Article 2 – Engagements du centre social** : « Concevoir et animer 6 ateliers culinaires ; réserver 6 places aux familles orientées par l'épicerie ; transmettre un bilan agrégé ; mentionner le partenariat sur les supports. » → *Engagements concrets et vérifiables.* **Article 3 – Engagements de l'épicerie** : « Orienter les familles intéressées ; fournir les légumes secs et produits de base des ateliers dans la limite de 60 € ; proposer en rayon les produits utilisés dans les recettes ; participer au comité de pilotage. » → *Chaque partenaire apporte quelque chose et y trouve un intérêt (chapitre 8.3.2).* **Article 4 – Communication** : « Les supports mentionnent les deux structures ; toute publication est validée conjointement. » → *Évite les malentendus sur l'image.* **Article 5 – Données personnelles et confidentialité** : « Aucune donnée nominative n'est échangée sans l'accord écrit des personnes ; les bilans sont agrégés et anonymes. » → *Conformité RGPD (chapitre 6).* **Article 6 – Suivi et évaluation** : « Un point d'étape à mi-parcours ; bilan commun en juin. » **Article 7 – Durée, modification, résiliation** : « La convention prend effet à la signature et s'achève le 30 juin 2028 ; elle peut être modifiée par avenant ou résiliée par l'une des parties avec un préavis d'un mois. » **Signatures** des représentants légaux (présidente de l'association du centre social,

président du CCAS ou son délégué).

Attention – Ce qui fragilise un partenariat

Des engagements flous (« participer au projet »), un déséquilibre (un partenaire qui donne sans rien recevoir), l'absence de point d'étape, une communication non concertée, un départ de la personne référente sans passation. Une convention ne remplace pas la **relation** : rencontres régulières, remerciements, restitution des résultats.

Relire son dossier avant le dépôt : la grille d'autocontrôle

Un dossier de financement est souvent lu rapidement, par un instructeur qui en examine plusieurs dizaines. Un dossier incomplet ou incohérent est écarté, même si le projet est bon. Avant le dépôt, le chef de projet relit donc le dossier avec une **grille d'autocontrôle**, idéalement avec une autre personne qui ne l'a pas rédigé.

Critère	Question de contrôle	Oui / Non
Éligibilité	Le porteur, le public, le territoire et les dates correspondent-ils au cahier des charges ?	
Complétude	Toutes les rubriques sont-elles remplies ? Toutes les pièces sont-elles jointes (statuts, RIB, budget, comptes, attestations) ?	
Cohérence	Les constats justifient-ils les objectifs ? Les actions permettent-elles d'atteindre les objectifs ?	
Chiffres	Les chiffres sont-ils identiques partout (nombre de bénéficiaires, montants, dates) ? Le budget est-il équilibré ?	
Indicateurs	Chaque objectif opérationnel a-t-il au moins un indicateur, une valeur cible et une source ?	
Partenariats	Les partenaires cités ont-ils donné leur accord écrit (lettre de soutien, convention) ?	
Lisibilité	Les phrases sont-elles courtes, sans jargon ? Les sigles sont-ils expliqués ? Un résumé ouvre-t-il le dossier ?	
Calendrier	Le dépôt est-il fait avant la date limite, avec une marge pour les problèmes techniques ?	

Erreurs fréquentes – Ce qui fait écarter un dossier

- Un projet qui ne correspond pas aux **priorités** de l'appel (public ou thème hors champ).
- Un budget **déséquilibré**, ou une demande qui dépasse le plafond ou le taux maximal de financement.
- Des **objectifs** formulés comme des activités (« faire six ateliers ») et sans indicateurs.
- Des chiffres qui changent d'une page à l'autre : 12 familles dans la présentation, 15 dans le budget.
- Des partenaires cités sans leur accord, ou une absence totale de partenariat quand l'appel le demande.
- Un dépôt la dernière heure, bloqué par une plateforme saturée.

Méthode – Rédiger le résumé du projet en dix lignes

Le résumé est souvent la seule partie lue en entier par tous les membres du comité de sélection. Il tient en dix lignes au plus et répond, dans l'ordre, à cinq questions :

1. **Quel problème ?** Un constat chiffré et sourcé.
2. **Pour qui ?** Le public et le territoire.
3. **Quoi ?** Les actions principales et leur calendrier.
4. **Avec qui ?** Les partenaires et leur rôle.
5. **Pour quels résultats ?** Les objectifs et deux ou trois indicateurs, et le montant demandé.

Exemple – Un résumé de projet (projet fictif)

« Dans la résidence autonomie des Glycines (52 résidents), le diagnostic réalisé en 2027 montre que 23 % des résidents ont perdu plus de 5 % de leur poids en un an et que 40 % sautent régulièrement le dîner. Le projet "Le dîner, ça se partage" propose, d'octobre 2027 à juin 2028, un dîner partagé mensuel préparé avec les résidents, six ateliers "dîners faciles" animés par une diététicienne et la formation de deux agents à la surveillance du poids. Il associe le CCAS, le service d'aide à domicile et une association de bénévoles. Objectifs : 30 résidents participants, une baisse de moitié du nombre de résidents sautant le dîner, une pesée mensuelle pour tous. Montant demandé : 6 200 €, soit 62 % d'un budget de 10 000 €. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.29

Relisez ce passage d'un dossier et relevez au moins quatre défauts, en vous aidant de la grille d'autocontrôle : « Le projet s'adresse aux jeunes du quartier. Il s'agit de sensibiliser à l'alimentation par des ateliers. Nous accueillerons 20 jeunes (budget établi pour 25 participants). Partenaires : collège, mission locale, supermarché voisin (contact prévu en septembre). Montant demandé : 9 000 €, soit 90 % du budget (taux maximal de l'appel : 80 %). »

Corrigé

1. Le public est flou (« les jeunes du quartier ») : il faut préciser l'âge, le nombre et les critères. 2. L'objectif est vague (« sensibiliser ») et sans indicateur. 3. Les chiffres sont incohérents : 20 jeunes dans le texte, 25 dans le budget. 4. Les partenaires ne sont pas engagés (un contact « prévu » n'est pas un accord) et le supermarché pose une question de conflit d'intérêts. 5. Le taux demandé (90 %) dépasse le maximum de l'appel (80 %) : le dossier est inéligible tant que le cofinancement n'est pas augmenté. Pour 10 000 € de budget, la demande ne peut pas dépasser 10 000 × 0,80 = 8 000 €.

Les clauses sensibles d'une convention

Le modèle commenté ci-dessus (8.3.12) présente les clauses de base d'une convention : objet, engagements de chaque partie, durée, suivi. D'autres clauses sont souvent oubliées alors qu'elles évitent les conflits. Le diététicien ne rédige pas seul les clauses juridiques : il les prépare avec la direction de la structure, qui signe la convention.

Clause · Ce qu'elle prévoit · Question à se poser

Durée et renouvellement — *Ce qu'elle prévoit :* Date de début, date de fin, renouvellement exprès ou tacite ; *Question à se poser :* Que se passe-t-il à la fin du projet ?

Moyens mis à disposition — *Ce qu'elle prévoit :* Locaux, matériel, temps de personnel, denrées, avec leur valorisation ; *Question à se poser :* Qui assure le matériel prêté en cas de casse ?

Responsabilité et assurance — *Ce qu'elle prévoit :* Chaque partie garantit les dommages causés par ses salariés et ses bénévoles ; attestation d'assurance ; *Question à se poser :* L'assurance de la structure couvre-t-elle les activités culinaires et les bénévoles ?

Données personnelles — *Ce qu'elle prévoit :* Qui collecte, qui conserve, pendant combien de temps, qui peut consulter (règlement général sur la protection des données, chapitre 6) ; *Question à se poser :* Les données des participants circulent-elles entre partenaires ? Avec quel accord ?

Communication et propriété des supports — *Ce qu'elle prévoit :* Logos, mention des partenaires, droit d'utiliser les recettes, photos et livrets après le projet ; *Question à se poser :* Qui peut réutiliser le livret de recettes ? Sous quelle forme ?

Résiliation — *Ce qu'elle prévoit :* Conditions dans lesquelles une partie peut mettre fin à la convention (préavis, motif) ; *Question à se poser :* Que devient l'action si un partenaire se retire ?

Règlement des litiges — *Ce qu'elle prévoit :* Recherche d'une solution amiable d'abord, puis tribunal compétent ; *Question à se poser :* Qui contacter en cas de désaccord ?

Définition – Tacite reconduction

Clause selon laquelle une convention est renouvelée automatiquement à son échéance, pour la même durée, si aucune des parties ne la dénonce. Pour un projet limité dans le temps, on préfère souvent un **renouvellement exprès** (une nouvelle signature), qui oblige à faire le bilan avant de continuer.

Attention – Convention de partenariat et convention de financement

La convention de partenariat organise une **collaboration** entre structures (qui fait quoi). La convention de financement (ou d'attribution de subvention, 8.3.3) fixe les **obligations liées à l'argent** : montant, modalités de versement, compte rendu financier, éventuel reversement des sommes non utilisées. Les deux documents ne se confondent pas, même si l'un peut citer l'autre.

Exemple – Une clause « données » rédigée simplement (projet fictif)

« Article 7 – Données personnelles. Le centre social est seul responsable de la collecte des données des participants (nom, téléphone, réponses aux questionnaires). Ces données sont conservées sur son serveur, accessibles à la coordinatrice et à la diététicienne du projet, et supprimées douze mois après la fin du projet. L'association partenaire ne reçoit que des résultats agrégés, sans nom. Chaque participant est informé de ses droits (accès, rectification, effacement) au moment de l'inscription. »

À vous de jouer – Exercice d'application 8.30

Une association de jardins familiaux prête une parcelle et deux bénévoles à un centre social pour des ateliers « du jardin à l'assiette ». Proposez le contenu de trois clauses sensibles de la convention : assurance, communication, résiliation.

Corrigé

Assurance : chaque structure assure ses salariés et ses bénévoles ; le centre social vérifie que son contrat couvre les activités extérieures (jardin) et les participants ; les deux parties échangent leurs attestations avant le premier atelier. Communication : le nom et le logo de l'association figurent sur l'affiche et le livret ; les photos prises au jardin ne sont diffusées qu'avec l'accord écrit des personnes ; le livret de recettes peut être réutilisé par les deux parties, avec mention de l'autre. Résiliation : chaque partie peut mettre fin à la convention avec un préavis d'un mois, par écrit ; les ateliers déjà programmés sont maintenus ou reportés en accord avec les participants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.12 – Le dossier et la convention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi faire relire un dossier de financement par une personne qui ne l'a pas rédigé ?
2. Citez trois erreurs qui font écarter un dossier.
3. À quelles cinq questions répond le résumé d'un projet ?
4. Un appel à projets finance au plus 70 % d'un budget de 8 000 €. Quel montant maximal peut-on demander ?
5. Qu'est-ce qu'une clause de tacite reconduction ?
6. Quelle différence y a-t-il entre une convention de partenariat et une convention de financement ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.12

1. Parce qu'un regard extérieur repère plus facilement les incohérences, les oublis et les passages peu clairs.
2. Par exemple : projet hors des priorités de l'appel, budget déséquilibré ou taux dépassé, objectifs sans indicateurs, chiffres incohérents, partenaires non engagés, dépôt hors délai.
3. Quel problème ? Pour qui ? Quoi ? Avec qui ? Pour quels résultats (et quel montant) ?
4. 8 000 × 0,70 = 5 600 €.

5. Une clause qui renouvelle automatiquement la convention à son échéance si aucune partie ne la dénonce.
6. La convention de partenariat organise la collaboration (qui fait quoi) ; la convention de financement fixe les obligations liées à la subvention (montant, versement, compte rendu).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 8.3.13.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la grille d'autocontrôle et le tableau des clauses.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les parties 8.3.11 et 8.3.12 et je refais les exercices d'application.

8.3.13 Estimer la charge de travail et tenir une feuille de temps

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Un plan d'action réaliste suppose d'estimer le **temps** nécessaire à chaque tâche : c'est souvent la ressource la plus rare (et le premier poste du budget, chapitre 8.3.5). La **feuille de temps** (fiche F5) permet ensuite de comparer le temps prévu et le temps réellement passé.

Méthode pas à pas – Estimer la charge d'une tâche

1. Décomposer chaque action en tâches élémentaires (préparer un atelier = conducteur + fiche technique + courses + installation + animation + rangement + bilan).

2. Estimer la durée de chaque tâche à partir de l'expérience (ou de celle de la tutrice).

3. Multiplier par le nombre de répétitions (6 ateliers).

4. Ajouter une marge pour les imprévus (en général 15 à 25 %).

5. Comparer au temps disponible (heures de stage, temps des partenaires) et arbitrer.

Exemple – Calcul détaillé : charge de préparation et d'animation d'un cycle de 6 ateliers

Tâche	Durée unitaire (h)	Nombre	Total (h)	Remarque
Conducteur et fiche technique	2,5	6	15	Moins long à partir du 3e atelier
Courses	1	6	6	
Installation et rangement	1	6	6	
Animation	3	6	18	
Bilan à chaud et saisie	0,5	6	3	
Questionnaires (conception, saisie, analyse)	–	–	10	Avant et après
Réunions (tutrice, COPIL)	1,5	4	6	
Sous-total			64	

- Sous-total : 15 + 6 + 6 + 18 + 3 + 10 + 6 = **64 h**.
- Marge de 20 % : 64 × 0,20 = **12,8 h** ; total prévisionnel : 64 + 12,8 = **76,8 h**, soit environ **77 h**.
- Temps disponible (période 2 de stage, 4 semaines de 35 h, dont 30 % consacrés à d'autres activités de la structure) : 140 × 0,70 = **98 h** ; le cycle tient dans le temps disponible, avec 98 − 77 = **21 h** pour la communication et le livret.
- **Comparaison au réalisé** (chapitre 1, feuille de temps d'Inès) : la préparation des ateliers a pris 38 h au lieu de 25 h prévues au départ, soit (38 − 25) / 25 × 100 = **+ 52 %** : sans marge, le planning aurait dérapé ; c'est un point d'auto-évaluation (fiche F14).

Attention – Le temps des partenaires compte aussi

Un projet mobilise le temps de la tutrice, de la diététicienne, des bénévoles et des partenaires : il faut le **prévoir**, le **demander** explicitement (convention) et le **valoriser** dans le budget (comptes 64 ou 86-87). Un partenaire surchargé est un risque pour le projet.

8.3.14 Utiliser les outils numériques du projet

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Le référentiel cite, parmi les outils et moyens de la démarche de projet, les **logiciels de gestion de projet**, le **mind-mapping** (carte mentale), le **tableur** et le **formulaire en ligne**. Ces outils ne remplacent pas la méthode : ils la rendent plus rapide, plus lisible et plus facile à partager. Leur usage est encadré par les règles de protection des données (chapitre 6) et de sécurité numérique (chapitre 21).

Outil · À quoi il sert dans le projet · Exemples d'usage · Points de vigilance

Carte mentale (mind- mapping) — *À quoi il sert dans le projet :* Organiser des idées autour d'un thème central, en branches et sous-branches ; visualiser un problème ou un plan ; *Exemples d'usage :* Brainstorming du diagnostic, préparation de l'arbre à problèmes, plan du dossier E5, carte des partenaires ; *Points de vigilance :* Rester lisible (un mot-clé par branche) ; ne pas confondre une carte d'idées avec un diagnostic validé par des données

Logiciel de gestion de projet — *À quoi il sert dans le projet :* Lister les tâches, les attribuer, fixer des échéances, suivre l'avancement (liste, tableau à colonnes « à faire / en cours / fait », diagramme de Gantt) ; *Exemples d'usage :* Planning des ateliers, suivi des tâches entre la stagiaire, la tutrice et les partenaires, jalons du comité de pilotage ; *Points de vigilance :* Choisir un outil autorisé par la structure ; ne pas y déposer de données personnelles des participants

Tableur — *À quoi il sert dans le projet :* Calculer, organiser des données, produire des graphiques ; *Exemples d'usage :* Budget prévisionnel et réalisé, plan de trésorerie, tableau de bord, saisie et dépouillement des questionnaires, feuille de temps ; *Points de vigilance :* Formules vérifiées, cellules protégées, une version de référence datée ; pseudonymiser les données des participants

Formulaire en ligne — *À quoi il sert dans le projet :* Recueillir des réponses à distance, dans un format directement exploitable par le tableur ; *Exemples d'usage :* Questionnaire de diagnostic, inscription aux ateliers, questionnaire de satisfaction ; *Points de vigilance :* RGPD : information des personnes, minimisation des données, durée de conservation, hébergement ; pas de données de santé sans cadre adapté

Plateforme collaborative et espace de stockage partagé — *À quoi il sert dans le projet :* Partager et co-écrire des documents, garder une version unique à jour ; *Exemples d'usage :* Fiches projet, conducteurs de séance, comptes rendus ; *Points de vigilance :* Droits d'accès limités aux personnes concernées ; liens de partage non publics (chapitre 21)

La carte mentale

Définition – Carte mentale (mind map)

Représentation graphique, rayonnante, de la pensée : un **thème central** au milieu de la page, des **branches principales** (idées clés), puis des **sous-branches** (détails), avec des mots-clés, des couleurs et parfois des pictogrammes. La méthode a été popularisée par Tony Buzan dans les années 1970. Elle se réalise sur papier ou avec un logiciel de cartographie mentale (il en existe des versions libres et gratuites).

Méthode pas à pas – Construire la carte mentale d'un diagnostic en 4 étapes

1. Écrire au centre le **sujet** : « Alimentation des familles du quartier des Tilleuls ».
2. Créer une **branche par type de données** : données objectives, besoins exprimés, besoins ressentis, besoins observés, ressources du territoire, politiques publiques.
3. Ajouter sur chaque branche les **constats** en mots-clés, avec leur source (« 71 % : manger équilibré coûte cher – questionnaire »).
4. **Relier** par des flèches les constats qui s'expliquent mutuellement : la carte prépare l'arbre à problèmes (chapitre 7).

Le logiciel de gestion de projet

Un logiciel de gestion de projet permet de découper le projet en **tâches**, de leur affecter un **responsable**, une **échéance**, une **durée** et des **dépendances** (une tâche ne peut commencer qu'après une autre), puis de visualiser l'ensemble sous forme de **liste**, de **tableau à colonnes** (méthode inspirée du kanban : « à faire », « en cours », « fait ») ou de **diagramme de Gantt** (8.3.4). L'outil calcule automatiquement les dates et signale les retards.

Exemple – Le tableau à colonnes d'Inès (extrait, semaine du 13 mars 2028)

À faire	En cours	Fait
Commander les denrées de l'atelier 3 (Inès, avant le 24/03)	Rédiger le conducteur de l'atelier 3 (Inès, 21/03)	Atelier 1 « légumes secs » animé le 7/03
Réserver le bus pour la visite du marché (Mme Martin, 20/03)	Saisir les questionnaires « avant » dans le tableur (Inès, 17/03)	Atelier 2 « légumes de saison » animé le 14/03
Préparer l'ordre du jour du comité de pilotage (Inès, 27/03)		Affiches et flyers diffusés

Lecture : chaque carte porte une tâche, un responsable et une échéance ; en réunion d'équipe, on déplace les cartes d'une colonne à l'autre. Le nombre de tâches « en cours » doit rester limité pour éviter la dispersion.

Le tableur

Le tableur est l'outil le plus utilisé dans un projet de santé publique : budget (fiche F6), tableau de bord (F12), dépouillement des questionnaires (F11), feuille de temps. Quelques fonctions suffisent dans la plupart des cas.

Fonction · Ce qu'elle fait · Exemple dans le projet

=B2*C2 — *Ce qu'elle fait :* Multiplie deux cellules ; *Exemple dans le projet :* Montant d'une ligne de budget = quantité × coût unitaire

=SOMME(D2:D10) — *Ce qu'elle fait :* Additionne une plage ; *Exemple dans le projet :* Total des charges

=MOYENNE(B2:B13) — *Ce qu'elle fait :* Calcule la moyenne ; *Exemple dans le projet :* Score moyen de connaissances des 12 participants

=MEDIANE(B2:B13) — *Ce qu'elle fait :* Calcule la médiane ; *Exemple dans le projet :* Score médian, moins sensible aux valeurs extrêmes

=NB.SI(C2:C49;"Oui") — *Ce qu'elle fait :* Compte les cellules qui remplissent une condition ; *Exemple dans le projet :* Nombre de parents qui souhaitent des ateliers

=NB.SI(C2:C49;"Oui")/ NBVAL(C2:C49) — *Ce qu'elle fait :* Calcule une proportion ; *Exemple dans le projet :* Part des parents qui souhaitent des ateliers (format %)

=D2-C2 et =(D2-C2)/C2 — *Ce qu'elle fait :* Calcule un écart absolu et un écart relatif ; *Exemple dans le projet :* Écart entre le budget réalisé et le budget prévu

Exemple – Calcul détaillé : un tableau de bord dans le tableur

Dans la feuille « tableau de bord », la colonne B contient la valeur prévue, la colonne C la valeur réalisée.

- Ligne 2, ateliers réalisés : prévu 6, réalisé 6 ; taux de réalisation =C2/B2 → 6 / 6 = **100 %**.
- Ligne 3, présences : prévu 72 (12 familles × 6 ateliers), réalisé 61 ; taux =C3/B3 → 61 / 72 = 0,847, soit **84,7** % (objectif ≥ 80 % atteint).
- Ligne 4, dépenses de denrées : prévu 210 €, réalisé 236 € ; écart =C4-B4 → **+ 26 €** ; écart relatif =(C4-B4)/B4 → 26 / 210 = 0,124, soit **+ 12,4 %**.
- Une **mise en forme conditionnelle** (cellule verte si l'objectif est atteint, orange sinon) rend le tableau lisible en comité de pilotage.

(Données fictives.)

Le formulaire en ligne

Le formulaire en ligne (questionnaire diffusé par un lien ou un QR code) facilite le recueil et le dépouillement : les réponses arrivent directement dans un tableur. Il ne convient pas à tous les publics : prévoir **toujours** une version papier ou une passation accompagnée pour les personnes éloignées du numérique (précarité numérique, chapitres 5 et 15).

Attention – Formulaire en ligne et RGPD : la liste de contrôle

- **Utiliser l'outil validé par la structure** : vérifier où sont hébergées les données (de préférence dans l'Union européenne) et qui y a accès.
- **Minimiser** : ne demander que les informations utiles à l'objectif ; un questionnaire de satisfaction peut être **anonyme** (pas de nom, pas d'adresse électronique obligatoire).
- **Informer** les personnes en tête du formulaire : responsable du traitement, finalité, caractère facultatif, durée de conservation, droits (accès, rectification, effacement) et contact.
- **Données de santé** (poids, maladie, traitement) : ce sont des données sensibles (article 9 du RGPD) ; ne pas les recueillir par un formulaire grand public sans cadre adapté (consentement explicite, hébergement et sécurité appropriés), demander l'avis du responsable de la structure ou du délégué à la protection des données.
- **Sécuriser et supprimer** : accès protégé par mot de passe, export dans un dossier sécurisé, suppression des réponses à la fin de la durée annoncée.

À vous de jouer – Exercice d'application – Choisir l'outil numérique adapté

Pour chacun des besoins suivants, indiquez l'outil le plus adapté et une précaution : a) préparer, avec l'équipe, le plan du dossier de projet ; b) suivre qui fait quoi et pour quand pendant les six semaines d'ateliers ; c) calculer le coût par famille et l'écart au budget prévu ; d) recueillir l'avis de 80 parents d'élèves sur le goûter.

Corrigé

a) Carte mentale (sur papier ou logiciel), partagée sur l'espace collaboratif de la structure ; précaution : la faire valider par la tutrice avant de rédiger. **b) Logiciel de gestion de projet** (tableau à colonnes ou Gantt) ; précaution : outil autorisé par la structure, aucune donnée personnelle des familles. **c) Tableur** : =SOMME() pour le total, =total/12 pour le coût par famille, =(réalisé − prévu)/prévu pour l'écart relatif ; précaution : vérifier les formules et dater la version. **d) Formulaire en ligne** diffusé par le cahier de liaison ou un QR code, **avec une version papier** ; précaution : questionnaire anonyme, information RGPD en tête, durée de conservation annoncée.

Travailler en équipe avec des documents partagés

Un projet de prévention se mène à plusieurs : chef de projet, tutrice, animateurs, partenaires, parfois bénévoles. Les documents circulent (tableau de bord, budget, conducteurs, questionnaires). Sans règles communes, on perd du temps à chercher la bonne version, et l'on risque de diffuser des données personnelles par erreur.

Méthode – Organiser les fichiers du projet en quatre règles

1. **Une arborescence simple et partagée**, décidée au lancement : par exemple 01_Diagnostic, 02_Conception, 03_Financement, 04_Ateliers, 05_Communication, 06_Évaluation, 07_Bilan.
2. **Un nommage normalisé** des fichiers : date à l'envers, objet, version. Exemple : 2028-03-14_conducteur_atelier2_v3. La date à l'envers permet de classer les fichiers dans l'ordre chronologique.
3. **Une seule version de référence** : on travaille dans le document partagé, ou l'on indique clairement qui détient la version en cours de modification. La version validée est marquée « VALIDÉ » ou déposée dans un dossier à part.
4. **Des accès limités** : les fichiers contenant des données personnelles (listes d'inscrits, questionnaires nominatifs) sont rangés dans un dossier à accès restreint, sur un espace de la structure, jamais sur une messagerie personnelle.

Situation · Mauvaise pratique · Bonne pratique

Un partenaire envoie ses corrections — *Mauvaise pratique :* Trois fichiers « budget_final », « budget_final2 », « budget_final_OK » ; *Bonne pratique :* Un fichier versionné (v1, v2, v3) et un tableau des modifications

Un animateur absent doit être remplacé — *Mauvaise pratique :* Le conducteur est dans sa messagerie ; *Bonne pratique :* Le conducteur est dans le dossier partagé, à jour

Le financeur demande un bilan intermédiaire — *Mauvaise pratique :* On reconstitue les chiffres à partir des feuilles papier ; *Bonne pratique :* Le tableau de bord est mis à jour chaque semaine dans le tableur partagé

On doit envoyer les résultats à un partenaire — *Mauvaise pratique :* On transfère le fichier des questionnaires nominatifs ; *Bonne pratique :* On envoie un tableau de résultats agrégés, sans nom

Définition – Compte rendu de réunion et relevé de décisions

Le **compte rendu** résume les échanges d'une réunion. Le **relevé de décisions**, plus court, ne retient que ce qui a été décidé : pour chaque décision, l'action à mener, le responsable et l'échéance. En projet, le relevé de décisions est souvent plus utile, car il se transforme directement en tâches dans le planning (8.3.6).

Exemple – Un relevé de décisions de comité de pilotage (projet fictif)

Comité de pilotage du 12 mars 2028, présents : 5 membres

sur 6.

Décision · Action · Responsable · Échéance

Ouvrir un troisième créneau d'atelier le samedi matin — *Action :* Réserver la salle, informer les familles de la liste d'attente ; *Responsable :* Coordinatrice ; *Échéance :* 20 mars

Remplacer les flyers par une formation des relais — *Action :* Organiser deux séances de formation de 2 heures ; *Responsable :* Diététicienne ; *Échéance :* 15 avril

Demander une avance au financeur — *Action :* Rédiger le courrier, le faire signer par la direction ; *Responsable :* Chef de projet ; *Échéance :* 18 mars

Attention – Les messageries instantanées

Les groupes de messagerie sont pratiques pour rappeler un horaire, mais ils ne conviennent pas pour échanger des informations de santé, des listes nominatives ou des documents de travail : les données sortent du contrôle de la structure, et les décisions s'y perdent. On y renvoie vers le dossier partagé et vers le relevé de décisions.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.31

Votre dossier de projet contient les fichiers suivants : « questionnaire.xlsx », « questionnaire bis.xlsx », « budget définitif.xlsx », « budget définitif 2.xlsx », « photo atelier.jpg », « CR réunion.docx ». Proposez une arborescence et un nommage pour ces fichiers, et indiquez lesquels doivent être placés dans un dossier à accès restreint.

Corrigé

Arborescence possible : 03_Financement (budget), 04_Ateliers (photos), 06_Évaluation (questionnaires), 08_Pilotage (relevés de décisions). Nommage : 2028-02-03_questionnaire_avant_v1 et 2028-02-10_questionnaire_avant_v2 (ou suppression de l'ancienne version après validation) ; 2028-01-20_budget_previsionnel_v1 et 2028-03-12_budget_previsionnel_v2_VALIDÉ ; 2028-03-02_atelier1_photo_groupe ; 2028-03-12_COPIL_releve_decisions. Accès restreint : les questionnaires s'ils sont nominatifs, et la photo si des personnes sont reconnaissables (avec l'accord écrit conservé à côté).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 8.3.14 – Temps de travail et outils numériques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Une tâche est estimée à 40 h. Avec une marge de 20 %, quel temps prévoit-on ?
2. Pourquoi tenir une feuille de temps pendant le projet ?
3. À quoi sert une carte mentale dans la démarche de projet ?
4. Pourquoi écrire la date à l'envers (année-mois-jour) dans le nom d'un fichier ?
5. Quelle différence y a-t-il entre un compte rendu et un relevé de décisions ?
6. Où ranger une liste d'inscrits avec leurs coordonnées ?

Corrigé – Point d'étape 8.3.14

1. 40 × 1,20 = 48 h.
2. Pour comparer le temps prévu et le temps réellement passé, ajuster le planning et nourrir le bilan.
3. À organiser des idées autour d'un thème central : brainstorming, plan du dossier, carte des partenaires.
4. Pour que les fichiers se classent automatiquement dans l'ordre chronologique.
5. Le compte rendu résume les échanges ; le relevé de décisions ne retient que les décisions, avec l'action, le responsable et l'échéance.
6. Dans un dossier à accès restreint, sur un espace de la structure, jamais sur une messagerie personnelle.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe au fil rouge 8.3.15.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis la méthode d'estimation de la charge et les règles de rangement.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les parties 8.3.13 et 8.3.14 et je refais les exercices d'application.

8.3.15 Fil rouge : le plan d'action d'Inès

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 8.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a mis en place

- **Stratégies combinées** : 6 ateliers (éducation) ; partenariat avec l'épicerie pour que les légumes secs des recettes soient disponibles à petit prix (environnement) ; mamans relais (renforcement) ; recettes du monde choisies par les familles (participation) ; note au CLS sur l'offre du quartier (plaidoyer).
- **Parties prenantes** : 14 identifiées et placées sur la matrice ; COPIL de 6 membres (direction du centre social, référente, diététicienne, CCAS-épicerie, représentante de la commune, une maman relais) réuni 3 fois (janvier, mars, juin).
- **Convention** signée avec l'épicerie solidaire (orientation des familles, fourniture des légumes secs, mention sur les supports).
- **Appel à projets ARS** : dossier déposé le 31 janvier 2028 (date limite : 15 février) ; demande de 1 500 € ; notification reçue le 2 mai ; versement en juin : le centre social a avancé les dépenses (risque R3).
- **Pilotage** : tableau de bord mis à jour chaque semaine dans le tableur ; un écart a conduit à remplacer une famille (déménagement) par une famille de la liste d'attente.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : communication, logistique et trésorerie aux Tilleuls

- **Plan de communication** : 31 familles ont pris contact pour 12 places (liste d'attente de 19 familles) ; 45 % par les mamans relais, 23 % par l'épicerie ; les 300 flyers n'ont apporté que 2 contacts : pour le cycle suivant, le budget des flyers (45 €) finance un temps de formation des relais.
- **Méthodes** : chaque atelier combinait une courte présentation (10 minutes au plus), une démonstration du geste clé, la pratique en équipes, la dégustation et un temps de faire dire.
- **Logistique** : liste de courses calculée avec les rendements (par exemple 1,1 kg de carottes brutes pour 900 g épluchés), courses à l'épicerie solidaire et au marché, rappel des familles la veille par message vocal.
- **Trésorerie** : besoin maximal de 1 246 € fin mai ; la direction du centre social a mobilisé sa trésorerie générale ; Inès a obtenu que la commune verse sa participation dès mars.

8.4 Approfondissements

8.4.1 Le cadre logique, outil des financeurs

Niveau · Description · Indicateurs · Sources de vérification · Hypothèses

Objectif général — *Description :* Contribuer à améliorer l'alimentation des familles du QPV ; *Indicateurs :* Consommation de légumes secs (enquête locale) ; *Sources de vérification :* Enquête à 1 an ; *Hypothèses :* Contexte économique stable

Objectif spécifique — *Description :* 60 % des familles consomment des légumes secs ≥ 2 fois/semaine ; *Indicateurs :* % de familles ; *Sources de vérification :* Questionnaire avant/après ; *Hypothèses :* Disponibilité à l'épicerie

Résultats — *Description :* Familles capables de cuisiner 3 recettes de légumes secs ; *Indicateurs :* Recettes refaites déclarées ; *Sources de vérification :* Questionnaire, échanges ; *Hypothèses :* Équipement de cuisine à domicile

Activités — *Description :* 6 ateliers, visite du marché, livret ; *Indicateurs :* Ateliers réalisés, présences ; *Sources de vérification :* Émargements, livret ; *Hypothèses :* Locaux disponibles, financement obtenu

Le cadre logique oblige à expliciter les **hypothèses** (ce qui ne dépend pas du projet mais conditionne son succès) et les **sources de vérification** des indicateurs : il prépare directement l'évaluation (chapitre 9).

Construire un cadre logique pas à pas

Le cadre logique se construit à partir de l'**arbre à problèmes** du diagnostic (chapitre 7) : le problème central devient l'objectif spécifique, ses causes deviennent les résultats attendus, et ses conséquences renvoient à l'objectif général. On remplit ensuite la matrice **de haut en bas** pour la colonne des objectifs, puis **de bas en haut** pour vérifier la logique.

Méthode pas à pas – Remplir la matrice du cadre logique

1. Objectif général : la contribution à long terme, que le projet seul ne peut pas garantir (souvent formulée avec « contribuer à »).

2. Objectif spécifique : le changement principal attendu chez le public à la fin du projet ; il n'y en a qu'un, ou très peu.

3. Résultats : les produits concrets du projet, qui, ensemble, permettent d'atteindre l'objectif spécifique (capacités acquises, outils produits, environnement modifié).

4. Activités : ce que l'équipe fait pour obtenir chaque résultat ; on les numérote comme les résultats (activités 1.1, 1.2 pour le résultat 1).

5. Hypothèses : pour chaque niveau, les conditions extérieures nécessaires, qui ne dépendent pas du projet.

6. Indicateurs et sources : pour chaque niveau, un indicateur mesurable, une valeur cible et la source qui permettra de le vérifier.

7. Vérification de bas en haut : « si les activités sont réalisées **et** si les hypothèses se vérifient, **alors** les résultats sont obtenus ; si les résultats sont obtenus et si les hypothèses se vérifient, alors l'objectif spécifique est atteint ».

Définition – Hypothèse et condition préalable

Une **hypothèse** est une condition extérieure au projet, nécessaire à sa réussite, que l'équipe ne maîtrise pas mais qu'elle surveille (par exemple : « l'épicerie solidaire continue à proposer des légumes secs à petit prix »). Une **condition préalable** doit être remplie avant même de commencer (par exemple : « la salle équipée est disponible »). Si une hypothèse est très peu probable et essentielle, on parle d'**hypothèse fatale** : il faut alors modifier le projet.

Exemple – De l'arbre à problèmes au cadre logique (projet fictif, résidence autonomie)

Problème central de l'arbre : « Beaucoup de résidents sautent le dîner ». Causes : isolement le soir, difficulté à cuisiner pour une personne, méconnaissance de dîners simples. Conséquences : perte de poids, risque de dénutrition.

Niveau · Contenu · Indicateur et cible · Source · Hypothèses

Objectif général — *Contenu :* Contribuer à prévenir la dénutrition des résidents ; *Indicateur et cible :* Part des résidents ayant perdu plus de 5 % de leur poids en un an ; *Source :* Pesées mensuelles ; *Hypothèses :* Pas d'épidémie majeure pendant l'année

Objectif spécifique — *Contenu :* Réduire de moitié la part des résidents qui sautent le dîner (de 40 % à 20 %) ; *Indicateur et cible :* Part des résidents sautant le dîner au moins 3 fois par semaine ; *Source :* Questionnaire avant et après ; *Hypothèses :* Les résidents restent dans la résidence

Résultat 1 — *Contenu :* Les résidents savent préparer trois dîners simples pour une personne ; *Indicateur et cible :* Nombre de dîners refaits déclarés ; *Source :* Questionnaire, échanges ; *Hypothèses :*

Les logements disposent d'un équipement minimal

Résultat 2 — *Contenu :* Un dîner partagé mensuel est installé ; *Indicateur et cible :* Nombre de dîners organisés, participants ; *Source :* Émargements ; *Hypothèses :* La salle commune reste disponible

Activités — *Contenu :* 1.1 Six ateliers « dîners faciles » ; 1.2 livret de recettes ; 2.1 organisation des dîners avec les bénévoles ; *Indicateur et cible :* Ateliers réalisés, livret diffusé ; *Source :* Comptes rendus ; *Hypothèses :* Les bénévoles restent mobilisés

Attention – Les pièges du cadre logique

Placer une activité au niveau des objectifs (« organiser six ateliers » n'est pas un objectif spécifique) ; écrire plusieurs objectifs spécifiques sans lien entre eux ; oublier les hypothèses ; choisir des indicateurs sans source réaliste. Le cadre logique est un outil de **cohérence** : il ne remplace ni le diagnostic ni le plan d'action détaillé.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.32

Classez ces éléments dans les niveaux du cadre logique (objectif général, objectif spécifique, résultat, activité, hypothèse) : a) former deux agents à la pesée ; b) contribuer à améliorer l'état nutritionnel des résidents ; c) le service d'aide à domicile accepte de transmettre les pesées ; d) 80 % des résidents sont pesés chaque mois ; e) les agents savent repérer une perte de poids inquiétante.

Corrigé

a) Activité. b) Objectif général. c) Hypothèse (condition extérieure que l'équipe ne maîtrise pas). d) Indicateur et cible de l'objectif spécifique ou d'un résultat, selon la construction choisie : ici, on peut le lier au résultat « un suivi mensuel du poids est en place ». e) Résultat (capacité acquise grâce à la formation). On vérifie la logique de bas en haut : si les agents sont formés (a) et si le service transmet les pesées (c), alors les agents savent repérer une perte de poids (e) et le suivi est assuré (d).

8.4.2 Le travail en réseau et la coordination territoriale

Sur un territoire, de nombreux acteurs agissent sur l'alimentation (centres sociaux, PMI, écoles, épiceries solidaires, associations, collectivités). Les **coordinations** (CLS, ateliers santé ville, PAT, réseaux régionaux de promotion de la santé comme les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé) évitent les doublons, mutualisent les ressources et permettent un **parcours** cohérent pour les habitants. Le diététicien gagne à participer aux groupes de travail locaux : ils sont aussi une source de partenaires et de financements.

Les dispositifs de coordination à connaître

Le diététicien qui monte un projet de prévention gagne à l'inscrire dans les dispositifs existants du territoire. Il y trouve des partenaires, des données, parfois des financements, et son action a plus de chances d'être poursuivie. Le tableau présente les principaux dispositifs et leur base juridique.

Dispositif · Ce que c'est · Base juridique · Intérêt pour un projet nutrition

Contrat local de santé (CLS) — *Ce que c'est :* Contrat entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour des actions de santé adaptées au territoire ; *Base juridique :* Code de la santé publique, art. L. 1434-10 ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Fiches actions « alimentation » ; mise en relation avec les acteurs ; légitimité auprès des financeurs

Atelier santé ville (ASV) — *Ce que c'est :* Démarche de coordination santé dans les quartiers de la politique de la ville ; *Base juridique :* Politique de la ville ; souvent intégré au volet santé du contrat de ville ou au CLS ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Accès aux habitants des quartiers prioritaires, aux relais et aux données locales

Projet alimentaire territorial (PAT) — *Ce que c'est :* Projet construit par les acteurs d'un territoire pour relocaliser l'agriculture et l'alimentation ; *Base juridique :* Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 ; Code rural, art. L. 111-2-2 ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Approvisionnement local, accessibilité alimentaire, lutte contre le gaspillage, éducation alimentaire

Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) — *Ce que c'est :* Regroupement de professionnels de santé d'un territoire autour d'un projet de santé commun ; *Base juridique :* Code de la santé publique, art. L. 1434-12 ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Missions de prévention ; lien avec les médecins, infirmiers et pharmaciens du territoire

Conseil local de santé mentale, réseaux de périnatalité, dispositifs d'appui à la coordination — *Ce que c'est :* Coordinations thématiques ; *Base juridique :* Textes propres à chaque dispositif ; *Intérêt pour un projet nutrition :* Relais vers des publics spécifiques (santé mentale, périnatalité, situations complexes)

Lien avec le chapitre 7 – Le diagnostic partagé

Un CLS ou un PAT s'appuie lui-même sur un diagnostic du territoire. Avant de lancer son propre diagnostic, le diététicien consulte ces documents : ils fournissent des données et montrent quelles priorités ont déjà été retenues par les acteurs locaux.

Méthode – S'inscrire dans un dispositif territorial

1. **Repérer** les dispositifs du territoire : site de l'ARS, de la collectivité, de la préfecture (politique de la ville), de la direction régionale de l'agriculture (PAT).
2. **Lire** le document de référence (contrat, projet de santé, plan d'action du PAT) et repérer les fiches actions liées à l'alimentation.
3. **Rencontrer** le coordonnateur (coordinateur CLS, chargé de mission PAT) pour présenter le projet et vérifier sa cohérence avec les priorités.
4. **Valoriser** ce lien dans le dossier de financement : « le projet répond à la fiche action n° 3 du CLS ».
5. **Participer** aux réunions de réseau et transmettre les résultats : c'est un gage de crédibilité et de pérennité.

Exemple – Un projet relié à trois dispositifs (projet fictif)

Une diététicienne prévoit des ateliers « cuisine de saison » dans une communauté de communes rurale. Elle

découvre que le CLS comporte une fiche action « favoriser une alimentation favorable à la santé des familles », que le PAT de la communauté de communes finance l'approvisionnement des cantines en légumes locaux, et que la CPTS du territoire a inscrit la prévention du diabète dans son projet de santé. Elle construit ses ateliers avec un maraîcher du PAT, propose à la CPTS d'orienter des patients à risque, et cite la fiche action du CLS dans son dossier : trois partenaires et trois sources de légitimité pour un même projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.33

Pour chacune des situations suivantes, indiquez le dispositif à contacter en priorité : a) un projet d'éducation alimentaire lié aux produits des agriculteurs locaux ; b) un projet dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; c) un projet de repérage du risque de diabète avec les médecins généralistes du secteur.

Corrigé

a) Le projet alimentaire territorial (PAT), qui rassemble les producteurs, les collectivités et les acteurs de l'alimentation. b) L'atelier santé ville ou le volet santé du contrat de ville, souvent articulé avec le contrat local de santé. c) La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), qui réunit les professionnels de santé du territoire et porte des missions de prévention. Dans les trois cas, le contrat local de santé, s'il existe, est aussi un point d'entrée utile.

8.4.3 La pérennisation dès la conception

Un projet financé sur un an risque de s'arrêter faute de moyens. La pérennisation se prépare **dès la conception** : former des relais (animatrices, mamans relais) qui pourront poursuivre l'action ; intégrer l'action dans le projet de la structure ; rechercher des financements pluriannuels (CPOM) ; produire des outils réutilisables (livret, conducteurs) ; inscrire l'action dans le CLS ou le PAT ; évaluer pour démontrer l'utilité (chapitre 9).

Les étapes de la pérennisation

Pérenniser ne veut pas dire répéter le même projet à l'identique, avec les mêmes financements. C'est faire en sorte que **les effets** et **les compétences** acquises durent, et que l'action, éventuellement transformée, soit **portée par d'autres** quand le financement initial s'arrête.

Étape · Moment · Actions

1. Prévoir — *Moment :* Dès la conception ; *Actions :* Identifier qui pourra poursuivre l'action ; prévoir la formation de relais ; choisir des activités peu coûteuses à reconduire

2. Transférer — *Moment :* Pendant le projet ; *Actions :* Associer les relais à l'animation ; rédiger des outils réutilisables (conducteurs, livret, fiches recettes) ; documenter les choix

3. Démontrer — *Moment :* Fin du projet ; *Actions :* Évaluer les résultats et les coûts ; présenter le bilan aux décideurs ; proposer des scénarios de suite chiffrés

4. Intégrer — *Moment :* Après le projet ; *Actions :* Inscrire l'action dans le projet de la structure, dans un CLS ou un PAT ; rechercher un financement pluriannuel

Définition – Transférabilité

Capacité d'une action à être reproduite dans un autre lieu ou par d'autres intervenants, avec des résultats comparables. Elle suppose une description précise de l'action (objectifs, public, contenu des séances, moyens) et l'identification de ses **fonctions clés**, c'est-à-dire de ce qui doit être conservé pour que l'action reste efficace (8.3.1).

Exemple – Trois scénarios de suite chiffrés (projet fictif)

À la fin d'un cycle de 6 ateliers qui a coûté 3 060 € en dépenses monétaires, la diététicienne présente trois scénarios au comité de pilotage :

- **Scénario 1, reconduction à l'identique** : 3 060 € par an, financement à trouver en totalité.
- **Scénario 2, animation par deux relais formées, avec deux interventions de la diététicienne** : 2 × 3 h × 45 € = 270 € d'honoraires, plus les denrées et le petit matériel (environ 600 €), soit environ 870 € par an.
- **Scénario 3, intégration au programme du centre social** : les ateliers sont animés par l'animatrice salariée du centre ; seules les denrées sont à financer.

Le comité retient le scénario 2 pour un an, avec une évaluation à mi-parcours : il maintient l'expertise diététique tout en divisant le coût par plus de trois (3 060 / 870 = 3,5).

Attention – La dépendance à une seule personne

Un projet qui repose entièrement sur une personne (stagiaire, salarié en contrat court, bénévole très investi) s'arrête souvent avec son départ. La passation (documents, contacts, relevés de décisions) et la formation d'au moins deux relais sont des conditions de la pérennisation.

8.4.4 Les contrats pluriannuels et les fonds européens

Pour pérenniser une action, les structures cherchent des financements **pluriannuels** : contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) avec l'ARS, conventions pluriannuelles avec les collectivités, financements de la CAF (prestations de service). Les **fonds européens** (Fonds social européen plus, FSE+, programmes régionaux) peuvent financer des projets d'inclusion ou d'aide alimentaire (une partie de l'aide alimentaire européenne relève du FSE+), avec des exigences administratives importantes (justificatifs, suivi des participants). Un projet de stage ne mobilise généralement pas ces fonds, mais le diététicien en poste peut y contribuer.

Les exigences des financements pluriannuels et européens

Les financements pluriannuels sécurisent une action, mais ils demandent une gestion plus rigoureuse. Le chef de projet doit les connaître pour éviter de s'engager dans un financement que la structure ne pourra pas gérer.

Exigence · Ce qu'elle implique · Conséquence pour la structure

Objectifs et indicateurs sur plusieurs années — *Ce qu'elle implique :* Un dialogue de gestion annuel avec le financeur, sur la base des indicateurs ; *Conséquence pour la structure :* Disposer d'un tableau de bord fiable et d'une évaluation continue

Justification des dépenses — *Ce qu'elle implique :* Factures, feuilles de temps, preuves de publicité du soutien ; *Conséquence pour la structure :* Archiver les pièces pendant la durée exigée par le financeur

Versements différés — *Ce qu'elle implique :* Souvent un acompte, puis des versements après contrôle des justificatifs ; *Conséquence pour la structure :* Prévoir un plan de trésorerie sur toute la durée (8.3.10)

Cofinancement — *Ce qu'elle implique :* Une part du budget doit venir d'autres financeurs ; *Conséquence pour la structure :* Rechercher plusieurs financeurs en même temps

Contrôle — *Ce qu'elle implique :* Contrôle sur pièces ou sur place ; reversement des sommes non justifiées ; *Conséquence pour la structure :* Organiser les dossiers dès le début du projet

Attention – Les fonds européens demandent une structure solide

Le Fonds social européen Plus (FSE+, programmation 2021-2027) peut financer des actions d'inclusion sociale, y compris en lien avec l'alimentation. Mais les dossiers sont lourds, les versements interviennent souvent longtemps après les dépenses et les contrôles sont stricts. Une petite association a intérêt à passer par une structure intermédiaire ou à commencer par des financements plus simples (commune, CAF, fondations, ARS).

À vous de jouer – Exercice d'application 8.34

Une association reçoit une proposition de financement sur trois ans : 6 000 € par an, avec un acompte de 30 % au début de chaque année et le solde après justification des dépenses, environ six mois après la fin de l'année. Calculez l'acompte et le solde annuels, puis expliquez la conséquence pour la trésorerie de l'association.

Corrigé

Acompte : 6 000 × 0,30 = 1 800 € au début de chaque année. Solde : 6 000 − 1 800 = 4 200 €, versé environ six mois après la fin de l'année. L'association doit donc avancer 4 200 € de dépenses chaque année, et pendant six mois de plus le temps du versement. Au début de la deuxième année, elle reçoit l'acompte de la deuxième année alors que le solde de la première n'est pas encore versé : elle doit avoir une trésorerie suffisante ou négocier un calendrier de versement plus favorable, et suivre un plan de trésorerie sur les trois ans.

8.4.5 La gestion des bénévoles

De nombreux projets reposent sur des **bénévoles** (aide en cuisine, accueil, mamans relais). Leur engagement est précieux mais fragile : il suppose un **accueil** (présentation du projet, des règles d'hygiène et de confidentialité), un **rôle clair** (fiche de mission), une **formation** courte, une **reconnaissance** (remerciements, attestation, participation aux temps forts) et un **suivi** (points réguliers). Le bénévolat se valorise dans le budget (comptes 86 et

87. et se distingue du travail salarié : pas de lien de subordination ni de rémunération.

Accueillir des bénévoles : cadre pratique

Les bénévoles apportent du temps, des compétences et un lien avec les habitants. Leur place doit être organisée : un bénévole mal accueilli ou sans rôle précis s'en va ; un bénévole mal assuré expose la structure à des risques.

Question · Réponse pratique

Faut-il un contrat ? — *Réponse pratique :* Non : le bénévolat ne crée pas de lien de subordination. On utilise une **fiche de mission** et, souvent, une **charte du bénévole** signée (valeurs, confidentialité, règles d'hygiène).

Les bénévoles sont-ils assurés ? — *Réponse pratique :* La structure vérifie que son contrat d'assurance couvre la responsabilité civile et les accidents des bénévoles pendant les activités, y compris les trajets si nécessaire.

Peut-on les rembourser ? — *Réponse pratique :* Oui, les frais réellement engagés pour l'association (achats, déplacements) peuvent être remboursés sur justificatifs. Un remboursement forfaitaire sans justificatif risque d'être considéré comme une rémunération.

Que se passe-t-il s'ils renoncent au remboursement ? — *Réponse pratique :* Les frais engagés et non remboursés peuvent être considérés comme un **don** à une association d'intérêt général : ils ouvrent droit à une réduction d'impôt (article 200 du Code général des impôts).

Comment valoriser leur temps ? — *Réponse pratique :* Dans les contributions volontaires en nature du budget (8.3.5), avec un taux horaire justifié.

Exemple – Calcul détaillé : l'abandon de frais d'une bénévole

Une bénévole a engagé 300 € de frais justifiés (achats de denrées et déplacements) pour une association d'intérêt général, qui a constaté ces frais dans ses comptes. Elle renonce par écrit à leur remboursement. L'association lui délivre un reçu fiscal de 300 €. La réduction d'impôt est de 66 % du montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable : 300 × 0,66 = **198 €**. Le coût réel pour la bénévole est de 300 − 198 = **102 €**.

Méthode – Rédiger une fiche de mission de bénévole

1. **Intitulé** de la mission (« aide en cuisine lors des ateliers du jeudi »).
2. **Objectif** de la mission dans le projet.
3. **Activités** confiées, et ce qui n'est pas confié (par exemple : pas de conseil nutritionnel individuel).
4. **Disponibilité** attendue (jour, horaire, fréquence) et durée de l'engagement.
5. **Formation** et accompagnement prévus (hygiène,

confidentialité, posture d'écoute).

6. **Référent** de la structure, à contacter en cas de question.

À vous de jouer – Exercice d'application 8.35

Un bénévole demande à recevoir 20 € par atelier « pour ses frais », sans justificatif. Expliquez pourquoi la structure refuse, puis proposez deux solutions conformes.

Corrigé

Un versement forfaitaire sans justificatif peut être considéré comme une rémunération : le bénévole deviendrait un salarié de fait, avec des obligations sociales pour la structure, et le caractère bénévole serait remis en cause. Solutions : rembourser les frais réels sur présentation de justificatifs (tickets de caisse, trajets déclarés selon les règles de la structure) ; ou proposer au bénévole d'abandonner le remboursement de ses frais justifiés et de recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt de 66 %.

8.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Gestion de projet : méthodes prédictives et agiles

La planification présentée (Gantt, PERT) relève des méthodes **prédictives** : on fixe le plan au départ. Les méthodes **agiles** (issues de l'informatique, manifeste agile de 2001) procèdent par **itérations** courtes, avec des retours fréquents des utilisateurs et des ajustements continus. En santé publique, une approche « hybride » est fréquente : un cadre fixé (objectifs, budget, calendrier du financeur) et des séances ajustées après chaque retour des participants (cycle « planifier, faire, vérifier, agir » de Deming, ou PDCA).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Coût, efficience et analyse médico-économique

L'**efficience** rapporte les résultats obtenus aux ressources mobilisées. Les évaluations médico-économiques comparent des interventions : analyse coût-efficacité (coût par unité de résultat, par exemple coût par famille ayant atteint l'objectif), coût-utilité (coût par année de vie ajustée sur la qualité, QALY), coût-bénéfice (résultats exprimés en euros). Exemple simple : si 9 familles sur 12 atteignent l'objectif « légumes secs », le coût par famille ayant atteint l'objectif est de 3 510 / 9 = **390 €**. Ces calculs restent fragiles à petite échelle, mais ils intéressent de plus en plus les financeurs.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Sociologie de la traduction et partenariats

La **sociologie de la traduction** (Callon, Latour, années 1980) analyse la manière dont un projet « enrôle » des acteurs aux intérêts différents en traduisant le problème dans les termes de chacun (pour l'épicerie : écouler des produits ; pour l'école : associer les parents ; pour l'ARS : réduire les inégalités). Un porteur de projet efficace construit des « points de passage obligés » où les intérêts convergent.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer le coût d'opportunité et le retour social sur investissement

Le **coût d'opportunité** d'un projet est la valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce en y consacrant des ressources (le temps de la diététicienne aurait pu servir à des consultations). Le **retour social sur investissement** (SROI) tente de traduire en valeur monétaire les effets sociaux d'un projet (économies de santé, gain de qualité de vie, réduction du gaspillage) et de les rapporter à l'investissement : un ratio de 3 signifie 3 € de valeur sociale créée pour 1 € investi. La méthode est discutée (choix des valeurs, attribution des effets), mais elle oblige à expliciter la **chaîne des effets** attendus et intéresse les financeurs.

8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Du soin au collectif

Un diététicien libéral, constatant les besoins de ses patients diabétiques, monte avec une maison de santé un programme d'ateliers collectifs financé par l'ARS ; il rédige la réponse à l'appel à projets et un budget incluant ses honoraires d'animation.

Situation bc2 – Budget et restauration

En restauration collective, le diététicien prépare le budget d'une animation « semaine du goût » (denrées, supports, temps de personnel) et suit les écarts entre prévu et réalisé, avec les mêmes outils qu'un projet BC3.

Situation bc3 – Une demande à la conférence des financeurs

Un CCAS sollicite la conférence des financeurs pour des ateliers « bien manger après 60 ans » : le diététicien lit le cahier des charges, vérifie l'éligibilité (public de 60 ans et plus, territoire), adapte les objectifs et construit le budget.

Situation bc3 – Un projet en retard

À mi-parcours, seules 2 des 4 écoles prévues ont commencé les ateliers. Le diététicien analyse les causes (calendrier scolaire, changement de directeur), réunit le COPIL, propose un nouveau calendrier et informe le financeur.

Situation bc3 – Une communication qui ne touche pas le public

Après trois semaines, un atelier n'a que 3 inscrits malgré 500 flyers distribués. Le diététicien analyse les canaux, rencontre l'animatrice du centre social et une association de quartier, forme deux habitantes relais : 11 inscriptions en une semaine.

Situation bc3 – Une subvention versée tardivement

Un projet financé par une fondation doit avancer 2 000 € d'achats avant le versement. Le diététicien établit un plan de trésorerie, propose à la direction un échelonnement des achats et demande un acompte de 30 % au financeur.

Cas guidé : un tiers-lieu nourricier en milieu rural

Ce cas guidé reprend toutes les étapes du chapitre sur un projet complet. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. Les données sont **fictives**.

Document – La situation

La commune de Saint-Aubin-des-Prés compte 1 900 habitants ; le supermarché le plus proche est à 14 km, et le bus ne passe que deux fois par jour. Une association a ouvert dans une ancienne grange un **tiers-lieu** : café associatif, atelier de réparation, cuisine partagée équipée. Un maraîcher bio s'est installé à 3 km. L'association souhaite monter un projet « Cuisiner ensemble à la Grange » pour deux publics : les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules (environ 180 dans la commune) et les parents de jeunes enfants. Une enquête menée par l'association auprès de 64 habitants en 2027 indique que 47 % des plus de 65 ans interrogés mangent seuls tous les soirs et que 38 % des parents déclarent « ne pas savoir quoi cuisiner avec des légumes de saison ». Vous êtes diététicien et vous accompagnez l'association.

Étape 1 – Choisir les stratégies. Quelles stratégies combiner, et pourquoi ?

Réponse commentée – Étape 1

On combine au moins trois stratégies (8.3.1). L'**éducation** : des ateliers culinaires de saison. L'action sur l'**environnement** : un accès facilité aux légumes du maraîcher (paniers à prix solidaire, dépôt à la Grange) et un transport solidaire pour les personnes âgées sans voiture. Le **lien social et la participation** : des repas partagés intergénérationnels, des recettes choisies par les participants. Le diagnostic montre en effet un problème d'accès (distance, transport), de savoir-faire et d'isolement : une seule stratégie ne suffirait pas.

Étape 2 – Formuler un objectif spécifique et deux objectifs opérationnels.

Réponse commentée – Étape 2

Objectif spécifique : « D'ici juin 2028, la moitié des participants au moins déclarent préparer un repas avec des légumes de saison au moins trois fois par semaine. » Objectifs opérationnels : « Organiser 8 ateliers culinaires de 12 participants entre octobre 2027 et mai 2028, avec au moins un tiers de personnes de plus de 65 ans » ; « Mettre en place un dépôt hebdomadaire de paniers du maraîcher à la Grange à partir de novembre 2027 ». Chaque objectif est mesurable, daté et réaliste.

Étape 3 – Identifier les parties prenantes. Citez cinq partenaires et leur rôle.

Réponse commentée – Étape 3

L'association du tiers-lieu (porteur, locaux, bénévoles) ; le maraîcher (produits, visite de l'exploitation, prix solidaire) ; la commune (financement, communication par le bulletin municipal, transport solidaire) ; le CCAS ou le service d'aide à domicile (repérage des personnes âgées isolées) ; la PMI ou le relais petite enfance (repérage des parents). On peut ajouter le projet alimentaire territorial de la communauté de communes, s'il existe (8.4.2), et le centre de ressources du réseau Promotion Santé pour les outils.

Étape 4 – Construire le budget prévisionnel. Données : diététicienne 8 ateliers × 4 h × 45 € ; denrées 8 ateliers × 12 portions × 2,10 € ; petit matériel 650 € ; communication 180 € ; transport solidaire 8 × 35 € ; assurance complémentaire 120 €. Contributions en nature : 3 bénévoles × 3 h × 8 ateliers au taux de 13 € de l'heure (taux fictif) ; cuisine de la Grange, valeur locative 40 € par atelier ; légumes donnés par le maraîcher, 15 € par atelier. Recettes : ARS 1 500 € ; commune 600 € ; fondation 600 € ; participation de 1 € par participant et par atelier.

Réponse commentée – Étape 4

Charges monétaires : diététicienne 8 × 4 × 45 = **1 440 €** ; denrées 8 × 12 × 2,10 = **201,60 €** ; petit matériel **650 €** ; communication **180 €** ; transport 8 × 35 = **280 €** ; assurance **120 €**. Total monétaire : 1 440 + 201,60 + 650 + 180 + 280 + 120 = **2 871,60 €**.

Contributions en nature : bénévoles 3 × 3 × 8 × 13 = **936 €** ; cuisine 8 × 40 = **320 €** ; légumes 8 × 15 = **120 €** ; total **1 376 €**.

Total des charges : 2 871,60 + 1 376 = **4 247,60 €**.

Recettes monétaires : 1 500 + 600 + 600 + 96 (8 × 12 × 1 €) = **2 796 €**. Autofinancement de l'association : 2 871,60 − 2 796 = **75,60 €**. Le budget s'équilibre à 4 247,60 € en ajoutant les 1 376 € de contributions en nature aux

recettes (comptes 86 et 87).

Ratios : l'ARS finance 1 500 / 4 247,60 = **35,3 %** du budget total ; les contributions en nature représentent 1 376 / 4 247,60 = **32,4 %** du total, ce qui montre l'importance de l'engagement local. Coût monétaire par participation : 2 871,60 / 96 = **29,91 €**.

Étape 5 – Choisir trois indicateurs de suivi.

Réponse commentée – Étape 5

Un indicateur de **réalisation** : nombre d'ateliers réalisés sur 8 prévus. Un indicateur de **participation** : taux de présence (présences / places proposées). Par exemple, avec 12, 11, 12, 10, 9, 12, 11 et 12 présents, on obtient 89 présences sur 96 places, soit 89 / 96 = **92,7 %**. Un indicateur de **résultat** : part des participants déclarant cuisiner des légumes de saison au moins trois fois par semaine, mesurée par un questionnaire avant et après. On peut ajouter un indicateur sur l'environnement : nombre de paniers vendus chaque semaine au dépôt.

Étape 6 – Repérer deux risques et prévoir leur traitement.

Réponse commentée – Étape 6

Risque 1 : les personnes âgées ne viennent pas faute de transport (probabilité élevée, impact fort). Traitement : transport solidaire organisé avec la commune, inscription par téléphone, rappel la veille. Risque 2 : le financement de l'ARS est notifié tardivement, alors que les achats de matériel ont lieu en octobre (probabilité moyenne, impact moyen). Traitement : plan de trésorerie, demande d'acompte, achat progressif du matériel (8.3.10). On peut aussi citer le risque sanitaire en cuisine partagée (formation hygiène des bénévoles, fiche allergies, 8.3.9).

Étape 7 – Préparer la pérennisation.

Réponse commentée – Étape 7

Former deux bénévoles du tiers-lieu à l'animation d'ateliers simples, avec un livret de recettes de saison construit avec les participants ; présenter le bilan à la commune et au projet alimentaire territorial ; proposer pour l'année suivante un scénario où la diététicienne n'intervient plus qu'à deux ateliers sur huit, et où le dépôt de paniers devient autonome (8.4.3).

Ce que le jury attend sur la conception et le pilotage

À l'épreuve E5, le jury ne vérifie pas seulement que vous connaissez les outils : il vérifie que vous savez les **choisir**, les **justifier** et les **adapter** à votre projet. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes et la manière d'y répondre.

Le jury attend… · Ce qui montre que vous l'avez fait · Ce qui le déçoit
Un lien clair entre le diagnostic et le plan d'action — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Chaque action renvoie à une cause identifiée dans l'arbre à problèmes ; *Ce qui le déçoit :* Des actions choisies « parce que ça marche bien » sans lien avec les constats
Des objectifs bien formulés — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Des objectifs mesurables, datés, avec des indicateurs et des cibles ; *Ce qui le déçoit :* Des objectifs vagues ou confondus avec des activités
Des stratégies combinées — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Au moins une action sur l'environnement en plus de l'éducation ; *Ce qui le déçoit :* Uniquement des ateliers d'information
Un partenariat réel — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Des partenaires nommés, avec un rôle précis et un accord écrit ; *Ce qui le déçoit :* Une liste de structures « à contacter »
Un budget juste et expliqué — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Des calculs détaillés, des contributions en nature valorisées, un budget équilibré ; *Ce qui le déçoit :* Des montants ronds sans justification, un budget déséquilibré
Un pilotage effectif — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Un tableau de bord, des écarts repérés, des décisions prises ; *Ce qui le déçoit :* Un planning théorique jamais confronté au réalisé
Une posture réflexive — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous changeriez ; *Ce qui le déçoit :* Un récit sans analyse critique
Le respect de l'éthique — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Messages non stigmatisants, consentement, données protégées, absence de conflit d'intérêts ; *Ce qui le déçoit :* Photos sans accord, outils sponsorisés par une marque

Astuce – Une phrase de justification par choix

Pour chaque choix important (stratégie, méthode, outil, partenaire, indicateur), écrivez une phrase qui commence par « J'ai choisi… parce que… ». Elle oblige à relier le choix au diagnostic, au public ou aux contraintes, et c'est exactement ce que le jury cherche à l'oral.

Erreurs fréquentes – Conception et pilotage du projet

- **Confondre objectif et activité** : « organiser six ateliers » est une activité ; l'objectif dit ce qui change chez le public.
- **Oublier le rendement et le conditionnement** dans les quantités, ce qui fausse les courses et le budget.
- **Mélanger budget et trésorerie** : un budget équilibré n'empêche pas un manque d'argent en cours de projet ; les contributions en nature n'entrent pas dans le plan de trésorerie.
- **Calculer un chemin critique sans vérifier les dépendances** : une tâche oubliée peut changer la durée totale du projet.
- **Négliger le temps** : le temps de préparation, de réunion et de saisie est souvent sous-estimé de moitié ; une marge de 15 à 25 % est prudente.
- **Citer des partenaires sans engagement écrit**, ou accepter un partenaire commercial sans analyser le conflit d'intérêts.
- **Utiliser des messages stigmatisants** (« obèses », « mauvaises habitudes ») ou des images de personnes sans accord écrit.
- **Oublier l'hygiène et les allergènes** dans un atelier

culinaire ou un buffet de fin de projet.

- **Ne pas prévoir la suite** : un projet sans relais formé ni scénario de pérennisation s'arrête avec son financement.

8.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concevoir le plan d'action

- **Combiner les stratégies** : éducation + environnement + lien social + participation + plaidoyer + formation de relais.
- **Choisir une action** : cohérence, efficacité (données probantes), adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique.
- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi ; **fiche projet** (F4).
- **Parties prenantes** : matrice pouvoir/intérêt (gérer étroitement, satisfaire, associer, surveiller) ; **RACI** (réalise, approuve, consulté, informé) ; **convention** ; **COPIL** (décide) / comité technique (organise) / comité d'usagers.
- **Financeurs** : ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP), collectivités, CAF, conférence des financeurs (loi du 28 décembre 2015), assurance maladie, mutuelles, fondations ; **appel à projets** : lire le cahier des charges, éligibilité, correspondance aux priorités, dossier complet (Cerfa n° 12156), dépôt avant la date limite, bilan.

À retenir – Planifier, budgéter, piloter

- **Gantt** : tâches × temps, jalons, dépendances. **PERT** : dates au plus tôt (max des fins des antériorités), au plus tard (min des débuts suivants), **marge** = au plus tard − au plus tôt ; **chemin critique** = tâches à marge nulle.
- **Budget** : charges (60, 61-62, 64, 86) = produits (70, 74, 75, 87) ; 86 = 87 ; cofinancement ; quantité × coût unitaire ; coût horaire = coût employeur / heures (151,67 h par mois).
- **Ratios** : part d'un financeur, part du personnel, coût par participant, coût par heure.
- **Écarts** : réalisé − prévu ; écart / prévu × 100 ; expliquer les écarts.
- **Pilotage** : tableau de bord (activité, présence, budget, délais) ; **risques** : criticité = probabilité × gravité ; réunion avec ordre du jour, décisions et relevé d'actions.

À retenir – Compléments : communication, pédagogie, logistique, trésorerie, dossier

- **Plan de communication** (F10) : objectifs, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation ; relais humains souvent plus efficaces que les supports ; coût par contact.
- **Méthodes pédagogiques** : expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative ; choisir selon le type d'objectif ; la « pyramide de l'apprentissage » est un mythe.
- **Logistique** : quantité brute = quantité nette × coefficient / rendement ; check-list avant, jour J, après.
- **Trésorerie** : solde = solde précédent + encaissements − décaissements ; besoin maximal ; acompte, échelonnement.
- **Dossier de financement** : constats chiffrés, politiques, objectifs SMART, actions, participation, évaluation, budget cofinancé, pérennisation.

8.8 Entraînement

8.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une action sur l'environnement alimentaire :

a) mettre l'eau en carafe à la cantine **b)** une conférence sur le sucre **c)** un partenariat avec une épicerie solidaire **d)** un quiz sur les repères

QCM 2 – La méthode QQOQCCP permet :

a) de décrire précisément une action **b)** de calculer un budget **c)** de vérifier qu'aucune dimension n'est oubliée **d)** de prioriser des problèmes

QCM 3 – Dans la matrice pouvoir/intérêt, les familles du public :

a) ont généralement un intérêt fort **b)** sont à associer et tenir informées **c)** sont à surveiller seulement **d)** peuvent siéger dans un comité d'usagers

QCM 4 – Dans une matrice RACI :

a) R = réalise **b)** A = approuve (une seule personne par tâche) **c)** C = contrôle **d)** I = informé

QCM 5 – Le comité de pilotage :

a) décide des orientations **b)** se réunit chaque jour **c)** valide les étapes et le budget **d)** peut inclure des usagers

QCM 6 – Le fonds d'intervention régional :

a) est géré par l'ARS **b)** finance des actions de prévention **c)** est prévu par le Code de la santé publique **d)** est réservé aux hôpitaux

QCM 7 – La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie :

a) concerne les 60 ans et plus **b)** a été créée par la loi du 28 décembre 2015 **c)** finance les crèches **d)** lance des appels à projets départementaux

QCM 8 – Le chemin critique :

a) est la suite de tâches sans marge **b)** détermine la durée minimale du projet **c)** contient les tâches les moins importantes **d)** se calcule avec un réseau PERT

QCM 9 – Si A dure 2 semaines, B 3 semaines (après A) et C 4 semaines (après A), et D (2 semaines) suit B et C, la durée minimale est :

a) 7 semaines **b)** 8 semaines **c)** 11 semaines **d)** 9 semaines

QCM 10 – Un budget prévisionnel associatif :

a) doit être équilibré **b)** présente les contributions en nature aux comptes 86 et 87 **c)** peut être financé à 100 % par un seul financeur sans difficulté **d)** distingue charges et produits

QCM 11 – Les charges de personnel figurent au compte :

a) 60 **b)** 62 **c)** 64 **d)** 74

QCM 12 – Une subvention de l'ARS figure au compte :

a) 70 **b)** 74 **c)** 86 **d)** 87

QCM 13 – Un poste prévu à 400 € et réalisé à 460 € présente un écart de :

a) + 60 € **b)** + 15 % **c)** + 13 % **d)** − 60 €

QCM 14 – Dans une matrice des risques, la criticité :

a) = probabilité × gravité **b)** = probabilité + gravité **c)** permet de hiérarchiser les risques **d)** dispense de traiter les risques graves peu probables

QCM 15 – Le compte rendu d'une réunion de pilotage contient :

a) les présents et excusés **b)** les décisions prises **c)** le relevé des actions (qui, quoi, quand) **d)** la retranscription mot à mot des échanges

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. **a, c**. 2. **a, c**. 3. **a, b, d**. 4. **a, b, d**. 5. **a, c, d**. 6. **a, b, c**. 7. **a, b, d**. 8. **a, b, d**. 9. **b** (A 2 + max(B 3 ; C 4) + D 2 = 2 + 4 + 2 = 8). 10. **a, b, d**. 11. **c**. 12. **b**. 13. **a, b** (60 / 400 × 100 = 15 %). 14. **a, c**. 15. **a, b, c**.

QCM 16 – Un plan de communication précise :

a) les cibles **b)** les messages **c)** les canaux et le calendrier **d)** les valeurs nutritionnelles des recettes

QCM 17 – Pour obtenir 900 g de carottes épluchées avec un rendement de 85 %, il faut acheter environ :

a) 765 g **b)** 900 g **c)** 1 059 g **d)** 1 500 g

QCM 18 – Un problème de trésorerie peut survenir :

a) même si le budget est équilibré **b)** quand les subventions sont versées après les dépenses **c)** uniquement si le budget est déficitaire **d)** quand le solde mensuel devient négatif

QCM 19 – Une méthode démonstrative :

a) consiste à montrer un geste puis à le faire reproduire **b)** convient aux savoir-faire **c)** se limite à un exposé **d)** peut être utilisée pour la cuisson des légumes secs

QCM 20 – Les bénévoles d'un projet :

a) sont valorisés aux comptes 86 et 87 **b)** sont rémunérés **c)** ont besoin d'une mission claire et d'une reconnaissance **d)** ne sont pas concernés par les règles d'hygiène

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. **a, b, c**. 17. **c** (900 / 0,85). 18. **a, b, d**. 19. **a, b, d**. 20. **a, c**.

8.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : la matrice pouvoir/intérêt

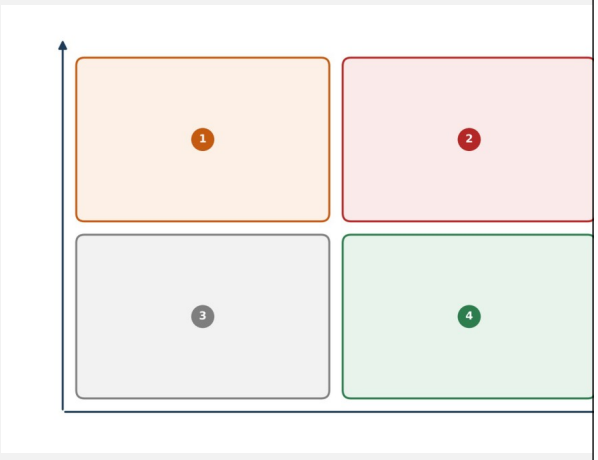


Figure 8.6 – Schéma à légender

Nommez les quadrants 1 à 4 (stratégie à adopter) et placez : a) le maire adjoint à la santé ; b) les parents d'élèves ; c) l'ARS ; d) la boulangerie du quartier ; e) la directrice de l'école partenaire.

Corrigé

1. Satisfaire (pouvoir fort, intérêt faible) : a) le maire adjoint (s'il ne suit pas le projet de près). 2. **Gérer étroitement** : c) l'ARS (financeur) ; e) la directrice de l'école (si l'action s'y déroule). 3. **Surveiller** : d) la boulangerie. 4. **Associer, tenir informés** : b) les parents. Le placement peut varier selon le contexte : il se justifie.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la matrice des risques

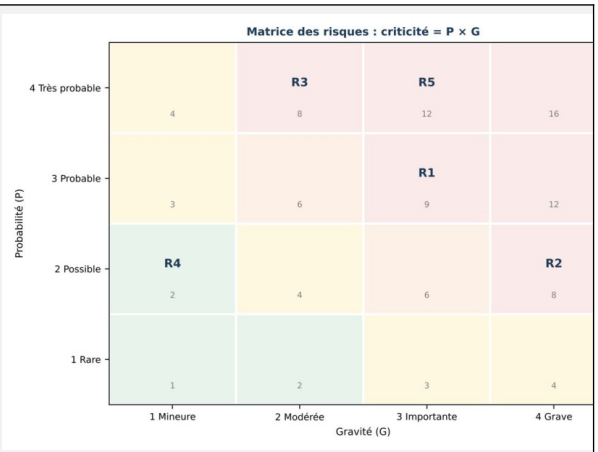


Figure 8.7 – Schéma à légender

Identifiez les risques R1 à R5 placés sur la matrice (probabilité, gravité), calculez leur criticité et classez-les.

Corrigé

R1 (P 3, G 3) = **9** ; R2 (P 2, G 4) = **8** ; R3 (P 4, G 2) = **8** ; R4 (P 2, G 1) = **2** ; R5 (P 4, G 3) = **12**. Classement : R5 > R1 > R2 = R3 > R4. R2 (allergie), grave, est traité en priorité malgré sa probabilité moyenne.

À vous de jouer – Exercice 3 – Réseau PERT

Un projet comprend : A recrutement des participants (2 sem.) ; B formation des animateurs (3 sem.) ; C préparation des supports (2 sem., après B) ; D atelier pilote (1 sem., après A et C) ; E ajustements (1 sem., après D) ; F cycle d'ateliers (8 sem., après E). Calculez les dates au plus tôt, la durée minimale, le chemin critique et la marge de A.

Corrigé

A : 0 → 2. B : 0 → 3. C : 3 → 5. D : début max(2 ; 5) = 5 → 6. E : 6 → 7. F : 7 → **15**. Durée minimale : **15 semaines**. Chemin critique : **B → C → D → E → F** (3 + 2 + 1 + 1 + 8 = 15). A : au plus tard, doit finir à 5 (début de D), donc commencer à 3 ; marge = 3 – 0 = **3 semaines**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Construire un budget prévisionnel

Construisez le budget équilibré d'un cycle de 8 ateliers pour 10 seniors : denrées 2,50 € par personne et par atelier ; diététicienne 8 ateliers × 3 h à 40 €/h ; supports 120 € ; assurance 60 € ; salle prêtée par la mairie (valorisée 25 € par atelier) ; bénévolat 16 h à 12 €/h. Produits : conférence des financeurs 1 200 € ; caisse de retraite 400 € ; participation 1 € par personne et par atelier.

Corrigé

Charges : denrées 2,50 × 10 × 8 = **200 €** ; diététicienne 8 × 3 × 40 = **960 €** ; supports **120 €** ; assurance **60 €** ; salle (86) 25 × 8 = **200 €** ; bénévolat (86) 16 × 12 = **192 €** ; total = 200 + 960 + 120 + 60 + 200 + 192 = **1 732 €**. **Produits** : conférence des financeurs **1 200 €** ; caisse de retraite **400 €** ; participation 1 × 10 × 8 = **80 €** ; contributions en nature (87) 200 + 192 = **392 €** ; sous-total = 1 200 + 400 + 80 + 392 = 2 072 €. **Constat** : les produits dépassent les charges de 2 072 – 1 732 = **340 €** : le budget n'est pas équilibré. Il faut **réduire la demande** à la conférence des financeurs à 1 200 – 340 = **860 €** (ou ajouter des charges justifiées, par exemple du temps de coordination). Budget équilibré : 1 732 € = 860 + 400 + 80 + 392.

À vous de jouer – Exercice 5 – Calculer un coût horaire

Une animatrice est payée 1 900 € bruts par mois ; la structure indique un taux de charges patronales de 40 %. Calculez son coût horaire et le coût de 25 h consacrées au projet.

Corrigé

Coût employeur : 1 900 × 1,40 = **2 660 €** ; heures mensuelles : 151,67 ; coût horaire : 2 660 / 151,67 = **17,54 €** ; 25 h : 25 × 17,54 = **438,50 €**.

À vous de jouer – Exercice 6 – Analyser des écarts

Prévu / réalisé : denrées 300 / 342 ; impression 150 / 120 ; intervenant 800 / 800 ; déplacements 100 / 64. Calculez les écarts en euros et en pourcentage, le total, et commentez.

Corrigé

Denrées : + 42 € ; 42 / 300 × 100 = **+ 14,0 %**. Impression : – 30 € ; – 30 / 150 × 100 = **– 20,0 %**. Intervenant : **0**. Déplacements : – 36 € ; – 36 / 100 × 100 = **– 36,0 %**. Total prévu : 300 + 150 + 800 + 100 = **1 350 €** ; réalisé : 342 + 120 + 800 + 64 = **1 326 €** ; écart : – 24 €, soit – 24 / 1 350 × 100 = **– 1,8 %**. Commentaire : budget respecté globalement ; hausse des denrées (prix, participants supplémentaires ?) compensée par les économies d'impression et de déplacements ; écarts à expliquer dans le compte rendu financier.

À vous de jouer – Exercice 7 – Lire un cahier des charges

Extrait d'un appel à projets ARS : « Publics prioritaires : enfants de 0 à 6 ans et leurs parents résidant en QPV ; actions de plus de 3 séances ; cofinancement obligatoire ; montant maximal 5 000 € et 70 % du coût total ; exclus : actions ponctuelles, achat de matériel au-delà de 10 % du budget. » Un projet de 6 ateliers pour des parents d'enfants de 3 à 10 ans d'un QPV coûte 4 800 €, dont 700 € de matériel. Vérifiez l'éligibilité et calculez le montant maximal sollicitable.

Corrigé

Public : enfants de 3 à 10 ans → **partiellement** hors cible (0-6 ans) : recentrer sur les parents d'enfants de 3 à 6 ans ou justifier. Nombre de séances : 6 > 3 . Matériel : 700 / 4 800 × 100 = **14,6 %** > 10 % → **non conforme** : ramener le matériel à 480 € au plus (10 % × 4 800). Montant maximal : 70 % × 4 800 = **3 360 €** (< 5 000 €) ; cofinancement minimal : 4 800 – 3 360 = **1 440 €**.

À vous de jouer – Exercice 8 – Rédiger une fiche action avec le QQOQCCP

Rédigez la fiche action d'une visite accompagnée du marché pour 10 familles.

Corrigé

Quoi : visite accompagnée du marché, repérage des produits de saison et des prix. **Qui** : 10 familles inscrites ; diététicienne et référente ; placier du marché informé. **Où** : marché du centre-ville (2,5 km), trajet en bus. **Quand** : samedi 25 mars, 9 h 30 – 11 h 30. **Comment** : jeu de piste « 5 légumes de saison à moins de 2 €/kg », relevé de prix, achat collectif avec 15 € pour l'atelier suivant, retour avec recettes. **Combien** : 2 animatrices × 4 h ; tickets de bus 10 × 2 × 1,60 € = 32 € ; 15 € de denrées. **Pourquoi** : objectif spécifique 3 (connaître et utiliser l'offre à petit prix).

À vous de jouer – Exercice 9 – Matrice RACI

Construisez la matrice RACI de la préparation d'un atelier (achats, fiche technique, communication, accueil, évaluation) pour : diététicienne, animatrice, étudiante, directrice.

Corrigé

Achats : étudiante R, animatrice C, directrice A, diététicienne I. Fiche technique : étudiante R, diététicienne A (validation technique), animatrice C. Communication : animatrice R, étudiante C, directrice A. Accueil : animatrice R, étudiante R, directrice A (une seule personne A). Évaluation : étudiante R, diététicienne C, directrice A, animatrice I.

À vous de jouer – Exercice 10 – Tableau de bord

À mi-parcours d'un projet de 10 ateliers pour 15 personnes : 5 ateliers réalisés, 58 présences, 2 300 € dépensés sur 5 200 €. Calculez les indicateurs et commentez.

Corrigé

Ateliers : 5 / 10 = **50 %** (conforme au temps écoulé). Présences : 58 / (5 × 15) = 58 / 75 × 100 = **77,3 %** (légèrement sous l'objectif usuel de 80 % : relancer, analyser les absences). Budget : 2 300 / 5 200 × 100 = **44,2 %** (légère sous-consommation, à surveiller : dépenses à venir ? économies ?).

8.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi les financeurs exigent-ils un cofinancement ?

Corrigé

Pour partager le risque, vérifier l'ancrage local du projet (d'autres acteurs y croient), éviter la dépendance à un seul financeur, favoriser la pérennisation et multiplier les projets financés avec une enveloppe limitée.

À vous de jouer – Question 2

Un projet très bien planifié peut-il échouer ?

Corrigé

Oui, si le diagnostic était erroné, si le public n'a pas été associé, si les partenaires ne s'engagent pas, si un risque n'a pas été anticipé ou si le plan est appliqué sans écoute des participants. Le pilotage (suivi, ajustements) et la participation sont aussi importants que la planification.

À vous de jouer – Question 3

Faut-il valoriser le bénévolat dans le budget ?

Corrigé

Oui : il montre la contribution réelle des acteurs (habitants, bénévoles), donne une image juste du coût du projet et renforce le dossier (ancrage local) ; il s'inscrit aux comptes 86 et 87, pour le même montant, sans effet sur la trésorerie.

8.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le projet « Petit-déjeuner pour tous » d'un collège en REP

Un collège de réseau d'éducation prioritaire (480 élèves) veut proposer un petit-déjeuner éducatif deux matins par semaine pendant 24 semaines pour les élèves de 6e (120 élèves, participation estimée à 60 %), avec 6 ateliers parents. Ressources : agents de restauration (3 h par matin à 20 €/h), infirmière (temps institutionnel non valorisé), diététicienne (6 ateliers × 2 h + 10 h de préparation à 40 €/h). Coût des denrées : 0,80 € par petit-déjeuner. Supports : 300 €.

1. Identifiez les parties prenantes et placez-les sur la matrice pouvoir/intérêt.
2. Calculez le nombre de petits-déjeuners servis et le budget prévisionnel des charges.
3. Proposez un plan de financement équilibré (au moins 3 financeurs) et calculez la part de chacun.
4. Construisez le Gantt simplifié (préparation, lancement, ateliers parents, évaluation).
5. Identifiez trois risques, évaluez leur criticité et proposez des mesures.

Corrigé

1. Gérer étroitement : principal, infirmière, gestionnaire, ARS ou collectivité financeuse. Satisfaire : département (propriétaire du collège, restauration), rectorat. Associer : élèves (délégués), parents, agents de restauration. Surveiller : fournisseurs.
2. Élèves participants : 120 × 0,60 = **72** ; matins : 2 × 24 = **48** ; petits-déjeuners : 72 × 48 = **3 456**. Denrées : 3 456 × 0,80 = **2 764,80 €**. Agents : 48 × 3 × 20 = **2 880 €**. Diététicienne : (6 × 2 + 10) × 40 = 22 × 40 = **880 €**. Supports : **300 €**. Total charges : 2 764,80 + 2 880 + 880 + 300 = **6 824,80 €**.
3. Exemple : département 2 880 € (temps des agents : 42,2 %) ; ARS (FIR) 2 500 € (36,6 %) ; programme national de petits-déjeuners à l'école, ou commune, 1 144,80 € (16,8 %) ; collège (fonds propres) 300 € (4,4 %) ; total 6 824,80 € . Calculs : 2 880 / 6 824,80 = 42,2 % ; 2 500 / 6 824,80 = 36,6 % ; 1 144,80 / 6 824,80 = 16,8 % ; 300 / 6 824,80 = 4,4 %.
4. Mai-juin : diagnostic et conventions ; septembre : achats, information des familles, formation des agents ; octobre à avril : petits-déjeuners (24 semaines hors vacances) ; ateliers parents en novembre, janvier, février, mars, avril, mai ; mai-juin : évaluation et bilan au COPIL.
5. Faible participation des élèves (P 3, G 3 = 9 : horaires de bus, communication par les délégués) ; allergies (P 2, G 4 = 8 : PAI, liste des allergènes) ; absence d'agents (P 2, G 3 = 6 : planning de remplacement).

8.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous choisi vos partenaires ? »

Corrigé

À partir du diagnostic (ressources du territoire) et de la matrice pouvoir/intérêt ; j'ai retenu ceux dont la mission rejoignait nos objectifs (l'épicerie pour l'accès aux légumes secs) et formalisé leur engagement dans une convention.

Mise en situation – MSE 2

La date limite de l'appel à projets est dans 5 jours et le budget n'est pas équilibré.

Corrigé

J'identifie l'écart, j'ajuste le montant sollicité ou l'autofinancement avec la direction, je vérifie que chaque ligne est justifiée, je fais relire et je dépose au moins un jour avant la date limite.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Qu'est-ce que le chemin critique ? »

Corrigé

C'est la suite des tâches sans marge qui détermine la durée minimale du projet ; tout retard sur l'une d'elles retarde l'ensemble. Dans mon projet, c'était le dépôt du dossier, la préparation des ateliers et le cycle d'ateliers.

Mise en situation – MSE 4

Un partenaire ne vient plus aux réunions.

Corrigé

Je le contacte pour comprendre (disponibilité, intérêt), je lui propose une forme de participation plus légère (point téléphonique, compte rendu), je lui montre ce que le projet lui apporte ; si besoin, j'ajuste la convention.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Pourquoi avez-vous valorisé le bénévolat ? »

Corrigé

Pour montrer la contribution réelle des mamans relais et le coût complet du projet ; elle figure aux comptes 86 et 87 pour le même montant, sans effet sur la trésorerie.

Mise en situation – MSE 6

Le financeur vous demande pourquoi vous avez dépensé 12 % de plus en denrées.

Corrigé

J'explique la cause (hausse des prix des fruits), je montre la compensation par d'autres postes et l'écart global de 2,3 %, avec le tableau prévu/réalisé.

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Quelle différence entre le COPIL et le comité technique ? »

Corrigé

Le COPIL décide (orientations, validation, budget) et se réunit peu ; le comité technique organise et met en œuvre, avec des réunions fréquentes.

Mise en situation – MSE 8

Une animatrice tombe malade la veille d'un atelier.

Corrigé

J'applique le plan prévu : binôme de remplacement qui dispose du conducteur et de la fiche technique ; sinon, je réduis l'atelier à un format réalisable en sécurité ou je reporte en prévenant les familles.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Qui a financé votre projet ? »

Corrigé

L'ARS (FIR) pour 42,7 %, la commune, la CAF, la participation des familles, l'autofinancement du centre social et des contributions en nature ; 71,2 % de financements publics.

Mise en situation – MSE 10

Le jury : « Votre projet est-il pérenne ? »

Corrigé

Des relais ont été formés (référente, mamans relais), les conducteurs et le livret sont réutilisables, l'action est inscrite au projet du centre social et une nouvelle demande est prévue dans le cadre du CLS.

Mise en situation – MSE 11

Une entreprise propose de financer tout le projet.

Corrigé

J'analyse le conflit d'intérêts (chapitre 6) et je préfère un cofinancement diversifié ; si le mécénat est accepté, c'est sans contrepartie sur le contenu, avec une convention et une mention transparente.

Mise en situation – MSE 12

Le jury : « Comment avez-vous suivi votre projet ? »

Corrigé

Avec un tableau de bord hebdomadaire (ateliers réalisés, présences, budget consommé, supports), une matrice des risques et trois réunions du COPIL avec comptes rendus et relevés d'actions.

8.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Schéma à légender : le plan de communication




Figure 8.10 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 6, puis complétez-les pour un atelier « goûters » destiné aux parents d'une école.

Corrigé

1. Objectifs : 15 inscriptions. 2. **Cibles** : parents de l'école, enseignants (relais). 3. **Messages** : « Des goûters maison, bons et pas chers : venez les préparer avec nous ». 4. **Canaux** : cahier de liaison, affichage à l'entrée, mot des enseignants, parents relais. 5. **Calendrier** : 3 semaines avant, rappel la veille. 6. **Budget et évaluation** : impression 20 € ; inscriptions par canal.

À vous de jouer – Exercice 12 – Efficacité des canaux

Origine de 40 inscriptions : réseaux sociaux de la mairie 6 ; affiche en pharmacie 3 ; médecins et infirmières 9 ; associations de quartier 15 ; bouche-à-oreille 7. Calculez les parts et le coût par inscription de la campagne d'affichage (12 affiches, 54 € d'impression) et des réseaux sociaux (publication sponsorisée : 60 €).

Corrigé

Vérification : 6 + 3 + 9 + 15 + 7 = **40**. Parts : réseaux **15 %** ; affiches **7,5 %** ; soignants **22,5 %** ; associations **37,5 %** ; bouche-à-oreille **17,5 %**. Coût par inscription : affiches 54 / 3 = **18 €** ; réseaux 60 / 6 = **10 €**. Les relais humains (associations, soignants, bouche-à-oreille) apportent 31 / 40 = **77,5 %** des inscriptions.

À vous de jouer – Exercice 13 – Quantités brutes

Pour 30 portions d'une soupe (recette pour 6 : 600 g de potiron épluché, 200 g de pommes de terre épluchées, 100 g d'oignon épluché), calculez les quantités brutes (rendements : potiron 70 %, pommes de terre 80 %, oignon 90 %) et le coût (potiron 1,80 €/kg ; pommes de terre 1,30 €/kg ; oignons 1,60 €/kg).

Corrigé

Coefficient : 30 / 6 = **5**. Potiron : 600 × 5 / 0,70 = 3 000 / 0,70 = **4 286 g** ; pommes de terre : 200 × 5 / 0,80 = 1 000 / 0,80 = **1 250 g** ; oignon : 100 × 5 / 0,90 = 500 / 0,90 = **556 g**. Coût : 4,286 × 1,80 = **7,71 €** ; 1,25 × 1,30 = **1,63** € ; 0,556 × 1,60 = **0,89 €** ; total **10,23 €**, soit 10,23 / 30 = **0,34 €** la portion (hors bouillon et épices).

À vous de jouer – Exercice 14 – Plan de trésorerie

Un projet : trésorerie de départ 300 € ; dépenses : sept. 400, oct. 600, nov. 600, déc. 300 ; recettes : oct. 500 (commune), janv. 1 500 (fondation). Calculez les soldes de fin de mois de septembre à janvier et le besoin maximal.

Corrigé

Sept. : 300 − 400 = **− 100** ; oct. : − 100 + 500 − 600 = **− 200** ; nov. : − 200 − 600 = **− 800** ; déc. : − 800 − 300 = **− 1 100** ; janv. : − 1 100 + 1 500 = **400**. Besoin maximal : **1 100 €** fin décembre ; solutions : acompte de la fondation, décalage des achats, trésorerie de la structure.

À vous de jouer – Exercice 15 – Choisir des méthodes

Pour chaque objectif, proposez une méthode et un outil : a) citer 3 sources de protéines végétales ; b) savoir cuire des pois chiches secs ; c) oser goûter un légume inconnu ; d) analyser une publicité pour des céréales.

Corrigé

a) Méthode interrogative : jeu de cartes-aliments à classer. b) Démonstrative puis active : trempage et cuisson en atelier, fiche en photos. c) Active, sans pression : dégustation à l'aveugle, vocabulaire sensoriel, modèle de l'animateur qui goûte. d) Active et coopérative : analyse en groupes avec une grille (biais, cibles, allégations), restitution.

À vous de jouer – Exercice 16 – Analyser un dossier de financement

Un dossier contient : « Les enfants mangent mal. Nous voulons sensibiliser les familles. Budget : 5 000 € demandés à l'ARS. » Listez 6 faiblesses et proposez une réécriture du premier paragraphe.

Corrigé

Faiblesses : constat sans donnée ni source ; jugement stigmatisant ; objectif non SMART (« sensibiliser ») ; pas d'actions décrites ; pas d'évaluation ; budget non détaillé et financé à 100 % par un seul financeur ; pas de partenaires ni de pérennisation. Réécriture : « Dans les deux écoles du quartier X (420 élèves), 13 % des enfants de grande section sont en surpoids contre 8 % dans le département (santé scolaire, 2026) ; 46 % des parents interrogés (n = 62) déclarent que leurs enfants boivent une boisson sucrée chaque jour. »

8.9 Glossaire

Terme · Définition

Appel à projets — *Définition :* Procédure par laquelle un financeur sélectionne des projets selon un cahier des charges

Autofinancement — *Définition :* Part du budget financée par les fonds propres du porteur

Cahier des charges — *Définition :* Document fixant priorités, publics, critères, montants et calendrier d'un appel à projets

Chemin critique — *Définition :* Suite des tâches sans marge déterminant la durée minimale du projet

Cofinancement — *Définition :* Financement d'un projet par plusieurs financeurs

Comité de pilotage (COPIL) — *Définition :* Instance de décision d'un projet

Contributions volontaires en nature — *Définition :* Bénévolat, prêts de locaux, dons valorisés (comptes 86 et 87)

Convention de partenariat — *Définition :* Document écrit fixant les engagements des partenaires

Criticité — *Définition :* Produit de la probabilité et de la gravité d'un risque

Diagramme de Gantt — *Définition :* Représentation des tâches sur une échelle de temps

FIR — *Définition :* Fonds d'intervention régional géré par l'ARS (art. L. 1435-8 CSP)

Jalon — *Définition :* Date clé d'un projet (dépôt, lancement, comité)

Marge — *Définition :* Retard possible d'une tâche sans retarder le projet

Matrice pouvoir/intérêt — *Définition :* Outil de classement des parties prenantes

Partie prenante — *Définition :* Acteur concerné par le projet ou pouvant l'influencer

PERT — *Définition :* Réseau des tâches et de leurs antériorités

Pilotage — *Définition :* Suivi, anticipation, décision et compte rendu tout au long du projet

QQOQCCP — *Définition :* Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi

RACI — *Définition :* Réalise, approuve, consulté, informé

Tableau de bord — *Définition :* Ensemble d'indicateurs de suivi mis à jour régulièrement

Acompte — *Définition :* Versement partiel d'une subvention avant la fin de l'action

Coût par contact — *Définition :* Coût d'un support de communication rapporté au nombre de contacts obtenus

Méthode démonstrative — *Définition :* Méthode pédagogique où l'on montre un geste avant de le faire reproduire

Plan de communication — *Définition :* Organisation des objectifs, cibles, messages, canaux, calendrier et budget de la communication

Plan de trésorerie — *Définition :* Prévision mois par mois des encaissements, décaissements et du solde

Rendement (culinaire) — *Définition :* Part comestible d'un produit après épluchage, parage ou cuisson

SROI — *Définition :* Retour social sur investissement : valeur sociale créée rapportée à l'investissement

8.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références
Stratégies, données probantes — *Références :* [1] Charte d'Ottawa ; [2] Santé publique France, interventions probantes
Partenariat, parties prenantes — *Références :* [3] Mendelow ; [4] Callon
Financements — *Références :* [5] CSP L. 1435-8 ; [6] loi du 28 décembre 2015 ; [7] Cerfa 12156 ; [8] Le Compte Asso
Planification — *Références :* [9] Gantt ; [10] PERT (US Navy)
Budget — *Références :* [11] Plan comptable associatif (règlement ANC 2018-06)
Démarche qualité — *Références :* [12] INPES guide d'autoévaluation ; [13] Deming

8.12 Bibliographie numérotée

1. OMS. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*. 1986.

2. Santé publique France. *Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé*, *santepubliquefrance.fr*.

3. Mendelow A. « Stakeholder mapping ». *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*, Cambridge (MA), 1991.

4. Callon M. « Éléments pour une sociologie de la traduction ». *L'Année sociologique*, 1986, 36, p. 169-208.

5. Code de la santé publique, article L. 1435-8 (fonds d'intervention régional).

6. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

7. Formulaire Cerfa n° 12156 « Demande de subvention(s) » des associations, *service-public.fr*.

8. Le Compte Asso, *lecompteasso.associations.gouv.fr*.

9. Gantt H. L. *Work, Wages and Profits*. New York, 1910.

10. Malcolm D. G. et coll. « Application of a technique for research and development program evaluation » (PERT). *Operations Research*, 1959, 7 (5), p. 646-669.

11. Autorité des normes comptables. Règlement n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

12. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ?* 2009.

13. Deming W. E. *Out of the Crisis*. MIT Press, 1986.

14. Santé publique France. *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. 2018.

15. Masters K. « Edgar Dale's Pyramid of Learning in medical education: a literature review ». *Medical Teacher*, 2013, 35 (11), e1584-e1593.

16. Social Value International. *A Guide to Social Return on Investment*. 2012.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 8.2.2)

17. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.
