Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 8



Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 8

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 8

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action, pilotage, appels à projets et parties prenantes

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 8

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Démarche de projet (2); Stratégies; Partenaires; Financements; Calendrier; Budget; Pilotage

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ; décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ; identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ; connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ; planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ; construire un budget prévisionnel équilibré, calculer des coûts et des ratios, suivre le budget réalisé.

Contenu. 1. Les définitions à savoir ; 2. Les outils ; 3. Les formules ; 4. Les financeurs ; 5. Les pièges ; 6. Auto-test ; 7. Flashcards ; Compléments du chapitre enrichi ; O8.1 – Fiche action QQOQCCP ; O8.2 – Cartographie des parties prenantes.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Project cycle (2): design, action plan, management, calls for proposals and stakeholders. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ choisir des stratégies et des actions cohérentes avec les objectifs, en combinant éducation, action sur l'environnement et participation ;

■ décrire une action avec la méthode QQOQCCP et la formaliser dans une fiche projet ;

■ identifier et analyser les parties prenantes (cartographie, matrice pouvoir/intérêt, matrice RACI) et construire un partenariat (convention, comité de pilotage) ;

■ connaître les principaux financeurs (ARS et fonds d'intervention régional, collectivités, CAF, conférence des financeurs, fondations, mutuelles) et répondre à un appel à projets ;

■ planifier un projet (diagramme de Gantt, réseau PERT, chemin critique, jalons) ;


Sommaire

Fiche de révision du chapitre 8 4
1. Les définitions à savoir 4
2. Les outils 4
3. Les formules 4
4. Les financeurs 5
5. Les pièges 5
6. Auto-test 5
7. Flashcards 5
Compléments du chapitre enrichi 5

Fiches-outils du chapitre 8 5
O8.1 – Fiche action QQOQCCP 5
O8.2 – Cartographie des parties prenantes 5
O8.3 – Matrice RACI 5
O8.4 – Analyse d'un cahier des charges 5
O8.5 – Calcul PERT 6
O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé 6
O8.7 – Registre des risques 6
O8.8 – Compte rendu de réunion 6

Fiche de révision du chapitre 8

Démarche de projet (2) : plan d'action, partenaires, financements, pilotage

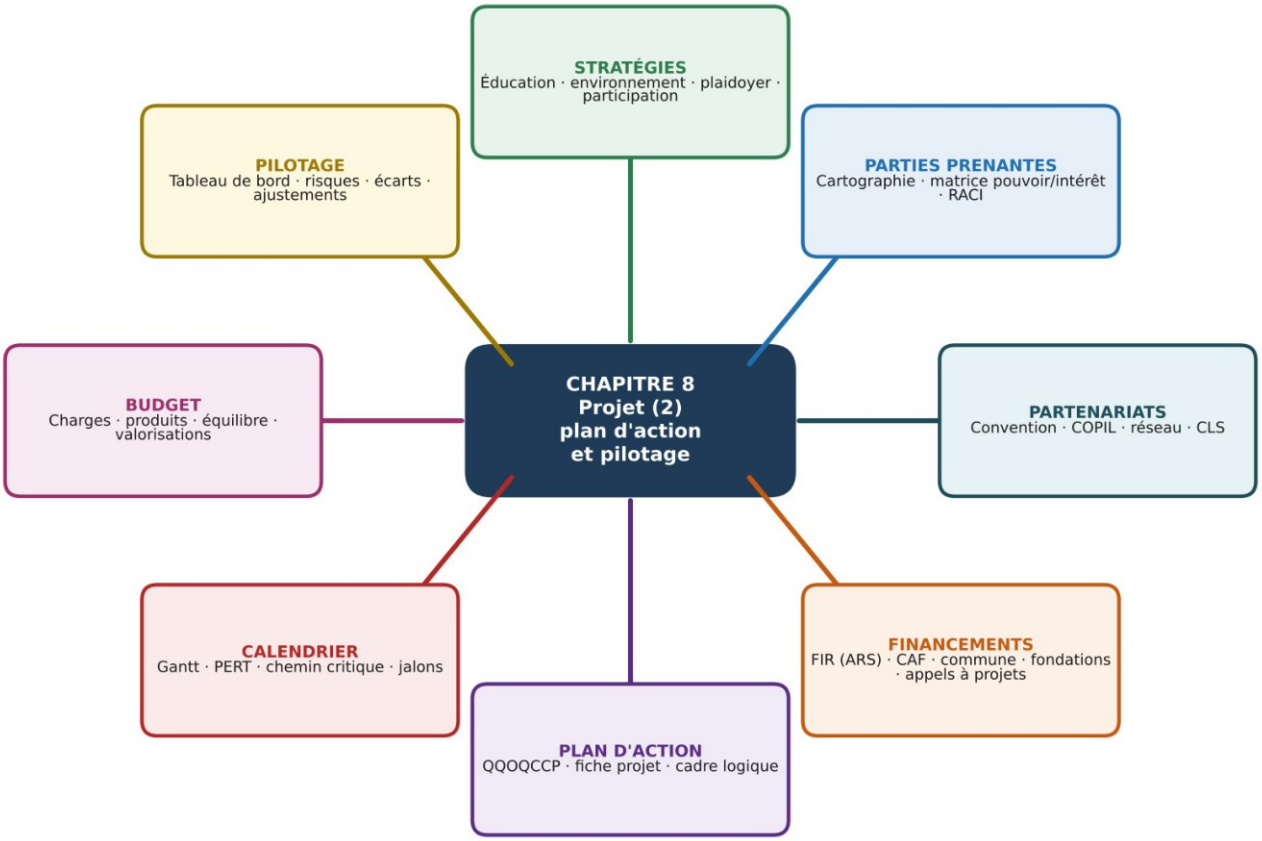

Carte mentale du chapitre 8

1. Les définitions à savoir

Notion · Définition
Partie prenante / partenaire — *Définition :* Acteur concerné ou influent / acteur qui s'engage avec des ressources
COPIL / comité technique — *Définition :* Décide / organise et met en œuvre
Appel à projets — *Définition :* Sélection de projets selon un cahier des charges
Chemin critique — *Définition :* Tâches à marge nulle ; fixe la durée minimale
Marge — *Définition :* Date au plus tard − date au plus tôt
Criticité — *Définition :* Probabilité × gravité
Contributions en nature — *Définition :* Comptes 86 (charges) = 87 (produits)

2. Les outils

- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi.
- **Matrice pouvoir/intérêt** : gérer étroitement · satisfaire · associer · surveiller.
- **RACI** : réalise · approuve (un seul) · consulté · informé.
- **Gantt** (tâches × temps, jalons) et **PERT** (antériorités, chemin critique).
- **Budget** : charges 60, 61-62, 64, 86 / produits 70, 74, 75, 87 ; équilibre ; cofinancement.
- **Tableau de bord** : ateliers, présences, budget consommé, délais.
- **Matrice des risques** : P × G de 1 à 16.

3. Les formules

Calcul · Formule et exemple
Ligne de budget — *Formule et exemple :* quantité × coût unitaire : 40 h × 38 € = 1 520 €
Coût horaire — *Formule et exemple :* coût employeur / 151,67 h : 2 840 / 151,67 = 18,73 €
Autofinancement — *Formule et exemple :* charges − autres produits : 3 510 − 3 094 = 416 €
Part d'un financeur — *Formule et exemple :* montant / total × 100 : 1 500 / 3 510 = 42,7 %
Écart budgétaire — *Formule et exemple :* (réalisé − prévu) / prévu × 100 : 26,40 / 210 = + 12,6 %
Date au plus tôt — *Formule et exemple :* max des fins des antériorités
Taux de présence — *Formule et exemple :* présences / (séances × inscrits) : 31 / 36 = 86,1 %

4. Les financeurs

ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP) · collectivités (CLS, contrat de ville, PAT) · CAF · conférence des financeurs (60 ans et plus, loi du 28/12/2015) · assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite · fondations (vigilance conflits d'intérêts).

5. Les pièges

> **Attention**
>
> - Budget non équilibré ou 86 ≠ 87.
> - Un seul financeur à 100 %.
> - Plusieurs personnes « A » dans la RACI.
> - Oublier les contraintes du calendrier (vacances, Ramadan, stage).
> - Ne pas expliquer les écarts budgétaires.
> - Déposer le dossier le dernier jour.

6. Auto-test

1. Que signifie QQOQCCP ? 2. Article du FIR ? 3. Public de la conférence des financeurs ? 4. Formule de la criticité ? 5. Comment calcule-t-on une date au plus tôt ? 6. Compte des subventions ? 7. Compte du personnel ? 8. Coût horaire de 2 660 € par mois ? 9. Rôle du COPIL ? 10. Que contient un compte rendu ?

Réponses : 1. Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi – 2. L. 1435-8 CSP – 3. 60 ans et plus – 4. Probabilité × gravité – 5. Maximum des fins des tâches antérieures – 6. 74 – 7. 64 – 8. 2 660 / 151,67 = 17,54 € – 9. Décider – 10. Présents, décisions, relevé d'actions.

7. Flashcards

Recto : Cadre logique ? · Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses

Recto : Cerfa des subventions ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : n° 12156 (ou plateforme Le Compte Asso)

Recto : CPOM ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

Recto : PDCA ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : Planifier, faire, vérifier, agir (Deming)

Recto : Coût par résultat ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : 3 510 / 9 familles = 390 € (efficience)

Recto : Pérennisation ? — *Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses :* Verso : Relais formés, outils réutilisables, financements pluriannuels

Compléments du chapitre enrichi

Notion · À retenir

Plan de communication — *À retenir :* Objectifs, cibles, messages, canaux, calendrier, budget, évaluation ; relais humains ; coût par contact

Méthodes — *À retenir :* Expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative ; selon le type d'objectif ; « pyramide de l'apprentissage » = mythe

Logistique — *À retenir :* Brut = net × coefficient / rendement (carottes 85 %, pommes de terre 80 %) ; check-list avant / J / après

Trésorerie — *À retenir :* Solde = précédent + encaissements − décaissements ; besoin maximal ; acompte

Dossier de financement — *À retenir :* Constats chiffrés, politiques, objectifs SMART, actions, participation, évaluation, budget cofinancé, pérennisation

Bénévoles — *À retenir :* Mission, formation, reconnaissance ; comptes 86/87

Fiches-outils du chapitre 8

Outil · Intitulé · Utilité

O8.1 — *Intitulé :* Fiche action QQOQCCP ; *Utilité :* Décrire chaque action du plan

O8.2 — *Intitulé :* Cartographie des parties prenantes ; *Utilité :* Matrice pouvoir/intérêt et stratégie

O8.3 — *Intitulé :* Matrice RACI ; *Utilité :* Répartir les rôles

O8.4 — *Intitulé :* Analyse d'un cahier des charges ; *Utilité :* Vérifier l'éligibilité avant de répondre

O8.5 — *Intitulé :* Calcul PERT ; *Utilité :* Dates, marges, chemin critique

O8.6 — *Intitulé :* Suivi budgétaire prévu / réalisé ; *Utilité :* Analyser les écarts

O8.7 — *Intitulé :* Registre des risques ; *Utilité :* Anticiper et réduire les risques

O8.8 — *Intitulé :* Compte rendu de réunion ; *Utilité :* Décisions et relevé d'actions

O8.1 – Fiche action QQOQCCP

Question	Réponse
Quoi ?	
Qui ? (public, animateurs,	
partenaires)	
Où ?	
Quand ?	
Comment ? (méthodes,	
outils)	
Combien ? (moyens, coût)	
Pourquoi ? (objectif visé)	

O8.2 – Cartographie des parties prenantes

O8.3 – Matrice RACI

Inscrire les acteurs en en-tête ; R = réalise, A = approuve (un seul par tâche), C = consulté, I = informé.

O8.4 – Analyse d'un cahier des charges

Critère	Exigence de l'appel à projets	Mon projet conforme ?
Financeur, intitulé, date limite		

Critère	Exigence de l'appel à projets	Mon projet conforme ?
Publics et territoires prioritaires		
Actions éligibles / exclues		
Montant maximal, taux maximal		
Cofinancement exigé		
Durée, calendrier		
Évaluation demandée		
Pièces à joindre		
Critères de sélection		

O8.5 – Calcul PERT

Début au plus tôt = max des fins des antériorités ; fin au plus tard = min des débuts au plus tard des tâches suivantes ; marge = fin tard − fin tôt ; chemin critique = marges nulles.

O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé

Poste	Prévu (€)	Réalisé (€)	Écart (€ et %)	Explication
Total				

O8.7 – Registre des risques

O8.8 – Compte rendu de réunion

Réunion : **.....** ***Date :*** **.....** ***Lieu :*** **.....**
Présents : **.....**
Excusés : **.....**

1.

2.

3.

Prochaine réunion : **.....**
