

CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 8 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action 6
Exercice 8.1 – Les stratégies d'intervention (10 points) 7
Exercice 8.2 – Rédiger une fiche action QQOQCCP (10 points) 9
Exercice 8.3 – Choisir une action avec des critères (12 points) 11
Exercice 8.4 – Relier les actions aux objectifs (12 points) 13
Exercice 8.5 – Adapter une action à un public (12 points) 15
Exercice 8.6 – Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier (16 points) 17
Corrigés de la partie 1 19
Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage 22
Exercice 8.7 – La matrice pouvoir/intérêt (10 points) 23
Exercice 8.8 – Organiser le pilotage du projet (10 points) 25
Exercice 8.9 – Corriger une matrice RACI (12 points) 27
Exercice 8.10 – Corriger une convention de partenariat (12 points) 29
Exercice 8.11 – Convaincre un partenaire réticent (12 points) 30
Exercice 8.12 – Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage (16 points) 31
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – Les financements et les appels à projets 36
Exercice 8.13 – Les étapes de la réponse à un appel à projets (10 points) 37
Exercice 8.14 – Qui finance quoi ? (10 points) 39
Exercice 8.15 – Lire un cahier des charges (12 points) 40
Exercice 8.16 – Construire un plan de financement (12 points) 42
Exercice 8.17 – Évaluer des dossiers avec une grille de sélection (12 points) 43
Exercice 8.18 – Relire un dossier de demande de subvention (16 points) 45
Corrigés de la partie 3 47
Partie 4 – Planifier le projet 50
Exercice 8.19 – Lire une tâche du réseau PERT (10 points) 51
Exercice 8.20 – Construire un diagramme de Gantt (10 points) 53
Exercice 8.21 – Calculer un réseau PERT complet (12 points) 54
Exercice 8.22 – Mesurer l'effet d'un retard (12 points) 56
Exercice 8.23 – Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps (12 points) 57
Exercice 8.24 – Fixer les dates réelles d'un cycle d'ateliers (16 points) 59
Corrigés de la partie 4 60
Partie 5 – Construire et suivre le budget 63
Exercice 8.25 – La structure d'un budget prévisionnel (10 points) 64
Exercice 8.26 – Calculer un coût horaire chargé (10 points) 66
Exercice 8.27 – Construire un budget équilibré (12 points) 67
Exercice 8.28 – Analyser un budget avec des ratios (12 points) 68
Exercice 8.29 – Analyser les écarts entre le prévu et le réalisé (12 points) 69
Exercice 8.30 – Calculer le coût complet d'un atelier et le seuil de participants (16 points) 71
Corrigés de la partie 5 72
Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques 75
Exercice 8.31 – Le principe du plan de trésorerie (10 points) 76
Exercice 8.32 – Construire un plan de trésorerie sur huit mois (12 points) 78
Exercice 8.33 – Calculer les quantités à acheter (12 points) 79
Exercice 8.34 – Préparer la logistique d'un atelier (12 points) 80
Exercice 8.35 – Choisir une méthode pédagogique (10 points) 81

Exercice 8.36 – Coût et apports d'une recette d'atelier (16 points) 82
Corrigés de la partie 6 84

Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication 87
Exercice 8.37 – La boucle du pilotage (10 points) 88
Exercice 8.38 – Construire une matrice des risques (12 points) 90
Exercice 8.39 – Analyser un tableau de bord multisite (12 points) 92
Exercice 8.40 – Construire un plan de communication (12 points) 93
Exercice 8.41 – Mesurer l'efficacité des canaux de communication (12 points) 95
Exercice 8.42 – Réagir à un imprévu en cours de projet (16 points) 96
Corrigés de la partie 7 98

Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet 101
Exercice 8.43 – Compléter un cadre logique (10 points) 102
Exercice 8.44 – Préparer la pérennisation (12 points) 104
Exercice 8.45 – Organiser et valoriser le bénévolat (12 points) 106
Exercice 8.46 – Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie (12 points) 107
Exercice 8.47 – Défendre son plan d'action devant le jury (14 points) 108
Exercice 8.48 – Cas complet : le « bol du bénévole » d'un festival de musique (40 points) 109
Corrigés de la partie 8 113

Bilan : grille d'auto-évaluation 118

Cahier d'exercices – Chapitre 8

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 8 : choix des stratégies et des actions, fiche action (QQOQCCP), parties prenantes et partenariat, pilotage, financements et appels à projets, planification (Gantt, PERT), budget, trésorerie, logistique, méthodes pédagogiques, tableau de bord, risques, communication, pérennisation (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les stratégies d'intervention, le QQOQCCP, la matrice pouvoir/intérêt, l'organisation du pilotage, la réponse à un appel à projets, la tâche PERT, la structure d'un budget, le plan de trésorerie, la matrice des risques, le plan de communication, la boucle du pilotage.
- Calculer et interpréter : coût d'une action, coût horaire chargé, budget équilibré, ratios, écarts prévu/réalisé, subvention selon un plafond et un taux, dates au plus tôt et au plus tard, marges, solde de trésorerie, quantités brutes, taux de présence, criticité, coût par contact, apports d'une recette (Ciqual 2025).
- Rédiger les parties « plan d'action », « partenariat », « budget » et « pilotage » d'un dossier de projet, et les défendre à l'oral.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de dossiers), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, appels à projets, prix, salaires et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de plan d'action à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans les documents les objectifs, le public, les ressources et les règles imposées (budget, financeur, calendrier). Ensuite, faites les calculs en posant la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité (euros, heures, semaines, pourcentage). Puis vérifiez la cohérence : budget équilibré, comptes 86 et 87 égaux, dépendances du planning respectées, trésorerie jamais négative sans solution. Enfin, concluez par une décision argumentée. Une copie qui donne

> un chiffre sans le vérifier, ou une décision sans chiffre, perd des points.

Partie 1 – Les stratégies, les actions et la fiche action

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les six grandes stratégies d'intervention et classer une action dans la bonne stratégie.
- Décrire une action avec la méthode QQOQCCP et chiffrer ses moyens.
- Choisir une action avec des critères explicites (cohérence, efficacité, adaptation, faisabilité, acceptabilité, éthique).
- Relier chaque action à un objectif spécifique et repérer les actions « orphelines ».
- Adapter une action aux capacités et à la culture d'un public.
- Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier de projet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les objectifs spécifiques disent ce qui doit changer ; les stratégies disent par quels leviers ; les actions disent ce que l'on fait concrètement.
- Six stratégies : éducation pour la santé ; action sur l'environnement ; lien social et entourage ; participation et développement du pouvoir d'agir ; plaidoyer ; formation des relais. Les interventions efficaces en nutrition combinent plusieurs stratégies (Charte d'Ottawa, 1986).
- QQOQCCP : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? Une fiche action complète répond aux sept questions.
- Six questions pour choisir une action : cohérence avec un objectif, efficacité prouvée, adaptation au public, faisabilité, acceptabilité et participation, éthique.
- Une action sans objectif est une action « orpheline » : on la supprime ou on la rattache à un objectif. Un objectif sans action ne sera pas atteint.

Exercice 8.1 – Les stratégies d'intervention (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de quartier des Coteaux (structure fictive) a posé son diagnostic : les familles du quartier consomment peu de fruits et de légumes, le seul commerce alimentaire est une supérette chère, et les parents se sentent seuls face aux refus des enfants. L'équipe a listé huit idées d'actions. Votre tutrice vous demande de vérifier que le projet combine plusieurs stratégies.

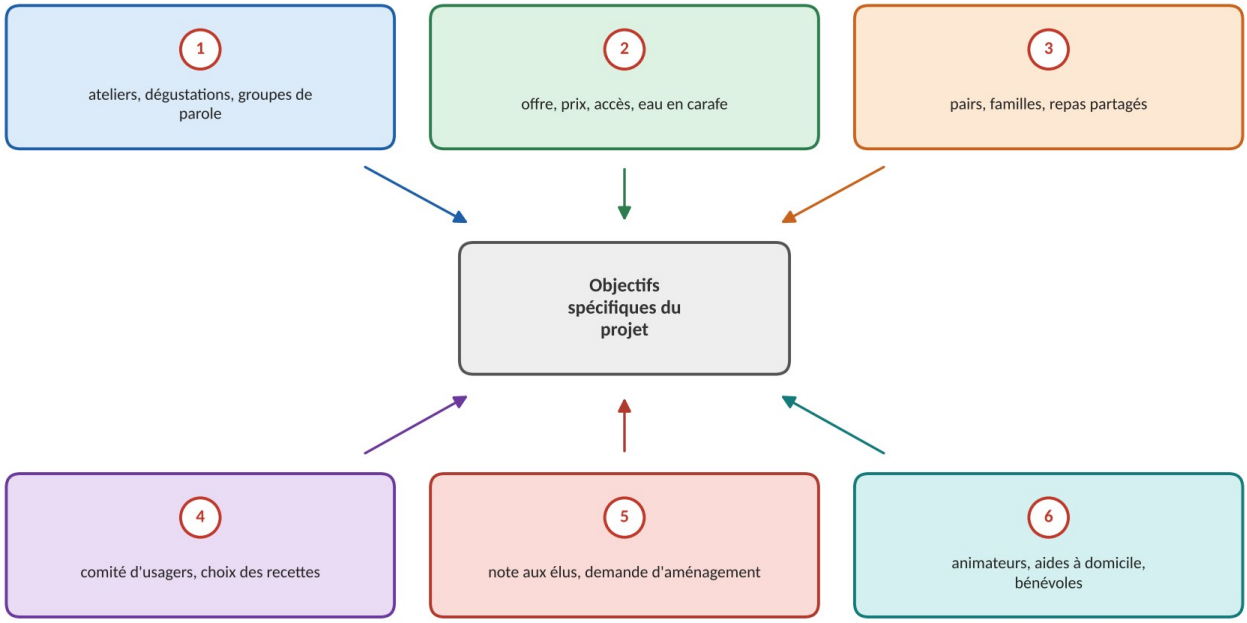


Figure 8.1 – Document 1 – Six stratégies au service des objectifs spécifiques (schéma à légender)

Document 2 – Huit idées d'actions

a) Trois ateliers « cuisiner les légumes de saison » avec dégustation.

b) Un marché de producteurs une fois par mois sur la place, avec des prix négociés.

c) Un groupe de parole de parents sur les refus alimentaires des enfants, animé avec la PMI.

d) Un comité de quatre parents qui choisit les recettes et les thèmes des ateliers.

e) Une note aux élus pour demander un arrêt de bus près du supermarché de la zone commerciale.

f) La formation des quatre animateurs du périscolaire à la découverte sensorielle.

g) Un « goûter des familles » mensuel où chaque famille apporte un plat.

h) Une exposition d'affiches sur les repères du PNNS dans le hall.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit actions du document 2 dans ces six stratégies. (4 pts)
3. Dites quelle action risque d'être la moins efficace si elle est menée seule, et pourquoi. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi il faut combiner plusieurs stratégies dans un projet de nutrition. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.2 – Rédiger une fiche action QQOQCCP (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le relais petite enfance (RPE) de Saint-Ombre (structure fictive) veut proposer aux assistantes maternelles un atelier « goûters faits maison pour les tout-petits ». L'animatrice du RPE vous transmet ses notes en vrac et vous demande une fiche action propre.

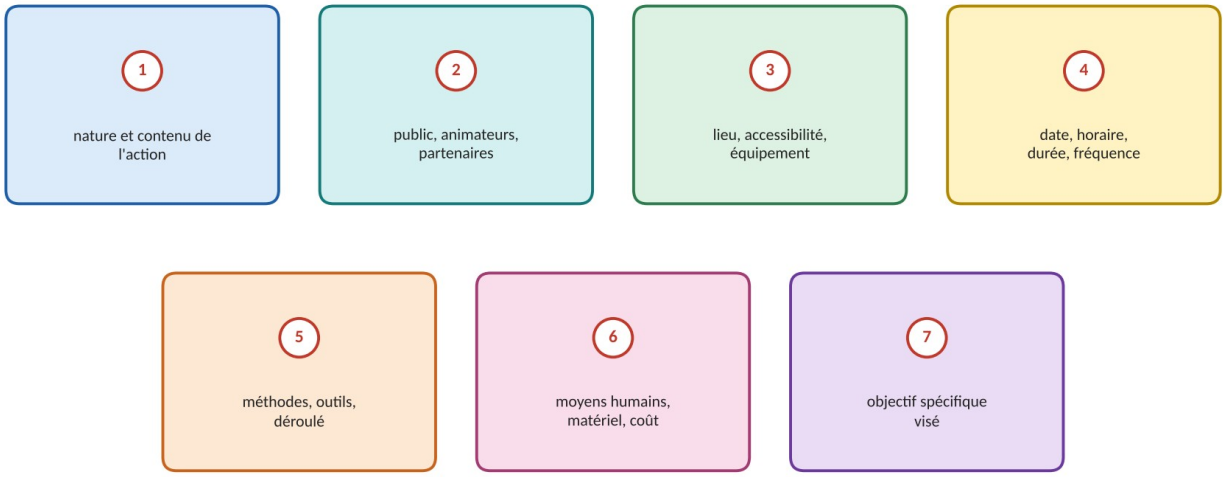


Figure 8.2 – Document 1 – Les sept questions de la méthode QQOQCCP (schéma à légender)

Document 2 – Notes de l'animatrice

« Ce serait un samedi matin, le 13 mars 2027, de 9 h 30 à 12 h, dans la salle d'activités du RPE (il y a un four et deux plaques). On prend 10 assistantes maternelles maximum, inscription au RPE. Je co-anime avec vous. Elles veulent des idées de goûters sans biscuits industriels, parce que 7 sur 12 interrogées en janvier disent acheter des biscuits par manque d'idées. On ferait trois recettes : compote pomme-banane, petits pancakes aux flocons d'avoine, yaourt nature et fruits. Puis on goûte et on échange sur les quantités adaptées à l'âge. Préparation : une heure à deux la veille ; rangement : 30 minutes à deux. Objectif spécifique 2 du projet : augmenter la part de goûters faits maison servis aux enfants accueillis. »

Document 3 – Liste des denrées (prix fictifs)

Denrée	Quantité	Prix
Farine de blé T65	400 g	1,10 € le kg
Œufs	6	0,30 € l'œuf
Yaourts nature	4 pots	0,25 € le pot
Pommes	1,5 kg	2,40 € le kg
Flocons d'avoine	300 g	2,60 € le kg
Lait demi-écrémé	1 L	1,05 € le litre
Bananes	1 kg	1,90 € le kg
Huile de colza	10 cl	2,80 € le litre

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Calculez le coût des denrées de l'atelier et le coût par participante. (2,5 pts)
3. Calculez le temps de travail des deux animatrices pour cet atelier. (1 pt)
4. Rédigez la fiche action sous la forme d'un tableau QQOQCCP. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.3 – Choisir une action avec des critères (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La résidence sociale Les Platanes (structure fictive) héberge 85 hommes âgés de 58 à 84 ans, pour la plupart arrivés d'Afrique du Nord pour travailler dans les années 1970. Ils disposent d'une cuisine commune par étage. Le diagnostic montre que beaucoup sont traités pour un diabète de type 2, mangent seuls, et lisent peu le français. L'équipe hésite entre quatre actions et a noté chacune de 0 (pas du tout) à 3 (tout à fait) sur les six critères de choix.

Document 1 – Notes de l'équipe (0 à 3)

Action	Cohérence	Efficacité	Adaptation	Faisabilité	Acceptabilité	Éthique
A – Conférence d'un médecin sur le diabète, dans la salle commune	1	1	0	3	1	2
B – Ateliers de cuisine collective : plats du pays adaptés, cuisinés et partagés	3	2	3	2	3	3
C – Distribution de dépliants nationaux sur le diabète, en français	1	0	0	3	1	2
D – Partenariat avec l'épicier voisin pour un panier hebdomadaire de légumes à prix réduit	3	2	2	1	2	2

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez la question que pose chacun des six critères. (3 pts)

2. Calculez le score total de chaque action et classez-les. (2 pts)

3. Justifiez les notes « adaptation » des actions A et C. (2 pts)

4. Proposez une combinaison de deux actions et dites à quelles stratégies elles appartiennent. (2 pts)

5. Proposez une modification de l'action A qui améliore sa note d'adaptation et d'acceptabilité. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.4 – Relier les actions aux objectifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le club des retraités de la vallée du Lizon (association fictive, 140 adhérents en zone rurale) prépare un projet « Bien manger, bien vieillir ». Le bureau a écrit les objectifs et une liste d'actions, mais personne n'a vérifié qu'elles correspondent.

Document 1 – Objectifs spécifiques (à 12 mois)

OS1 – Augmenter de 35 % à 55 % la part des adhérents qui consomment un produit laitier à chaque repas.

OS2 – Augmenter de 20 % à 40 % la part des adhérents vivant seuls qui partagent au moins un repas par semaine.

OS3 – Faire passer de 3 à 8 le nombre de pesées mensuelles proposées par les relais du club, pour repérer les pertes de poids.

Document 2 – Actions proposées par le bureau

a) Un repas partagé mensuel au foyer rural, préparé par un groupe de volontaires.

b) Une formation de deux heures pour huit bénévoles relais : peser, noter, orienter vers le médecin traitant.

c) Une sortie annuelle au salon de l'agriculture.

d) Quatre ateliers « desserts lactés faciles et peu coûteux ».

e) Un concours de belote.

f) Un covoiturage solidaire vers le repas partagé.

g) L'achat d'un pèse-personne par relais.

h) Une conférence sur l'ostéoporose avec un rhumatologue.

À vous de jouer – Questions

1. Rattachez chaque action à un objectif spécifique quand c'est possible. (4 pts)
2. Repérez les actions « orphelines » et dites ce que vous en faites. (2 pts)
3. Classez les actions retenues selon les facteurs du modèle PRECEDE (prédisposants, facilitants, de renforcement). (3 pts)
4. Un objectif est-il mal couvert ? Proposez une action complémentaire. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.5 – Adapter une action à un public (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Mains et Voix (structure fictive) accompagne des adultes sourds qui communiquent en langue des signes française (LSF). Sa coordinatrice voudrait reprendre un atelier « lire les étiquettes au supermarché » conçu par une mutuelle pour le grand public. Vous devez l'adapter.

Document 1 – L'atelier tel qu'il est conçu pour le grand public

Séquence	Contenu	Durée
1	Exposé oral avec diaporama : la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel, le Nutri-Score	30 min
2	Quiz à main levée : « Quel produit contient le plus de sucre ? »	15 min
3	Visite du supermarché en groupe de 15 : l'animatrice commente au micro portatif	45 min
4	Questionnaire de satisfaction écrit	10 min

Document 2 – Ce que dit la coordinatrice

« Nos adhérents lisent le français avec des niveaux très variables. Beaucoup ont eu une scolarité difficile. Une interprète LSF coûte 60 € de l'heure (tarif fictif) et il faut la réserver trois semaines avant. Dans un supermarché, on ne peut pas tous regarder l'animatrice en même temps : il faut se voir. Et nos adhérents détestent qu'on parle d'eux à la troisième personne devant eux. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez trois obstacles de l'atelier actuel pour ce public. (3 pts)
2. Proposez un nouveau déroulé en quatre séquences, avec les méthodes et les supports. (5 pts)
3. Calculez le coût de l'interprète pour un atelier de 2 h 30 avec 30 minutes de préparation commune. (1 pt)
4. Proposez une façon d'associer les adhérents à la conception de l'atelier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.6 – Rédiger la partie « plan d'action » d'un dossier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre communal d'action sociale (CCAS) de Mérovel (commune fictive de 9 000 habitants, ancienne cité minière). Le diagnostic a été validé. Vous devez rédiger la partie « plan d'action » du dossier de projet, en une page et demie.

Document 1 – Extrait du diagnostic validé (données fictives, 2026)

- 62 % des 48 bénéficiaires de l'épicerie sociale interrogés ne cuisinent jamais de légumes secs ; 71 % disent « ne pas savoir les préparer ».
- L'épicerie sociale reçoit des légumes secs de la banque alimentaire, mais 40 % sont jetés ou redonnés faute de demande.
- Les bénéficiaires demandent « des recettes rapides » et « pouvoir goûter avant d'acheter ».
- Ressources : cuisine pédagogique au centre social (12 places), une conseillère en économie sociale et familiale (CESF), deux bénévoles qui cuisinent volontiers, une diététicienne libérale qui accepte quatre interventions.

Document 2 – Objectifs validés par le comité de pilotage

Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation des bénéficiaires de l'épicerie sociale de Mérovel.

OS1 – Dans un an, 40 % des bénéficiaires interrogés cuisinent des légumes secs au moins une fois par semaine (valeur initiale : 0 % chaque semaine, 38 % au moins de temps en temps).

OS2 – Dans un an, réduire de 40 % à 15 % la part des légumes secs jetés ou redonnés par l'épicerie.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez trois actions qui combinent au moins deux stratégies, et rattachez chacune à un objectif. (4 pts)
2. Rédigez la fiche QQOQCCP de l'action principale. (4 pts)
3. Calculez le nombre de places offertes si l'on organise quatre ateliers de 12 places, et la part des 48 bénéficiaires interrogés qu'il permet de toucher si chaque personne ne vient qu'une fois. Commentez. (2 pts)
4. Proposez deux objectifs opérationnels SMART. (3 pts)
5. Rédigez le paragraphe d'introduction du plan d'action (6 à 8 lignes). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 8.1

1. Légendes : 1 Éducation pour la santé ; 2 Action sur l'environnement ; 3 Lien social et entourage ; 4 Participation et pouvoir d'agir ; 5 Plaidoyer ; 6 Formation des relais.
2. Éducation pour la santé : a) ateliers de cuisine, h) exposition d'affiches. Action sur l'environnement : b) marché de producteurs à prix négociés. Lien social et entourage : c) groupe de parole de parents, g) goûter des familles. Participation : d) comité de parents. Plaidoyer : e) note aux élus pour un arrêt de bus. Formation des relais : f) formation des animateurs du périscolaire. Une action peut relever de deux stratégies : le groupe de parole (c) relève aussi de l'éducation pour la santé.
3. L'**exposition d'affiches** (h) : elle transmet une information, mais elle ne donne ni compétence, ni accès, ni soutien. Une information seule change peu les comportements, surtout chez les publics qui ont peu de moyens.
4. Les comportements alimentaires dépendent de facteurs individuels (savoir cuisiner), environnementaux (prix, offre, transport) et sociaux (soutien de l'entourage). Agir sur un seul facteur laisse les autres freins en place. La Charte d'Ottawa (1986) recommande d'agir à la fois sur les aptitudes individuelles, les milieux, l'action communautaire et les politiques.

Corrigé – Exercice 8.2

1. Légendes : 1 Quoi ? ; 2 Qui ? ; 3 Où ? ; 4 Quand ? ; 5 Comment ? ; 6 Combien ? ; 7 Pourquoi ?
2. Farine : 0,4 × 1,10 = 0,44 € ; œufs : 6 × 0,30 = 1,80 € ; yaourts : 4 × 0,25 = 1,00 € ; pommes : 1,5 × 2,40 = 3,60 € ; flocons : 0,3 × 2,60 = 0,78 € ; lait : 1,05 € ; bananes : 1,90 € ; huile : 0,1 × 2,80 = 0,28 €. **Total : 10,85 €**, soit 10,85 / 10 = **1,09 € par participante** (1,085 arrondi).
3. Par animatrice : 1 h de préparation + 2 h 30 d'atelier + 30 min de rangement = 4 h ; pour deux animatrices : **8 heures**.
4. Fiche action (exemple) :

Question	Réponse
Quoi ?	Atelier « goûters faits maison pour les tout-petits » : trois recettes (compote pomme-banane, pancakes aux flocons d'avoine, yaourt nature et fruits), dégustation, échange sur les quantités adaptées à l'âge
Qui ?	10 assistantes maternelles au plus, inscrites au RPE ; animatrice du RPE et stagiaire en diététique
Où ?	Salle d'activités du RPE (four, deux plaques)
Quand ?	Samedi 13 mars 2027, de 9 h 30 à 12 h
Comment ?	Démonstration courte puis réalisation en trois groupes, dégustation, échange ; fiches recettes illustrées remises à la fin
Combien ?	10,85 € de denrées (1,09 € par participante) ; 8 heures de travail pour deux animatrices ; matériel du RPE
Pourquoi ?	Objectif spécifique 2 : augmenter la part de goûters faits maison servis aux enfants accueillis (7 assistantes maternelles sur 12 achètent des biscuits par manque d'idées)

Corrigé – Exercice 8.3

1. Cohérence : l'action répond-elle à un objectif spécifique et à une cause du diagnostic ? Efficacité : existe-t-il des preuves ou des retours d'expérience ? Adaptation : convient-elle à la langue, à la culture, à la littératie, aux horaires et au budget du public ? Faisabilité : a-t-on les compétences, les locaux, le temps et l'argent ? Acceptabilité : le public la souhaite-t-il, a-t-il été consulté ? Éthique : est-elle non stigmatisante, équitable, indépendante ?
2. A : 1 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 = **8** ; B : 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 = **16** ; C : 1 + 0 + 0 + 3 + 1 + 2 = **7** ; D : 3 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2

= **12**. Classement : **B (16), D (12), A (8), C (7)**.

3. A : une conférence en français, sans support visuel adapté, ne convient pas à des hommes qui lisent peu le français et qui ont l'habitude de cuisiner leurs plats ; elle ne tient pas compte de leurs habitudes. C : des dépliants nationaux en français sont illisibles pour une partie des résidents ; ils ne parlent ni de leurs plats, ni de leur cuisine commune.

4. Exemple : **B + D**. Les ateliers de cuisine relèvent de l'éducation pour la santé et du lien social (repas partagés) ; le panier de légumes à prix réduit relève de l'action sur l'environnement (accès, prix). Les ateliers donnent l'envie et le savoir-faire, le panier donne l'accès aux produits.

5. Exemple : remplacer la conférence par un **temps d'échange autour d'un thé**, animé par le médecin et un résident relais qui traduit en arabe ; partir des questions des résidents (« Puis-je manger du couscous ? ») ; utiliser des photos de leurs plats et des portions réelles ; inviter par le bouche-à-oreille du conseil de concertation des résidents.

Corrigé – Exercice 8.4

1. OS1 (produits laitiers) : d) ateliers desserts lactés ; h) conférence sur l'ostéoporose (lien indirect avec le calcium). OS2 (repas partagés) : a) repas partagé mensuel ; f) covoiturage vers le repas. OS3 (pesées) : b) formation des bénévoles relais ; g) achat de pèse-personnes.

2. Actions orphelines : c) sortie au salon de l'agriculture et e) concours de belote. Elles ne répondent à aucun objectif du projet. On les sort du projet (elles peuvent rester des activités du club, financées autrement), ou on les transforme : un concours de belote suivi d'un goûter lacté pourrait servir OS1 et OS2, à condition de le décrire comme tel.

3. Prédisposants (connaissances, motivations) : h) conférence, d) ateliers (découvrir des recettes). Facilitants (compétences, accès, ressources) : d) ateliers (savoir-faire), f) covoiturage, g) pèse-personnes, b) formation des relais. De renforcement (soutien, entourage) : a) repas partagé, b) relais qui encouragent et suivent.

4. L'OS2 vise les adhérents **vivant seuls**, mais rien ne garantit qu'ils viendront au repas mensuel ; un seul repas par mois ne suffit pas pour atteindre « un repas partagé par semaine ». Action complémentaire : des binômes « repas à deux » chaque semaine entre adhérents voisins, avec un relais qui les met en contact, ou un repas hebdomadaire tournant chez les adhérents volontaires.

Corrigé – Exercice 8.5

1. Exemples : l'exposé oral de 30 minutes repose sur l'écoute (inaccessible sans interprète) et sur la lecture d'un diaporama (difficile pour une partie du public) ; la visite commentée au micro, en groupe de 15, est impossible à suivre puisqu'il faut voir l'animatrice ou l'interprète ; le questionnaire écrit exclut ceux qui lisent mal ; le quiz à main levée suppose de suivre une question orale.

2. Exemple de déroulé :

Séquence	Contenu, méthode et supports	Durée
1	Accueil en LSF avec l'interprète ; jeu de tri d'emballages réels apportés par les adhérents (méthode active)	25 min
2	Démonstration visuelle : repérer le sucre et le sel sur trois emballages agrandis, pictogrammes, Nutri-Score en couleurs (méthode démonstrative)	25 min
3	Visite du supermarché en deux groupes de 5 à 6, en arc de cercle pour se voir ; chaque groupe compare deux produits et note sa réponse avec des pictogrammes (méthode active et coopérative)	1 h
4	Retour en salle : chaque groupe présente sa découverte en LSF ; évaluation avec des cartes de couleur (vert, orange, rouge)	40 min

3. Durée de présence de l'interprète : 2 h 30 + 30 min = 3 h ; coût : 3 × 60 = **180 €**.

4. Exemples : réunir trois adhérents volontaires avant l'atelier pour choisir les produits à comparer et tester les supports ; former un adhérent pair qui co-anime en LSF ; parler aux personnes directement (et non à l'interprète), comme le demande la coordinatrice.

Corrigé – Exercice 8.6

1. Exemples : A1 – quatre ateliers « légumes secs en 30 minutes » avec dégustation (éducation pour la santé) → OS1 ; A2 – dégustation mensuelle à l'épicerie sociale, avec fiche recette et sachet de légumes secs à emporter (action sur l'environnement et éducation) → OS1 et OS2 ; A3 – un comité de trois bénéficiaires et deux bénévoles qui choisit et teste les recettes (participation) → OS1 et OS2.

2. Fiche QQOQCCP de A1 (exemple) : Quoi ? quatre ateliers de cuisine « légumes secs en 30 minutes » ; Qui ? 12 bénéficiaires par atelier, la CESF, la diététicienne, deux bénévoles ; Où ? cuisine pédagogique du centre social ; Quand ? un mardi matin par mois, de 9 h 30 à 12 h, de février à mai 2027 ; Comment ? démonstration, réalisation en trois groupes, dégustation, recette illustrée, sachet de légumes secs offert par l'épicerie ; Combien ? 4 interventions de la diététicienne, temps de la CESF, denrées issues de l'épicerie ; Pourquoi ? OS1 et OS2.

3. Places : 4 × 12 = **48 places**. Si chaque personne vient une fois, on peut toucher au plus 48 personnes, soit 48 / 48 × 100 = **100 %** des bénéficiaires interrogés. Commentaire : c'est un maximum théorique ; en pratique, certaines personnes reviendront et d'autres ne viendront pas. Il faut compléter par une action qui touche tous les bénéficiaires sur place (dégustations à l'épicerie).

4. Exemples : « Organiser 4 ateliers de 12 places entre février et mai 2027 au centre social, avec un taux de remplissage d'au moins 75 %. » « Proposer une dégustation de légumes secs à l'épicerie sociale le premier jeudi de chaque mois, de mars à décembre 2027, soit 10 dégustations. »

5. Exemple : « Le plan d'action répond aux deux objectifs spécifiques validés par le comité de pilotage. Il combine l'éducation pour la santé (ateliers culinaires), l'action sur l'environnement (dégustations et sachets de légumes secs à l'épicerie sociale) et la participation (comité de recettes). Ce choix s'appuie sur le diagnostic : 71 % des bénéficiaires disent ne pas savoir préparer les légumes secs, alors que l'épicerie en dispose et en perd 40 %. Les actions mobilisent les ressources du territoire : la cuisine pédagogique, la CESF, deux bénévoles et une diététicienne. Elles sont décrites ci-dessous avec la méthode QQOQCCP. »

Partie 2 – Les parties prenantes, le partenariat et le pilotage

Objectifs – Objectifs de la partie

- Placer les parties prenantes dans la matrice pouvoir/intérêt et en déduire la façon de les associer.
- Organiser les instances du projet : comité de pilotage, comité technique, comité d'usagers.
- Construire et corriger une matrice RACI.
- Rédiger et corriger les articles d'une convention de partenariat.
- Convaincre un partenaire en montrant ce que le projet lui apporte.
- Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage avec un relevé de décisions.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Partie prenante : personne ou organisation concernée par le projet ou capable de l'influencer. Partenaire : partie prenante qui s'engage et apporte des ressources selon des modalités définies.
- Matrice pouvoir/intérêt (d'après Mendelow, 1991) : pouvoir fort et intérêt fort, gérer étroitement ; pouvoir fort et intérêt faible, satisfaire ; pouvoir faible et intérêt fort, associer et informer ; pouvoir faible et intérêt faible, surveiller.
- Matrice RACI : R réalise ; A approuve et rend compte (une seule personne A par tâche) ; C consulté ; I informé. Chaque tâche a au moins un R et exactement un A.
- Comité de pilotage : il décide (2 à 3 réunions). Comité technique : il organise et suit le tableau de bord. Comité d'usagers : il donne l'avis des personnes concernées.
- Convention de partenariat : objet, engagements de chaque partie, durée, communication, données personnelles, suivi, modification et résiliation, signatures.
- Compte rendu : envoyé sous 48 heures ; présents et excusés, points abordés, décisions, relevé des actions (quoi, qui, pour quand).

Exercice 8.7 – La matrice pouvoir/intérêt (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La commune du Val-d'Orbe (fictive) veut installer un réfrigérateur solidaire devant la salle des fêtes : les commerçants et les habitants y déposent des produits frais, et chacun peut se servir librement. Une association de bénévoles gérerait le nettoyage et le contrôle des dates. Vous préparez la cartographie des parties prenantes.

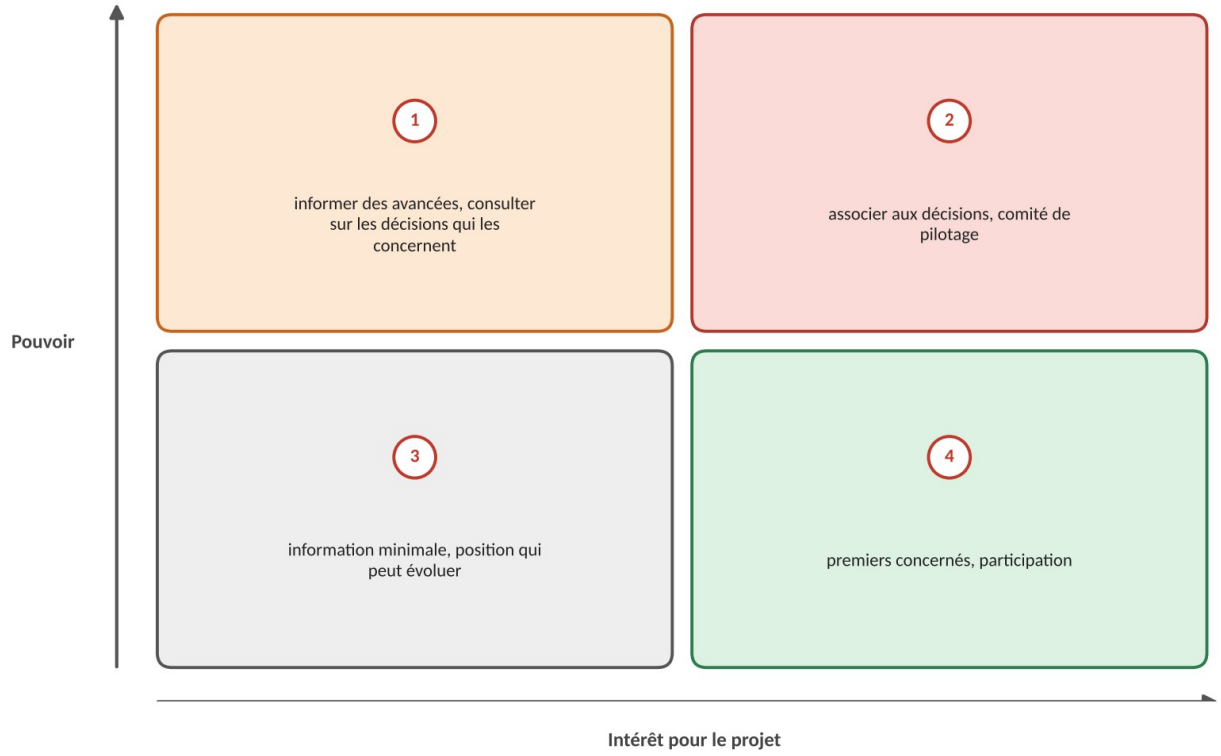


Figure 8.3 – Document 1 – La matrice pouvoir/intérêt (schéma à légender)

Document 2 – Dix parties prenantes

a) Le maire et le conseil municipal, qui financent l'achat du réfrigérateur.

b) La direction départementale de la protection des populations (DDPP), qui contrôle l'hygiène des denrées.

c) Les habitants qui utiliseront le réfrigérateur.

d) Les bénévoles de l'association qui le gérera.

e) Le supermarché qui donnera ses invendus.

f) Les riverains de la salle des fêtes.

g) La fondation qui pourrait financer l'entretien.

h) Le journal local.

i) La boulangerie, qui hésite à donner son pain de la veille.

j) La directrice du CCAS, qui oriente les personnes en difficulté et copilote le projet.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)

2. Placez les dix parties prenantes dans la matrice. (5 pts)

3. Dites comment associer concrètement les habitants (c) et les riverains (f). (2 pts)

4. Expliquez pourquoi la matrice doit être mise à jour en cours de projet, avec un exemple tiré du document 2. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.8 – Organiser le pilotage du projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bailleur social Habitat du Causse (structure fictive) lance, avec le centre social et la diététicienne de la maison de santé, un projet « Cuisiner dans un petit logement » pour les locataires de la résidence des Genêts (180 logements). Il vous demande de proposer l'organisation des instances du projet.

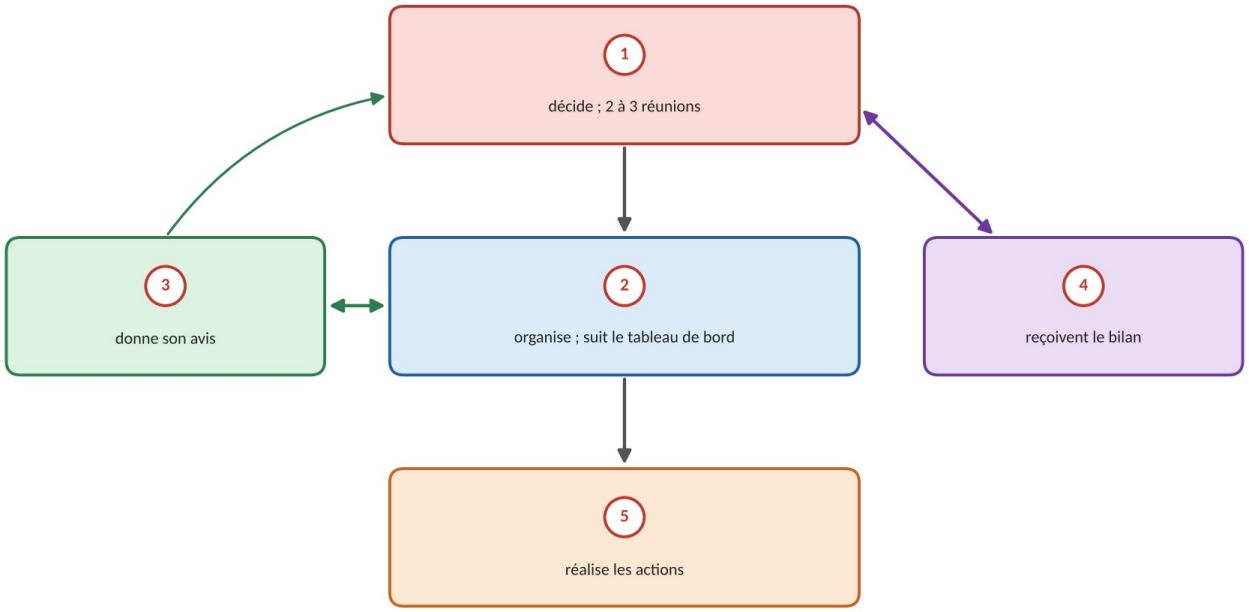


Figure 8.4 – Document 1 – L'organisation du pilotage d'un projet (schéma à légender)

Document 2 – Personnes et structures disponibles

La responsable territoriale du bailleur ; la directrice du centre social ; la référente familles du centre social ; la diététicienne de la maison de santé ; l'amicale des locataires (présidente et deux membres) ; la gardienne de la résidence ; la chargée de mission du contrat de ville ; vous-même (stagiaire) ; la caisse d'allocations familiales (financeur) ; huit locataires volontaires.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Proposez la composition du comité de pilotage et du comité technique. (3 pts)
3. Indiquez le rôle et la fréquence de réunion de chaque instance. (2,5 pts)
4. Expliquez pourquoi il est utile que l'amicale des locataires siège au comité de pilotage, et non seulement au comité d'usagers. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.9 – Corriger une matrice RACI (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association d'aide aux devoirs Coup de Pouce Saint-Rémi (fictive) accueille 40 enfants de 6 à 11 ans après l'école et leur sert un goûter. Elle lance un projet « goûters équilibrés et faits ensemble ». La coordinatrice a rempli une matrice RACI et vous demande de la vérifier.

Document 1 – La matrice RACI proposée

Tâche	Coordinatrice	Stagiaire en diététique	Animateurs (3)	Parents volontaires	Bureau de l'association
Diagnostic (goûters servis, avis des enfants)	A	R	C	C	A
Choix des goûters du trimestre	C	C	C	C	I
Achats des denrées	R	I	R	–	A
Préparation des goûters avec les enfants	A	C	R	R	–
Animation d'un atelier « goût » par mois	I	–	C	–	–
Évaluation (questionnaire, relevé des goûters)	A	R	C	I	I
Validation du budget	C	–	–	–	A

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez la signification des quatre lettres et les deux règles de construction d'une matrice RACI. (3 pts)
2. Repérez les trois tâches qui ne respectent pas ces règles et expliquez l'erreur. (3 pts)
3. Proposez une matrice corrigée. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la matrice RACI pour un projet qui associe des bénévoles et des parents. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.10 – Corriger une convention de partenariat (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison des jeunes et de la culture (MJC) des Rives (fictive) organise un cycle de six ateliers « cuisiner à 15 ans » pour des adolescents. Un supermarché voisin propose d'offrir les denrées. Son responsable a envoyé un projet de convention. La directrice de la MJC vous demande votre avis avant de signer.

Document 1 – Projet de convention (extraits)

Article 1 – Objet : « Le supermarché soutient les activités de la MJC. »

Article 2 – Engagements de la MJC : « La MJC fait apparaître le logo du supermarché sur tous ses supports, y compris les fiches recettes remises aux jeunes. Les recettes utilisent les produits de la marque du distributeur. »

Article 3 – Engagements du supermarché : « Le supermarché fournit des denrées. »

Article 4 – Données : « La MJC transmet la liste des participants et leurs adresses électroniques pour l'envoi d'offres promotionnelles. »

Article 5 – Durée : « La convention est conclue sans limite de durée. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les cinq faiblesses de ce projet de convention. (5 pts)
2. Réécrivez les articles 1, 3 et 4. (4 pts)
3. Citez les articles qui manquent dans cette convention. (2 pts)
4. La directrice doit-elle refuser le partenariat ? Donnez votre avis argumenté. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.11 – Convaincre un partenaire réticent (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la zone d'activités des Trois-Chênes (fictive), le service de prévention et de santé au travail interentreprises veut lancer un projet sur le déjeuner des salariés. La plupart déjeunent au restaurant interentreprises, géré par un prestataire. Le chef de cuisine est réticent : « Encore un projet qui va me dire que ma cuisine est trop grasse. » Votre tutrice vous demande de préparer l'entretien avec lui.

Document 1 – Données utiles (fictives, 2026)

- Le restaurant sert en moyenne 420 repas par jour, 5 jours par semaine.
- Le relevé des retours de plateaux montre que 31 % des accompagnements de légumes sont jetés.
- Le prestataire a perdu 8 % de couverts en un an, au profit des boulangeries et de la livraison.
- Le projet demande au chef : 2 réunions d'une heure et demie, la co-animation de 3 dégustations d'une heure, la mise au point de 4 recettes (2 heures chacune).
- Coût horaire chargé du chef, communiqué par le prestataire : 27 €.

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez ce que le projet peut apporter au chef et au prestataire. (3 pts)

2. Calculez le temps demandé au chef et sa valorisation. Dites dans quels comptes du budget du projet elle apparaît si le prestataire ne facture pas ce temps. (3 pts)

3. Les 420 repas actuels correspondent à la fréquentation après la baisse de 8 %. Calculez le nombre de couverts perdus chaque jour en un an (arrondi à l'unité) et le nombre de repas que ces pertes représentent sur une semaine. (2 pts)

4. Rédigez les trois premières phrases que vous direz au chef pour ouvrir l'entretien. (2 pts)

5. Proposez deux engagements réciproques à inscrire dans une convention. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.12 – Rédiger le compte rendu d'une réunion de pilotage (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de la Haute-Sorne (fictive) conduit un projet de six ateliers pour des patients à risque de diabète. Vous avez assisté au comité de pilotage de mi-parcours et vous devez en rédiger le compte rendu.

Document 1 – Vos notes de réunion, 14 janvier 2027, 18 h – 19 h 30, salle de réunion de la MSP

Présents : Dr Mallet (médecin coordinateur), Mme Bataille (infirmière Asalée), M. Ortiz (diététicien), Mme Leroux (patiente représentante), vous-même. Excusées : Mme Faure (pharmacienne), Mme Henri (chargée de mission du contrat local de santé).

- Dr Mallet ouvre la séance, rappelle l'objectif : 3 ateliers sur 6 réalisés.
- Mme Bataille : 36 places possibles pour les 3 ateliers (12 par atelier) ; 25 présences. Deux patients ont arrêté à cause de l'horaire (14 h).
- M. Ortiz : le budget est consommé à 41 % (820 € sur 2 000 €). La salle de cuisine du lycée hôtelier n'est plus disponible en mars.
- Mme Leroux : « Les patients aimeraient un atelier le samedi matin. Et la fiche sur les étiquettes est trop petite pour les lire. »
- Décision : les ateliers 4 à 6 auront lieu le samedi de 10 h à 12 h 30. M. Ortiz cherche une autre cuisine avant le 31 janvier. Mme Bataille rappelle les patients absents d'ici le 21 janvier. La fiche sera réimprimée en grands caractères par vous, avant le 28 janvier. Mme Leroux relit la nouvelle fiche.
- Prochaine réunion : jeudi 6 mai 2027, 18 h, même salle (bilan final).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence aux trois premiers ateliers et commentez-le au regard de l'objectif de 80 %. (2 pts)
2. Comparez la consommation du budget à l'avancement du projet. (2 pts)
3. Rédigez le compte rendu complet de la réunion, avec un relevé des actions sous forme de tableau. (8 pts)
4. Dites à qui vous envoyez le compte rendu, et dans quel délai. (2 pts)
5. Expliquez ce qu'apporte la présence d'une patiente représentante au comité de pilotage. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 8.7

1. Légendes : 1 Satisfaire (pouvoir fort, intérêt faible) ; 2 Gérer étroitement (pouvoir fort, intérêt fort) ; 3 Surveiller (pouvoir faible, intérêt faible) ; 4 Associer et informer (pouvoir faible, intérêt fort).
2. Placement (exemple justifié) :

Quadrant	Parties prenantes
Gérer étroitement	a) maire et conseil municipal (financent et décident) ; j) directrice du CCAS (copilote) ; d) association des bénévoles (gère le réfrigérateur, peut tout arrêter)
Satisfaire	b) DDPP (peut interdire si l'hygiène n'est pas respectée, mais n'est pas porteuse) ; g) fondation (peut financer, intérêt encore faible)
Associer et informer	c) habitants utilisateurs (premiers concernés) ; e) supermarché donateur (intérêt fort : réduire le gaspillage, pouvoir limité sur le projet)
Surveiller	f) riverains ; h) journal local ; i) boulangerie hésitante

On accepte d'autres placements s'ils sont justifiés : les bénévoles peuvent aussi être placés en « associer » ; les riverains peuvent devenir un risque (plaintes pour le bruit ou les déchets).

3. Habitants : les inviter à choisir l'emplacement et les règles d'usage, créer un petit groupe d'utilisateurs qui fait remonter les problèmes, afficher les règles avec des pictogrammes. Riverains : les informer avant l'installation (courrier, rencontre), leur donner un contact en cas de problème, les inviter à l'inauguration.
4. Les positions changent : la boulangerie (i), aujourd'hui hésitante, peut devenir donatrice et passer en « associer » ; la fondation (g) peut accorder un financement et prendre un intérêt fort. La matrice se met à jour à chaque comité de pilotage.

Corrigé – Exercice 8.8

1. Légendes : 1 Comité de pilotage ; 2 Comité technique ; 3 Comité d'usagers ; 4 Financeurs ; 5 Équipe d'animation.
2. Comité de pilotage (exemple) : la responsable territoriale du bailleur, la directrice du centre social, la chargée de mission du contrat de ville, la présidente de l'amicale des locataires, un représentant de la CAF (financeur), la diététicienne. Comité technique : la référente familles, la diététicienne, la gardienne, vous-même, un membre de l'amicale.
3. Comité de pilotage : il valide les objectifs, le budget et les grandes décisions, et arbitre en cas de difficulté ; 3 réunions (lancement, mi-parcours, bilan). Comité technique : il organise les ateliers, suit le tableau de bord et prépare les décisions du comité de pilotage ; une réunion par mois. Comité d'usagers (les huit locataires volontaires) : il donne son avis sur les thèmes, les horaires, les recettes et les supports ; une réunion avant chaque série d'ateliers.
4. Au comité d'usagers, les locataires donnent un avis ; au comité de pilotage, ils participent aux **décisions** (budget, priorités). La présence de l'amicale garantit que les choix tiennent compte de la vie réelle de la résidence, renforce la légitimité du projet et favorise la mobilisation des autres locataires. C'est un niveau de participation plus élevé.

Corrigé – Exercice 8.9

1. R : réalise la tâche ; A : approuve et rend compte du résultat ; C : consulté avant la décision ; I : informé du résultat. Règles : **un seul A par tâche** ; **au moins un R par tâche**.
2. Diagnostic : **deux A** (coordinatrice et bureau) : on ne sait pas qui valide. Choix des goûters : **aucun R ni A** : personne n'est chargé de choisir. Animation de l'atelier « goût » : **aucun R ni A** : personne ne l'anime.

(Les autres lignes respectent les règles ; la ligne « achats » a deux R, ce qui est permis.)

3. Matrice corrigée (exemple) :

Tâche	Coordinatrice	Stagiaire	Animateurs	Parents	Bureau
Diagnostic	A	R	C	C	I
Choix des goûters du trimestre	A	R	C	C	I
Achats des denrées	R	I	R	–	A
Préparation des goûters avec les enfants	A	C	R	R	–
Animation d'un atelier « goût » par mois	A	R	C	I	–
Évaluation	A	R	C	I	I
Validation du budget	C	–	–	–	A

4. Quand des bénévoles, des parents et des salariés travaillent ensemble, les rôles sont flous et chacun peut croire qu'un autre s'occupe d'une tâche. La matrice rend visible qui fait quoi, évite les oublis et les doublons, et permet aux parents de savoir quand ils sont consultés et quand ils sont seulement informés.

Corrigé – Exercice 8.10

1. Faiblesses : article 1, objet flou (aucune action, aucune période) ; article 2, logo sur les fiches recettes et recettes imposées avec la marque du distributeur : c'est de la publicité auprès de mineurs et une perte d'indépendance ; article 3, engagement vague (quelles denrées, quelle quantité, quel montant ?) ; article 4, transmission de données personnelles de mineurs à des fins commerciales, contraire au RGPD et à l'éthique ; article 5, durée illimitée, sans possibilité de sortie.

2. Article 1 : « La présente convention définit les modalités du soutien du supermarché au cycle de six ateliers "cuisiner à 15 ans" organisé par la MJC des Rives de janvier à juin 2027. » Article 3 : « Le supermarché fournit gratuitement les denrées des six ateliers, dans la limite de 60 € par atelier, selon la liste transmise par la MJC une semaine avant chaque atelier. Le choix des recettes et des produits reste de la seule responsabilité de la MJC. » Article 4 : « Aucune donnée personnelle des participants n'est transmise au supermarché. La MJC transmet un bilan agrégé et anonyme du cycle. »

3. Il manque : la communication (mention sobre du soutien, par exemple « avec le soutien de… » sur l'affiche, jamais sur les supports éducatifs, validation commune) ; le suivi et l'évaluation (point à mi-parcours, bilan) ; la modification et la résiliation (avenant, préavis) ; les signatures des représentants légaux.

4. Non : le partenariat avec un commerce local peut être utile (accès aux produits, ancrage dans le quartier). La directrice doit en revanche refuser ce texte et proposer une convention qui protège l'indépendance pédagogique et les données des jeunes. Si le supermarché refuse ces conditions, elle renonce au partenariat.

Corrigé – Exercice 8.11

1. Apports : pour le chef, la reconnaissance de son savoir-faire (il co-anime et crée les recettes), moins de légumes jetés (31 % aujourd'hui), un travail valorisé auprès des salariés ; pour le prestataire, un argument pour reconquérir des couverts (− 8 % en un an), une image d'entreprise engagée, des économies sur les denrées jetées.

2. Temps : 2 × 1,5 + 3 × 1 + 4 × 2 = 3 + 3 + 8 = **14 heures** ; valorisation : 14 × 27 = **378 €**. Si le prestataire ne facture pas ce temps, c'est une **contribution volontaire en nature** : 378 € au **compte 86** (emplois, côté charges) et 378 € au **compte 87** (contributions, côté produits).

3. Les 420 repas correspondent à la situation actuelle après une perte de 8 % : les repas d'il y a un an étaient

420 / 0,92 = 456,5, soit environ **457 repas** ; perte : 457 − 420 = **37 couverts par jour** (36,5 arrondi). Sur une semaine de 5 jours : 36,5 × 5 = 182,6, soit environ **183 repas**. On accepte aussi le calcul simplifié 420 × 0,08 = 33,6, soit 34 couverts par jour et 168 par semaine, s'il est expliqué.

4. Exemple : « Merci de me recevoir. Je ne viens pas juger votre cuisine : je viens vous demander votre aide, parce que vous connaissez mieux que personne ce que les salariés mangent et ce qu'ils laissent. Nous aimerions construire avec vous quelques recettes de légumes qui reviennent moins sur les plateaux. »
5. Exemples : le service de santé au travail s'engage à présenter le chef comme co-auteur des recettes et à financer les supports de dégustation ; le prestataire s'engage à proposer les quatre recettes au menu au moins une fois par mois et à transmettre le relevé des retours de plateaux chaque mois.

Corrigé – Exercice 8.12

1. Taux de présence : 25 / 36 × 100 = **69,4 %**. Il est inférieur à l'objectif de 80 % (écart de 10,6 points). Les abandons liés à l'horaire de 14 h expliquent une partie de l'écart ; le passage au samedi matin répond à cette cause.
2. Avancement : 3 ateliers sur 6, soit 50 %. Budget consommé : 820 / 2 000 × 100 = **41 %**. La consommation est inférieure à l'avancement : il reste 2 000 − 820 = **1 180 €** pour la seconde moitié, ce qui laisse une marge, par exemple pour louer une autre cuisine.
3. Compte rendu (exemple) :

Comité de pilotage du projet « Prévenir le diabète en cuisinant » – MSP de la Haute-Sorne – jeudi 14 janvier 2027, 18 h – 19 h 30.

Présents : Dr Mallet (médecin coordinateur), Mme Bataille (infirmière Asalée), M. Ortiz (diététicien), Mme Leroux (patiente représentante), la stagiaire en diététique (rédactrice). Excusées : Mme Faure (pharmacienne), Mme Henri (chargée de mission du contrat local de santé).

Points abordés : 1. Avancement : 3 ateliers sur 6 réalisés. 2. Participation : 25 présences sur 36 possibles (69,4 %, objectif 80 %) ; deux patients ont arrêté à cause de l'horaire. 3. Budget : 820 € consommés sur 2 000 € (41 %). 4. Logistique : la cuisine du lycée hôtelier n'est plus disponible en mars. 5. Avis des patients : demande d'un atelier le samedi ; fiche « étiquettes » difficile à lire.

Décisions : les ateliers 4 à 6 auront lieu le samedi de 10 h à 12 h 30 ; la fiche « étiquettes » est réimprimée en grands caractères.

Action	Responsable	Échéance
Rappeler les patients absents	Mme Bataille	21 janvier 2027
Réimprimer la fiche « étiquettes » en grands caractères	La stagiaire	28 janvier 2027
Relire la nouvelle fiche	Mme Leroux	28 janvier 2027
Trouver une autre cuisine pour mars	M. Ortiz	31 janvier 2027

Prochaine réunion : jeudi 6 mai 2027, 18 h, salle de réunion de la MSP (bilan final).

4. À tous les membres du comité, présents **et excusés** (Mme Faure et Mme Henri doivent connaître les décisions), dans les **48 heures**, après relecture rapide par le médecin coordinateur.
5. Elle apporte le point de vue des patients (horaires, lisibilité des documents), que les professionnels n'avaient pas vu ; ses propositions ont conduit à deux décisions. Sa présence rend le projet plus acceptable et applique le principe de participation des personnes concernées.

Partie 3 – Les financements et les appels à projets

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les étapes de la réponse à un appel à projets.
- Associer un projet au financeur adapté.
- Lire un cahier des charges : éligibilité, exclusions, plafond, taux.
- Calculer une subvention et construire un plan de financement qui respecte les règles de plusieurs financeurs.
- Utiliser une grille de sélection comme un membre de comité.
- Relire un dossier de demande et repérer ses incohérences.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Appel à projets : un financeur fixe dans un cahier des charges ses priorités, ses publics, ses critères d'éligibilité et de sélection, son calendrier et son montant ; les porteurs déposent un dossier ; un comité choisit selon une grille ; le porteur retenu rend un bilan.
- Sept étapes : lire le cahier des charges ; vérifier l'éligibilité ; faire correspondre le projet aux priorités ; rédiger ; remplir le formulaire (souvent le Cerfa n° 12156 ou Le Compte Asso) ; faire relire ; déposer avant la date limite.
- Financeurs : ARS (fonds d'intervention régional, article L. 1435-8 du Code de la santé publique) ; collectivités ; CAF ; conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (loi du 28 décembre 2015) pour les 60 ans et plus ; Assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite ; fondations ; État (politique de la ville).
- Subvention = minimum (plafond ; taux × assiette). L'assiette est la base de calcul fixée par le financeur (souvent les dépenses éligibles, hors contributions en nature).
- Un financeur ne finance presque jamais 100 % : on montre un cofinancement et on distingue les financements acquis et sollicités.

Exercice 8.13 – Les étapes de la réponse à un appel à projets (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Jardins de la Combe (fictive) découvre le 1er février 2027 un appel à projets dont la date limite est le lundi 15 mars 2027 à midi. Le trésorier a noté en désordre ce qu'il faut faire.

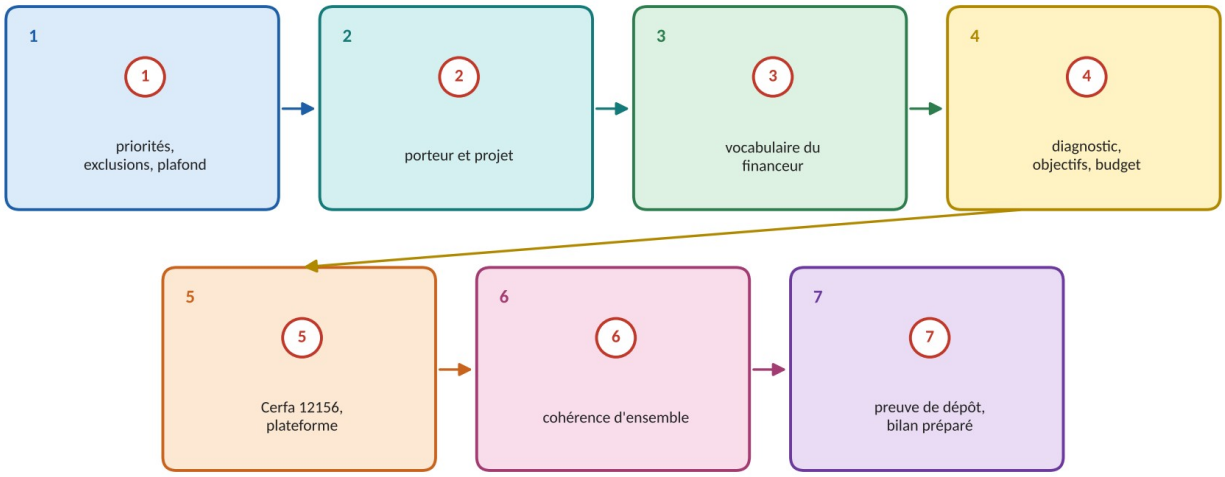


Figure 8.5 – Document 1 – Répondre à un appel à projets en sept étapes (schéma à légender)

Document 2 – Les notes du trésorier, en désordre

a) Demander à la présidente et au partenaire de relire le dossier.

b) Vérifier que l'association est déclarée, qu'elle a un numéro SIRET et un compte bancaire.

c) Créer le compte de l'association sur la plateforme et saisir le formulaire.

d) Déposer le dossier et enregistrer l'accusé de réception.

e) Lire tout le cahier des charges et surligner les actions exclues.

f) Rédiger le diagnostic, les objectifs, les actions et le budget.

g) Reprendre les mots du financeur : « publics prioritaires », « réduction des inégalités ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Remettez les notes du document 2 dans l'ordre des sept étapes. (3,5 pts)
3. Proposez une date de dépôt et justifiez-la. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi il faut préparer le bilan dès le dépôt du dossier. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.14 – Qui finance quoi ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion du réseau des diététiciens de prévention d'un département, chacun présente un projet en recherche de financement. Vous devez proposer, pour chaque projet, le financeur le plus adapté.

Document 1 – Huit projets en recherche de financement

a) Des ateliers « bien manger après 70 ans » dans trois résidences autonomie.

b) Des ateliers parents-enfants dans un centre social, dans le cadre de l'animation collective familles.

c) Un programme de prévention de l'obésité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, inscrit dans le contrat de ville.

d) Des actions de nutrition pour des personnes en situation de précarité, inscrites dans le projet régional de santé.

e) L'amélioration des menus de la restauration scolaire d'une commune.

f) Un projet innovant de cuisine mobile pour les zones rurales isolées.

g) Des ateliers « retraite active et alimentation » pour des retraités du régime général qui vivent à domicile.

h) Un programme d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques, déclaré à l'ARS.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez un financeur pour chaque projet et justifiez en une ligne. (8 pts)
2. Pour le projet f), citez une précaution à prendre si le financeur est une fondation d'entreprise. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.15 – Lire un cahier des charges (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le conseil départemental de Brenne-et-Loir (collectivité fictive) publie un appel à projets « Bien manger en Brenne-et-Loir 2027 ». La date limite de dépôt est le 31 mars 2027. Vous aidez une animatrice territoriale de santé à analyser cinq projets avant de conseiller leurs porteurs.

Document 1 – Extraits du cahier des charges (fictif)

- Porteurs éligibles : associations déclarées depuis au moins un an à la date limite de dépôt ; communes ; CCAS.
- Publics prioritaires : familles avec au moins un enfant de moins de 6 ans ; personnes de 60 ans et plus vivant à domicile.
- Actions éligibles : actions collectives d'éducation pour la santé, actions sur l'environnement alimentaire.
- Actions exclues : consultations individuelles ; distribution de denrées seule ; investissements de plus de 500 € par équipement.
- Durée : 12 mois au plus.
- Montant : 50 % au plus des dépenses éligibles (dépenses monétaires hors investissements exclus), dans la limite de 4 000 € par projet.

Document 2 – Cinq projets

Projet	Porteur	Contenu	Durée	Budget total (dont contributions en nature)
P1	Association créée en 2019	8 ateliers parents-enfants de moins de 6 ans	10 mois	7 200 € (900 €)
P2	Association créée en mai 2026	Ateliers culinaires pour des seniors à domicile	9 mois	5 000 € (400 €)
P3	CCAS	Consultations diététiques individuelles pour les plus de 60 ans	12 mois	6 000 € (0 €)
P4	Commune	Jardins partagés et ateliers pour les familles	18 mois	8 500 € (1 200 €)
P5	Association créée en 2010	Ateliers dans un club de seniors, dont l'achat d'un four à 650 €	12 mois	11 000 € (1 000 €)

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque projet est éligible, et justifiez. (5 pts)

2. Calculez la subvention maximale du projet P1. (2 pts)

3. Calculez la subvention maximale du projet P5, en tenant compte de l'achat du four. (3 pts)

4. Proposez un conseil au porteur du projet P4 pour qu'il puisse déposer un dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.16 – Construire un plan de financement (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Âge d'Or en Cuisine (fictive) prépare huit ateliers « bien manger chez soi » pour 15 personnes de plus de 60 ans vivant à domicile. Le coût total du projet est de 9 600 €, dont 1 200 € de contributions en nature (bénévolat et salle prêtée). Vous construisez le plan de financement.

Document 1 – Règles des financeurs (fictives)

- Conférence des financeurs : 60 % au plus des charges monétaires, dans la limite de 5 000 €.
- Caisse de retraite : 1 500 € au plus.
- Commune : 1 000 €, déjà accordés (financement acquis).
- Participation des personnes : 2 € par atelier et par personne.
- Exigence de la conférence des financeurs : l'autofinancement de l'association doit représenter au moins 10 % des charges monétaires.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les charges monétaires du projet. (1 pt)
2. Calculez la subvention maximale de la conférence des financeurs et la participation totale des personnes. (2 pts)
3. Si l'on demande le maximum à chaque financeur, calculez l'autofinancement nécessaire et vérifiez la règle des 10 %. (3 pts)
4. Proposez un plan de financement équilibré qui respecte toutes les règles, sous forme de tableau, contributions en nature comprises. (4 pts)
5. Indiquez quels financements sont acquis et lesquels sont sollicités, et pourquoi il faut le préciser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.17 – Évaluer des dossiers avec une grille de sélection (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice siège au comité de sélection d'un appel à projets intercommunal (fictif) doté de 8 000 €. Elle vous demande de préparer la notation de trois dossiers. Chaque critère est noté de 0 à 4 ; les points obtenus sont égaux au poids × note / 4. Un dossier doit obtenir au moins 60 points sur 100 pour être financé.

Document 1 – Grille et notes proposées

Critère	Poids	Dossier X	Dossier Y	Dossier Z
Diagnostic chiffré et sourcé	20	3	4	2
Objectifs SMART reliés aux constats	15	2	4	1
Public prioritaire	15	4	2	3
Qualité et cohérence des actions	20	3	3	2
Partenariats engagés	10	2	4	1
Évaluation prévue	10	1	3	0
Budget équilibré et cofinancé	10	3	2	2

Document 2 – Montants demandés

Dossier X : 3 500 € (familles en quartier prioritaire). Dossier Y : 4 000 € (salariés d'une zone d'activités). Dossier Z : 3 000 € (jeunes d'un foyer rural).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de points de chaque dossier, critère par critère, puis le total. (5 pts)
2. Indiquez les dossiers qui peuvent être financés et vérifiez l'enveloppe. (2 pts)
3. Le dossier X touche le public le plus prioritaire mais prévoit mal son évaluation. Rédigez le conseil que le comité peut lui adresser. (2 pts)
4. Rédigez deux conseils au porteur du dossier Z pour un prochain dépôt. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.18 – Relire un dossier de demande de subvention (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue a rédigé la réponse de l'association Tables Ouvertes (fictive) à un appel à projets de l'ARS (fictif) dont le plafond est de 3 500 € par projet. Le public prioritaire de l'appel à projets est : « personnes en situation de précarité ». Elle vous demande une relecture critique avant le dépôt.

Document 1 – Extraits du dossier

Contexte : « Beaucoup de personnes ont du mal à bien manger dans notre ville. »

Public : « Tout public. »

Objectif : « Sensibiliser la population à l'équilibre alimentaire. »

Actions : « Six ateliers de cuisine et une conférence. »

Évaluation : « Un questionnaire de satisfaction. »

Calendrier : « De janvier 2027 à juin 2028. »

Document 2 – Budget prévisionnel du dossier

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Achats (denrées, petit matériel)	1 240 €	74 – Subvention ARS sollicitée	4 000 €
62 – Honoraires d'une diététicienne	2 100 €	74 – Commune (acquise)	1 500 €
64 – Personnel (coordination)	3 600 €	70 – Participation des personnes	300 €
86 – Bénévolat valorisé	800 €	87 – Bénévolat valorisé	600 €
		Autofinancement	1 140 €
Total	7 740 €	Total	7 540 €

Phrase du dossier : « La subvention ARS représente 45 % du budget total. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez les faiblesses du texte (document 1) et proposez une correction pour chacune. (6 pts)
2. Vérifiez le budget : totaux, équilibre, comptes 86 et 87. (3 pts)
3. Calculez la part réelle de la subvention de l'ARS dans le budget et comparez-la au plafond. (3 pts)
4. Proposez un budget corrigé, équilibré, qui respecte le plafond, sans changer les charges. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 8.13

1. Légendes : 1 Lire le cahier des charges ; 2 Vérifier l'éligibilité ; 3 Faire correspondre ; 4 Rédiger ; 5 Remplir le formulaire ; 6 Faire relire ; 7 Déposer avant la date.
2. Ordre : e) lire le cahier des charges → b) vérifier l'éligibilité → g) reprendre les mots du financeur → f) rédiger → c) saisir le formulaire sur la plateforme → a) faire relire → d) déposer et garder l'accusé de réception.
3. Exemple : déposer le **mercredi 10 mars 2027**, soit quelques jours avant la date limite, pour faire face à une panne de la plateforme, à une pièce manquante (relevé d'identité bancaire, statuts) ou à une signature en retard. Un dépôt le dernier jour expose au refus si un incident survient.
4. Le financeur demandera un bilan (compte rendu d'activité et compte rendu financier) avec les indicateurs annoncés dans le dossier. Si l'on ne recueille pas les données dès le début (présences, questionnaires « avant »), on ne pourra pas les reconstituer à la fin.

Corrigé – Exercice 8.14

1. Propositions :

Projet	Financeur	Justification
a) Ateliers en résidences autonomie	Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie	Prévention pour les 60 ans et plus (loi du 28 décembre 2015) ; les résidences autonomie en relèvent
b) Ateliers parents-enfants	CAF	Animation collective familles des centres sociaux, soutien à la parentalité
c) Quartier prioritaire	État (crédits de la politique de la ville) et commune	Action inscrite dans le contrat de ville
d) Nutrition et précarité	ARS (fonds d'intervention régional)	Prévention conforme au projet régional de santé, publics prioritaires
e) Menus de la cantine	Commune	La restauration scolaire du premier degré relève de la commune
f) Cuisine mobile en zone rurale	Fondation, ou programme européen de développement rural	Projet innovant ; les fondations financent souvent l'innovation
g) Retraités du régime général	Caisse de retraite (action sociale)	Prévention « bien vieillir » pour ses retraités à domicile
h) Éducation thérapeutique	ARS	Depuis le décret du 31 décembre 2020, les programmes d'ETP sont déclarés à l'ARS ; ils peuvent être financés par le fonds d'intervention régional

2. Vérifier l'absence de **conflit d'intérêts** : la fondation ne doit pas imposer ses produits, son logo sur les supports éducatifs ou ses messages ; prévoir une convention qui garantit l'indépendance du contenu et la transparence du financement (chapitre 6).

Corrigé – Exercice 8.15

1. P1 : **éligible** (association de plus d'un an, public prioritaire des familles avec enfants de moins de 6 ans, action collective, 10 mois). P2 : **non éligible** : l'association a été créée en mai 2026, elle aura moins d'un an au 31 mars 2027. P3 : **non éligible** : les consultations individuelles sont exclues. P4 : **non éligible en l'état** : 18 mois dépasse la durée maximale de 12 mois. P5 : **éligible**, mais l'achat du four (650 €, plus de 500 €) est exclu des dépenses éligibles.

2. P1 : dépenses éligibles = 7 200 − 900 = **6 300 €** ; 50 % × 6 300 = **3 150 €** ; inférieur au plafond de 4 000 € : subvention maximale **3 150 €**.

3. P5 : dépenses éligibles = 11 000 − 1 000 − 650 = **9 350 €** ; 50 % × 9 350 = **4 675 €** ; supérieur au plafond : subvention maximale **4 000 €**. Le four doit être financé autrement (fonds propres, autre financeur).

4. Découper le projet : déposer une première phase de 12 mois au plus (par exemple la création des jardins et les ateliers de la première saison), puis une seconde phase l'année suivante ; ou réduire la durée du projet à 12 mois.

Corrigé – Exercice 8.16

1. Charges monétaires : 9 600 − 1 200 = **8 400 €**.

2. Conférence des financeurs : 60 % × 8 400 = 5 040 €, supérieur au plafond : **5 000 €**. Participation : 2 € × 8 ateliers × 15 personnes = **240 €**.

3. Financements maximaux : 5 000 + 1 500 + 1 000 + 240 = **7 740 €** ; autofinancement nécessaire : 8 400 − 7 740 = **660 €**, soit 660 / 8 400 × 100 = **7,9 %** : la règle des 10 % **n'est pas respectée**. Il faut au moins 10 % × 8 400 = **840 €** d'autofinancement.

4. On porte l'autofinancement à 840 € et l'on réduit d'autant la demande à la caisse de retraite : 8 400 − 5 000 − 1 000 − 240 − 840 = **1 320 €**.

Produits	Montant	Statut
74 – Conférence des financeurs	5 000 €	Sollicité
74 – Caisse de retraite	1 320 €	Sollicité
74 – Commune	1 000 €	Acquis
70 – Participation des personnes	240 €	Prévu
Autofinancement de l'association	840 €	Acquis
87 – Contributions volontaires en nature	1 200 €	Prévu
Total	**9 600 €**	

Vérification : 5 000 + 1 320 + 1 000 + 240 + 840 = 8 400 € de produits monétaires, plus 1 200 € de contributions en nature (comptes 86 et 87 égaux) = 9 600 €, égal aux charges.

5. Acquis : la commune (déjà accordée) et l'autofinancement. Sollicités : la conférence des financeurs et la caisse de retraite. Le financeur doit savoir ce qui est certain et ce qui dépend d'autres décisions ; si une demande est refusée, le projet devra être réduit ou financé autrement. C'est une règle de **prudence**.

Corrigé – Exercice 8.17

1. Points (poids × note / 4) :

Critère	X	Y	Z
Diagnostic (20)	15	20	10
Objectifs (15)	7,5	15	3,75
Public prioritaire (15)	15	7,5	11,25
Actions (20)	15	15	10
Partenariats (10)	5	10	2,5
Évaluation (10)	2,5	7,5	0
Budget (10)	7,5	5	5
Total	**67,5**	**80**	**42,5**

2. X (67,5) et Y (80) dépassent le seuil de 60 points ; Z (42,5) ne l'atteint pas. Enveloppe : 3 500 + 4 000 = **7 500 €** ≤ 8 000 € : les deux dossiers peuvent être financés ; il reste 500 €.

3. Exemple : « Le comité retient votre projet, qui touche un public prioritaire. Il vous demande de préciser avant le premier versement les indicateurs d'évaluation (présence, questionnaire avant/après sur les pratiques), leurs valeurs cibles et la façon de les recueillir. »

4. Exemples : appuyer le diagnostic sur des données locales chiffrées et datées (enquête auprès des jeunes du foyer, données de la structure) ; rédiger des objectifs SMART reliés aux constats et prévoir des indicateurs d'évaluation ; joindre des lettres d'engagement des partenaires.

Corrigé – Exercice 8.18

1. Faiblesses et corrections :

Élément	Faiblesse	Correction
Contexte	Aucune donnée, aucune source	Données locales chiffrées et datées (Insee, enquête auprès des personnes accueillies)
Public	« Tout public » : ne correspond pas au public prioritaire	Personnes en situation de précarité accueillies par l'association, nombre prévu
Objectif	« Sensibiliser » : verbe flou, non mesurable	Objectifs SMART, par exemple : « Dans 12 mois, 50 % des participants cuisinent un repas à base de légumes au moins deux fois par semaine (valeur initiale à mesurer) »
Actions	Pas de détail ; la conférence convient mal au public	Fiche QQOQCCP de chaque atelier ; remplacer la conférence par une action plus active
Évaluation	Satisfaction seulement	Indicateurs de processus (présence) et de résultats (pratiques avant/après)
Calendrier	18 mois	À vérifier dans le cahier des charges, qui limite souvent la durée à 12 mois

2. Total des charges : 1 240 + 2 100 + 3 600 + 800 = **7 740 €** (exact). Total des produits : 4 000 + 1 500 + 300 + 600 + 1 140 = **7 540 €** (exact). Le budget **n'est pas équilibré** : il manque 200 €. La cause : le compte 87 (600 €) n'est pas égal au compte 86 (800 €).

3. Part réelle : 4 000 / 7 740 × 100 = **51,7 %**, et non 45 %. De plus, 4 000 € **dépasse le plafond** de 3 500 €.

4. Budget corrigé (exemple) : charges inchangées (7 740 €). Produits : ARS 3 500 € ; commune 1 500 € ; participation 300 € ; 87 – bénévolat 800 € ; autofinancement 1 640 €. Total : 3 500 + 1 500 + 300 + 800 + 1 640 = **7 740 €**. Part de l'ARS : 3 500 / 7 740 × 100 = **45,2 %**. Si l'association ne peut pas apporter 1 640 €, elle cherche un autre cofinancement (CAF, fondation) ou réduit les charges.

Partie 4 – Planifier le projet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Lire une tâche du réseau PERT et calculer les dates au plus tôt, au plus tard et les marges.
- Construire un diagramme de Gantt avec des jalons et des contraintes de calendrier.
- Trouver le chemin critique d'un projet et la durée minimale.
- Mesurer l'effet d'un retard et décider d'un ajustement.
- Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps.
- Fixer des dates réelles en tenant compte des contraintes du public et des lieux.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diagramme de Gantt (Henry Gantt, vers 1910) : les tâches en lignes, le temps en colonnes ; chaque tâche est une barre ; on ajoute les jalons (dates clés) et les dépendances.
- Réseau PERT (1958) : il représente les tâches et leurs antériorités. Calcul aller : début au plus tôt d'une tâche = maximum des fins au plus tôt des tâches qui la précèdent. Calcul retour : fin au plus tard = minimum des débuts au plus tard des tâches qui la suivent.
- Marge = début au plus tard − début au plus tôt. Chemin critique : suite des tâches de marge nulle ; sa durée est la durée minimale du projet.
- Un retard sur une tâche critique retarde tout le projet ; un retard sur une tâche qui a une marge n'a d'effet que s'il dépasse la marge.
- Marge de sécurité : 10 à 20 % sur les tâches qui dépendent d'autres personnes ; dépôt d'un dossier quelques jours avant la date limite.

Exercice 8.19 – Lire une tâche du réseau PERT (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer un projet court dans une association de quartier (fictive), votre tutrice vous demande de maîtriser la lecture d'une tâche PERT, puis de calculer un petit réseau.

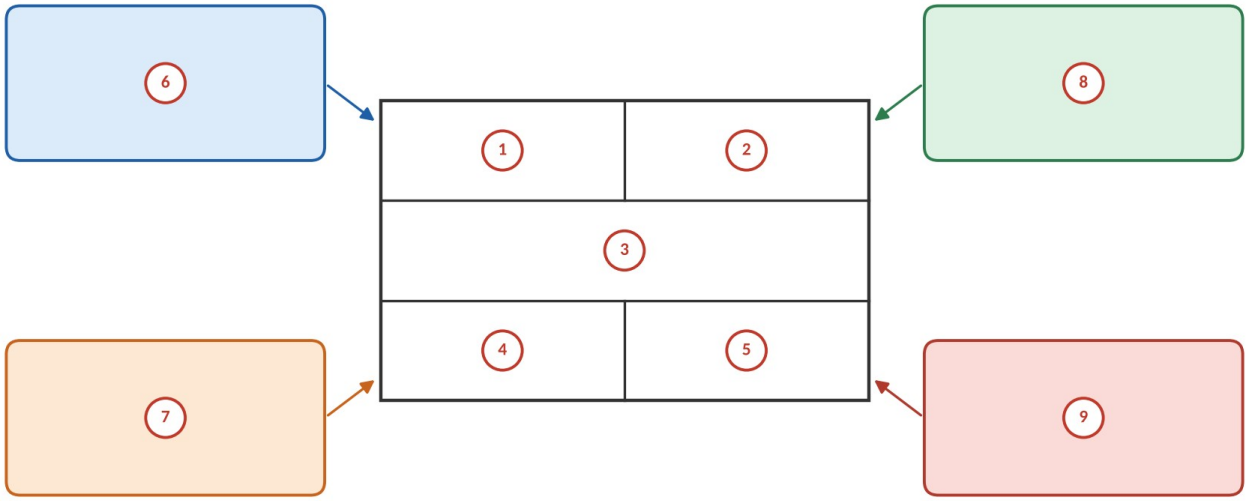


Figure 8.6 – Document 1 – Lire une tâche du réseau PERT (schéma à légender)

Document 2 – Un petit projet de cinq tâches (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Réunion de lancement	1	–
B	Conception des ateliers	4	A
C	Réservation de la salle et du matériel	2	A
D	Trois ateliers	3	B, C
E	Commande des fiches recettes imprimées	2	C

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)

2. Calculez les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche du document 2. (3 pts)

3. Calculez les marges, donnez le chemin critique et la durée minimale du projet. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.20 – Construire un diagramme de Gantt (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de santé communautaire du Mail (structure fictive) prépare un cycle de cinq ateliers hebdomadaires « marcher et cuisiner ». Le projet commence la semaine 1. Le centre est fermé la semaine 10 (congés du personnel). Le comité de pilotage de bilan doit se réunir au plus tard la semaine 15.

Document 1 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic complémentaire	2	–
B	Conception des ateliers	2	A
C	Réservation de la salle et du matériel	1	A
D	Communication et inscriptions	3	B
E	Achat du petit matériel	1	C
F	Cinq ateliers, un par semaine	5	D, E
G	Évaluation et bilan	2	F

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez pour chaque tâche la semaine de début et la semaine de fin, sans tenir compte de la fermeture. (3 pts)
2. Construisez le diagramme de Gantt sur 15 semaines en tenant compte de la fermeture de la semaine 10. (3 pts)
3. Placez trois jalons sur le diagramme. (2 pts)
4. Le comité de bilan peut-il se réunir la semaine 15 ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.21 – Calculer un réseau PERT complet (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Bocal et Compagnie (fictive) monte une épicerie itinérante qui proposera aussi des ateliers culinaires dans six villages. Le projet commence à la semaine 0. Vous devez calculer sa durée et repérer les tâches à surveiller.

Document 1 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Diagnostic dans les six villages	3	–
B	Choix des actions	1	A
C	Dossier de financement	2	B
D	Recherche de partenaires (mairies, producteurs)	3	A
E	Conception des ateliers	3	B
F	Formation des bénévoles	2	D, E
G	Communication dans les villages	1	C, E
H	Tournée et ateliers	8	F, G
I	Évaluation et bilan	2	H

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les dates de début et de fin au plus tôt de chaque tâche. (4 pts)
2. Calculez les dates de début et de fin au plus tard. (3 pts)
3. Calculez les marges, donnez le chemin critique et la durée minimale du projet. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi le dossier de financement (C) n'est pas critique, et pourquoi il faut pourtant le surveiller. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.22 – Mesurer l'effet d'un retard (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Reprenez le réseau de l'exercice 8.21 (durée minimale : 19 semaines). Au cours du projet, plusieurs incidents sont envisagés. On les étudie un par un.

Document 1 – Quatre incidents possibles

- Incident 1 : la recherche de partenaires (D) prend 5 semaines au lieu de 3, car deux mairies tardent à répondre.
- Incident 2 : le dossier de financement (C) prend 4 semaines au lieu de 2.
- Incident 3 : la formation des bénévoles (F) prend 3 semaines au lieu de 2.
- Incident 4 : la communication (G) prend 2 semaines au lieu de 1.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, calculez la nouvelle durée du projet. (6 pts)

2. Pour l'incident 1, donnez le nouveau chemin critique. (2 pts)

3. Pour l'incident 2, expliquez ce qui change dans le réseau même si la durée du projet ne change pas. (2 pts)

4. Proposez une mesure pour éviter l'incident 1. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.23 – Estimer la charge de travail et suivre une feuille de temps (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La conseillère en économie sociale et familiale (CESF) d'un centre social (fictif) anime un cycle de six ateliers culinaires. Son employeur lui demande d'estimer le temps qu'elle y consacrera, puis de le comparer au temps réel. Son coût horaire chargé, communiqué par l'employeur, est de 23 €.

Document 1 – Estimation de la charge de travail

Tâche	Base de calcul
Préparation (conducteur, fiches)	3 h par atelier
Achats	1 h par atelier
Animation	2 h 30 par atelier
Rangement et bilan à chaud	30 min par atelier
Réunions du comité technique	3 réunions d'1 h 30
Communication et inscriptions	6 h au total
Évaluation et bilan écrit	8 h au total

Document 2 – Feuille de temps réelle à la fin du cycle

Total des heures notées par la CESF : 72 heures. Elle signale que les inscriptions ont demandé de nombreux appels téléphoniques et que deux fiches recettes ont été réécrites en facile à lire et à comprendre (FALC).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures prévues pour chaque tâche et le total. (4 pts)
2. Calculez le coût prévu et le coût réel du temps de la CESF. (2 pts)
3. Calculez l'écart en heures et en pourcentage, et interprétez-le. (3 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'une feuille de temps pour le prochain projet et pour le bilan financier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.24 – Fixer les dates réelles d'un cycle d'ateliers (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social des Hauts-Prés (fictif) prépare six ateliers hebdomadaires « cuisiner en famille », le mardi de 14 h à 16 h 30, pour des mères de famille du quartier. Le comité de pilotage de bilan est fixé au mardi 1er juin 2027 ; l'évaluation demande une semaine après le dernier atelier. Vous devez proposer les dates.

Document 1 – Contraintes recueillies

- Les ateliers peuvent commencer à partir du mardi 2 mars 2027.
- Plusieurs participantes jeûnent pendant le mois de Ramadan, attendu du 8 février au 9 mars 2027 environ ; elles souhaitent que le cycle commence après.
- La cuisine est réservée pour une formation le mardi 6 avril 2027.
- Le centre social est fermé du lundi 19 au vendredi 30 avril 2027 (congés du personnel, dates fictives).
- Les participantes demandent que les ateliers se suivent, sans plus de deux semaines d'interruption.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez les six dates du cycle et justifiez chacune. (5 pts)
2. Vérifiez que le calendrier permet l'évaluation avant le comité de bilan. (2 pts)
3. Identifiez l'interruption la plus longue et proposez une action pour garder le lien avec les participantes pendant cette période. (3 pts)
4. Construisez un rétroplanning des tâches de préparation, en partant du premier atelier. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi le calendrier doit être construit avec les participantes plutôt que pour elles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 8.19

1. Légendes : 1 Début au plus tôt ; 2 Fin au plus tôt ; 3 Tâche et durée ; 4 Début au plus tard ; 5 Fin au plus tard ; 6 Calcul aller : on prend le maximum des fins ; 7 Calcul retour : on prend le minimum des débuts ; 8 Marge = début au plus tard − début au plus tôt ; 9 Chemin critique : tâches de marge nulle.

2. et 3. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (1)	0	1	0	1	0
B (4)	1	5	1	5	0
C (2)	1	3	3	5	2
D (3)	max(5 ; 3) = 5	8	5	8	0
E (2)	3	5	6	8	3

Calcul retour : D et E finissent au plus tard à 8 ; C doit finir avant le début au plus tard de D (5) et de E (6) : minimum = 5. A doit finir avant le début au plus tard de B (1) et de C (3) : minimum = 1. Chemin critique : **A → B → D**, durée minimale **8 semaines** (1 + 4 + 3). C a une marge de 2 semaines, E de 3 semaines.

Corrigé – Exercice 8.20

1. A : semaines 1 à 2. B : 3 à 4. C : semaine 3. D : 5 à 7 (après B). E : semaine 4 (après C). F : 8 à 12 (après D, qui finit en semaine 7, et E). G : 13 à 14.

2. Avec la fermeture de la semaine 10, les ateliers ont lieu les semaines 8, 9, 11, 12 et 13 ; l'évaluation se fait les semaines 14 et 15.

Tâche	Semaines occupées
A – Diagnostic	1, 2
B – Conception	3, 4
C – Réservation	3
D – Communication	5, 6, 7
E – Achat du matériel	4 (marge jusqu'à la semaine 7)
F – Ateliers	8, 9, (fermeture en 10), 11, 12, 13
G – Évaluation	14, 15

3. Exemples de jalons : fin de la semaine 4, « ateliers conçus et validés » ; fin de la semaine 7, « inscriptions closes » ; fin de la semaine 13, « fin des ateliers » ; fin de la semaine 15, « comité de bilan ».

4. Oui, mais **sans aucune marge** : l'évaluation se termine en fin de semaine 15. Le comité doit se réunir à la fin de la semaine 15 ; le moindre retard d'une tâche critique (A, B, D, F, G) le reporterait. Il faut surveiller ces tâches ou prévoir de présenter un bilan provisoire.

Corrigé – Exercice 8.21

1. à 3. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (3)	0	3	0	3	0
B (1)	3	4	3	4	0
C (2)	4	6	6	8	2

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
D (3)	3	6	4	7	1
E (3)	4	7	4	7	0
F (2)	max(6 ; 7) = 7	9	7	9	0
G (1)	max(6 ; 7) = 7	8	8	9	1
H (8)	max(9 ; 8) = 9	17	9	17	0
I (2)	17	19	17	19	0

Calcul retour (exemples) : H commence au plus tard à 17 − 8 = 9 ; F et G doivent finir à 9 ; E doit finir avant le début au plus tard de F (7) et de G (8) : minimum = 7 ; B doit finir avant le début au plus tard de C (6) et de E (4) : minimum = 4 ; A doit finir avant le début au plus tard de B (3) et de D (4) : minimum = 3.

Chemin critique : **A → B → E → F → H → I**, soit 3 + 1 + 3 + 2 + 8 + 2 = **19 semaines**.

4. C a une marge de 2 semaines : il peut glisser de 2 semaines sans retarder le projet. Mais un dossier de financement dépend d'une date limite fixée par le financeur et d'une réponse qui conditionne les achats et la trésorerie : un retard au-delà de la marge, ou un refus, compromettrait toute la tournée. On le surveille donc comme une tâche à risque.

Corrigé – Exercice 8.22

1. Incident 1 (D = 5) : D finit à 3 + 5 = 8 ; F commence à max(8 ; 7) = 8 et finit à 10 ; H : 10 à 18 ; I : 18 à 20. **Durée : 20 semaines** (+ 1 semaine : la marge de D, 1 semaine, absorbe une partie du retard). Incident 2 (C = 4) : C finit à 8 ; G commence à max(8 ; 7) = 8 et finit à 9 ; H commence toujours à 9. **Durée : 19 semaines** (la marge de C, 2 semaines, absorbe le retard). Incident 3 (F = 3) : F est critique ; F finit à 10 ; **durée : 20 semaines**. Incident 4 (G = 2) : G finit à 9 ; H commence toujours à 9 ; **durée : 19 semaines** (marge de G : 1 semaine).
2. Incident 1 : nouveau chemin critique **A → D → F → H → I** (3 + 5 + 2 + 8 + 2 = 20 semaines). B et E ne sont plus critiques (marge d'une semaine).
3. Incident 2 : la marge de C est entièrement consommée ; C et G deviennent **critiques** (il existe alors un second chemin critique A → B → C → G → H → I de 19 semaines). Le moindre retard supplémentaire sur C ou G retarderait tout le projet.
4. Exemples : contacter les mairies dès la fin du diagnostic, avec un courrier et un rendez-vous fixé à l'avance ; s'appuyer sur un élu relais ; prévoir une relance à date fixe ; démarrer la recherche de partenaires en parallèle de la fin du diagnostic.

Corrigé – Exercice 8.23

1. Préparation : 6 × 3 = **18 h** ; achats : 6 × 1 = **6 h** ; animation : 6 × 2,5 = **15 h** ; rangement : 6 × 0,5 = **3 h** ; réunions : 3 × 1,5 = **4,5 h** ; communication : **6 h** ; évaluation : **8 h**. Total : 18 + 6 + 15 + 3 + 4,5 + 6 + 8 = **60,5 heures**.
2. Coût prévu : 60,5 × 23 = **1 391,50 €** ; coût réel : 72 × 23 = **1 656,00 €**.
3. Écart : 72 − 60,5 = **+ 11,5 heures**, soit 11,5 / 60,5 × 100 = **+ 19,0 %** (264,50 € de plus). Le temps a été sous-estimé, surtout pour les inscriptions (appels téléphoniques) et pour l'adaptation des fiches en FALC. Ces tâches sont réelles et utiles ; il faut les prévoir dans le prochain projet.
4. La feuille de temps permet de mieux estimer les prochains projets (on connaît le temps réel par tâche), de justifier les charges de personnel dans le compte rendu financier remis au financeur, et de repérer les tâches qui prennent plus de temps que prévu pour les organiser autrement.

Corrigé – Exercice 8.24

1. Dates proposées : **mardi 16 mars** (premier mardi après la fin du Ramadan, le 9 mars environ ; le 2 et le 9 mars sont exclus) ; **23 mars** ; **30 mars** ; le 6 avril est exclu (formation) ; **13 avril** ; les 20 et 27 avril sont exclus (fermeture du centre) ; **4 mai** ; **11 mai 2027**.

2. Dernier atelier le 11 mai ; évaluation du 12 au 18 mai ; il reste deux semaines avant le comité du 1er juin. Le calendrier convient, avec une marge de deux semaines.

3. L'interruption la plus longue va du 13 avril au 4 mai : trois semaines entre deux ateliers, soit deux mardis sans atelier, ce qui respecte tout juste la demande des participantes. Pour garder le lien : un défi « recette à la maison » donné le 13 avril, avec une photo du plat à partager si elles le souhaitent, et un message de rappel la veille du 4 mai.

4. Rétroplanning (exemple) :

Échéance	Tâche
Semaine du 8 février	Réunion avec trois participantes pour choisir les thèmes et les dates
Semaine du 15 février	Réservation de la cuisine pour les six dates ; vérification du matériel
Semaine du 22 février	Affiches et bouche-à-oreille ; début des inscriptions
Semaine du 1er mars	Conducteurs et fiches recettes des trois premiers ateliers ; recueil des allergies
Vendredi 12 mars	Achats du premier atelier ; confirmation des inscriptions
Lundi 15 mars	Rappel téléphonique aux participantes

5. Les participantes connaissent leurs contraintes (jeûne, enfants, travail, transports) ; un calendrier construit avec elles réduit les absences et montre que leur avis compte. C'est une application du principe de participation et un moyen d'augmenter le taux de présence.

Partie 5 – Construire et suivre le budget

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer des charges et des produits dans les comptes du plan comptable associatif.
- Calculer un coût horaire chargé et le coût du temps affecté au projet.
- Construire un budget prévisionnel équilibré, contributions en nature comprises.
- Calculer et interpréter des ratios d'analyse.
- Calculer des écarts entre le prévu et le réalisé et les expliquer.
- Calculer le coût complet d'un atelier et le nombre minimal de participants.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Plan comptable associatif (règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018) ; formulaire de demande de subvention : Cerfa n° 12156.
- Charges : 60 achats ; 61 services extérieurs (locations, assurances) ; 62 autres services extérieurs (honoraires, publicité et impressions, déplacements) ; 63 impôts et taxes ; 64 charges de personnel ; 86 emplois des contributions volontaires en nature.
- Produits : 70 ventes et participations ; 74 subventions d'exploitation ; 75 cotisations et dons ; 87 contributions volontaires en nature ; l'autofinancement du porteur complète.
- Règles d'or : équilibre (total des charges = total des produits) ; compte 86 = compte 87 ; cofinancement ; cohérence avec les actions ; justification (quantité × coût unitaire) ; prudence (acquis et sollicités).
- Coût horaire chargé = brut mensuel × (1 + taux de charges patronales) / heures mensuelles ; à 35 h par semaine : 35 × 52 / 12 = 151,67 h. On utilise toujours le taux fourni par l'employeur.
- Écart (€) = réalisé − prévu ; écart (%) = écart / prévu × 100. Un écart global inférieur à 5 % est en général jugé satisfaisant ; chaque écart important est expliqué.

Exercice 8.25 – La structure d'un budget prévisionnel (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des familles du Clos-Fleuri (fictive) prépare son premier budget de projet. Le trésorier a listé les lignes, mais ne sait pas où les placer.

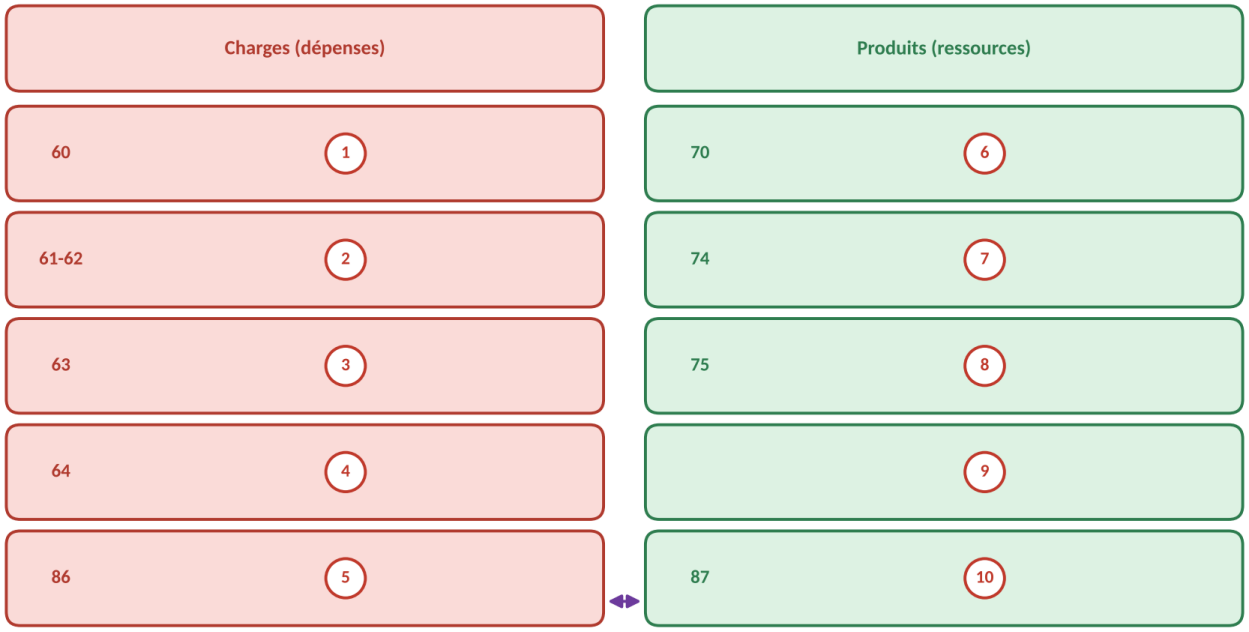


Figure 8.7 – Document 1 – La structure d'un budget prévisionnel associatif (schéma à légender)

Document 2 – Seize lignes à classer

a) Denrées alimentaires des ateliers. b) Petit matériel de cuisine. c) Location d'une salle. d) Assurance de l'activité. e) Impression des affiches. f) Honoraires d'une diététicienne libérale. g) Remboursement des déplacements. h) Salaire brut d'une animatrice. i) Cotisations patronales de cette animatrice. j) Taxe sur les salaires. k) Salle prêtée gratuitement par la mairie (valorisée). l) Heures de bénévolat (valorisées). m) Subvention de la CAF. n) Participation des familles. o) Cotisations des adhérents. p) Don d'un commerçant.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (5,5 pts)
2. Classez les seize lignes du document 2 dans les comptes. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la salle prêtée par la mairie apparaît deux fois dans le budget. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.26 – Calculer un coût horaire chargé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le budget du projet de l'association des familles du Clos-Fleuri, la directrice vous communique les salaires et les taux de charges patronales des trois salariées qui y travailleront (données fictives ; le taux réel dépend des allègements de cotisations de chaque structure).

Document 1 – Salaires et temps affecté au projet

Salariée	Salaire brut mensuel	Taux de charges patronales	Temps de travail	Heures sur le projet
Animatrice	1 950 €	40 %	35 h par semaine	48 h
Coordinatrice	2 600 €	44 %	35 h par semaine	20 h
Agent d'entretien	1 150 €	38 %	24 h par semaine	10 h

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures mensuelles d'un temps plein et du temps partiel de 24 heures. (2 pts)

2. Calculez le coût employeur mensuel et le coût horaire chargé de chaque salariée (au centime). (4,5 pts)

3. Calculez le coût du temps de chaque salariée sur le projet et le total à inscrire au compte 64. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas inscrire le salaire brut seul. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.27 – Construire un budget équilibré (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association des familles du Clos-Fleuri prépare six ateliers de 3 heures pour 12 familles. Vous construisez le budget prévisionnel à partir des éléments réunis par la directrice.

Document 1 – Éléments du budget (fictifs)

- Denrées : 32 € par atelier. Petit matériel : 180 €. Impression des fiches et des affiches : 95 €.
- Diététicienne libérale : 2 h 30 par atelier, honoraires de 55 € de l'heure.
- Animatrice : 48 h à 18,00 € de l'heure. Coordinatrice : 20 h à 24,69 € de l'heure.
- Salle prêtée par la mairie : 3 h par atelier, valorisée à 25 € de l'heure.
- Bénévolat : 3 bénévoles par atelier, 3 h chacun, valorisées à 12 € de l'heure (taux fixé par l'association).
- CAF : 1 500 € (acquis). Commune : 800 € (sollicités). Participation des familles : 1,50 € par famille et par atelier.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque ligne de charges et le total des charges. (4 pts)

2. Calculez les contributions en nature et la participation des familles. (2 pts)

3. Calculez l'autofinancement nécessaire pour équilibrer le budget. (2 pts)

4. Présentez le budget sous forme de tableau équilibré. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.28 – Analyser un budget avec des ratios (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage du projet du Clos-Fleuri veut comprendre le budget construit à l'exercice 8.27 (total : 3 747,80 €, dont 1 098 € de contributions en nature ; personnel : 1 357,80 € ; CAF : 1 500 € ; commune : 800 € ; participation des familles : 108 € ; autofinancement : 241,80 €). Vous préparez des ratios.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de la subvention de la CAF et la part des financements publics dans le budget total. (2 pts)
2. Calculez la part des charges de personnel et la part des contributions en nature. (2 pts)
3. Calculez le coût par famille et le coût par heure d'atelier. (2 pts)
4. Calculez la part de l'autofinancement dans les charges monétaires. (2 pts)
5. Calculez ce que paie une famille pour le cycle, et ce que cela représente du coût par famille. (2 pts)
6. Rédigez l'interprétation de ces ratios pour le comité (5 à 6 lignes). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.29 – Analyser les écarts entre le prévu et le réalisé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le cycle d'ateliers du Clos-Fleuri est terminé. Vous préparez le compte rendu financier pour la CAF et la commune.

Document 1 – Budget prévu et réalisé

Poste	Prévu	Réalisé
Denrées	192,00 €	231,60 €
Petit matériel	180,00 €	154,90 €
Impression	95,00 €	95,00 €
Diététicienne	825,00 €	825,00 €
Animatrice	864,00 €	972,00 €
Coordinatrice	493,80 €	493,80 €
Salle prêtée (contribution en nature)	450,00 €	375,00 €
Bénévolat (contribution en nature)	648,00 €	756,00 €

Document 2 – Notes de la directrice

« Les prix des fruits ont beaucoup augmenté au printemps. On a trouvé une batterie de casseroles en promotion. L'animatrice a fait six heures de plus, pour rappeler les familles absentes et accompagner deux mères au marché. Le dernier atelier a eu lieu dans la cuisine de l'école, prêtée sans frais et non valorisée. Trois mères sont devenues bénévoles et ont aidé à la fin du cycle. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart en euros et en pourcentage pour chaque poste, puis pour le total. (5 pts)
2. Expliquez chaque écart à l'aide du document 2. (3 pts)
3. Calculez l'écart qui touche réellement la trésorerie de l'association (hors contributions en nature) et dites comment il est couvert. (2 pts)
4. Le résultat global est-il satisfaisant ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.30 – Calculer le coût complet d'un atelier et le seuil de participants (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service prévention d'une caisse de retraite (fictive) finance des ateliers « cuisine et convivialité » pour des retraités vivant à domicile. Elle verse à l'association organisatrice un forfait de 20 € par personne présente. Chaque participant paie 3 €. La présidente de l'association vous demande à partir de combien de participants l'atelier couvre ses coûts.

Document 1 – Coûts d'un atelier (fictifs)

- Animatrice : 3 h 30 (préparation, animation, rangement) à 18,00 € de l'heure.
- Diététicienne libérale : 2 h 30 à 55 € de l'heure.
- Location de la salle : 30 € par atelier.
- Denrées : 2,40 € par participant. Fiche recette imprimée : 0,35 € par participant.
- La salle accueille 14 personnes au plus.

À vous de jouer – Questions

1. Distinguez les coûts fixes et les coûts variables, et calculez-les. (3 pts)
2. Calculez le coût par participant pour 6, 8, 10, 12 et 14 participants. Présentez un tableau. (4 pts)
3. Calculez le nombre minimal de participants pour que l'atelier couvre ses coûts. (3 pts)
4. Les ateliers réunissent en moyenne 9 personnes. Calculez la perte par atelier et proposez deux solutions. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi il ne faut pas augmenter fortement la participation demandée aux retraités. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 8.25

1. Légendes : 1 Achats (60) ; 2 Services extérieurs (61-62) ; 3 Impôts et taxes (63) ; 4 Charges de personnel (64) ; 5 Emplois des contributions volontaires en nature (86) ; 6 Ventes, participation des usagers (70) ; 7 Subventions d'exploitation (74) ; 8 Cotisations, dons (75) ; 9 Autofinancement du porteur ; 10 Contributions volontaires en nature (87) ; 11 Total des charges = total des produits ; compte 86 = compte 87.
2. 60 : a), b). 61 : c), d). 62 : e), f), g). 63 : j). 64 : h), i). 86 et 87 : k), l). 74 : m). 70 : n). 75 : o), p).
3. La salle ne coûte rien à l'association, mais elle a une valeur. On l'inscrit en **charge** au compte 86 (on l'utilise) et en **produit** au compte 87 (on la reçoit), pour le même montant. Le budget reste équilibré, et il montre la contribution réelle de la mairie et le vrai coût du projet.

Corrigé – Exercice 8.26

1. Temps plein : 35 × 52 / 12 = **151,67 h** par mois. Temps partiel : 24 × 52 / 12 = **104 h** par mois.
2. Animatrice : 1 950 × 1,40 = **2 730,00 €** ; 2 730 / 151,67 = **18,00 €** de l'heure. Coordinatrice : 2 600 × 1,44 = **3 744,00 €** ; 3 744 / 151,67 = **24,69 €** de l'heure. Agent d'entretien : 1 150 × 1,38 = **1 587,00 €** ; 1 587 / 104 = **15,26 €** de l'heure.
3. Animatrice : 48 × 18,00 = **864,00 €** ; coordinatrice : 20 × 24,69 = **493,80 €** ; agent : 10 × 15,26 = **152,60 €**. Total au compte 64 : 864,00 + 493,80 + 152,60 = **1 510,40 €**.
4. L'employeur paie aussi les cotisations patronales : le coût réel d'une heure est bien supérieur au salaire brut. Inscrire le brut seul sous-estimerait les charges et déséquilibrerait le budget réalisé.

Corrigé – Exercice 8.27

1. Denrées : 6 × 32 = **192,00 €** ; petit matériel : **180,00 €** ; impression : **95,00 €** ; diététicienne : 6 × 2,5 × 55 = **825,00 €** ; animatrice : 48 × 18,00 = **864,00 €** ; coordinatrice : 20 × 24,69 = **493,80 €** ; salle : 6 × 3 × 25 = **450,00 €** ; bénévolat : 3 × 6 × 3 × 12 = **648,00 €**. Total des charges : **3 747,80 €**.
2. Contributions en nature : 450 + 648 = **1 098,00 €**. Participation : 12 × 6 × 1,50 = **108,00 €**.
3. Autofinancement : 3 747,80 − 1 500 − 800 − 108 − 1 098 = **241,80 €**.
4. Budget prévisionnel :

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Denrées	192,00 €	70 – Participation des familles	108,00 €
60 – Petit matériel	180,00 €	74 – CAF (acquis)	1 500,00 €
62 – Impression	95,00 €	74 – Commune (sollicité)	800,00 €
62 – Honoraires de la diététicienne	825,00 €	Autofinancement	241,80 €
64 – Animatrice	864,00 €	87 – Mise à disposition de la salle	450,00 €
64 – Coordinatrice	493,80 €	87 – Bénévolat	648,00 €
86 – Mise à disposition de la salle	450,00 €		
86 – Bénévolat	648,00 €		
Total	**3 747,80 €**	**Total**	**3 747,80 €**

Corrigé – Exercice 8.28

1. CAF : 1 500 / 3 747,80 × 100 = **40,0 %**. Financements publics (CAF et commune) : 2 300 / 3 747,80 × 100 = **61,4 %**.
2. Personnel : 1 357,80 / 3 747,80 × 100 = **36,2 %**. Contributions en nature : 1 098 / 3 747,80 × 100 = **29,3 %**.

3. Coût par famille : 3 747,80 / 12 = **312,32 €**. Coût par heure d'atelier : 3 747,80 / (6 × 3) = 3 747,80 / 18 = **208,21 €**.

4. Charges monétaires : 3 747,80 − 1 098 = 2 649,80 € ; autofinancement : 241,80 / 2 649,80 × 100 = **9,1 %**.

5. Une famille paie 6 × 1,50 = **9 €** pour le cycle, soit 9 / 312,32 × 100 = **2,9 %** du coût par famille.

6. Exemple : « Le projet est financé aux six dixièmes par des fonds publics, dont 40 % par la CAF. Près de 30 % de sa valeur vient de contributions en nature (salle, bénévolat), ce qui montre l'engagement du territoire. Le personnel représente un peu plus d'un tiers du budget, et les honoraires de la diététicienne s'y ajoutent. La participation des familles est symbolique (9 € pour le cycle, moins de 3 % du coût) : elle favorise l'engagement sans exclure. L'autofinancement reste modeste (9,1 % des charges monétaires). »

Corrigé – Exercice 8.29

1. Écarts :

Poste	Prévu	Réalisé	Écart (€)	Écart (%)
Denrées	192,00	231,60	+ 39,60	+ 20,6 %
Petit matériel	180,00	154,90	− 25,10	− 13,9 %
Impression	95,00	95,00	0,00	0,0 %
Diététicienne	825,00	825,00	0,00	0,0 %
Animatrice	864,00	972,00	+ 108,00	+ 12,5 %
Coordinatrice	493,80	493,80	0,00	0,0 %
Salle (nature)	450,00	375,00	− 75,00	− 16,7 %
Bénévolat (nature)	648,00	756,00	+ 108,00	+ 16,7 %
Total	**3 747,80**	**3 903,30**	**+ 155,50**	**+ 4,1 %**

2. Denrées : hausse du prix des fruits au printemps. Petit matériel : achat en promotion. Animatrice : 6 heures de plus (6 × 18 = 108 €) pour rappeler les familles absentes et accompagner deux mères au marché. Salle : un atelier sur six a eu lieu dans la cuisine de l'école, non valorisée (5 × 3 × 25 = 375 €). Bénévolat : 9 heures de plus (108 / 12 = 9 h), grâce aux trois mères devenues bénévoles, ce qui est un signe positif de participation.

3. Écart de trésorerie (hors comptes 86 et 87) : 39,60 − 25,10 + 108,00 = **+ 122,50 €**. Il est couvert par l'autofinancement de l'association, qui passe de 241,80 € à 241,80 + 122,50 = **364,30 €**. Les contributions en nature changent aussi de montant, mais les comptes 86 et 87 restent égaux (375 + 756 = 1 131 €).

4. Oui : l'écart global est de + 4,1 %, inférieur au repère de 5 %. Chaque écart est expliqué ; les dépenses supplémentaires de personnel ont servi la participation (rappels, accompagnement au marché). Il faudra prévoir une marge sur les denrées et du temps pour les rappels dans le prochain budget.

Corrigé – Exercice 8.30

1. Coûts fixes (ne dépendent pas du nombre de participants) : animatrice 3,5 × 18 = 63,00 € ; diététicienne 2,5 × 55 = 137,50 € ; salle 30,00 € ; total **230,50 €** par atelier. Coûts variables (par participant) : denrées 2,40 € + fiche 0,35 € = **2,75 €**.

2. Coût par participant = 230,50 / n + 2,75 :

Participants	Coût total de l'atelier	Coût par participant	Recettes (23 € × n)	Résultat de l'atelier
6	247,00 €	41,17 €	138,00 €	− 109,00 €
8	252,50 €	31,56 €	184,00 €	− 68,50 €
10	258,00 €	25,80 €	230,00 €	− 28,00 €
12	263,50 €	21,96 €	276,00 €	+ 12,50 €

Participants	Coût total de l'atelier	Coût par participant	Recettes (23 € × n)	Résultat de l'atelier
14	269,00 €	19,21 €	322,00 €	+ 53,00 €

3. Recette par participant : 20 + 3 = 23 € ; chaque participant rapporte 23 − 2,75 = 20,25 € pour couvrir les coûts fixes. Seuil : 230,50 / 20,25 = **11,4**, soit **12 participants** au minimum.

4. Avec 9 participants : coût 230,50 + 9 × 2,75 = 255,25 € ; recettes 9 × 23 = 207,00 € ; perte **48,25 €** par atelier. Solutions : réduire les coûts fixes (la diététicienne intervient un atelier sur deux et l'animatrice formée assure les autres ; salle prêtée gratuitement par la commune) ; augmenter la fréquentation (inscription par les relais, covoiturage, rappels) ; demander un complément à un autre financeur (conférence des financeurs).

5. Une forte participation financière exclurait les retraités aux petites pensions, qui sont souvent les plus isolés et les plus exposés à la dénutrition. Cela irait contre l'objectif d'équité du projet (universalisme proportionné).

Partie 6 – La trésorerie, la logistique et les méthodes pédagogiques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un plan de trésorerie mois par mois et repérer le besoin de trésorerie.
- Proposer des solutions à un problème de trésorerie.
- Calculer des quantités brutes à partir d'une recette, d'un nombre de portions et d'un rendement.
- Préparer la logistique d'un atelier : check-list et conducteur.
- Choisir une méthode pédagogique adaptée au type d'objectif.
- Calculer le coût et les apports d'une recette d'atelier avec la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un budget équilibré sur l'année peut poser un problème de trésorerie : les dépenses arrivent avant les recettes (une subvention est souvent versée en partie à la notification, le solde après le bilan).
- Solde de fin de mois = solde de début + encaissements − décaissements. Le besoin de trésorerie maximal est le solde le plus négatif. Les contributions en nature n'entrent pas dans la trésorerie.
- Solutions : demander une avance ou un acompte, décaler des achats, échelonner les paiements, mobiliser la trésorerie de la structure, demander le versement anticipé d'un cofinancement.
- Mise à l'échelle : coefficient = portions voulues / portions de la recette. Poids brut = poids net / rendement (partie comestible).
- Méthodes pédagogiques : expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative. La « pyramide de l'apprentissage » (« on retient 10 % de ce qu'on lit… ») ne repose sur aucune étude.

Exercice 8.31 – Le principe du plan de trésorerie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le trésorier de l'association Cuisine et Partage du Val (fictive) ne comprend pas pourquoi la banque l'appelle alors que le budget du projet est équilibré. Vous lui expliquez le plan de trésorerie.

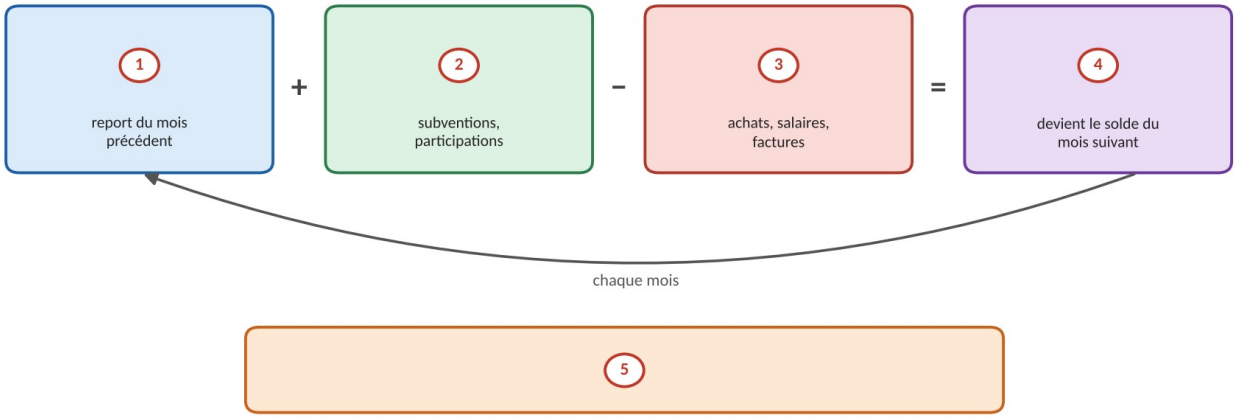


Figure 8.8 – Document 1 – Le calcul d'un plan de trésorerie (schéma à légender)

Document 2 – Les quatre premiers mois du projet

Trésorerie disponible au 1er janvier : 300 €. Janvier : aucun encaissement, 250 € de décaissements. Février : aucun encaissement, 420 € de décaissements. Mars : subvention de 1 200 € encaissée, 380 € de décaissements. Avril : aucun encaissement, 300 € de décaissements.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez le solde de fin de mois de janvier à avril. (4 pts)
3. Indiquez le mois où un problème apparaît et son montant. (1,5 pt)
4. Expliquez au trésorier, en deux phrases, pourquoi un budget équilibré n'empêche pas ce problème. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.32 – Construire un plan de trésorerie sur huit mois (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Pas à Pas (fictive) accompagne des familles d'enfants à besoins alimentaires particuliers. Son projet d'ateliers dure de janvier à août 2027. Le budget est équilibré, mais la directrice s'inquiète des versements. Vous construisez le plan de trésorerie.

Document 1 – Encaissements et décaissements prévus (hors contributions en nature)

- Trésorerie disponible au 1er janvier : 500 €.
- Commune : 1 000 € versés en mars.
- ARS : subvention de 3 000 €, versée pour moitié à la notification (mai) et pour moitié après le bilan (décembre).
- Participation des familles : 40 € par mois, de mars à août.
- Décaissements : janvier 350 € ; février 420 € ; mars 680 € ; avril 720 € ; mai 640 € ; juin 580 € ; juillet 300 € ; août 210 €.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le plan de trésorerie de janvier à août : encaissements, décaissements, calcul et solde de fin de mois. (5 pts)
2. Indiquez les mois de solde négatif et le besoin de trésorerie maximal. (2 pts)
3. Calculez le solde après le versement du solde de l'ARS en décembre, et vérifiez-le avec les totaux. (2 pts)
4. Proposez trois solutions adaptées à cette situation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.33 – Calculer les quantités à acheter (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'hébergement pour adultes en insertion (structure fictive) organise trois ateliers où l'on prépare le même plat : un dahl de lentilles corail aux carottes, servi avec du riz. Chaque atelier sert 15 portions. La recette de base est prévue pour 4 personnes.

Document 1 – Recette pour 4 personnes (poids nets) et prix (fictifs)

Denrée	Poids net pour 4	Rendement	Prix
Lentilles corail sèches	200 g	100 %	2,90 € le kg
Carottes épluchées	300 g	85 %	1,40 € le kg
Oignons épluchés	100 g	90 %	1,80 € le kg
Lait de coco	200 g	100 %	4,50 € le kg
Riz blanc cru	240 g	100 %	1,90 € le kg
Coriandre, épices, sel	–	–	0,90 € par atelier

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coefficient de mise à l'échelle. (1 pt)
2. Calculez, pour un atelier, le poids net et le poids brut de chaque denrée. (4 pts)
3. Calculez les quantités brutes à commander pour les trois ateliers. (2 pts)
4. Calculez le coût d'un atelier, le coût par portion et le coût des trois ateliers (coût de chaque ligne arrondi au centime). (3 pts)
5. Calculez le poids de carottes épluchées obtenu si l'on oublie le rendement, et dites ce qui se passe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.34 – Préparer la logistique d'un atelier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez le premier atelier du foyer d'hébergement de l'exercice 8.33, le jeudi de 10 h à 13 h, dans la cuisine collective du foyer (deux plaques, un four, un seul évier). Douze résidents sont inscrits, dont un allergique à l'arachide et une personne en fauteuil roulant. L'atelier se termine par le repas pris ensemble.

Document 1 – Ce qu'a prévu l'éducateur du foyer

« On commence à 10 h, tout le monde arrive en même temps. Je fais les courses le matin même. On épluche tous les légumes ensemble à l'évier. On mange à 13 h, et on range après. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez quatre risques dans l'organisation prévue par l'éducateur. (2 pts)
2. Construisez la check-list « avant, jour J, après » de l'atelier. (4 pts)
3. Construisez le conducteur de l'atelier, de 9 h 30 à 13 h 30, en indiquant pour chaque séquence l'horaire, l'activité et le rôle de l'animatrice. (4 pts)
4. Indiquez les adaptations prévues pour la personne en fauteuil roulant et pour la personne allergique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.35 – Choisir une méthode pédagogique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue prépare des séances pour un groupe de jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par une association d'insertion (fictive). Elle a écrit un objectif par séance, et cite dans son projet une affirmation entendue en formation.

Document 1 – Cinq objectifs de séance

a) À la fin de la séance, les jeunes savent citer trois repères du PNNS sur les fruits et légumes.

b) À la fin de la séance, les jeunes savent cuire des pâtes et des œufs durs sans aide.

c) À la fin de la séance, les jeunes savent comparer le prix au kilo de deux produits en rayon.

d) À la fin de la séance, les jeunes osent goûter un légume qu'ils ne connaissent pas.

e) À la fin de la séance, les jeunes savent repérer une technique publicitaire dans une publicité pour une boisson sucrée.

Document 2 – L'affirmation citée par la collègue

« On retient 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on entend, 30 % de ce qu'on voit, et 90 % de ce qu'on fait. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque objectif : connaissance, savoir-faire ou attitude. (2,5 pts)
2. Proposez pour chaque objectif une méthode pédagogique et un outil. (5 pts)
3. Que pensez-vous de l'affirmation du document 2 ? Proposez une autre justification des méthodes actives. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.36 – Coût et apports d'une recette d'atelier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min*

Mise en situation – Mise en situation

La crèche parentale Les Petits Cailloux (structure fictive) propose aux parents un atelier « déjeuner du soir vite fait » : un gratin de pâtes complètes au brocoli et au thon, puis une poire. L'atelier prépare 10 portions pour adultes. Le budget de l'atelier est de 2,50 € par portion.

Document 1 – Grammages nets par portion, pertes et prix (fictifs)

Denrée	Grammage net	Perte	Prix
Pâtes sèches au blé complet, crues	70 g	sans perte	2,20 € le kg
Brocoli	120 g	30 %	3,20 € le kg
Thon au naturel, égoutté	50 g	sans perte	14,00 € le kg égoutté
Lait demi-écrémé	120 g	sans perte	1,05 € le kg
Farine de blé T65	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,90 € le kg
Poire	120 g	10 %	2,60 € le kg
Épices, muscade, sel	–	–	forfait 0,60 € pour 10 portions

Document 2 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870)	353	11,8	67,6	1,8	2,2	6,1	0,016	32,1	3,2	0
Brocoli, cru (20057)	31,9	2,9	2,15	1,7	0,36	2,6	0,075	47,5	0,81	91,2
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74	6,26	0,76	traces
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078	119	0,041	1,6
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03	25,3	1,31	–
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	traces	traces	28,8	0	0,61	978	0,15	traces
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	0,072	4,3

On calcule avec les poids nets (le brocoli et les pâtes sont pesés crus) ; « traces », « < » et « – » sont comptés

0.

À vous de jouer – Questions

1. Établissez le bon de commande pour 10 portions (poids net total, poids brut, coût de chaque ligne au centime) et vérifiez le budget. (5 pts)
2. Calculez les apports d'une portion du repas complet (gratin et poire) en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C. (5 pts)
3. Calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides. (2 pts)
4. Commentez l'intérêt nutritionnel de ce repas pour un adulte (fibres, calcium, vitamine C, sel). (2 pts)
5. Proposez une version sans poisson pour une famille végétarienne, et dites ce qui change. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 8.31

1. Légendes : 1 Solde de début de mois ; 2 Encaissements ; 3 Décaissements ; 4 Solde de fin de mois ; 5 Solde négatif = besoin de trésorerie : avance, acompte, décalage des achats.

2. Janvier : 300 + 0 − 250 = **50 €**. Février : 50 + 0 − 420 = **− 370 €**. Mars : − 370 + 1 200 − 380 = **450 €**. Avril : 450 + 0 − 300 = **150 €**.

3. En **février** : le solde est de **− 370 €**. L'association ne peut pas payer ses dépenses sans découvert bancaire.

4. Le budget compare les charges et les produits sur toute la durée du projet, sans tenir compte des dates. La trésorerie suit les dates réelles des entrées et des sorties d'argent : si la subvention arrive en mars et que les dépenses commencent en janvier, il manque de l'argent entre-temps.

Corrigé – Exercice 8.32

1. Plan de trésorerie :

Mois	Encaissements	Décaissements	Calcul	Solde de fin de mois
Janvier	0	350	500 + 0 − 350	150
Février	0	420	150 − 420	− 270
Mars	1 040	680	− 270 + 1 040 − 680	90
Avril	40	720	90 + 40 − 720	− 590
Mai	1 540	640	− 590 + 1 540 − 640	310
Juin	40	580	310 + 40 − 580	− 230
Juillet	40	300	− 230 + 40 − 300	− 490
Août	40	210	− 490 + 40 − 210	− 660

Mars : 1 000 (commune) + 40 (familles) = 1 040 € ; mai : 1 500 (ARS, première moitié) + 40 = 1 540 €.

2. Soldes négatifs en février, avril, juin, juillet et août. Besoin de trésorerie maximal : **660 €**, fin août, et il dure jusqu'en décembre.

3. Décembre : − 660 + 1 500 = **840 €**. Vérification : encaissements de janvier à août = 1 040 + 40 + 1 540 + 4 × 40 = **2 740 €** ; décaissements = 350 + 420 + 680 + 720 + 640 + 580 + 300 + 210 = **3 900 €** ; 500 + 2 740 − 3 900 + 1 500 = **840 €**.

4. Exemples : demander à l'ARS un acompte plus important (par exemple 80 % à la notification) ; demander à la commune un versement en janvier plutôt qu'en mars ; décaler en septembre les achats qui peuvent attendre et échelonner les paiements des intervenants ; mobiliser la trésorerie générale de l'association ou un prêt court, après accord du bureau.

Corrigé – Exercice 8.33

1. Coefficient : 15 / 4 = **3,75**.

2. et 3. Quantités :

Denrée	Poids net pour 15	Poids brut pour 15	Brut pour 3 ateliers
Lentilles corail	200 × 3,75 = 750 g	750 g	2,25 kg
Carottes	300 × 3,75 = 1 125 g	1 125 / 0,85 = 1 323,5 g	3,97 kg
Oignons	100 × 3,75 = 375 g	375 / 0,90 = 416,7 g	1,25 kg
Lait de coco	200 × 3,75 = 750 g	750 g	2,25 kg
Riz blanc cru	240 × 3,75 = 900 g	900 g	2,70 kg

4. Coût d'un atelier : lentilles 0,750 × 2,90 = 2,18 € ; carottes 1,3235 × 1,40 = 1,85 € ; oignons 0,4167 × 1,80 = 0,75 € ; lait de coco 0,750 × 4,50 = 3,38 € ; riz 0,900 × 1,90 = 1,71 € ; forfait 0,90 €. Total : **10,77 €** par atelier ; **0,72 € par portion** ; **32,31 €** pour les trois ateliers.

5. Si l'on achète 1 125 g de carottes brutes, on obtient 1 125 × 0,85 = **956 g** épluchés, soit 169 g de moins que prévu : les portions seront plus petites ou il faudra racheter en urgence. À l'inverse, surestimer conduit au gaspillage.

Corrigé – Exercice 8.34

1. Risques : faire les courses le matin même (oubli, retard, produit manquant) ; accueillir tout le monde à 10 h sans installation préalable ; un seul évier pour 12 personnes (attente, désordre) ; pas de recueil des allergies ni de vérification de l'étiquetage (arachide) ; pas d'adaptation pour la personne en fauteuil ; manger à 13 h sans avoir prévu le temps de cuisson du riz et du dahl.

2. Check-list :

Moment	Tâches
Avant (J – 7 à J – 1)	Liste de courses chiffrée (exercice 8.33) ; courses la veille ; vérification du matériel (balances, couteaux, planches, casseroles, plaques, four) ; recueil des allergies et lecture des étiquettes (lait de coco, épices : traces d'arachide ?) ; fiches recettes illustrées ; rappel aux inscrits la veille ; poste de travail adapté pour le fauteuil
Jour J	Installation à 9 h 30 ; lavage des mains ; affichage de la recette et des allergènes ; émargement ; trois postes de travail (légumes, dahl, riz) ; respect de la marche en avant ; repas ensemble
Après	Rangement et vaisselle en équipes ; restes refroidis rapidement et étiquetés, ou jetés ; inventaire du matériel et des denrées ; bilan à chaud ; saisie des présences et des avis

3. Conducteur (exemple) :

Horaire	Activité	Rôle de l'animatrice
9 h 30 – 10 h	Installation des postes, denrées pesées par poste	Prépare avec l'éducateur
10 h – 10 h 15	Accueil, lavage des mains, présentation de la recette avec photos	Accueille, explique
10 h 15 – 10 h 45	Épluchage et découpe en trois postes, à tour de rôle à l'évier	Montre les gestes, veille à la sécurité
10 h 45 – 11 h 30	Cuisson du dahl ; cuisson du riz ; dressage de la table	Fait goûter, ajuste l'assaisonnement
11 h 30 – 12 h	Calcul du coût par portion avec les participants ; échange	Anime l'échange
12 h – 13 h	Repas partagé	Mange avec le groupe, recueille les avis
13 h – 13 h 30	Rangement en équipes, bilan à chaud	Organise, remercie

4. Fauteuil roulant : un plan de travail à hauteur adaptée (table basse ou planche sur les genoux), une circulation dégagée, une tâche qu'il peut faire assis (découpe, assaisonnement, calcul du coût). Allergie à l'arachide : vérification de toutes les étiquettes (mention « traces »), plan de travail et ustensiles nettoyés, pas de produit à risque dans l'atelier, connaissance du protocole d'urgence et du traitement de la personne.

Corrigé – Exercice 8.35

1. a) connaissance ; b) savoir-faire ; c) savoir-faire ; d) attitude ; e) savoir-faire critique, qui touche aussi une

attitude (esprit critique).

2. Exemples : a) méthode interrogative et ludique : quiz avec cartes et photos d'aliments ; b) méthode démonstrative puis active : démonstration, puis chaque jeune cuisine à son poste ; c) méthode active sur le terrain : comparaison en magasin avec une calculatrice et une fiche de relevé ; d) méthode active et coopérative : dégustation à l'aveugle sans obligation, dans un climat bienveillant, avec un jeune pair qui goûte en premier ; e) méthode interrogative et active : analyse en petits groupes de trois publicités réelles, puis débat.

3. Ces pourcentages, attribués à tort à Edgar Dale, ne reposent sur **aucune étude** : il ne faut pas les citer comme une preuve. On justifie plutôt les méthodes actives par ce qui est établi : l'engagement actif, la pratique répétée et le retour d'information favorisent l'apprentissage, surtout pour les savoir-faire.

Corrigé – Exercice 8.36

1. Bon de commande pour 10 portions :

Denrée	Poids net total	Poids brut	Coût
Pâtes complètes	700 g	700 g	0,700 × 2,20 = 1,54 €
Brocoli	1 200 g	1 200 / 0,70 = 1 714 g	1,714 × 3,20 = 5,49 €
Thon égoutté	500 g	500 g	0,500 × 14,00 = 7,00 €
Lait demi-écrémé	1 200 g	1 200 g	1,200 × 1,05 = 1,26 €
Farine	80 g	80 g	0,080 × 1,10 = 0,09 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Emmental râpé	150 g	150 g	0,150 × 9,90 = 1,49 €
Poires	1 200 g	1 200 / 0,90 = 1 333 g	1,333 × 2,60 = 3,47 €
Épices, sel	–	–	0,60 €
Total			**21,10 €**

Coût par portion : 21,10 / 10 = **2,11 €**, inférieur au budget de 2,50 € (marge de 0,39 € par portion). Le thon représente 7,00 / 21,10 = 33,2 % du coût.

2. Apports d'une portion (gratin + poire) : énergie **609,1 kcal** ; protéines **34,39 g** ; glucides **76,26 g**, dont sucres **20,89 g** ; lipides **15,51 g** ; fibres **11,15 g** ; sel **0,66 g** ; calcium **381,9 mg** ; fer **3,86 mg** ; vitamine C **116,5 mg**. Exemple de calcul : protéines des pâtes = 70 × 11,8 / 100 = 8,26 g ; calcium de l'emmental = 15 × 978 / 100 = 146,7 mg.

3. Protéines : 34,39 × 4 / 609,1 × 100 = **22,6 %** ; lipides : 15,51 × 9 / 609,1 × 100 = **22,9 %** ; glucides : 76,26 × 4 / 609,1 × 100 = **50,1 %**. Le reste (environ 3,7 %) vient des fibres (11,15 × 2 = 22,3 kcal).

4. Le repas apporte **37 %** des 30 g de fibres conseillés par jour (11,15 / 30) grâce aux pâtes complètes, au brocoli et à la poire ; **40 %** de la référence de 950 mg de calcium (381,9 / 950), grâce au lait et à l'emmental ; plus que la référence quotidienne de 110 mg de vitamine C (brocoli cru ; une partie sera perdue à la cuisson). Le sel reste modéré (0,66 g). Les lipides sont plutôt bas : on peut garder l'huile de colza, riche en oméga 3.

5. Remplacer le thon par 50 g de pois chiches appertisés égouttés et 1 œuf, ou par du fromage de chèvre. Les protéines baissent un peu (les pois chiches en apportent moins que le thon), les fibres augmentent, le coût diminue. On vérifie avec la table Ciqual avant de valider.

Partie 7 – Piloter : tableau de bord, risques et communication

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire la boucle du pilotage et lire un tableau de bord.
- Construire une matrice des risques et proposer des mesures de prévention.
- Analyser un tableau de bord à mi-parcours et proposer des décisions.
- Construire un plan de communication par cible.
- Mesurer l'efficacité des canaux de communication.
- Réagir à un imprévu (baisse de financement, retrait d'un partenaire) en ajustant le budget.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Pilotage : suivre l'avancement (activités, délais, budget, participation), repérer les écarts et les risques, décider des ajustements, rendre compte aux partenaires et aux financeurs.
- Tableau de bord : quelques indicateurs de suivi, chacun avec une valeur prévue, une valeur réalisée et une analyse. Taux de présence = présences constatées / présences possibles × 100.
- Matrice des risques : criticité = probabilité × gravité (de 1 à 16) ; on traite d'abord les risques les plus critiques, et toujours ceux de gravité maximale.
- Plan de communication : objectifs de communication, cibles, messages, canaux et supports, calendrier, budget et évaluation. Auprès des publics éloignés, les relais humains sont souvent les canaux les plus efficaces.
- Coût par contact = coût du canal / nombre de contacts obtenus ; taux de transformation = inscrits / contacts × 100.

Exercice 8.37 – La boucle du pilotage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution et application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le jardin partagé des Prés-Verts (association fictive) conduit huit ateliers « du jardin à l'assiette ». À mi-parcours, le comité technique prépare son tableau de bord.

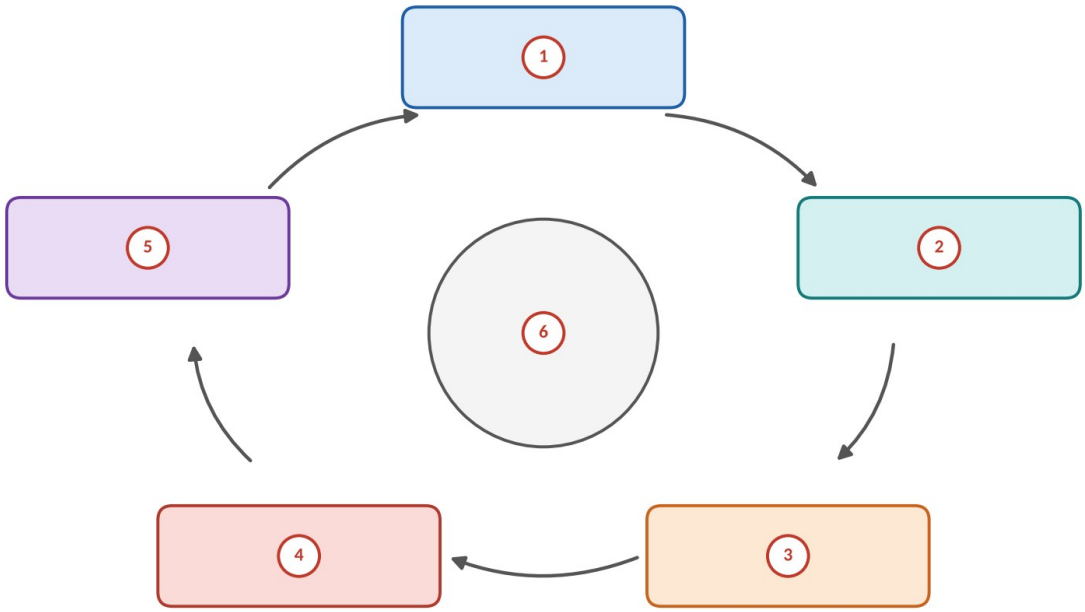


Figure 8.9 – Document 1 – La boucle du pilotage (schéma à légender)

Document 2 – Données à mi-parcours

Indicateur de suivi	Prévu à mi-parcours	Réalisé
Ateliers réalisés	4 sur 8	4
Taux de présence	75 % au moins	38 présences sur 48 possibles
Budget consommé	environ 50 % de 3 000 €	1 260 €
Fiches recettes testées et validées	6 sur 8	5

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Calculez le taux de présence, la part du budget consommée et la part des fiches validées. (3 pts)

3. Complétez la colonne « analyse » du tableau de bord pour chaque indicateur. (2 pts)

4. Proposez une décision pour l'indicateur en retard. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.38 – Construire une matrice des risques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Bocal et Compagnie (exercice 8.21) va faire circuler une cuisine mobile, installée dans un camion aménagé, dans six villages. L'équipe a listé les risques et les a notés de 1 (faible) à 4 (fort).

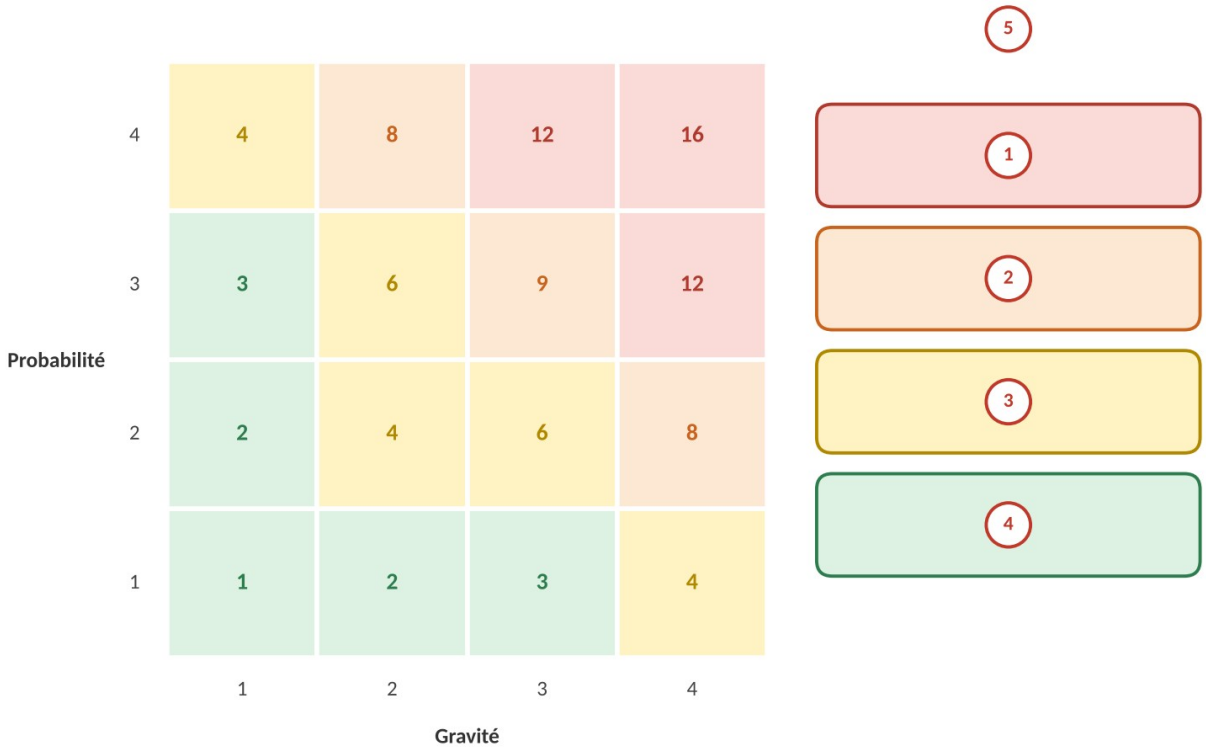


Figure 8.10 – Document 1 – La matrice des risques (schéma à légender)

Document 2 – Les risques identifiés

Risque	Probabilité	Gravité
R1 – Panne du camion un jour d'atelier	2	4
R2 – Mauvais temps qui réduit la fréquentation	3	2
R3 – Faible participation dans certains villages	3	3
R4 – Rupture de la chaîne du froid pendant une tournée	2	4
R5 – Départ d'un bénévole formé	3	2
R6 – Réaction allergique pendant une dégustation	1	4
R7 – Hausse du prix des denrées	4	2

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez la criticité de chaque risque et classez-les. (3 pts)
3. Proposez une mesure de prévention ou de réduction pour chaque risque. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi R6 doit être traité alors que sa criticité est la plus faible. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.39 – Analyser un tableau de bord multisite (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bailleur social Habitat du Causse (exercice 8.8) a étendu le projet « Cuisiner dans un petit logement » à trois résidences, avec huit ateliers prévus dans chacune. À mi-parcours, vous préparez le tableau de bord pour le comité de pilotage. Budget total : 4 800 €.

Document 1 – Données de suivi à mi-parcours (fictives)

Résidence	Ateliers réalisés	Places par atelier	Présences constatées
A – Les Genêts	4	12	41
B – Le Vallon	4	12	26
C – Les Aubépines	4	9	33

Budget consommé : 2 150 €. Questionnaires « avant » recueillis : 30 sur 36 inscrits. Supports en FALC validés : 3 sur 4 prévus.

Remarques de la référente : « À la résidence B, les ateliers ont lieu à 14 h, en même temps que l'aide aux devoirs ; beaucoup de mères ne peuvent pas venir. La cuisine de la résidence C est très petite, mais le groupe est soudé. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence de chaque résidence et le taux global. (4 pts)
2. Calculez le budget consommé et la part des questionnaires recueillis. (2 pts)
3. Présentez le tableau de bord avec une analyse par indicateur (objectif de présence : 75 %). (3 pts)
4. Proposez deux décisions à soumettre au comité de pilotage. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.40 – Construire un plan de communication (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réfrigérateur solidaire du Val-d'Orbe (exercice 8.7) sera installé en avril 2027. La directrice du CCAS vous demande le plan de communication. Elle insiste : « Personne ne doit avoir honte de se servir. »

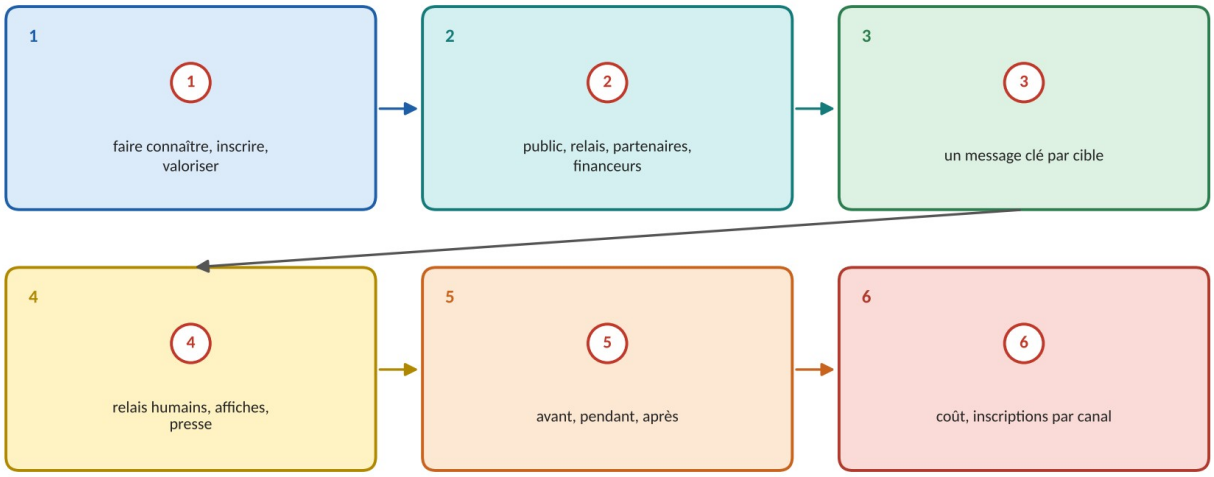


Figure 8.11 – Document 1 – Les six étapes d'un plan de communication (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Formulez trois objectifs de communication distincts des objectifs de santé du projet. (2 pts)
3. Construisez le plan de communication pour quatre cibles : habitants, donateurs (commerces), riverains, élus. Pour chaque cible, donnez l'objectif, le message, le canal et le moment. (5 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer la communication. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.41 – Mesurer l'efficacité des canaux de communication (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle courte · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social du quartier de la Butte (fictif) a recruté les participants de ses ateliers « bien manger, petit budget » avec six canaux. À la fin des inscriptions, la référente vous transmet les chiffres et vous demande où mettre l'argent l'an prochain.

Document 1 – Contacts, inscriptions et coût par canal (fictifs)

Canal	Personnes qui ont pris contact	Personnes inscrites	Coût du canal
Relais (mères et voisines formées)	17	12	120 € (temps de formation)
Affiches dans le quartier	8	4	35 €
Réseaux sociaux du centre	6	2	72 € (4 h de travail)
Flyers distribués (400)	3	1	60 €
Radio locale (annonce gratuite)	2	1	0 €
Bouche-à-oreille	10	8	0 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de contacts et d'inscrits, puis la part de chaque canal dans les inscriptions. (3 pts)
2. Calculez le taux de transformation (inscrits / contacts) et le coût par inscrit de chaque canal payant. (3 pts)
3. Calculez la part des inscriptions apportées par les relais humains (relais et bouche-à-oreille) et le rendement des flyers (contacts pour 100 flyers). (2 pts)
4. Rédigez la recommandation pour l'an prochain (5 à 6 lignes). (3 pts)
5. Indiquez une limite de cette analyse. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.42 – Réagir à un imprévu en cours de projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Saveurs du Faubourg (fictive) conduit huit ateliers culinaires de 15 places. En février, deux mauvaises nouvelles arrivent : la commune réduit sa subvention de 30 %, et l'épicerie partenaire, qui devait donner les denrées, ferme. Vous préparez les propositions pour le comité de pilotage.

Document 1 – Budget prévisionnel initial

Charges	Montant	Produits	Montant
Charges monétaires fixes (coordination, communication, évaluation)	2 000 €	74 – ARS	2 500 €
Charges monétaires des ateliers (400 € par atelier)	3 200 €	74 – Commune	1 000 €
86 – Denrées données par l'épicerie (50 € par atelier)	400 €	74 – CAF	800 €
86 – Salle et bénévolat (forfaits annuels)	500 €	70 – Participation (1,50 € × 15 personnes × 8 ateliers)	180 €
		Autofinancement	720 €
		87 – Contributions en nature	900 €
Total	6 100 €	Total	6 100 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la nouvelle subvention de la commune et le nouveau coût monétaire des ateliers si l'association doit acheter les denrées. (2 pts)
2. Calculez le besoin de financement supplémentaire créé par ces deux nouvelles. (2 pts)
3. Le comité envisage de passer à sept ateliers. Calculez les nouvelles charges, la nouvelle participation et l'autofinancement nécessaire. Présentez le budget équilibré. (6 pts)
4. Proposez deux autres solutions et comparez-les à la réduction du nombre d'ateliers. (3 pts)
5. Indiquez qui doit être informé de ces changements et pourquoi l'ARS doit l'être. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 8.37

1. Légendes : 1 Mesurer les indicateurs de suivi ; 2 Comparer le réalisé au prévu ; 3 Analyser les causes des écarts ; 4 Décider des ajustements ; 5 Rendre compte aux partenaires ; 6 Tableau de bord.
2. Présence : 38 / 48 × 100 = **79,2 %**. Budget : 1 260 / 3 000 × 100 = **42,0 %**. Fiches : 5 / 8 × 100 = **62,5 %** (6 prévues à mi-parcours, soit 75 %).
3. Ateliers : conforme (4 sur 8). Présence : conforme (79,2 % ≥ 75 %). Budget : conforme, légèrement sous la moitié ; il reste 1 740 €. Fiches : **en retard** d'une fiche sur le prévu.
4. Exemple : fixer une séance de test de la fiche manquante avec deux jardiniers volontaires avant l'atelier 5, et confier la relecture à une personne désignée, avec une échéance notée au compte rendu.

Corrigé – Exercice 8.38

1. Légendes : 1 Prioritaire : traiter tout de suite ; 2 À traiter : mesures prévues ; 3 À surveiller ; 4 Acceptable ; 5 Criticité = P × G.
2. Criticités : R3 = 3 × 3 = **9** ; R1 = 2 × 4 = **8** ; R4 = 2 × 4 = **8** ; R7 = 4 × 2 = **8** ; R2 = 3 × 2 = **6** ; R5 = 3 × 2 = **6** ; R6 = 1 × 4 = **4**. Classement : R3, puis R1, R4 et R7, puis R2 et R5, puis R6.
3. Exemples : R3 – passer par les mairies, les écoles et des relais dans chaque village, choisir l'horaire avec les habitants, annoncer le passage une semaine avant ; R1 – entretien du camion avant la saison, solution de repli (salle communale avec réchauds), numéro de dépannage ; R4 – glacières et accumulateurs de froid, thermomètre, relevé des températures, produits sensibles achetés le jour même ; R7 – recettes de saison, achats auprès des producteurs partenaires, marge de 10 % sur la ligne denrées ; R2 – tonnelle, solution de repli en salle, report de date ; R5 – former au moins deux bénévoles par poste, conducteurs écrits et partagés ; R6 – recueil des allergies, affichage des 14 allergènes réglementaires (règlement européen INCO n° 1169/2011), variantes sans allergène, protocole d'urgence.
4. R6 a une gravité **maximale** (4) : une réaction allergique peut mettre la vie en danger. Un risque grave appelle toujours des mesures, même s'il est peu probable ; c'est aussi une obligation d'information sur les allergènes.

Corrigé – Exercice 8.39

1. Places possibles : A = 4 × 12 = 48 ; B = 4 × 12 = 48 ; C = 4 × 9 = 36. Taux de présence : A = 41 / 48 × 100 = **85,4 %** ; B = 26 / 48 × 100 = **54,2 %** ; C = 33 / 36 × 100 = **91,7 %**. Global : (41 + 26 + 33) / (48 + 48 + 36) = 100 / 132 × 100 = **75,8 %**.
2. Budget : 2 150 / 4 800 × 100 = **44,8 %** pour 50 % d'avancement ; il reste 2 650 €. Questionnaires : 30 / 36 × 100 = **83,3 %**.
3. Tableau de bord :

Indicateur	Prévu	Réalisé	Analyse
Ateliers réalisés	12 sur 24	12	Conforme
Présence globale	75 %	75,8 %	Conforme, mais masque de grands écarts
Présence résidence B	75 %	54,2 %	Écart de – 20,8 points : horaire en concurrence avec l'aide aux devoirs
Budget consommé	environ 50 %	44,8 %	Conforme
Questionnaires « avant »	36	30 (83,3 %)	Six manquants : à recueillir avant l'atelier suivant
Supports FALC	4	3	Un support en retard

4. Exemples : déplacer les ateliers de la résidence B à un autre horaire (10 h ou samedi matin), choisi avec les mères ; à la résidence C, garder le groupe mais limiter à 9 places, ou réserver une salle plus grande pour

l'atelier final ; utiliser une partie du reste du budget pour une garde d'enfants pendant les ateliers de la résidence B.

Corrigé – Exercice 8.40

1. Légendes : 1 Objectifs de communication ; 2 Cibles ; 3 Messages ; 4 Canaux et supports ; 5 Calendrier ; 6 Budget et évaluation.
2. Exemples : faire connaître le réfrigérateur et ses règles à tous les habitants avant son ouverture ; obtenir l'engagement d'au moins quatre commerces donateurs ; informer les riverains pour prévenir les conflits ; valoriser l'action auprès des élus après six mois.
3. Plan de communication (exemple) :

Cible	Objectif	Message	Canal, support	Quand
Habitants	Connaître et utiliser le réfrigérateur sans gêne	« Ici, chacun donne et chacun prend. »	Affiche avec pictogrammes sur le réfrigérateur, journal municipal, relais du CCAS et des associations	Deux semaines avant l'ouverture, puis en continu
Commerces donateurs	S'engager à donner	« Moins de gaspillage, un geste visible pour votre commune. »	Rencontre en face à face, courrier de la mairie, convention simple	Un mois avant
Riverains	Accepter l'installation	« Un réfrigérateur entretenu chaque jour par des bénévoles ; un contact en cas de problème. »	Courrier dans les boîtes, rencontre sur place	Trois semaines avant
Élus	Soutenir et pérenniser	« En six mois, … kg de produits sauvés et partagés. »	Note de bilan, présentation en conseil municipal	Au bout de six mois

Le message aux habitants s'adresse à **tous** (« chacun donne et chacun prend ») : il ne désigne pas les personnes pauvres, ce qui évite la honte et la stigmatisation.

4. Exemples : nombre de commerces donateurs engagés ; nombre de personnes qui disent avoir connu le réfrigérateur par chaque canal (court questionnaire) ; nombre de plaintes de riverains.

Corrigé – Exercice 8.41

1. Contacts : 17 + 8 + 6 + 3 + 2 + 10 = **46** ; inscrits : 12 + 4 + 2 + 1 + 1 + 8 = **28**. Parts des inscriptions : relais 12 / 28 = **42,9 %** ; bouche-à-oreille 8 / 28 = **28,6 %** ; affiches 4 / 28 = **14,3 %** ; réseaux sociaux 2 / 28 = **7,1 %** ; flyers **3,6 %** ; radio **3,6 %**.
2. Taux de transformation : relais 12 / 17 = **70,6 %** ; affiches **50,0 %** ; réseaux sociaux **33,3 %** ; flyers **33,3 %** ; radio **50,0 %** ; bouche-à-oreille **80,0 %**. Coût par inscrit : relais 120 / 12 = **10,00 €** ; affiches 35 / 4 = **8,75 €** ; réseaux sociaux 72 / 2 = **36,00 €** ; flyers 60 / 1 = **60,00 €**.
3. Relais humains : (12 + 8) / 28 × 100 = **71,4 %** des inscriptions. Flyers : 3 contacts pour 400 flyers, soit **0,75 contact pour 100 flyers**.
4. Exemple : « Les relais humains apportent sept inscriptions sur dix, avec les meilleurs taux de transformation. Les flyers coûtent 60 € par inscrit et touchent très peu de personnes. L'an prochain, nous proposons de supprimer les flyers, de réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, de garder les affiches, peu coûteuses, et d'investir les 60 € économisés dans la formation de deux relais supplémentaires. »
5. Limites : les effectifs sont petits (un inscrit de plus change fortement les pourcentages) ; une personne a pu être touchée par plusieurs canaux et n'en citer qu'un ; le coût des relais ne compte pas le temps qu'ils donnent.

Corrigé – Exercice 8.42

1. Commune : 1 000 × (1 − 0,30) = **700 €**. Coût monétaire d'un atelier si l'on achète les denrées : 400 + 50 = **450 €** ; pour huit ateliers : 8 × 450 = **3 600 €**.

2. Besoin supplémentaire : baisse de la commune 300 € + denrées à acheter 400 € = **700 €**. Les contributions en nature baissent de 400 € (comptes 86 et 87), sans effet sur l'équilibre.

3. Sept ateliers : charges monétaires = 2 000 + 7 × 450 = **5 150 €** ; contributions en nature : **500 €** ; total des charges : **5 650 €**. Participation : 1,50 × 15 × 7 = **157,50 €**. Produits connus : 2 500 + 700 + 800 + 157,50 + 500 = 4 657,50 € ; autofinancement nécessaire : 5 650 − 4 657,50 = **992,50 €** (contre 720 € prévus, soit 272,50 € de plus).

Charges	Montant	Produits	Montant
Charges fixes	2 000,00 €	74 – ARS	2 500,00 €
Sept ateliers (450 € chacun)	3 150,00 €	74 – Commune	700,00 €
86 – Salle et bénévolat	500,00 €	74 – CAF	800,00 €
		70 – Participation	157,50 €
		Autofinancement	992,50 €
		87 – Contributions en nature	500,00 €
Total	**5 650,00 €**	**Total**	**5 650,00 €**

4. Exemples : chercher un nouveau donateur de denrées (autre commerce, banque alimentaire, producteurs du marché), ce qui garde les huit ateliers ; demander à la CAF ou à une fondation un complément de 700 €. Ces solutions préservent l'action pour le public, mais elles sont incertaines et prennent du temps. Réduire à sept ateliers est sûr et rapide, mais diminue l'offre : on peut le décider à titre provisoire et rétablir le huitième atelier si un financement arrive.

5. Informer le comité de pilotage (qui décide), les financeurs (ARS, CAF, commune), les participants (si le calendrier change) et les bénévoles. L'ARS doit être informée parce que la subvention a été accordée pour un projet précis (huit ateliers) : toute modification importante du contenu ou du budget doit lui être signalée, et parfois validée par un avenant. Le bilan devra expliquer l'écart.

Partie 8 – Synthèse : du plan d'action au cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Compléter un cadre logique, l'outil des financeurs.
- Préparer la pérennisation dès la conception et chiffrer le coût d'une deuxième année.
- Organiser et valoriser l'engagement des bénévoles.
- Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie.
- Défendre son plan d'action devant le jury.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve : diagnostic, objectifs, planning, budget, trésorerie, repas (Ciqual 2025), risques et éthique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Cadre logique : un tableau à quatre colonnes (logique d'intervention, indicateurs, sources de vérification, hypothèses) et quatre lignes (objectif général, objectif spécifique, résultats, activités). Il vérifie la cohérence verticale (les activités produisent les résultats qui servent l'objectif) et horizontale (chaque niveau a ses indicateurs).
- Pérennisation : former des relais, rendre les outils réutilisables, inscrire l'action dans le projet de la structure, diversifier les financements, rechercher des financements pluriannuels (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, fonds européens).
- Bénévoles : une mission claire, un accueil, une formation, un référent, une reconnaissance ; le bénévolat est valorisé aux comptes 86 et 87 avec un taux horaire justifié.
- Tableur : formules plutôt que valeurs saisies à la main ; une cellule par donnée ; vérification automatique de l'équilibre.
- À l'oral : relier chaque choix du plan d'action au diagnostic, montrer les chiffres, reconnaître les limites et dire ce que l'on ferait autrement.

Exercice 8.43 – Compléter un cadre logique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une fondation (fictive) demande à l'association Bocal et Compagnie (exercices 8.21 et 8.38) de présenter son projet de cuisine mobile sous la forme d'un cadre logique. Le coordinateur a commencé le tableau.

Document 1 – Cadre logique à compléter

Niveau	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à améliorer l'alimentation des habitants isolés de six villages	……	……	–
Objectif spécifique	Dans un an, 30 % des participants cuisinent au moins deux fois par semaine des légumes achetés aux producteurs locaux (valeur initiale : 12 %)	……	……	……
Résultats	……	6 villages desservis ; 4 producteurs partenaires	……	……
Activités	24 haltes de la cuisine mobile avec atelier et dégustation ; formation de 8 bénévoles	……	……	……

À vous de jouer – Questions

1. Complétez les cases vides du cadre logique. (6 pts)

2. Expliquez la différence entre un indicateur et une source de vérification. (2 pts)

3. Expliquez à quoi servent les hypothèses, avec un exemple. (2 pts)

Ma réponse

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

.....

Exercice 8.44 – Préparer la pérennisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La première année du projet « Cuisine au cœur du bourg » (association fictive) a été financée en grande partie par une subvention qui ne sera pas renouvelée. Le bureau veut continuer huit ateliers en deuxième année, avec 12 participants par atelier, et vous demande un budget réaliste.

Document 1 – Charges monétaires de la première année et choix pour la deuxième année (fictifs)

Poste	Année 1	Choix pour l'année 2
Diététicienne	8 ateliers × 3 h × 55 €	3 ateliers × 3 h × 55 € ; les autres sont animés par l'animatrice et deux relais formés
Coordinatrice	60 h × 24 €	20 h × 24 € (outils déjà construits)
Animatrice	64 h × 18 €	64 h × 18 €
Denrées	8 × 40 €	8 × 40 €
Petit matériel	450 €	0 € (matériel acquis)
Communication	220 €	80 € (affiches réimprimées)
Formation des relais	2 séances × 3 h × 55 €	0 €

Ressources de l'année 2 : participation de 2 € par personne et par atelier ; la commune accorde 600 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les charges monétaires des deux années et la baisse en euros et en pourcentage. (4 pts)
2. Calculez la participation, puis l'autofinancement nécessaire en année 2, et sa part dans les charges. (3 pts)
3. Relevez dans le document 1 trois choix de l'année 1 qui ont préparé la pérennisation. (3 pts)
4. Proposez deux pistes de financement pour l'année 2. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.45 – Organiser et valoriser le bénévolat (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association Saveurs du Faubourg (exercice 8.42) s'appuie sur neuf bénévoles. Après deux départs l'an dernier, la présidente vous demande de mieux organiser leur engagement et de valoriser leur temps dans le budget (charges monétaires : 8 000 €). L'association a fixé à 15 € le taux horaire de valorisation (taux fictif, à justifier dans l'annexe du budget).

Document 1 – Temps des bénévoles prévu sur l'année

- 4 bénévoles aux ateliers : 8 ateliers de 3 heures chacun.
- 2 bénévoles à la logistique : 10 heures chacun.
- 3 bénévoles à la communication : 6 heures chacun.

Document 2 – Ce qu'ont dit les deux bénévoles partis

« On ne savait jamais ce qu'on devait faire en arrivant. » « Personne ne m'a dit merci, et je n'ai jamais su si les familles avaient aimé. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'heures de bénévolat et leur valorisation. (2 pts)
2. Calculez la part du bénévolat dans le budget total, contributions en nature comprises. (2 pts)
3. Indiquez comment le bénévolat apparaît dans le budget. (2 pts)
4. Proposez cinq mesures pour fidéliser les bénévoles, en vous appuyant sur le document 2. (4 pts)
5. Citez deux tâches qu'un bénévole ne doit pas assurer seul dans un atelier culinaire, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.46 – Utiliser un tableur pour le budget et la trésorerie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous construisez dans un tableur le suivi du budget du Clos-Fleuri (exercices 8.27 et 8.29) et un plan de trésorerie. Votre tutrice veut que le fichier se mette à jour seul quand on change une valeur.

Document 1 – Organisation de la feuille « Budget »

Ligne 1 : titres. Colonne A : postes. Colonne B : prévu. Colonne C : réalisé. Colonne D : écart en euros. Colonne E : écart en pourcentage. Lignes 2 à 9 : les huit postes de l'exercice 8.29. Ligne 10 : totaux.

Document 2 – Organisation de la feuille « Trésorerie »

Ligne 1 : titres. Colonne A : mois. Colonne B : encaissements. Colonne C : décaissements. Colonne D : solde de fin de mois. La cellule D1 contient le solde de départ (500 €). Lignes 2 à 9 : janvier à août.

À vous de jouer – Questions

1. Écrivez les formules des cellules D2, E2, B10 et D10 de la feuille « Budget ». (4 pts)
2. Écrivez la formule de la cellule D2 de la feuille « Trésorerie », puis celle de D3, recopiable vers le bas. (2 pts)
3. Proposez une formule qui affiche « équilibré » ou « déséquilibré » en comparant le total des charges (cellule H20) et le total des produits (cellule K20). (2 pts)
4. Proposez une mise en forme qui fait apparaître les soldes négatifs. (2 pts)
5. Donnez deux règles pour qu'un fichier partagé reste fiable. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.47 – Défendre son plan d'action devant le jury (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors du temps 1 de l'épreuve E5, après votre exposé de 10 minutes, le jury vous interroge pendant 20 minutes sur le plan d'action de votre projet de stage. Vous vous entraînez avec cinq questions fréquentes.

Document 1 – Cinq questions du jury

a) « Pourquoi avez-vous choisi des ateliers culinaires plutôt qu'une autre action ? »

b) « Votre budget repose à 70 % sur une seule subvention. Est-ce raisonnable ? »

c) « Votre taux de présence était de 62 %. Qu'avez-vous fait ? »

d) « Qui a décidé des horaires des ateliers ? »

e) « Si vous deviez recommencer, que changeriez-vous dans votre plan d'action ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque question, dites ce que le jury cherche à vérifier. (5 pts)
2. Rédigez une réponse de trois à quatre phrases pour chaque question, appuyée sur des faits. (7,5 pts)
3. Indiquez trois erreurs à éviter pendant l'entretien. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.48 – Cas complet : le « bol du bénévole » d'un festival de musique (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage auprès de l'association qui organise « Les Nuits du Lac » (festival fictif de musique, trois soirs en juillet 2027, en zone rurale). Le festival repose sur 160 bénévoles, qui travaillent souvent de 16 h à 2 h du matin. L'an dernier, plusieurs malaises ont été signalés et beaucoup de bénévoles se sont plaints de la cantine. La coordinatrice vous confie, avec une diététicienne libérale, un projet pour l'alimentation et l'hydratation des bénévoles : un « bol du bénévole » servi chaque nuit à 23 h, des fontaines à eau et une gourde pour chacun. Le projet commence en semaine 0 (fin avril 2027).

Document 1 – Questionnaire de fin d'édition 2026 (données fictives) : 112 répondants sur 160 bénévoles

Réponse	Nombre
A sauté au moins un repas pendant le festival	47
A surtout mangé des chips ou des sandwichs la nuit	58
A bu moins d'un litre et demi d'eau par jour	63
A ressenti un malaise ou une grande fatigue	19
Est satisfait de la cantine	41
Trouve les horaires de la cantine inadaptés	66

Croisement : parmi les 48 bénévoles postés après 22 h, 29 ont sauté au moins un repas ; parmi les 64 autres, 18 sont dans ce cas.

Document 2 – Règles de financement (fictives)

- Fondation Terres et Fêtes : 50 % au plus des charges monétaires du projet, dans la limite de 3 000 € ; versement de 70 % à la signature (mai), le solde après le bilan (octobre).
- Communauté de communes : 1 200 € accordés, versés en septembre.
- Le festival complète par autofinancement. Il affecte au projet une trésorerie de 900 € au 1er avril.
- Un brasseur, partenaire du festival, propose de payer les gourdes si elles portent le logo de sa bière.

Document 3 – Les tâches du projet (durées en semaines)

Tâche	Intitulé	Durée	Antériorités
A	Analyse du questionnaire 2026	2	–
B	Choix des actions avec la coordinatrice	1	A
C	Dossier pour la fondation	2	B
D	Recherche de producteurs locaux	3	B
E	Conception du bol et des fiches	3	B
F	Commande des gourdes et location des fontaines	2	C
G	Formation de l'équipe de la cantine	1	D, E
H	Communication auprès des bénévoles	2	E
I	Festival	1	F, G, H
J	Bilan	2	I

Document 4 – Éléments du budget (fictifs)

- Denrées du bol : 480 portions (160 bénévoles × 3 nuits), coût à calculer (document 5).
- Gourdes : 160 × 2,10 €. Location de 3 fontaines à eau pendant 4 jours : 45 € par fontaine et par jour.
- Diététicienne : 2 jours de préparation de 7 h et 3 soirs de présence de 4 h, à 50 € de l'heure.
- Impression des affiches et des fiches : 180 €. Coordinatrice salariée : 40 h à 22,00 € de l'heure.
- Équipe de la cantine : 12 bénévoles × 3 jours × 6 h, valorisées à 14 € de l'heure. Cuisine de la salle des fêtes prêtée par la commune : valorisée 600 €.
- Jusqu'ici, le festival achetait à un traiteur un sandwich de minuit à 2,90 € pour chaque bénévole et chaque nuit (hors projet).

Document 5 – Le « bol du bénévole » : grammages nets par portion, pertes et prix (fictifs) et extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Net par portion	Perte	Prix	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Riz complet, cru (9102)	60 g	–	2,40 € le kg	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01	11,1	0
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	80 g	–	2,60 € le kg	108	8,31	13	0,97	7	0,68	58	0,2
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	40 g	–	3,40 € le kg	105	2,66	18,3	1,68	3,1	0,59	3,51	2,1
Poivron rouge, cru (20087)	50 g	15 %	3,80 € le kg	33,6	1,06	5,98	< 0,5	3,2	< 0,013	4,8	121
Tomate sans précision, crue (20385)	60 g	5 %	2,90 € le kg	19,2	0,6	3,69	< 0,5	1,02	< 0,013	6,78	20,1
Huile de colza (17130)	6 g	–	3,20 € le kg	900	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	60 g	–	2,60 € le kg	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 2
Nectarine ou brugnon, chair et peau, sans noyau, crue (13399)	150 g	8 %	3,20 € le kg	49,5	0,74	11,3	< 0,5	0,47	< 0,013	4,88	3,24

Citron, cumin, sel : forfait de 1,60 € pour 160 portions. On calcule avec les poids nets ; « < » est compté 0.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic et objectifs (8 points)

1. Calculez le taux de participation au questionnaire et les pourcentages du document 1. (2 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de bénévoles qui ont sauté un repas. (1 pt)

3. Calculez le risque relatif de sauter un repas pour les bénévoles postés après 22 h, avec son intervalle de confiance à 95 % (formule : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$), et interprétez-le. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels SMART. (3 pts)

Partie B – Planification (5 points)

5. Calculez les dates au plus tôt et au plus tard, les marges, le chemin critique et la durée minimale du projet.

(4 pts)

6. Le festival a lieu en semaine 10. Le projet est-il tenable ? Indiquez la marge disponible. (1 pt)

Partie C – Le bol du bénévole (9 points)

7. Établissez le bon de commande pour une nuit (160 portions) : poids net, poids brut, coût de chaque ligne au centime. Calculez le coût par portion et le coût des trois nuits. (3 pts)

8. Calculez les apports d'une portion (bol et nectarine) en énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel, calcium et vitamine C, et la répartition de l'énergie. (4 pts)

9. Commentez ce repas pour un bénévole qui travaille la nuit, et proposez une modification pour augmenter les protéines ; calculez-en l'effet avec un œuf dur de 50 g (Ciqual 22010 : 134 kcal, 13,5 g de protéines, 8,62 g de lipides, 41 mg de calcium pour 100 g). (2 pts)

Partie D – Budget, financement et trésorerie (12 points)

10. Calculez chaque charge du projet et présentez le budget équilibré, contributions en nature comprises. (5 pts)

11. Calculez la subvention de la fondation et l'autofinancement du festival. Comparez avec la dépense de sandwichs évitée. (3 pts)

12. Construisez le plan de trésorerie d'avril à octobre (décaissements : avril 920 € ; mai 400 € ; juin 556 € ; juillet : le reste des charges monétaires) ; indiquez le besoin maximal et une solution propre à un festival. (4 pts)

Partie E – Risques, communication et éthique (6 points)

13. Identifiez trois risques propres à cette action et proposez une mesure pour chacun. (3 pts)

14. Rédigez le message de communication adressé aux bénévoles, et indiquez deux canaux. (1,5 pt)

15. Que répondez-vous au brasseur (document 2) ? Justifiez. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 8.43

1. Cadre logique complété (exemple) :

Niveau	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif général	Contribuer à améliorer l'alimentation des habitants isolés de six villages	Évolution de la consommation de fruits et de légumes des habitants participants	Enquête au début et à la fin du projet	–
Objectif spécifique	30 % des participants cuisinent au moins deux fois par semaine des légumes des producteurs locaux (valeur initiale 12 %)	Part des participants qui déclarent cuisiner ces légumes au moins deux fois par semaine	Questionnaire avant/après	Les producteurs maintiennent des prix accessibles
Résultats	La cuisine mobile dessert six villages ; quatre producteurs vendent sur les haltes ; les habitants savent cuisiner les légumes de saison	6 villages desservis ; 4 producteurs partenaires ; part des participants capables de réaliser une recette	Planning des haltes, conventions, grille d'observation des ateliers	Les mairies prêtent un emplacement ; les habitants viennent aux haltes
Activités	24 haltes avec atelier et dégustation ; formation de 8 bénévoles	24 haltes réalisées ; 8 bénévoles formés ; nombre de participants par halte	Feuilles d'émargement, compte rendu de formation	Le camion est en état ; les bénévoles restent disponibles

2. L'**indicateur** est ce que l'on mesure (une part, un nombre) ; la **source de vérification** est le document ou l'outil qui permet de le mesurer et de le prouver (questionnaire, feuille d'émargement, convention).

3. Les hypothèses sont les conditions extérieures, hors du contrôle de l'équipe, nécessaires pour passer d'un niveau au suivant. Exemple : si les mairies refusent un emplacement, les haltes ne pourront pas avoir lieu, même si l'équipe est prête. Elles sont reliées à la matrice des risques.

Corrigé – Exercice 8.44

1. Année 1 : diététicienne 8 × 3 × 55 = 1 320 € ; coordinatrice 60 × 24 = 1 440 € ; animatrice 64 × 18 = 1 152 € ; denrées 8 × 40 = 320 € ; matériel 450 € ; communication 220 € ; formation 2 × 3 × 55 = 330 € ; total **5 232 €**. Année 2 : diététicienne 3 × 3 × 55 = 495 € ; coordinatrice 20 × 24 = 480 € ; animatrice 1 152 € ; denrées 320 € ; communication 80 € ; total **2 527 €**. Baisse : 5 232 − 2 527 = **2 705 €**, soit 2 705 / 5 232 × 100 = **51,7 %**.

2. Participation : 2 € × 12 × 8 = **192 €**. Autofinancement : 2 527 − 192 − 600 = **1 735 €**, soit 1 735 / 2 527 × 100 = **68,7 %** des charges.

3. La formation de deux relais (qui animent désormais cinq ateliers) ; l'achat de matériel durable ; la construction des outils par la coordinatrice (conducteurs, fiches, affiches réutilisables).

4. Exemples : déposer une demande à la conférence des financeurs si le public a plus de 60 ans, ou à la CAF s'il s'agit de familles ; inscrire l'action dans le contrat local de santé ou le projet alimentaire territorial ; solliciter une caisse de retraite ou une mutuelle ; demander à la commune une convention sur trois ans.

Corrigé – Exercice 8.45

1. Heures : 4 × 8 × 3 = 96 h ; 2 × 10 = 20 h ; 3 × 6 = 18 h ; total **134 heures**. Valorisation : 134 × 15 = **2 010 €**.

2. Budget total : 8 000 + 2 010 = 10 010 € ; part du bénévolat : 2 010 / 10 010 × 100 = **20,1 %**.

3. Au **compte 86** (emplois des contributions volontaires en nature, côté charges) et au **compte 87**

(contributions volontaires en nature, côté produits), pour 2 010 € de chaque côté. Le taux de 15 € et le nombre d'heures sont justifiés dans l'annexe.

4. Exemples : une fiche mission pour chaque poste (ce que l'on attend, horaires, référent) ; un accueil avant le premier atelier et un point de dix minutes au début de chaque séance ; une courte formation (hygiène, accueil du public, gestes de sécurité) ; un retour sur ce que les familles ont dit et sur les résultats du projet ; une reconnaissance (remerciements publics, repas des bénévoles, attestation d'engagement) ; une place au comité de pilotage pour un représentant des bénévoles.
5. Exemples : la gestion d'une allergie ou d'un malaise (il faut connaître le protocole et appeler les secours) ; le conseil nutritionnel individuel (il relève de la diététicienne) ; la sécurité des gestes dangereux (four, friture, couteaux) avec un groupe entier.

Corrigé – Exercice 8.46

1. D2 : =C2-B2 ; E2 : =D2/B2 (format pourcentage) ou =(C2-B2)/B2*100 ; B10 : =SOMME(B2:B9) ; D10 : =C10-B10 (ou =SOMME(D2:D9)).
2. D2 : =D1+B2-C2 ; D3 : =D2+B3-C3, à recopier vers le bas jusqu'à D9.
3. =SI(H20=K20;"équilibré";"déséquilibré") ; pour éviter les erreurs d'arrondi : =SI(ARRONDI(H20-K20;2)=0;"équilibré";"déséquilibré").
4. Une mise en forme conditionnelle : si la valeur de la cellule est inférieure à 0, police rouge et fond rose ; on peut aussi utiliser le format de nombre « 0,00 € ;[Rouge]-0,00 € ».
5. Exemples : ne jamais écrire un résultat à la main là où une formule est prévue ; garder une seule version partagée, avec la date de mise à jour ; protéger les cellules de formules ; noter les sources des données (devis, factures) ; faire vérifier les totaux par une deuxième personne.

Corrigé – Exercice 8.47

1. a) La cohérence entre l'action et le diagnostic, et la connaissance des données probantes. b) La compréhension des règles de prudence et de cofinancement. c) La capacité à piloter : repérer un écart, en chercher les causes, décider. d) La participation du public. e) La capacité d'analyse critique et de recul.
2. Exemples de réponses :

a) « Le diagnostic montrait que 71 % des personnes ne savaient pas préparer les légumes secs, alors que l'épicerie en disposait. Une information seule n'aurait pas donné ce savoir-faire. Les ateliers culinaires sont une méthode active, recommandée pour les savoir-faire, et je les ai combinés avec des dégustations à l'épicerie pour agir aussi sur l'accès. »

b) « Ce n'est pas idéal : si la subvention avait été refusée, le projet aurait été réduit de moitié. J'ai distingué les financements acquis et sollicités, et prévu une version à quatre ateliers. Pour l'an prochain, nous avons déposé une demande à la CAF pour diversifier les ressources. »

c) « J'ai calculé le taux après chaque atelier : 62 %, pour un objectif de 80 %. Les appels aux absentes ont montré que l'horaire de 14 h tombait pendant la sortie de l'école. Le comité de pilotage a déplacé les ateliers à 9 h 30, et le taux est remonté à 81 % sur les trois derniers ateliers. »

d) « Les horaires ont été choisis avec trois participantes lors d'une réunion de préparation, puis confirmés avec le groupe. Quand ils ne convenaient plus, nous les avons changés sur leur proposition. »

e) « J'associerais les participantes dès le choix des actions, et pas seulement des horaires. Je prévoirais plus de temps pour les inscriptions, que j'avais sous-estimé de près de 20 %, et je préparerais le questionnaire "après" dès le début. »

3. Exemples : réciter le dossier sans répondre à la question ; se justifier sans reconnaître une limite réelle ; donner un chiffre sans savoir le recalculer ; parler des participants de façon stigmatisante ; couper la parole au jury.

Corrigé – Exercice 8.48

Partie A

1. Participation : 112 / 160 × 100 = **70,0 %**. Pourcentages (sur 112 répondants) : repas sauté **42,0 %** ; chips ou sandwichs la nuit **51,8 %** ; moins d'un litre et demi d'eau **56,3 %** (63 / 112 = 56,25 %) ; malaise ou grande fatigue **17,0 %** ; satisfaits de la cantine **36,6 %** ; horaires inadaptés **58,9 %**.

2. p = 47 / 112 = 0,420 ; marge = 1,96 × √(0,420 × 0,580 / 112) = **0,091**, soit **± 9,1 points** ; intervalle : **32,9 % à 51,1 %**. Entre un tiers et la moitié des bénévoles ont probablement sauté un repas. Les 48 non-répondants sont peut-être différents (biais de non-réponse).

3. Postés après 22 h : 29 / 48 = 60,4 % ; autres : 18 / 64 = 28,1 % ; RR = 60,4 / 28,1 = **2,15**. Erreur type : √(1/29 − 1/48 + 1/18 − 1/64) = 0,234 ; IC à 95 % : exp(ln 2,15 ± 1,96 × 0,234) = **[1,36 ; 3,38]**. Les bénévoles postés la nuit ont environ deux fois plus de risque de sauter un repas ; l'intervalle ne contient pas 1 : la différence est statistiquement significative. Cela justifie un repas servi à 23 h.

4. Exemple. Objectif général : contribuer à préserver la santé des bénévoles du festival. OS1 : lors de l'édition 2027, réduire de 42 % à 20 % la part des bénévoles qui sautent au moins un repas (questionnaire de fin d'édition). OS2 : lors de l'édition 2027, réduire de 56 % à 30 % la part des bénévoles qui boivent moins d'un litre et demi d'eau par jour. Objectifs opérationnels : servir chaque nuit à 23 h, pendant les trois nuits, 160 bols du bénévole, soit 480 portions ; installer trois fontaines à eau et remettre une gourde à chacun des 160 bénévoles avant le premier soir.

Partie B

5. Calculs (en semaines) :

Tâche	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Fin au plus tard	Marge
A (2)	0	2	0	2	0
B (1)	2	3	2	3	0
C (2)	3	5	4	6	1
D (3)	3	6	4	7	1
E (3)	3	6	3	6	0
F (2)	5	7	6	8	1
G (1)	6	7	7	8	1
H (2)	6	8	6	8	0
I (1)	max(7 ; 7 ; 8) = 8	9	8	9	0
J (2)	9	11	9	11	0

Chemin critique : **A → B → E → H → I → J** ; durée minimale : 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 = **11 semaines**.

6. Le festival (I) peut commencer au plus tôt en semaine 8 ; s'il a lieu en semaine 10, il reste **2 semaines de marge** pour l'ensemble des tâches qui le précèdent. Le projet est tenable, à condition de ne pas dépasser ces deux semaines de retard sur la conception du bol et la communication.

Partie C

7. Bon de commande pour 160 portions : riz complet 9,6 kg × 2,40 = **23,04 €** ; haricots rouges 12,8 kg × 2,60 = **33,28 €** ; maïs 6,4 kg × 3,40 = **21,76 €** ; poivrons 8,0 kg net, 8,0 / 0,85 = 9,41 kg brut × 3,80 = **35,76 €** ; tomates 9,6 kg net, 9,6 / 0,95 = 10,11 kg brut × 2,90 = **29,31 €** ; huile 0,96 kg × 3,20 = **3,07 €** ; fromage blanc 9,6 kg × 2,60 = **24,96 €** ; nectarines 24,0 kg net, 24,0 / 0,92 = 26,09 kg brut × 3,20 = **83,48 €** ; forfait **1,60 €**. Total par nuit : **256,26 €** ; par portion : 256,26 / 160 = **1,60 €** ; trois nuits : 3 × 256,26 = **768,78 €**.

8. Apports d'une portion : énergie **540,4 kcal** ; protéines **18,29 g** ; glucides **85,03 g** ; lipides **11,07 g** ; fibres **12,77 g** ; sel **0,84 g** ; calcium **146,9 mg** ; vitamine C **78,4 mg**. Exemple : énergie du riz = 60 × 350 / 100 = 210 kcal ; vitamine C du poivron = 50 × 121 / 100 = 60,5 mg. Répartition : protéines 18,29 × 4 / 540,4 = **13,5 %** ; lipides 11,07 × 9 / 540,4 = **18,4 %** ; glucides 85,03 × 4 / 540,4 = **62,9 %** ; fibres environ 4,7 %.

9. Le repas est riche en glucides complexes et en fibres (riz complet, haricots rouges), utiles pour tenir

pendant un effort prolongé ; il apporte beaucoup de vitamine C et peu de sel ; il se mange froid, se prépare à l'avance et se sert vite, ce qui convient à une pause courte. Les protéines (13,5 % de l'énergie) et les lipides sont un peu bas pour un repas principal. Avec un œuf dur de 50 g : protéines 18,29 + 6,75 = **25,04 g** (16,5 % de l'énergie) ; énergie 540,4 + 67 = **607,4 kcal** ; lipides 11,07 + 4,31 = **15,38 g** ; calcium **167,4 mg**. Coût supplémentaire : le prix d'un œuf (environ 0,30 €, prix fictif), soit environ 1,90 € par portion.

Partie D

10. Charges : denrées 768,78 € ; gourdes 160 × 2,10 = 336,00 € ; fontaines 3 × 4 × 45 = 540,00 € ; diététicienne (2 × 7 + 3 × 4) × 50 = 26 × 50 = 1 300,00 € ; impression 180,00 € ; coordinatrice 40 × 22,00 = 880,00 € ; bénévolat 12 × 3 × 6 × 14 = 3 024,00 € ; cuisine prêtée 600,00 €.

Charges	Montant	Produits	Montant
60 – Denrées du bol	768,78 €	74 – Fondation Terres et Fêtes (sollicitée)	2 002,39 €
60 – Gourdes	336,00 €	74 – Communauté de communes (acquise)	1 200,00 €
61 – Location des fontaines	540,00 €	Autofinancement du festival	802,39 €
62 – Honoraires de la diététicienne	1 300,00 €	87 – Bénévolat	3 024,00 €
62 – Impression	180,00 €	87 – Mise à disposition de la cuisine	600,00 €
64 – Coordinatrice	880,00 €		
86 – Bénévolat	3 024,00 €		
86 – Mise à disposition de la cuisine	600,00 €		
Total	**7 628,78 €**	**Total**	**7 628,78 €**

11. Charges monétaires : 768,78 + 336 + 540 + 1 300 + 180 + 880 = **4 004,78 €**. Fondation : 50 % × 4 004,78 = **2 002,39 €**, inférieur au plafond de 3 000 €. Autofinancement : 4 004,78 − 2 002,39 − 1 200 = **802,39 €**. Sandwichs évités : 480 × 2,90 = **1 392 €** ; le festival économise donc 1 392 − 802,39 = **589,61 €** par rapport à l'an dernier, tout en offrant un repas plus complet.

12. Fondation : 70 % × 2 002,39 = 1 401,67 € en mai ; solde 600,72 € en octobre. Décaissements de juillet : 4 004,78 − 920 − 400 − 556 = 2 128,78 €.

Mois	Encaissements	Décaissements	Solde de fin de mois
Avril	0	920,00	900 − 920 = − 20,00
Mai	1 401,67	400,00	981,67
Juin	0	556,00	425,67
Juillet	0	2 128,78	− 1 703,11
Août	0	0	− 1 703,11
Septembre	1 200,00	0	− 503,11
Octobre	600,72	0	97,61

Besoin maximal : **1 703,11 €** en juillet et en août. Solution propre au festival : les recettes de la billetterie et de la buvette sont encaissées en juillet ; le festival peut avancer cette somme sur sa trésorerie générale. On peut aussi demander à la communauté de communes un versement en juillet. Vérification : 900 + 1 401,67 + 1 200 + 600,72 − 4 004,78 = 97,61 € ; les 900 € apportés couvrent l'autofinancement de 802,39 € et il reste 97,61 €.

Partie E

13. Exemples : chaleur et rupture de la chaîne du froid (fromage blanc, riz cuit) : préparation l'après-midi, stockage au froid, service dans les deux heures, relevé des températures, jamais de riz cuit gardé à température ambiante (*Bacillus cereus*) ; faible consommation du bol par les bénévoles postés loin de la cantine : distribution au poste par une équipe mobile ; allergies (lait, céleri éventuel dans les épices) :

affichage des allergènes, version sans fromage blanc ; malaise d'un bénévole : lien avec le poste de secours, rappel de boire à chaque prise de poste.

14. Exemple : « Cette année, on prend soin de ceux qui font le festival : à 23 h, ton bol t'attend à la cantine, ou il vient à toi à ton poste. Ta gourde se remplit aux trois fontaines. » Canaux : le groupe de messagerie des bénévoles et la réunion d'accueil du premier jour ; affiches à la cantine et aux fontaines.

15. Refuser poliment : associer une marque de bière à un objet de prévention santé remis à tous les bénévoles serait contradictoire avec l'objectif, et la publicité pour les boissons alcoolisées est strictement encadrée en France par la loi Évin (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991). On peut proposer au brasseur de soutenir le projet autrement, sans logo sur les gourdes (par exemple en finançant les fontaines à eau, avec une simple mention dans le bilan), ou chercher un autre financeur.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Classer des actions dans les six stratégies ; rédiger une fiche QQOQCCP chiffrée ; choisir une action avec des critères ; relier actions et objectifs ; adapter une action à un public ; rédiger un plan d'action	8.1 à 8.6			
2	Construire une matrice pouvoir/intérêt ; organiser les instances de pilotage ; corriger une matrice RACI ; corriger une convention ; convaincre un partenaire ; rédiger un compte rendu	8.7 à 8.12			
3	Répondre à un appel à projets ; choisir le financeur ; vérifier l'éligibilité ; calculer une subvention avec un plafond et un taux ; construire un plan de financement ; relire un dossier	8.13 à 8.18			
4	Lire et calculer un réseau PERT ; construire un Gantt ; mesurer l'effet d'un retard ; estimer une charge de travail ; fixer un calendrier réel	8.19 à 8.24			
5	Classer les comptes ; calculer un coût horaire chargé ; construire un budget équilibré ; calculer des ratios ; analyser des écarts ; calculer un seuil de participants	8.25 à 8.30			
6	Construire un plan de trésorerie ; calculer des quantités brutes ; préparer la logistique et le conducteur ; choisir une méthode pédagogique ; calculer coût et apports avec la table Ciqual	8.31 à 8.36			
7	Lire un tableau de bord ; construire une matrice des risques ; analyser un suivi multisite ; construire un plan de communication ; mesurer l'efficacité des canaux ; réagir à un imprévu	8.37 à 8.42			
8	Compléter un cadre logique ; préparer la pérennisation ; organiser le bénévolat ; utiliser un tableur ; défendre un plan d'action ; traiter un cas complet	8.43 à 8.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.
