

CHAPITRE

08

Démarche de projet (2) : conception, plan d'action et pilotage

Démarche de projet (2) | Stratégies | Partenaires | Financements | Calendrier

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express


Sommaire

Fiche de révision du chapitre 8 3
1. Les définitions à savoir 3
2. Les outils 3
3. Les formules 4
4. Les financeurs 4
5. Les pièges 4
6. Auto-test 4
7. Flashcards 4
Compléments du chapitre enrichi 5

Fiches-outils du chapitre 8 5
O8.1 – Fiche action QQOQCCP 5
O8.2 – Cartographie des parties prenantes 6
O8.3 – Matrice RACI 6
O8.4 – Analyse d'un cahier des charges 6
O8.5 – Calcul PERT 6
O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé 6
O8.7 – Registre des risques 6
O8.8 – Compte rendu de réunion 6

Fiche de révision du chapitre 8

Démarche de projet (2) : plan d'action, partenaires, financements, pilotage

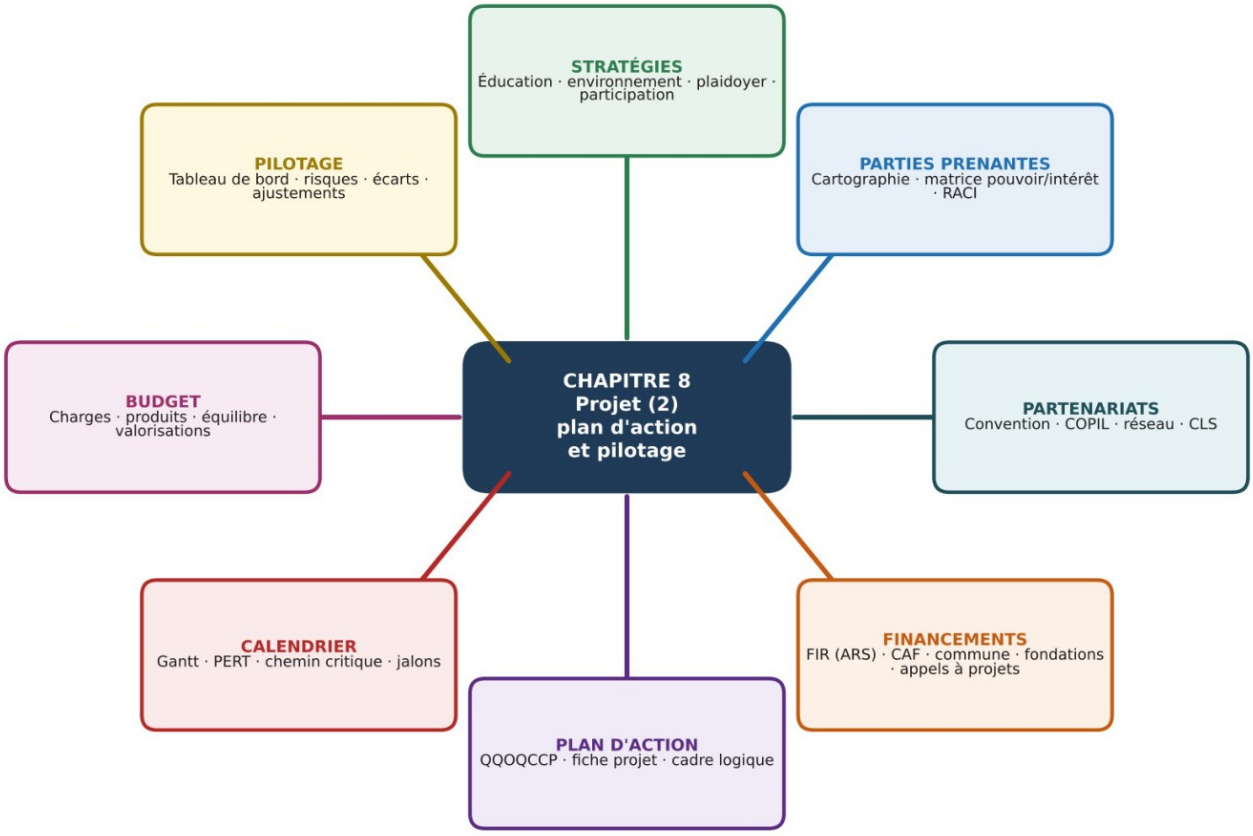

Carte mentale du chapitre 8

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Partie prenante / partenaire	Acteur concerné ou influent / acteur qui s'engage avec des ressources
COPIL / comité technique	Décide / organise et met en œuvre
Appel à projets	Sélection de projets selon un cahier des charges
Chemin critique	Tâches à marge nulle ; fixe la durée minimale
Marge	Date au plus tard − date au plus tôt
Criticité	Probabilité × gravité
Contributions en nature	Comptes 86 (charges) = 87 (produits)

2. Les outils

- **QQOQCCP** : quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi.
- **Matrice pouvoir/intérêt** : gérer étroitement · satisfaire · associer · surveiller.
- **RACI** : réalise · approuve (un seul) · consulté · informé.

- **Gantt** (tâches × temps, jalons) et **PERT** (antériorités, chemin critique).
- **Budget** : charges 60, 61-62, 64, 86 / produits 70, 74, 75, 87 ; équilibre ; cofinancement.
- **Tableau de bord** : ateliers, présences, budget consommé, délais.
- **Matrice des risques** : P × G de 1 à 16.

3. Les formules

Calcul	Formule et exemple
Ligne de budget	quantité × coût unitaire : 40 h × 38 € = 1 520 €
Coût horaire	coût employeur / 151,67 h : 2 840 / 151,67 = 18,73 €
Autofinancement	charges − autres produits : 3 510 − 3 094 = 416 €
Part d'un financeur	montant / total × 100 : 1 500 / 3 510 = 42,7 %
Écart budgétaire	(réalisé − prévu) / prévu × 100 : 26,40 / 210 = + 12,6 %
Date au plus tôt	max des fins des antériorités
Taux de présence	présences / (séances × inscrits) : 31 / 36 = 86,1 %

4. Les financeurs

ARS (FIR, art. L. 1435-8 CSP) · collectivités (CLS, contrat de ville, PAT) · CAF · conférence des financeurs (60 ans et plus, loi du 28/12/2015) · assurance maladie, mutuelles, caisses de retraite · fondations (vigilance conflits d'intérêts).

5. Les pièges

Attention

- Budget non équilibré ou 86 ≠ 87.
- Un seul financeur à 100 %.
- Plusieurs personnes « A » dans la RACI.
- Oublier les contraintes du calendrier (vacances, Ramadan, stage).
- Ne pas expliquer les écarts budgétaires.
- Déposer le dossier le dernier jour.

6. Auto-test

1. Que signifie QQOQCCP ? 2. Article du FIR ? 3. Public de la conférence des financeurs ? 4. Formule de la criticité ? 5. Comment calcule-t-on une date au plus tôt ? 6. Compte des subventions ? 7. Compte du personnel ? 8. Coût horaire de 2 660 € par mois ? 9. Rôle du COPIL ? 10. Que contient un compte rendu ?

Réponses : 1. Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi – 2. L. 1435-8 CSP – 3. 60 ans et plus – 4. Probabilité × gravité – 5. Maximum des fins des tâches antérieures – 6. 74 – 7. 64 – 8. 2 660 / 151,67 = 17,54 € – 9. Décider – 10. Présents, décisions, relevé d'actions.

7. Flashcards

Recto : Cadre logique ?	Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses
Recto : Cerfa des subventions ?	Verso : n° 12156 (ou plateforme Le Compte Asso)
Recto : CPOM ?	Verso : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Recto : PDCA ?	Verso : Planifier, faire, vérifier, agir (Deming)

Recto : Cadre logique ?	Verso : Objectifs, indicateurs, sources de vérification, hypothèses
Recto : Coût par résultat ?	Verso : 3 510 / 9 familles = 390 € (efficience)
Recto : Pérennisation ?	Verso : Relais formés, outils réutilisables, financements pluriannuels

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Plan de communication	Objectifs, cibles, messages, canaux, calendrier, budget, évaluation ; relais humains ; coût par contact
Méthodes	Expositive, interrogative, démonstrative, active, coopérative ; selon le type d'objectif ; « pyramide de l'apprentissage » = mythe
Logistique	Brut = net × coefficient / rendement (carottes 85 %, pommes de terre 80 %) ; check-list avant / J / après
Trésorerie	Solde = précédent + encaissements − décaissements ; besoin maximal ; acompte
Dossier de financement	Constats chiffrés, politiques, objectifs SMART, actions, participation, évaluation, budget cofinancé, pérennisation
Bénévoles	Mission, formation, reconnaissance ; comptes 86/87

Fiches-outils du chapitre 8

Outil	Intitulé	Utilité
O8.1	Fiche action QQOQCCP	Décrire chaque action du plan
O8.2	Cartographie des parties prenantes	Matrice pouvoir/intérêt et stratégie
O8.3	Matrice RACI	Répartir les rôles
O8.4	Analyse d'un cahier des charges	Vérifier l'éligibilité avant de répondre
O8.5	Calcul PERT	Dates, marges, chemin critique
O8.6	Suivi budgétaire prévu / réalisé	Analyser les écarts
O8.7	Registre des risques	Anticiper et réduire les risques
O8.8	Compte rendu de réunion	Décisions et relevé d'actions

O8.1 – Fiche action QQOQCCP

Question	Réponse
Quoi ?	
Qui ? (public, animateurs,	
partenaires)	
Où ?	
Quand ?	
Comment ? (méthodes,	
outils)	
Combien ? (moyens, coût)	

Question	Réponse
Pourquoi ? (objectif visé)	

O8.2 – Cartographie des parties prenantes

O8.3 – Matrice RACI

Inscrire les acteurs en en-tête ; R = réalise, A = approuve (un seul par tâche), C = consulté, I = informé.

O8.4 – Analyse d'un cahier des charges

Critère	Exigence de l'appel à projets	Mon projet conforme ?
Financeur, intitulé, date limite		
Publics et territoires prioritaires		
Actions éligibles / exclues		
Montant maximal, taux maximal		
Cofinancement exigé		
Durée, calendrier		
Évaluation demandée		
Pièces à joindre		
Critères de sélection		

O8.5 – Calcul PERT

Début au plus tôt = max des fins des antériorités ; fin au plus tard = min des débuts au plus tard des tâches suivantes ; marge = fin tard − fin tôt ; chemin critique = marges nulles.

O8.6 – Suivi budgétaire prévu / réalisé

Poste	Prévu (€)	Réalisé (€)	Écart (€ et %)	Explication
Total				

O8.7 – Registre des risques

O8.8 – Compte rendu de réunion

Réunion : ..... Date : ..... Lieu : ..... Présents : .....
Excusés : .....

1.

2.

3.

Prochaine réunion : .....
